

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial Loja

PROYECTO: K001 MTOP - Rehabilitación 24 meses - mantenimiento -48 meses C. Velacruz Chaguarpamba Río Pindo de 62.5 KM. long.

Líder del Proyecto:	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina (bhurtado@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Calderón Ojeda, Jaime Ramiro	Programas Relacionados:	Provincia - Loja, REHABILITACION (24 MESES) MANTENIMIENTO (48 MESES) C. VELACRUZ ¿ CHAGUARPAMBA RIO PINDO DE 62.5 KM. LONG. ADEMÁS, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Bustamante Rivera, Esner Fidel	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.766.3740	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	44,546,164.38
Localidad de Gestión:	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	15/04/2008 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	03/05/2018	Fecha de Fin Base:	04/01/2017
Modificado por:	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	Fecha del siguiente Hito:	31/05/2018

DATOS GENERALES

<p>Descripción</p> <p>DESCRIPCION: Rehabilitación de la vía principal con pavimento rígido, además del acceso a Olmedo e interconexión con Chaguarpamba con pavimento flexible y mantenimiento de las vías. Contratista: Cía Hidrobo Estrada Fiscalizador: Cía Fisolvar</p> <p>LINEA BASE: El proyecto permite la conexión interprovincial entre Loja y El Oro, este se lo concluyó en el año 2013, este proyecto inicia el 15 de enero de 2014, el periodo de mantenimiento rutinario.</p> <p>PRODUCTO/SERVICIO: Garantizar una red de Transporte seguro y competitivo.</p> <p>OBJETIVO GENERAL: Contribuir al desarrollo del País a través de la formulación de políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos, que garanticen un Sistema Nacional del Transporte Intermodal y Multimodal, sustentado en una red de Transporte con estándares internacionales de calidad, alineados con las directrices económicas, sociales, medioambientales y el plan nacional de desarrollo.</p> <p>OBJETIVO ESPECIFICOS: Mejorar la calidad en la vialidad, en beneficio de las diferentes comunidades, ofreciendo un mejor servicio en la transportación y movilidad, así como la seguridad en la transportación, beneficios en el desarrollo de las comunidades y por ende del País, permitir la comunicación interprovincial, regional e internacional.</p> <p>Beneficios Cualitativos</p> <p>Incrementar ancho de calzada, para mejorar la circulación vehicular. Mejorar las capa de rodadura de la vía, que disminuye los tiempos de viaje. Mejorar la transitabilidad del sector, para incrementar la productividad.</p> <p>Tipo de Beneficiario</p> <p>Pobladores de la región por incremento del turismo. Mejora las condiciones de vida de las poblaciones de Olmedo, Chaguarpamba. Favorece al sector agrícola, ganadero y comercial del sector y la región de influencia del proyecto.</p>
--


Restricciones

Para la ejecución de la obra debe contarse con el presupuesto y cronograma bien formulado, a fin de obtener una obra de buena calidad y que la misma sea entregada en la fecha establecida en el contrato.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 94.53 %
 Fecha de Inicio: 15/04/2008 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

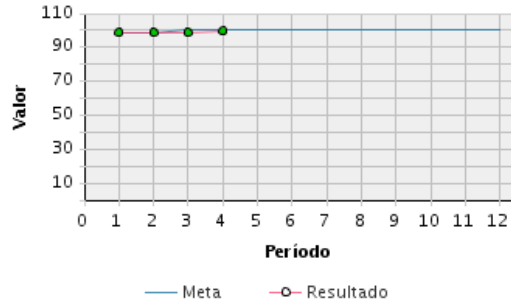

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	99 %	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	99 %	99 %	99 %	100 %								
	Estado											
	●	●	●	●								

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ABRIL 2018.- Con fecha 13 de abril de 2018, se suscribe el Acta de Recepción Definitiva. Personal y maquinaria del MTOP-Loja, realiza trabajos de mantenimiento de la vía Velacruz - Chaguarpamba - Río Pindo.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	03/05/2018 - 01:41 PM
Marzo 2018.- En trámite Recepción Definitiva. Febrero 2018.- Mediante Memorando MTOP-DDL-2018-360-ME, de fecha 23 de febrero de 2018, se designa la comisión para Recepción Definitiva del proyectos, una vez concluidos la etapa de mantenimiento.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	03/04/2018 - 09:48 AM
Enero 2017.- Contratista ejecuta trabajos de mantenimiento rutinario de la vía Velacruz-Chaguarpamba-Río Pindo: limpieza de cunetas, roza a mano y limpieza de alcantarillas.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/02/2018 - 05:48 PM
Diciembre 2017.- Contratista ejecuta trabajos de mantenimiento rutinario de la vía Velacruz-Chaguarpamba-Río Pindo: limpieza de cunetas, roza a mano.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/02/2018 - 05:48 PM
Noviembre 2017.- Contratista ejecuta trabajos de mantenimiento rutinario de la vía Velacruz-Chaguarpamba-Río Pindo: limpieza de cunetas, roza a mano.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	04/12/2017 - 11:38 AM
Octubre 2017.- Contratista ejecuta trabajos de mantenimiento rutinario de la vía Velacruz-Chaguarpamba-Río Pindo: limpieza de cunetas, roza a mano.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	04/12/2017 - 11:36 AM
Septiembre 2017.- Contratista ejecuta trabajos de mantenimiento rutinario de la vía Velacruz-Chaguarpamba-Río Pindo: limpieza de cunetas, roza a mano.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/10/2017 - 10:27 AM
Agosto 2017.- Contratista ejecuta trabajos de mantenimiento rutinario de la vía Velacruz-Chaguarpamba-Río Pindo: limpieza de cunetas, roza a mano.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	04/10/2017 - 04:05 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Julio 2017: Contratista ejecuta trabajos de mantenimiento rutinario de la vía Velacruz-Chaguarpamba-Río Pindo: limpieza de cunetas, roza a mano, trabajos que se ha dispuesto mediante ofcio MTOP-CONS_LOJ-2017-244-OF.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	04/08/2017 - 10:37 AM
Junio 2017.- Contratista ejecuta trabajos de mantenimiento rutinario de la vía Velacruz-Chaguarpamba-Río Pindo: limpieza de cunetas, roza a mano.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	04/08/2017 - 10:18 AM
Mayo 2017.- Contratista ejecuta trabajos de mantenimiento rutinario de la vía Velacruz-Chaguarpamba-Río Pindo: limpieza de cunetas, roza a mano y limpieza de derrumbos.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	04/07/2017 - 05:36 PM
Abril 2017.- Contratista ejecuta trabajos de mantenimiento rutinario de la vía Velacruz-Chaguarpamba-Río Pindo: limpieza de cunetas, roza a mano y limpieza de derrumbos.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/06/2017 - 09:36 AM
Marzo 2017.- Contratista ejecuta trabajos de mantenimiento rutinario de la vía Velacruz-Chaguarpamba-Río Pindo: limpieza de cunetas, roza a mano y limpieza de derrumbos.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/05/2017 - 08:14 AM
FEBRERO 2017.- Contratista realiza traabjos de limpieza de derrumbos, roza a mano.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/04/2017 - 03:27 PM
ENERO 2017: La contratista ejecuta los trabajos de mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/03/2017 - 03:37 PM
DICIEMBRE 2016: La contratista ejecuta los trabajos de mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	03/01/2017 - 10:07 AM
NOVIEMBRE 201: La contratista ejecuta los trabajos de mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	29/12/2016 - 11:05 AM
OCTUBRE 2016: Con memorando Nro. MTOP-DDL-2016-763-ME, se aplica la multa por incumplimiento en la etapa de mantenimiento a la contratista. Actualmente la contratista no ejecuta el 100 % de lo trabajos de mantenimiento rutinario por lo eventualmente el equipo del MTOP-Loja realizan trabajos con la finalidad de solventar algunas emergencias cuyas cantidades de desalojo son superiores a las cantidades programadas y contempladas en el contrato en la etapa de mantenimiento.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/12/2016 - 09:54 AM
SEPTIEMRE 2016.- La Contratista realiza trabajos de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas y alcantarillas, roza a mano. AGOSTO 2016.- La Contratista realiza trabajos de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas y alcantarillas, roza a mano.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	07/11/2016 - 01:51 PM
JULIO 2016.- La Contratista realiza trabajos de mantenimiento rutinario como limpieza de cunetas y alcantarillas, roza a mano.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/09/2016 - 04:38 PM
JUNIO 2016.- La Contratista realiza trabajos de mantenimiento rutinario como: limpieza de cunetas y alcantarillas, roza a mano	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	04/08/2016 - 03:35 PM
MAYO 2016.- La Contratista realiza trabajos de mantenimiento rutinario. Por la estación invernal que se presenta en este sector se ha producido deslizamientos en diferentes tramos de la vía por lo que se esta interviniendo conjuntamente con la maquinaria y personal del MTOP-Loja	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	03/06/2016 - 12:29 PM
ABRIL 2016.- La Contratista realiza trabajos de mantenimiento rutinario. Por la estación invernal que se presenta en este sector se ha producido deslizamientos en diferentes tramos de la vía por lo que se esta interviniendo conjuntamente con la maquinaria y personal del MTOP-Loja	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	03/06/2016 - 12:28 PM
MARZO 2016.- La Contratista realiza trabajos de mantenimiento rutinario. Por la estación invernal que se presenta en este sector se ha producido deslizamientos en diferentes tramos de la vía por lo que se esta interviniendo conjuntamente con la maquinaria y personal del MTOP-Loja	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	04/05/2016 - 10:37 AM
FEBRERO 2016.- La Contratista realiza la ejecución de trabajos de mantenimiento rutinario a fin de mantener la vía en buenas condiciones de transitabilidad.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	06/04/2016 - 08:16 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2016.- Se insiste a la Contratista que realice la ejecución de trabajos de mantenimiento rutinario a fin de mantener la vía en buenas condiciones de transitabilidad.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	02/03/2016 - 04:01 PM
DICIEMBRE 2015.- Contratista realiza mantenimiento de la vía Velacruz-Chaguarpamba-Río Pindo con limpieza de alcantarillas, cunetas, roza a mano.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/01/2016 - 04:07 PM
NOVIEMBRE 2015.- Contratsita realiza mantenimiento de la vía Velacruz-Chaguarpamba-Río Pindo con limpieza de alcantarillas, cunetas, roza a mano, limpieza de calzada, mantenimiento de señales verticales.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	07/12/2015 - 12:40 PM
OCTUBRE 2015.- Contratsita realiza mantenimiento de la vía Velacruz-Chaguarpamba-Río Pindo con limpieza de alcantarillas, cunetas, roza a mano, limpieza de calzada, mantenimiento de señales verticales.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	06/11/2015 - 02:57 PM
SEPTIEMBRE 2015.- Contratsita realiza mantenimiento de la vía Velacruz-Chaguarpamba-Río Pindo con limpieza de alcantarillas, cunetas, roza a mano, limpieza de calzada, mantenimiento de señales verticales. Se realiza la estabilización del talud y desalojo de material proveniente del derrumbe Km 23+100.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	08/10/2015 - 11:45 AM
AGOSTO 2015.- Contratsita realiza mantenimiento de la vía Velacruz-Chaguarpamba-Río Pindo con limpieza de alcantarillas, cunetas, roza a mano, limpieza de calzada, mantenimiento de señales verticales. Se realiza la estabilización del talud y desalojo de material proveniente del derrumbe Km 23+100.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	10/09/2015 - 11:36 AM
JULIO 2015.- Contratsita realiza mantenimiento de la vía Velacruz-Chaguarpamba-Río Pindo con limpieza de alcantarillas, cunetas, roza a mano, limpieza de calzada. Desalojo de material proveniente del derrumbe Km 23+100 y estabilización del talud.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	10/09/2015 - 11:33 AM
JUNIO 2015.- Proyecto en etapa de mantenimiento rutinario contratado, contratista ejecuto trabajos de limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de calzada y alcantarillas, manteniendo niveles de servicio aceptables, en el Km. 23+100 se presento un derrumbe de gran magnitud por lo que se encuentra realizando el desalojo del material y estabilización del talud.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	08/07/2015 - 03:41 PM
MARZO 2015.- Proyecto en etapa de mantenimiento rutinario, contratista ejecuto trabajos de limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de derrumbes, calzada y alcantarillas, manteniendo niveles de servicio aceptables.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	08/04/2015 - 02:50 PM
FEBRERO 2015.- Proyecto en etapa de mantenimiento rutinario, contratista realizó trabajos de limpieza de cunetas, roza a mano, derrumbes, limpieza de calzada y alcantarillas, manteniendo niveles de servicio de mantenimiento adecuados en los sectores donde realiza trabajos durante el presente mes.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	06/03/2015 - 02:15 PM
ENERO 2015.- Proyecto en etapa de mantenimiento rutinario, contratista realizó trabajos de limpieza de cunetas, roza a mano, derrumbes, limpieza de calzada y alcantarillas, manteniendo niveles de servicio de mantenimiento adecuados en los sectores donde realiza trabajos durante el presente mes.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	06/02/2015 - 10:53 AM
DICIEMBRE 2014.- Proyecto en etapa de mantenimiento rutinario, contratsita realizó trabajos de limpieza de cunetas, roza a mano, derrumbes, limpieza de calzada y alcantarillas, manteniendo niveles de servicio de mantenimiento adecuados en los sectores donde realiza trabajos durante el presente mes.	Piedra Gálvez, José Salvador	06/01/2015 - 01:25 AM
NOVIEMBRE 2014.- Proyecto en etapa de mantenimiento rutinario, contratsita realizó trabajos de limpieza de cunetas, roza a mano, derrumbes y limpieza de calzada y alcantarillas, manteniendo niveles de servicio de mantenimiento adecuados en los sectores donde realiza trabajos durante el presente mes.	Paredes Ortega, Ángel Alberto	08/12/2014 - 10:40 AM
OCTUBRE 2014.- Proyecto en etapa de mantenimiento rutinario contratado, contratsita realizó trabajos de limpieza de cunetas, roza a mano, derrumbes y limpieza de calzada, en la actualidad se encuentra en limpieza de alcantarillas, manteniendo niveles de servicio de mantenimiento adecuados en los sectores donde realiza trabajos durante el presente mes.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	08/12/2014 - 07:31 AM
SEPTIEMBRE 2014.- Proyecto en etapa de mantenimiento rutinario contratado, contratsita realizó trabajos de limpieza de cunetas, roza a mano, derrumbes y limpieza de calzada, en la actualidad se encuentra en limpieza de alcantarillas, manteniendo niveles de servicio de mantenimiento adecuados en los sectores donde realiza trabajos durante el presente mes.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	10/11/2014 - 05:01 PM
AGOSTO 2014.- Proyecto en etapa de mantenimiento rutinario contratado, contratsita realizó trabajos de limpieza de cunetas, roza a mano, derrumbes y limpieza de calzada, en la actualidad se encuentra en limpieza de alcantarillas, manteniendo niveles de servicio de mantenimiento adecuados en los sectores donde realiza trabajos durante el presente mes.	Piedra Gálvez, José Salvador	07/09/2014 - 09:28 PM
JULIO 2014.- Proyecto en etapa de mantenimiento rutinario contratado, contratsita realiza trabajos de limpieza de cunetas, roza a mano, derrumbes y limpieza de calzada, manteniendo	Piedra Gálvez, José Salvador	05/08/2014 - 09:54 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
niveles de servicio de mantenimiento adecuados en los sectores donde realiza trabajos durante el presente mes.		
JUNIO 2014.- Proyecto en etapa de mantenimiento contratado, contratista realiza trabajos de limpieza de cunetas, roza a mano, derrumbes y limpieza de calzada, manteniendo niveles de servicio de mantenimiento adecuados.	Piedra Gálvez, José Salvador	06/07/2014 - 08:41 PM
MAYO 2014.- En este periodo se realizan obras de mantenimiento rutinario, como limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de derrumbes	Paredes Ortega, Ángel Alberto	03/06/2014 - 10:25 PM
ABRIL 2014.- En este periodo se realizan obras de mantenimiento rutinario, como limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de derrumbes	Criollo Chalco, Henry Fabricio	06/05/2014 - 03:47 PM
MARZO 2014.- En este periodo se realizan obras de mantenimiento rutinario, como limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de derrumbes. FEBRERO 2014(alcanse a resumen anterior).- En este periodo se realizan obras de mantenimiento rutinario, como limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de derrumbes. La planilla de los trabajos mes de enero no se tramita en el mes de febrero, por no entregar oportunamente la Planilla al contratista.	Paredes Ortega, Ángel Alberto	07/04/2014 - 05:42 PM
Febrero 2014.- Se continúa el mantenimiento rutinario	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	08/03/2014 - 02:16 PM
Enero 2014.- El 14 de Enero de 2014, se suscribe el Acta de Recepción Provisional. y se inician trabajos de mantenimiento rutinario Diciembre 2013.- Se realiza la Recepción Provisional de la obra.	Paredes Ortega, Ángel Alberto	07/02/2014 - 11:10 AM
Noviembre 2013: Aún no se suscribe acta de recepción provisional debido a que se ejecuta análisis del cumplimiento de la especificaciones técnicas del MTOP, referente a numeral 405.10. Condiciones para recepción de pavimentos.-	Carrión Rojas, Hernán	10/12/2013 - 03:16 PM
Octubre 2013: Se cancela planillas de liquidación del Contrato original, Contrato Complementario y Costo mas Porcentaje. Aún no se suscribe acta de recepción provisional debido a que se ejecuta análisis del cumplimiento de la especificaciones técnicas del MTOP referente a las evaluaciones de las obras para la recepción de las mismas.	Carrión Rojas, Hernán	04/11/2013 - 10:46 AM
Septiembre 2013: Se concluyeron trabajos de reparación de observaciones de comisión de recepción provisional, en revisión de documentos de liquidación de planillas para proceder a suscribir acta de recepción provisional.	Carrión Rojas, Hernán	05/10/2013 - 09:52 PM
Agosto 2013: Reparación de observaciones de comisión de recepción provisional para poder proceder a suscribir acta de recepción provisional Julio de 2013: Reparación de observaciones de comisión de recepción provisional para poder proceder a suscribir acta de recepción provisional	Carrión Rojas, Hernán	10/09/2013 - 08:58 PM
Junio de 2013: Reparación de observaciones de comisión de recepción provisional para poder proceder a suscribir acta de recepción provisional Mayo de 2013: Reparación de observaciones de comisión de recepción provisional para poder proceder a suscribir acta de recepción provisional Abril de 2013: Desde el 13 de marzo al 23 de abril de 2013 se encargó del proyecto el Ing. Israel Villavicencio, por vacaciones del titular.	Carrión Rojas, Hernán	06/07/2013 - 11:54 AM
MARZO 2013: En trámite recepción provisional FEBRERO 2013: En trámite recepción provisional ENERO 2013: La fecha de terminación del contrato es el 4 de enero de 2013 por lo que el cronograma no permite dividir en planillas, se debe realizar una sola planilla que será la de liquidación por tal motivo se actualizará los datos una vez concluidos los trámites de recepción Provisional. DICIEMBRE 2012 La fecha de terminación del contrato es el 4 de enero de 2013 NOVIEMBRE 2012 Los trabajos de señalización en el tramo I se iniciaron con la colocación de pintura termoplástica, tachas reflectivas, además se esta ejecutando la construcción de veredas en la Panamericana y en la calle 10 de Agosto y colocación de hormigón asfáltico en los diferentes puentes del proyecto. OCTUBRE 2012 De acuerdo a Cronograma de avance programado es el 87,63% y el avance real es el 86,96%, por tal desface se procede de conformidad con la clausula décimo cuarta 14.2, por incumplimiento de avance programado. SEPTIEMBRE 2012	Carrión Rojas, Hernán	16/04/2013 - 10:59 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>El 06 de Septiembre de 2012 se suscribió orden de cambio legalizando la ampliación de plazo en 120 días hasta el 04 de enero de 2013. Se anexa Orden de Cambio No. 3, en trámite reprogramación.</p> <p>AGOSTO 2012</p> <p>En trámite formalización de ampliación de plazo, se presenta cronograma de trabajos, aumento y disminución de cantidades.</p> <p>DE SEPTIEMBRE 2011 A JULIO 2012 ESTA GUARDADO EN ARCHIVO ANEXO</p>		

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Fallas en calzada varios sitios.	04/08/2017	Blanca Paulina Hurtado Angamarca	100	40	40	0/1

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>5- PROYECTO. Técnico.</p> <p>En sitios de asentamientos de taludes inferiores CAUSARÍA deterioro de calzada</p>	04/08/2017	Blanca Paulina Hurtado Angamarca	40 %	60	24	0/1

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 7 - Sur > Loja > Chaguarpamba

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANIFICACIÓN: Contrato suscrito realizado.	3-Adjudicación	15/04/2008		15/04/2008		Sí	1.0
2	EJECUCIÓN: Contrato complementario Aprobado	5-Entregables Intermedios	07/06/2010		07/06/2010		Sí	1.0
3	EJECUCIÓN: Calzada tramo 1 Velacruz-Chaguarpamba ejecutado.	5-Entregables Intermedios	12/12/2010		12/12/2010		Sí	20.0
4	EJECUCIÓN: Orden de cambio No. 1 y reprogramación del cronograma valorado de trabajos aprobada.	5-Entregables Intermedios	23/06/2011		21/11/2011		Sí	1.0
5	EJECUCIÓN: Drenaje tramo 1 y 2 ejecutado.	5-Entregables Intermedios	20/09/2011		31/10/2011		Sí	10.0
6	Ejecución: Problemas existentes en la población de Olmedo solucionado.	5-Entregables Intermedios	21/09/2011		21/09/2011		Sí	2.0
7	EJECUCIÓN: Obras de infraestructura de Olmedo ejecutado.	5-Entregables Intermedios	10/10/2011		10/10/2011		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
8	EJECUCIÓN: Puentes Chipianga ejecutado.	5-Entregables Intermedios	21/11/2011		21/11/2011		Sí	2.0
9	EJECUCIÓN: Trabajos contractuales ejecutados.	5-Entregables Intermedios	04/01/2012		04/01/2012		Sí	5.0
10	EJECUCIÓN: Calzada tramo 2 ejecutado.	5-Entregables Intermedios	06/05/2012		06/05/2012		Sí	25.0
11	EJECUCIÓN: Acceso a Olmedo ejecutado.	5-Entregables Intermedios	08/06/2012		08/06/2012		Sí	6.0
12	EJECUCIÓN: Estabilización de taludes tramo 1 y 2 ejecutados.	5-Entregables Intermedios	08/06/2012		08/06/2012		Sí	6.0
13	EJECUCIÓN: Puente Buenavista ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	2.0
14	EJECUCIÓN: Terracería tramo 1 y 2 ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	2.0
15	EJECUCIÓN: Conexión Olmedo-Chaguarpamba ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2012		30/12/2012		Sí	5.0
16	EJECUCIÓN: Señalización vial tramo ejecutado.	5-Entregables Intermedios	19/01/2013		19/01/2013		Sí	2.0
17	EJECUCIÓN: Señalización vial tramo 2 ejecutado.	5-Entregables Intermedios	19/01/2013		19/01/2013		Sí	2.0
18	CIERRE: Recepción Provisional realizada (pedido, disposición e inspección) ejecutado.	9-Entregables Formales	23/02/2013		04/10/2013		Sí	0.5
19	CIERRE: Acta Recepción provisional de la obra suscrita	9-Entregables Formales	04/10/2013		14/01/2014		Sí	0.5
20	EJECUCIÓN: Mantenimiento del proyecto PRIMER AÑO, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	14/01/2015		14/01/2015		Sí	1.0
21	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto SEGUNDO AÑO, 1er. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	14/04/2015		14/04/2015		Sí	0.25
22	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto SEGUNDO AÑO, 2do. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	14/07/2015		14/07/2015		Sí	0.25
23	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto SEGUNDO AÑO, 3er. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	14/10/2015		14/10/2015		Sí	0.25
24	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto SEGUNDO AÑO, 4to. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	14/01/2016		14/01/2016		Sí	0.25
25	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, 1er. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	14/04/2016		14/04/2016		Sí	0.25
26	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, 2do. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	14/07/2016		14/07/2016		Sí	0.25
27	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, 3er. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	14/10/2016		14/10/2016		Sí	0.25
28	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, 4to. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	14/01/2017		14/01/2017		Sí	0.25
29	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto CUARTO AÑO, 1er. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	14/04/2017		14/06/2017		Sí	0.25





HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
30	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto CUARTO AÑO, 2do. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	14/07/2017		14/07/2017		Sí	0.25
31	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto CUARTO AÑO, 3er. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	14/10/2017		14/10/2017		Sí	0.25
32	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto CUARTO AÑO, 4to. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	14/01/2018		14/01/2018		Sí	0.25
33	CIERRE: Liquidación económica ejecutado.	5-Entregables Intermedios	15/03/2018	31/05/2018			No	0.5
34	COMPLETADO: Recepción definitiva de la obra y acta de recepción suscrita. Proyecto ejecutado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2018		13/04/2018		Sí	0.5

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión negativa, contratista no ha ejecutado el mantenimiento vial al 100%.	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	02/02/2017
2	Constructora no ejecuta al 100% mantenimiento rutinario, supervisión negativa	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	25/01/2016
3	Verificación del mantenimiento de la vía Velacruz-Chaguarpamba-Punte del Río Pindo	Ojeda Valarezo, Tania Verónica	{PR} - Provincia - LOJA	27/11/2014
4	Rehabilitación y mantenimiento carretera Velacruz - Chaguarpamba - Río Pindo, acceso Olmedo	Torres Paz, Marcelo Vinicio	{PR} - Provincia - LOJA	23/10/2013
5	Carretera Velacruz-Chaguarpamba-Río Pindo, acceso Olmedo y conexión Olmedo -Chaguarpamba	Torres Paz, Marcelo Vinicio	{PR} - Provincia - LOJA	12/04/2013
6	Historico - El avance económico es de 78.92%, mientras que el físico es de 81,77%, el proyecto fue suspendido temporalmente. La fecha de terminación vigente es 26-03-2012.	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	03/08/2012
7	Historico - El avance económico es de 78.53%, mientras que el físico es de 81,59%, el proyecto fue suspendido temporalmente por la temporada invernal, y con fecha 01 de junio se reinició el mismo.	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	05/07/2012
8	Historico - El avance económico es de 78.18%, mientras que el físico es de 81,22%, el proyecto fue suspendido temporalmente por la temporada invernal, y con fecha 01 de junio se reinició el mismo.	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	07/06/2012
9	Historico - El avance económico es de 78.01%, mientras que el físico es de 80,40%, el proyecto fue suspendido temporalmente por la temporada invernal, y hasta la fecha no se tiene información de r	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	07/05/2012
10	Historico - El avance económico es del 77,85%, mientras que el físico es 80,38%, se tiene una orden de paralización justificada, lo cual repercutirá en la dilatación del proyecto que debía culmina	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	11/04/2012
11	Historico - La constructora ha presentado un nuevo oficio para suspender los trabajos por la temporada invernal, por lo que es necesario reprogramar las actividades y cumplir con la triple jornada	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	22/03/2012
12	Historico - El avance económico del proyecto es 75.01% mientras que el físico es 76.82%, el plazo de terminación concluyó el 21-11-2011. Debido a los reiterados retrasos en el avance de la obra,	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	08/02/2012

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de calzada en pavimento rígido y flexible.		100.00 %	100	100	01/01/2011	Abril
2	Porcentaje de obras de drenaje.		100.00 %	100	100	01/01/2011	Abril
3	Porcentaje de avance en movimiento de tierras y estabilización taludes.		100.00 %	100	100	01/01/2011	Abril
4	Porcentaje de mantenimiento rutinario		100.00 %	100	100	15/01/2014	Abril


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	17,765,318.35
Estimado Al Fin Del Proyecto:	44,546,164.38 **
Costo Total:	44,413,295.89
Total Devengado:	43,880,621.99
% Costo Total Devengado:	98.80 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 98.80 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	60,902,712.92	665,542.39	0.00	61,568,255.31
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	23,802,466.48	665,542.39	0.00	24,468,008.87
Ppto. Codificado	47,844,199.29	665,542.39	0.00	48,509,741.68
Ppto. Comprometido	14,444,321.90	0.00	0.00	14,444,321.90
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	43,853,476.62	665,542.39	0.00	44,519,019.01
Ppto. Devengado	43,880,621.99	0.00	0.00	43,880,621.99
Pagado Real	1,083,440.33	0.00	0.00	1,083,440.33
Estimado a fin de año	* 43,880,621.99	0.00	0.00	43,880,621.99
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-27,145.37	665,542.39	0.00	638,397.02
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.06 %	0.00 %	0.00 %	98.57 %
Ppto. Codificado 998	5,029,464.18	0.00	0.00	5,029,464.18
Ppto. Devengado 998	4,957,131.36	0.00	0.00	4,957,131.36

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

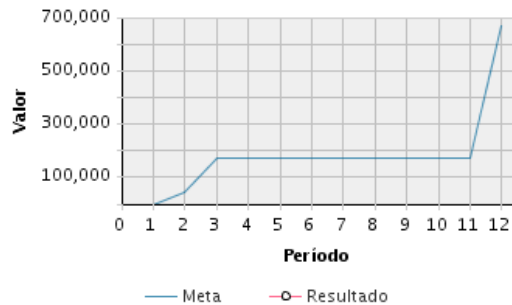

Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	44,265.00		44,265.00				
Mar	127,272.00		171,537.00				
Abr	0.00		171,537.00				
May	0.00		171,537.00				
Jun	0.00		171,537.00				
Jul	0.00		171,537.00				
Ago	0.00		171,537.00				
Sep	0.00		171,537.00				
Oct	0.00		171,537.00				
Nov	0.00		171,537.00				
Dic	494,005.39		665,542.39				
Total	665,542.39						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
15	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
16	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
17	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
18	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	1. Contrato Original	CONTRATO_ORIGINAL_196.pdf	29/12/2016
2	2. Contrato Complementario	CONTRATO_COMPLEMENTARIO.pdf	29/12/2016
3	3. Orden de Cambio No. 1	ORDEN_DE_CAMBIO_No._01.pdf	29/12/2016
4	4. Orden de Cambio No.2	ORDEN_DE_CAMBIO_No._02.pdf	29/12/2016
5	5. Orden de Cambio No. 03	ORDEN_DE_CAMBIO_No._03.pdf	29/12/2016
6	6. Acta de aprobación Orden de Cambio No. 03	ACTA_DE_APROBACIÓN_ORDEN_DE_CAMBIO_No._03.pdf	29/12/2016
7	7. Costo + %	COSTO+_%.pdf	29/12/2016
8	8. Planilla Costo+%	PLANILLA_COSTO_MAS_%.pdf	29/12/2016
9	9. Dictamen de Prioridad Senplades	Dictamen_de_Prioridad_Senplades.pdf	29/12/2016
10	A.1 Informe ejecutivo enero 2012	1.1._Informe_Ejec._enero_2012..pdf	09/09/2014
11	A.2 Informe ejecutivo febrero 2012	1.2._Informe_Ejec._febrero_2012..pdf	09/09/2014
12	A.3 Informe ejecutivo marzo-2012	1.3._Informe_Ejec._marzo_2012.pdf	09/09/2014
13	A.4 Informe ejecutivo abril 2012	1.4._Informe_Ejec._abril_2012..pdf	09/09/2014
14	A.5 Informe ejecutivo mayo 2012	1.5._Informe_Ejec._mayo_2012.pdf	09/09/2014
15	A.6 Informe ejecutivo junio 2012	1.6._Informe_Ejec._junio_2012.pdf	09/09/2014
16	A.7 Informe ejecutivo julio 2012	1.7._Informe_Ejec._julio_2012.pdf	09/09/2014
17	A.8 Informe ejecutivo agosto 2012	1.8._Informe_Ejec._agosto_2012.pdf	09/09/2014
18	A.9 Informe ejecutivo septiembre 2012	1.9._Informe_Ejec._septiembre_2012.pdf	09/09/2014
19	A10 Informe ejecutivo octubre 2012	Infor-ejecutivo octubre-2012.pdf	09/09/2014
20	A11 Informe ejecutivo noviembre 2012	2.1._Informe_Ejec._noviembre_2012.pdf	09/09/2014
21	A12 Informe ejecutivo diciembre 2012	Infor-ejecutivo diciembre_2012.pdf	09/09/2014
22	ARCHIVO DE RESUMEN EJECUTIVO SEPT-2011 A JULIO 2012	RESUMEN_EJECUTIVO_GPRs__SEPT_2011_-_JULIO_2012.docx	08/11/2012

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
23	Armado del tablero de la superestructura del Pte. Chiapianga	DSC01818[1].JPG	10/10/2011
24	B.1 Informe ejecutivo enero 2013	Infor-ejecutivo_eenero_2013.pdf	09/09/2014
25	B.2 Informe ejecutivo febrero 2013	Infor-ejecutivo_febrero_2013.pdf	09/09/2014
26	B.3 Informe ejecutivo marzo 2013	Infor-ejecutivo_marzo_2013.pdf	09/09/2014
27	B.4 Informe ejecutivo abril 2013	Infor-ejecutivo_abril_2013.pdf	09/09/2014
28	B.6 Informe ejecutivo junio 2013	Inf_Ejecutivo_Junio_2013.pdf	09/09/2014
29	B.7 Informe ejecutivo julio 2013	Informe_Ejecutivo_Julio_2013.pdf	09/09/2014
30	B.8 Informe ejecutivo agosto 2013	Informe_ejecutivo_agosto_2013.pdf	09/09/2014
31	B.9 Informe ejecutivo septiembre 2013	Inf_ejec_sept_2013.pdf	09/09/2014
32	B10 Informe ejecutivo octubre 2013	Inf_ejec_Oct_2013.pdf	09/09/2014
33	B11 Informe ejecutivo noviembre 2013	Informe_ejecutivo_Noviembre_2013.pdf	09/09/2014
34	B12 Informe ejecutivo diciembre 2013	Infor-ejecutivo_diciembre_2013.pdf	09/09/2014
35	C.1 Informe ejecutivo enero 2014	3.1_Informe_ejecutivo_enero_2014.pdf	09/09/2014
36	C.2 Informe ejecutivo febrero 2014	3.2_Informe_ejecutivo_febrero_2014.pdf	09/09/2014
37	C.3 Informe ejecutivo marzo 2014	3.3_Informe_ejecutivo_marzo_2013.pdf	09/09/2014
38	C.4 Informe ejecutivo abril 2014	3.4_Informe_Ejecutivo_Abril_2014.pdf	09/09/2014
39	C.6 Informe ejecutivo junio 2014	INF_EJECUT._JUNIO_2014.pdf	09/09/2014
40	C.7 Informe ejecutivo julio 2014	INF_EJECUT._JULIO_2014.pdf	09/09/2014
41	C.8 Informe Ejecutivo Agosto 2014	INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2014.pdf	10/09/2014
42	C.9 Informe ejecutivo septiembre 2014	Infor-ejecutivo_sept-2014.pdf	12/11/2014
43	C10 Informe ejecutivo octubre 2014	Infor-ejecutivo_oct-2014.pdf	12/11/2014
44	C11 Informe ejecutivo noviembre 2014	Infor-ejecutivo_nov-2014.pdf	08/12/2014
45	C12 Informe ejecutivo diciembre 2014	Infor-ejecutivo_Dic-2014.pdf	06/01/2015
46	Colocación de Paimento Rígido Km 60+000, Lado Izquierdo	DSC01823[3].JPG	10/10/2011
47	Colocación de Pavimento Flexible Conexión Olmedo Chaguarpamba Km 4+500 LD y LI	DSC01774.JPG	10/10/2011
48	Comisión para Recepción Definitiva	MTOP-DDL-2018-360-ME.pdf	03/04/2018
49	D.1 Informe ejecutivo enero-2015	Infor-ejecutivo_enero-2015.pdf	06/02/2015
50	D.2 Informe ejecutivo febrero 2015	INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2015.pdf	06/03/2015
51	D.3 Informe ejecutivo marzo-2015	Infor-ejecutivo_marzo_2015.pdf	08/04/2015
52	D.4 Informe ejecutivo abril-2015	Infor-ejecutivo_abril-2015.pdf	06/05/2015
53	D.5 Informe ejecutivo mayo 2015	Info-ejecutivo_mayo-2015.pdf	09/06/2015
54	D.6 Informe ejecutivo jun-2015	Infor-ejecutivo_junio-2015.pdf	09/07/2015
55	D.7 Informe ejecutivo julio 2015	Informe_ejecutivo_julio_2015.pdf	06/08/2015
56	D.8 Informe ejecutivo agosto 2015	Informe_ejecutivo_agosto_2015.pdf	08/09/2015
57	D.9 Informe ejecutivo septiembre 2015	Informe_ejecutivo_septiembre_2015.pdf	08/10/2015
58	D10 Informe ejecutivo octubre 2015	Informe_ejecutivo_octubre_2015.pdf	06/11/2015
59	D11 Informe ejecutivo noviembre-2015	Informe_ejecutivo_Noviembre-2015.pdf	09/12/2015
60	D12 Informe Ejecutivo Diciembre 2015	D12_Informe_Ejecutivo_Diciembre_2015.pdf	03/05/2016
61	E.1 Informe Ejectuvio Enero 2016	E.1_Informe_Ejecutivo_Enero_2016.pdf	03/05/2016
62	E.2 Informe Ejectuvio Febrero 2016	E.2_Informe_Ejecutivo_Febrero_2016.pdf	03/05/2016
63	E.3 Informe Ejecutivo Marzo 2016	E.3_Informe_Ejecutivo_Marzo_2016.pdf	05/05/2016
64	E.4 Informe Ejecutivo Abril 2016-196	Informe_Ejecutivo_Abril_2016-196.pdf	03/06/2016
65	E.5 Informe Ejecutivo Mayo 2016-196	Informe_Ejecutivo_Mayo_2016-196.pdf	03/06/2016
66	E.6 Informe Ejecutivo Junio 2016	Junio_2016.pdf	06/10/2016
67	E.7 Informe Ejecutivo Julio 2016	Julio_2016.pdf	06/10/2016
68	E.8 Informe Ejecutivo Agosto 2016	Agosto_2016.pdf	06/10/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
69	E.9 Informe Ejecutivo_Sept. 2016	Septiembre_2016.pdf	06/10/2016
70	E10. Informe Ejecutivo Octubre 2016	Octubre_2016.pdf	24/04/2017
71	E11 Informe Ejecutivo Noviembre 2016	Noviembre_2016.pdf	24/04/2017
72	E12 Informe Ejecutivo Diciembre 2016	Diciembre_2016.pdf	24/04/2017
73	Encofrado y armado de tablero de la superestructura del Pte. Chipianga	DSC01818[1].JPG	10/10/2011
74	Es la respuesta que se emite a la Sra Gobernadora de Loja, Ing. Alicia Jaramillo, en lo referente a la solicitud de suspensión de trabajos.	RESPUESTA_SRA._GOBERNADORA.pdf	29/03/2012
75	F.1 Enero 2017	Enero_2017.pdf	24/04/2017
76	F.2 Informe Ejecutivo Febrero 2017	Febrero_2017.pdf	24/04/2017
77	F.3 Informe Ejecutivo Marzo 2017	Marzo_2017.pdf	24/04/2017
78	MTOP-DPL-2013-652-ME designacion_supervisor_Israel_Villavicencio_08-04-13	MTOP-DPL-2013-652-ME_designacion_supervisor_Israel_Villavicencio_08-04-13.pdf	15/04/2013
79	Oficios Incumplimiento en la Etapa de Mantenimiento	Oficio_Nro._MTOP-CONS_LOJ-16-72-OF_y_Memorando_Nro.MTOP-CONS_LOJ-2016-356-ME.pdf	29/12/2016
80	OFICIOS OBSERV EN AMPL PLAZO	OFICIOS_OBSERV_EN_AMPL_PLAZO.pdf	07/08/2012
81	ORDEN DE CAMBIO No. 3 AMPLIACIÓN 120 DÍAS HASTA 04-01-2013	ORDEN_DE_CAMBIO_N_3.pdf	09/10/2012

LIGAS EXTERNAS

Dirección (URL)	
1	SITOP
	http://172.20.1.130/mtop/

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Calderón Ojeda, Jaime Ramiro	Subsecretario Regional 7	Subsecretario Regional 7	jcalderon@mtop.gob.ec	023974600
Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	Lider de Proyecto	Analista de Infraestructura Provincial 1	bhurtado@mtop.gob.ec	023974600
Ludeña Suescun, Rusbel Enrique	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Loja	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Loja	drodriguez@mtop.gob.ec	072570807 - 72501
Pineda Betancourt, Gabriela Del Cisne	Coordinadora de Planificación Zonal 7	Coordinadora de Planificación Zonal 7	gpineda@mtop.gob.ec	023974600
Vega Silva, Andrea Karla	Coordinador de Infraestructura Provincial	Coordinadora de Infraestructura Provincial	avega@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
4840_1.jpg	06/01/2015
