

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 5**  
**Dirección Provincial Los Ríos**

**PROYECTO: K022** MTOP - Rehabilitación y Mantenimiento de la carretera E-25 a Baba ubicada en la provincia de Los Ríos

Líder del Proyecto:	Marcillo Gavilánez, Danny Orlando (dmarcillo@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	Programas Relacionados:	Provincia - Los Ríos, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E-25 A BABA UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Zambrano Vera, Olger Oswaldo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.374333	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	31,352,181.58
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Inversionista nacional	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	14/09/2012 - 28/06/2019
Fecha de última actualización:	04/06/2018	Fecha de Fin Base:	02/05/2019
Modificado por:	Marcillo Gavilánez, Danny Orlando	Fecha del siguiente Hito:	16/12/2018

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Proyectos de Inversión:

\* DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: De acuerdo al censo realizado por INEC en el año 2010, la población del área de influencia directa que se beneficiará con el mejoramiento de la vía es de 39.681 habitantes, de los cuáles 21.031 están ubicados en el área urbana y 18.650 en el área rural. Como beneficiarios indirectos se considera que este proyecto sirve al resto de la provincia de Los Ríos, con una población de 738.434 habitantes, como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

\* PRODUCTO / SERVICIO: El mejoramiento de una carretera ocasionará el surgimiento del denominado Tráfico, el cual se produce fundamentalmente por la reducción de los costos del transporte, disminución del tiempo de viaje, desarrollo de mayores velocidades y confort o seguridad en el viaje, aumento de los ingresos promedio en aquellas poblaciones donde se ha cumplido con las actividades de conservación de carreteras. Incrementa lo socioeconómico entre poblaciones de los diferentes cantones, y ayuda a mejorar el medio ambiente.

\* LINEA BASE: El inicio del proyecto es en la intersección de la carretera E-25 (Panamericana) en la abscisa 0+000. El final del proyecto es en el ingreso al cantón de Baba en la Abscisa 16+518.

\* OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Proporcionar una adecuada movilidad entre los cantones Babahoyo y Baba mediante la Rehabilitación y Mantenimiento de la estructura del pavimento de la carretera E-25 a Baba de 16.52 km. de longitud, mejorando las condiciones de transitabilidad permanente, lo que brindará mayor facilidad para la transportación e intercambio de productos y de personas, integrando la infraestructura vial del país y auspiciando el desarrollo de las distintas zonas, logrando comodidad y seguridad a los usuarios y revalorizar los predios de las zonas.

Objetivos específicos:

1. Realizar la construcción de la vía E-25 a Baba (Babahoyo - Baba) el cual incluye movimiento de tierras, obras viales, obras de arte, obras de control ambiental, señalización y mantenimiento por cuatro años.
2. Fiscalizar la construcción de las obras, lo cual incluye la supervisión y auditoría de las mismas.

**Beneficios Cualitativos**

- \* Reducir los daños y desgaste vehicular
- \* Beneficiar a la población en tener vías con seguridad vial
- \* Disminuir los tiempos de transporte de los productos de la zona
- \* Proporcionar una adecuada movilidad entre los cantones Babahoyo y Baba

**Tipo de Beneficiario**

BENEFICIARIOS DIRECTOS	
Cantón Baba	39.681

**Tipo de Beneficiario**

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

Resto provincia de Los Ríos 738.434

**Restricciones**

TIEMPO: El plazo de ejecución es de veintidós (22) meses, distribuidos entre los años 2012, 2013 y 2014.

COSTO:

CONTRATISTA

Monto del Contrato Original: \$ 20'045.570,65

Monto del Contrato Complementario #1: \$ 5'090.711,92

Orden de Cambio #1: 2 meses de plazo

Costo más Porcentaje: \$52.254,18

Monto de Mantenimiento: \$1'047.616,23

\* Monto de obra vigente: \$ 26'236.152,98

FISCALIZACIÓN

Monto del Contrato Original: \$ 938.107,50

Monto del Contrato Complementario #1: \$ 248.935,81

Monto del Contrato Complementario #2: 20 días de plazo

\* Monto de obra vigente: \$ 1'187.043,31

ALCANCE:

1. OBRAS VIALES:

- Material de préstamo importado
- Acabado de la Obra básica existente
- Sub-Base Clase 2 y Base Clase 1
- Riego de Imprimación
- Riego Bituminoso de Adherencia
- Hormigón Asfáltico Mezclado en Planta

2. OBRAS DE ARTE:

- Excavación para cimentación de puentes
- Alcantarillas y otros sistemas de drenaje
- Hormigón de cemento portland

3. OBRAS DE CONTROL AMBIENTAL

- Control del polvo
- Rellenos sanitarios
- Charlas de concientización
- Charlas de educación ambiental

RECURSOS:

- Camión Distribuidor
- Camión Mediano
- Cargadora Frontal
- Distribuidor de agregados
- Distribuidor de Asfalto
- Escoba Autopropulsada
- Moto Niveladora
- Planta Asfáltica
- Operadores de Equipo
- Choferes
- Operadores de Plantas (asfalto, hormigón, trituración y explotación de materias)
- Equipos de Topografía

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

**Ejecución**

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 85.40 %  
 Fecha de Inicio: 14/09/2012 Fecha de Fin: 28/06/2019

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

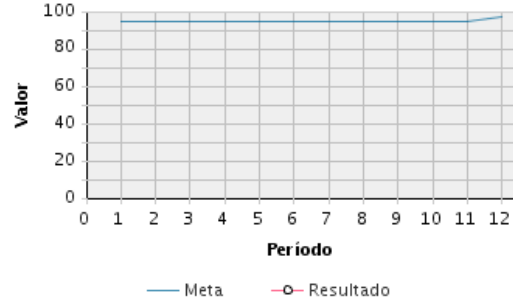

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	97 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<b>MAYO 2018</b> Roza a mano desde la abscisa 0+000 AL 12+000 Limpieza de señalizacion vertical; Limpieza de alcantarilla, Limpieza de cunetas, Roza a mano.	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	04/06/2018 - 03:31 PM
<b>ABRIL 2018</b> Roza a mano desde la abscisa 12+000 AL 17+000 Limpieza de señalizacion vertical; Limpieza de alcantarilla, Limpieza de cunetas, Roza a mano.	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	07/05/2018 - 09:49 AM
<b>MARZO 2018</b> Roza a mano desde la abscisa 0000 AL 12+000 Limpieza de señalizacion vertical; Limpieza de alcantarilla, Limpieza de cunetas, Roza a mano.	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	05/04/2018 - 09:28 PM
<b>FEBRERO 2018</b> Roza a mano desde la abscisa 12+000 AL 17+000 Limpieza de señalizacion vertical; Limpieza de alcantarilla, Limpieza de cunetas, Roza a mano.	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	21/03/2018 - 04:38 PM
<b>ENERO 2018</b> Roza a mano desde la abscisa 0+000 AL 12+000 Limpieza de señalizacion vertical; Limpieza de alcantarilla, Limpieza de cunetas, Roza a mano.	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	06/02/2018 - 08:44 AM
<b>DICIEMBRE 2017</b> Roza a mano desde la abscisa 12+000 AL 17+000 Limpieza de señalizacion vertical; Limpieza de alcantarilla	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	04/01/2018 - 10:17 AM
<b>NOVIEMBRE 2017</b> Roza a mano desde la abscisa 0 +000 hasta 12+000 Limpieza de señalizacion vertical; Limpieza de alcantarilla	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	04/12/2017 - 08:06 AM
<b>OCTUBRE 2017</b> Roza a mano desde la abscisa 0 +000 hasta 12+000 Limpieza de señalizacion vertical; Limpieza de alcantarilla	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	01/11/2017 - 09:16 AM
<b>SEPTIEMBRE</b> Roza a mano desde la abscisa 12+000 hasta 16+000 Limpieza de señalizacion vertical; Limpieza de alcantarilla	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	03/10/2017 - 08:50 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO</p> <p>Roza a mano desde la abscisa 9+000 hasta 12+000</p> <p>Limpieza de señalización vertical</p>	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	05/09/2017 - 08:12 AM
<p>- 1 AL 7 JULIO</p> <p>Roza a mano desde la abscisa 6+000 hasta 9+000</p>	Marcillo Gavilánez, Danny Orlando	16/08/2017 - 01:43 PM
<p>MAYO 2017 Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <p>- 1 AL 4 DE JUNIO</p> <p>Roza a mano desde la abscisa 6+000 hasta 9+000</p> <p>- 5 AL 11 DE JUNIO</p> <p>Roza a mano desde la abscisa 9+000 hasta 14+000</p> <p>- 12 AL 18 DE JUNIO</p> <p>Roza a mano desde la abscisa 14+000 hasta 17+000</p> <p>- 19 AL 25 JUNIO</p> <p>Limpieza de alcantarilla la abscisa 0+000 hasta 3+000</p> <p>- 26 AL 30 JUNIO</p> <p>Roza a mano desde la abscisa 3+000 hasta 6+000</p>	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	03/07/2017 - 11:11 AM
<p>MAYO 2017 Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <p>- 1 AL 7 DE MAYO</p> <p>Roza a mano desde la abscisa 6+000 hasta 9+000</p> <p>- 8 AL 14 DE MAYO</p> <p>Roza a mano desde la abscisa 9+000 hasta 14+000</p> <p>- 15 AL 21 DE MAYO</p> <p>Roza a mano desde la abscisa 14+000 hasta 17+000</p> <p>- 22 AL 28 MAYO</p> <p>Limpieza de alcantarilla la abscisa 0+000 hasta 3+000</p> <p>- 29 AL 31 MAYO</p> <p>Roza a mano desde la abscisa 3+000 hasta 6+000</p>	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	05/06/2017 - 04:48 PM
<p>ABRIL 2017: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <p>- 1 AL 2 DE ABRIL</p> <p>Roza a mano desde la abscisa 0+000 hasta 2+000</p> <p>- 3 AL 9 DE ABRIL</p> <p>Roza a mano desde la abscisa 2+000 hasta 9+000</p> <p>- 10 AL 16 DE ABRIL</p> <p>Roza a mano desde la abscisa 9+000 hasta 14+000</p> <p>- 17 AL 23 ABRIL</p> <p>Limpieza de alcantarilla la abscisa 14+000 hasta 17+000</p> <p>- 24 AL 30 ABRIL</p> <p>Roza a mano desde la abscisa 0+000 hasta 5+000</p>	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	03/05/2017 - 11:09 AM
<p>MARZO 2017: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <p>- 1 AL 5 DE MARZO</p> <p>Roza a mano desde la abscisa 0+000 hasta 4+000</p> <p>- 6 AL 12 DE MARZO</p> <p>Roza a mano desde la abscisa 4+000 hasta 10+000</p> <p>- 13 AL 19 DE MARZO</p> <p>Roza a mano desde la abscisa 10+000 hasta 15+000</p>	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	05/04/2017 - 08:51 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>- 20 AL 26 MARZO Limpieza de alcantarilla la abscisa 15+000 hasta 17+000</p> <p>- 27 AL 31 MARZO Roza a mano desde la abscisa 0+000 hasta 6+000</p>		
<p>FEBRERO 2017: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <p>- 1 AL 8 DE FEBRERO Roza a mano desde la abscisa 0+000 hasta 4+000</p> <p>- 9 AL 15 DE FEBRERO Roza a mano desde la abscisa 4+000 hasta 10+000</p> <p>- 16 AL 22 DE FEBRERO Roza a mano desde la abscisa 10+000 hasta 15+000</p> <p>- 23 AL 28 FEBRERO Limpieza de alcantarilla la abscisa 15+000 hasta 17+000</p>	<p>Pulecio Montalvo, Roger Alberto</p>	<p>05/03/2017 - 01:04 PM</p>
<p>ENERO 2017: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <p>- 1 AL 8 DE ENERO Roza a mano desde la abscisa 0+000 hasta 4+000</p> <p>- 9 AL 15 DE ENERO Roza a mano desde la abscisa 4+000 hasta 10+000</p> <p>- 16 AL 22 DE ENERO Roza a mano desde la abscisa 10+000 hasta 15+000</p> <p>- 23 AL 29 ENERO Limpieza de alcantarilla la abscisa 15+000 hasta 17+000</p> <p>- 30 AL 31 DE ENERO Limpieza de alcantarillas desde la abscisa 17+000 hasta 15+000</p>	<p>Pulecio Montalvo, Roger Alberto</p>	<p>02/02/2017 - 11:04 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2016: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <p>- 1 AL 4 DE DICIEMBRE Roza a mano desde la abscisa 0+000 hasta 5+000</p> <p>- 5 AL 11 DE DICIEMBRE Roza a mano desde la abscisa 5+000 hasta 9+000</p> <p>- 12 AL 18 DE DICIEMBRE Roza a mano desde la abscisa 10+000 hasta 14+000</p> <p>- 19 AL 25 DICIEMBRE Limpieza de alcantarilla la abscisa 14+000 hasta 17+000</p> <p>- 26 AL 31 DE DICIEMBRE Limpieza de alcantarillas desde la abscisa 7+000 hasta 17+000 Pulecio Montalvo, Roger 06/01/2017 - 11:27 AM</p>	<p>Pulecio Montalvo, Roger Alberto</p>	<p>06/01/2017 - 11:29 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2016: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <p>- 1 AL 6 DE NOVIEMBRE Roza a mano desde la abscisa 0+000 hasta 4+000</p> <p>- 7 AL 13 DE NOVIEMBRE Roza a mano desde la abscisa 4+000 hasta 8+000</p> <p>- 14 AL 20 DE NOVIEMBRE Roza a mano desde la abscisa 8+000 hasta 12+000</p> <p>- 21 AL 27 NOVIEMBRE Limpieza de alcantarilla la abscisa 12+000 hasta 17+000</p>	<p>Pulecio Montalvo, Roger Alberto</p>	<p>06/01/2017 - 11:27 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- 28 AL 30 DE NOVIEMBRE Limpieza de alcantarillas desde la abscisa 0+000 hasta 5+000		
OCTUBRE 2016: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:  - 1 AL 5 DE OCTUBRE Roza a mano desde la abscisa 0+000 hasta 4+000  - 7 AL 14 DE OCTUBRE Roza a mano desde la abscisa 4+000 hasta 8+000  - 15 AL 21 DE OCTUBRE Roza a mano desde la abscisa 8+000 hasta 12+000  - 21 AL 28 DE OCTUBRE Limpieza de alcantarilla la abscisa 12+000 hasta 17+000  - 28 AL 31 DE OCTUBRE Limpieza de alcantarillas desde la abscisa 0+000 hasta 5+000	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	16/11/2016 - 09:37 AM
SEPTIEMBRE 2016: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:  - 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE Roza a mano desde la abscisa 5+000 hasta 8+000  - 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Roza a mano desde la abscisa 8+000 hasta 12+000  - 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE Roza a mano desde la abscisa 12+000 hasta 15+000  - 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE Limpieza de alcantarilla la abscisa 15+000 hasta 17+000  - 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE Limpieza de alcantarillas desde la abscisa 0+000 hasta 4+000	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	16/11/2016 - 09:37 AM
AGOSTO 2016: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:  - 1 AL 5 DE AGOSTO Roza a mano desde la abscisa 0+000 hasta 2+000  - 7 AL 14 DE AGOSTO Roza a mano desde la abscisa 2+000 hasta 5+000  - 15 AL 21 DE AGOSTO Roza a mano desde la abscisa 5+000 hasta 9+000  - 21 AL 28 DE AGOSTO Limpieza de alcantarilla la abscisa 0+000 hasta 3+000  - 28 AL 31 DE AGOSTO Roza a mano desde la abscisa 3+000 hasta 5+000	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	10/10/2016 - 08:07 AM
JULIO 2016: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba: - Roza a mano desde la abscisa 10+000 hasta 17+000	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	05/08/2016 - 08:24 AM
JUNIO 2016: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba: - Roza a mano desde la abscisa 0+000 hasta 10+000 - Limpieza de alcantarilla la abscisa 0+000 hasta 10+000	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	12/07/2016 - 08:47 AM
MAYO 2016: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba: - Roza a mano desde la abscisa 10+000 hasta 17+000 - Limpieza de alcantarilla la abscisa 10+000 hasta 17+000	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	12/07/2016 - 08:46 AM
ABRIL 2016: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba: - Roza a mano desde la abscisa 10+000 hasta 17+000 - Limpieza de alcantarilla la abscisa 10+000 hasta 17+000	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	05/05/2016 - 11:31 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MARZO 2016: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba: - Roza a mano desde la abscisa 5+000 hasta 10+000 - Limpieza de alcantarilla la abscisa 5+000 hasta 10+000	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	05/05/2016 - 11:31 AM
FEBRERO 2016: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba: - Roza a mano desde la abscisa 0+000 hasta 5+000 - Limpieza de alcantarilla la abscisa 0+000 hasta 5+000	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	05/05/2016 - 11:31 AM
ENERO 2016: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba: - Roza a mano desde la abscisa 7+000 hasta 17+000 - Limpieza de alcantarilla la abscisa 7+000 hasta 17+000	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	22/02/2016 - 08:53 AM
DICIEMBRE 2015: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba: - Roza a mano desde la abscisa 0+000 hasta 7+000 - Limpieza de alcantarilla la abscisa 0+000 hasta 7+000	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	22/02/2016 - 08:51 AM
NOVIEMBRE 2015: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba: - Roza a mano - Limpieza de alcantarilla	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	04/01/2016 - 05:24 PM
OCTUBRE 2015: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba: - Roza a mano - Limpieza de alcantarilla	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	10/12/2015 - 04:26 PM
SEPTIEMBRE 2015: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba: - Roza a mano - Limpieza de alcantarilla	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	09/11/2015 - 05:28 PM
AGOSTO 2015: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba: - Roza a mano - Limpieza de alcantarilla	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	12/10/2015 - 04:16 PM
JULIO 2015: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba: - Roza a mano - Limpieza de alcantarilla	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	08/09/2015 - 03:06 PM
JUNIO 2015: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba: - Roza a mano - Limpieza de alcantarilla	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	05/08/2015 - 12:05 PM
MAYO 2015: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25: - Roza a mano - Limpieza de alcantarilla - Trabajo de sellado asfáltico	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	09/07/2015 - 11:36 AM
ABRIL 2015: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25: - Roza a mano - Limpieza de alcantarilla - Trabajo de sellado asfáltico	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	10/05/2015 - 11:40 PM
Marzo 2015: Se continúa con el mantenimiento en toda la vía E-25 a Baba: - Roza a mano	Salcedo Faytong, Carolina Estefanía	07/04/2015 - 03:29 PM
FEBRERO 2015: Se continua con el mantenimiento en toda la vía E-25 a Baba: - Roza a mano - Limpieza de alcantarilla	Salcedo Faytong, Carolina Estefanía	11/03/2015 - 03:48 PM
ENERO 2015: * Se recibió acta de recepción provisional firmada con fecha 16 de diciembre de 2014 * Se inicia los trabajos de mantenimiento en la vía; roza a mano y limpieza de alcantarillas	Salcedo Faytong, Carolina Estefanía	10/02/2015 - 08:19 AM
DICIEMBRE 2014: La obra se encuentra 100% terminada. El acta de recepción provisional se encuentra en trámite.	Salcedo Faytong, Carolina Estefanía	06/01/2015 - 11:43 AM
NOVIEMBRE 2014: Se encuentra en trámite la planilla de liquidación. La diligencia del acta de recepción provisional se lo realizara el martes 16 de diciembre de 2014	Salcedo Faytong, Carolina Estefanía	10/12/2014 - 06:07 PM
OCTUBRE 2014: La obra se encuentra 100% terminada y se encuentra en trámite la planilla de liquidación y el acta de recepción provisional.	Salcedo Faytong,	05/11/2014 - 11:56 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
	Carolina Estefanía	
SEPTIEMBRE 2014: La obra se encuentra 100% terminada y se encuentra en trámite la planilla de liquidación y el acta de recepción provisional.	Salcedo Faytong, Carolina Estefanía	09/10/2014 - 03:45 PM
AGOSTO 2014: * La parte vial esta 100% terminada * Falta la conclusión sobre el puente sobre el rio el arenal ( iluminación y la señalización del puente) * Se firmo una orden de cambio por ampliación de plazo por 60 días, el cual concluye el 2 de octubre del 2014.	Salcedo Faytong, Carolina Estefanía	09/10/2014 - 03:44 PM
JULIO 2014: * Se continua con la explotación de las minas Tronado y Zapotal extrayendo los materiales para la vía * Capa de rodadura de Hor. Asfáltico mezclado en Planta e=5cm * Capa de rodadura de Hor. Asfáltico mezclado en Planta e=12,5cm * Estructura metálica, (incluido Pintura, transporte y montaje) puente Arenal * Tratamiento Bituminoso superficial tipo 2B (Inc. Transporte) * Hormigón Estructural Cem. Portland * Pórticos 0+000; 0+150; 7+150; 7+440; 15+600; 16+020; 16+180 * Cabezal 16+120 * Acero de refuerzo en barras * Suministro e instalación de Guarda camino (doble tipo flex-beam) * Sub-Base Clase II (Inc. Transporte) accesos (2+480; 11+280)  Se firmo el acta 451 para la ampliación de plazo por 60 días, la obra culminaria el 3 de Octubre del 2014.	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	13/08/2014 - 10:57 PM
JUNIO 2014: Se continúa con la: * Explotación de las Minas Tronador y Zapotal extrayendo los materiales para la vía. * Estructura metálica, incluida pintura, transporte y montaje del puente Arenal * Suministro y Colocación de piedra Triturada, alcantarilla 16+120 * Estabilización con material Pétreo * Mejoramiento de la Subrasante con suelo seleccionado  Se esta tramitando una ampliación de plazo por tres meses.	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	09/07/2014 - 09:21 PM
MAYO 2014: Se continúan trabajando en: * Se continúa con la explotación de las Minas Tronador y Zapotal extrayendo los materiales para la vía. * Capa de rodadura de Hor. Asfáltico mezclado en planta * Transporte de mejoramiento Abs 15+800 LD * Mejoramiento cajera abscisa 15+800 * Limpieza con barredora previo imprimación * Limpieza manual previa imprimación * Control de polvo * Reconformación de la vía	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	31/05/2014 - 07:35 PM
ABRIL 2014: Se continúan con los siguientes trabajos: * La obra está programada que se entregue en el mes de agosto del 2014 * Para concluir la obra, faltan aproximadamente 9 kilómetros de asfalto y montar un puente de estructura metálica. El cual está programado ya terminar de montarlo en el mes de junio * Los puentes del sector La Margarita y Mapan se encuentran terminados, faltando el puente de sobre el rio el Arenal que tiene un avance del 40%.	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	31/05/2014 - 07:07 PM
MARZO 2014: Se continua con:  * Explotación de las Minas Tronado y Zapotal extrayendo los materiales para la vía * Tratamiento Bituminoso Superficial Tipo 2B	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	12/05/2014 - 06:07 PM
FEBRERO 2014: Se continúa con: . La explotación de las Minas Tronador y Zapotal extrayendo los materiales para la vía . Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e=5cm LD (7+960 8+020) . Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e=12.5cm LI (2+900 3+150), LD (7+960 8+020) . Juntas de Neopreno Tipo Transflex B-7, 11+377.37 Y 11+407.95	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	15/03/2014 - 06:10 PM
ENERO 2014: Se continúa con los trabajos de:	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	10/03/2014 - 10:27 AM



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
.La explotación de las Minas Tronador y Zapotal extrayendo los materiales para la vía .Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e=5cm LI (2+900 3+150), LD (3+500 7+890) .Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e=12.5cm LI (1+330 1+700), (2+900 3+150), LD (3+500 3773), (3+773 6+920), (6+920 7+260), (7+260 7+890)		
DICIEMBRE 2013: * Se continúa con la explotación de las Minas Tronador y Zapotal extrayendo los materiales para la vía. * Mejoramiento de la Subrasante con suelo seleccionado lado derecho 13+700 14+400 lado izquierdo 13+700 14+400 * Base clase 1 lado derecho 6+500 7+300 * Capa de rodadura de Hor. Asfáltico mezclado en planta e=12.5cm lado izquierdo 0+020 0+140	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	10/03/2014 - 10:11 AM
NOVIEMBRE 2013: * Se realiza la construcción del puente arenal, fistola y pueblo viejo * Se colocó la carpeta asfáltica desde la abscisa 0+000 hasta 3+000 * Se continúa con la colocación del sud base en la abscisa 10+000 hasta 17+000	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	07/01/2014 - 05:21 PM
OCTUBRE 2013: Se continua con la explotación de las Minas Tronador y Zapotal extrayendo los materiales para la vía: 402-2(1) E Mejoramiento de la Subrasante con suelo seleccionado (incluyendo transporte), lado derecho (15+020 15+135); 404-1 E Base clase 1 (Incluyendo transporte) lado derecho.	Dávila Cadena, Christian Roberto	08/12/2013 - 11:39 PM
SEPTIEMBRE 2013: Se realizó el armado de los estribos del puente pueblo viejo, se comenzó con la colocación de la base clase 1 en la vía.	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	07/11/2013 - 09:33 AM
AGOSTO 2013: Se realizan trabajos de pilotaje en el puente arenal, puente sobre rio pueblo viejo y el puente fistola. Colocación del material de sud base.	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	05/10/2013 - 11:49 AM
JULIO 2013: Se continúa con la explotación de las minas Tronador y zapotal, extrayendo los materiales para la vía. Se coloca en ciertos 503-2(1)E Hormigón estructural Cem.Porlant CL-B fc=280Kg/cm2, tuberías 1500, acero de refuerzo en barras, pilote pre barrenado D=0.80m, vaciado en sitio (Inc. Camisa Metálica Perdida e=1cm) en la abscisa 2+462,45.	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	11/09/2013 - 09:33 AM
JUNIO 2013: Se continúa con la explotación de las Minas Tronador y Zapotal extrayendo los materiales para la vía, se coloca en ciertos tramos de excavación de alcantarillas 4+920, 3+500 y 2+935. Suministro y colocación de piedra triturada alcantarillas 4+920, 3+500 y 2+935. Estabilización con material Pétreo alcantarillas 4+920, 3+500 y 2+935. Material de préstamo importado lado izquierdo 14+980, 15+135.	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	08/08/2013 - 08:20 PM
MAYO 2013: Se continuan con los trabajo de colocacion de mejoramiento, colocación de alcantarillas en la abscisa desde 2+935 hasta 5+000, se derroco el puente sobre el estero pistola.	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	08/07/2013 - 12:49 PM
ABRIL 2013: Se sigue trabajando en la colocación del material de mejoramiento.	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	11/06/2013 - 12:10 PM
MARZO 2013: Se sigue trabajando en la ampliación de la vía. También en la colocación de material de mejoramiento y subbase.	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	13/05/2013 - 06:13 PM
FEBRERO 2013: Se continuo con los trabajos de ampliación de la vía, con la colocación del material de mejoramiento.	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	07/03/2013 - 05:56 PM
ENERO 2013: Se esta trabajando en movimientos de tierra en la abscisa 1+220 hasta 4+360 (segundo terraceo ) y desde la 4+360 hasta 8+800 (primer terraceo), también en el desmontaje de señales de tránsito en postes eléctricos, desmontaje de señales verticales, construcción de e instalacion de letreros/señalización.	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	26/02/2013 - 07:27 PM
DICIEMBRE 2012: Se siguen realizando trabajos de Excavación, relleno, colocación de textil, trabajos de ampliación en la vía.	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	17/01/2013 - 04:01 PM
OCTUBRE 2012: Se ha realizado los trabajos de Excavación, relleno, colocación de textil GNT 1800, Geomaya TX160, colocación de triturados, piedras. NOVIEMBRE 2012: Trabajos de ampliación en la vía.	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	07/01/2013 - 07:35 PM

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>3- REGIONAL. Ambiental.</b> Fuerte estación invernal CAUSARÍA que se suspenda los trabajos	08/11/2014	Roger Alberto Pulecio Montalvo	50 %	50	25	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto
No hay información disponible

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Contrato Firmado	4-Inicio de Trabajo	14/09/2012		14/09/2012		Sí	2.0
2	EJECUCIÓN: * Excavación sin clasificación (Inc. Desalojo) * Suministro e instalación de Geotextil NT-1800 * Suministro e instalación de Geomalla Triaxial (TX-160) * Suministro y colocación de Piedra triturada, realizados	4-Inicio de Trabajo	03/10/2012		03/10/2012		Sí	5.0
3	EJECUCIÓN: Plan de manejo ambiental de la vía E-25 a baba, realizados	1-Solicitud de Información	03/10/2012		03/10/2012		Sí	10.0
4	EJECUCIÓN: * Estabilización con Material Petreo (E=0.50m), Mejoramiento de la Subrasante con suelo seleccionado, realizados	5-Entregables Intermedios	05/10/2012		05/10/2012		Sí	7.0
5	EJECUCIÓN: Plan de Seguridad y señalización vial: * Desmontaje de señales de tránsito en postes electricos * Desmontaje de señales verticales, realizados	5-Entregables Intermedios	15/12/2012		15/12/2012		Sí	5.0
6	EJECUCIÓN: Señalización para la seguridad vial (Proceso Constructivo), realizados	5-Entregables Intermedios	20/12/2012		20/12/2012		Sí	7.0
7	EJECUCIÓN: * Sudbase Clase II * Base Clase I * Hormigon Estructural Cem. * Acero de refuerzo en barras fv=4200kg/cm2, realizados	5-Entregables Intermedios	06/05/2013		06/05/2013		Sí	5.0
8	EJECUCIÓN: Material de prestamo Importado, realizados	4-Inicio de Trabajo	03/06/2013		03/06/2013		Sí	6.0
9	EJECUCION: Capa de rodadura de Hor. asfáltico mezclado en planta e=5cm, realizados	1-Solicitud de Información	03/07/2013		03/07/2013		Sí	5.0
10	EJECUCIÓN: * Suministro e instalación de Geomalla Triaxial (TX-140) * Suministro e instalación de Geotextil NT-1600 * Tuberia de PVD=6"(160MM)(Perforada-Dren.), realizados	5-Entregables Intermedios	10/07/2013		10/07/2013		Sí	5.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
11	EJECUCIÓN: * Tratamiento Bituminoso Superficial Tipo 2B * Capa de rodadura de Hor. asfáltico mezclado en planta e=12,5cm, realizados	1-Solicitud de Información	10/08/2013		10/08/2013		Sí	5.0
12	EJECUCIÓN: Puentes: * Excavación sin clasificación (Inc. Desalojo), realizados	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	20/08/2013		20/08/2013		Sí	5.0
13	EJECUCIÓN: Remoción de Hormigón de cemento Portland, realizados	1-Solicitud de Información	02/09/2013		02/09/2013		Sí	5.0
14	EJECUCIÓN: Tratamiento bituminoso superficial tipo 2b, realizados	5-Entregables Intermedios	01/10/2013		01/10/2013		Sí	5.0
15	EJECUCIÓN: Estructura Metálica (inc. pintura, transporte y montaje), realizados	1-Solicitud de Información	01/01/2014		01/01/2014		Sí	5.0
16	EJECUCIÓN: Señalización definitiva horizontal, vertical e informativa, realizados	1-Solicitud de Información	03/08/2014		01/08/2014		Sí	5.0
17	CIERRE: Acta de Entrega - Recepción Provisional, firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	28/11/2014		27/11/2014		Sí	2.0
18	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 1 de la carretera E-25 a Baba (4 años), realizados	1-Solicitud de Información	16/12/2015		16/12/2015		Sí	2.0
19	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 2 de la carretera E-25 a Baba (4 años), realizados	1-Solicitud de Información	16/12/2016		16/12/2016		Sí	2.0
20	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 3 de la carretera E-25 a Baba (4 años), realizados	1-Solicitud de Información	16/12/2017		16/12/2017		Sí	2.0
21	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 4 de la carretera E-25 a Baba (4 años), realizados	1-Solicitud de Información	16/12/2018	16/12/2018			No	2.0
22	CIERRE: Planilla liquidada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2018	30/12/2018			No	0.0
23	COMPLETADO: Acta de Entrega - Recepción Definitiva, firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/01/2019	31/01/2019			No	3.0


**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Mantenimiento de vía	Chavez Bajaña, Kharla del Rocío	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	15/02/2016
2	Obra finalizada	Narvaez Quinto, Jesus German	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	01/11/2014
3	familias de viviendas ubicadas a un costado del puente aun no se las Indemniza	Narvaez Quinto, Jesus German	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	31/08/2014
4	visita a la carretera e-25 del cantón Baba. obra esta por concluir	Narvaez Quinto, Jesus German	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	31/07/2014
5	carretera e-25 en un 90% aproximadamente	Narvaez Quinto, Jesus German	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	27/06/2014
6	rehabilitación de la vía al cantón baba avanza normalmente.	Narvaez Quinto, Jesus German	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	09/04/2014

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
7	Supervisión de la obra	Narvaez Quinto, Jesus German	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	28/02/2014
8	avance de obra	Narvaez Quinto, Jesus German	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	29/11/2013
9	Supervisión de la Obra	Narvaez Quinto, Jesus German	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	30/10/2013
10	Revisión del Avance del Proyecto en campo	Narvaez Quinto, Jesus German	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	31/08/2013
11	INSPECCIÓN DE LA OBRA	Narvaez Quinto, Jesus German	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	30/07/2013
12	Jesús Narváez Quinto	Narvaez Quinto, Jesus German	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	23/04/2013

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Kilómetros en buen estado		100.00 %	90	90	03/10/2012	Ene-Mar


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	6,327,956.06
Estimado Al Fin Del Proyecto:	31,352,181.58 **
Costo Total:	31,761,697.84
Total Devengado:	31,352,181.58
% Costo Total Devengado:	98.71 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 98.71 %

**Perfil Económico 2018**

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	36,164,210.90	0.00	0.00	<b>36,164,210.90</b>
Ppto. Externo Planeado	6,327,956.06	0.00	0.00	<b>6,327,956.06</b>
Ppto. Aprobado Inicial	7,180,976.09	0.00	0.00	<b>7,180,976.09</b>
Ppto. Codificado	37,981,957.88	0.00	0.00	<b>37,981,957.88</b>
Ppto. Comprometido	37,981,437.73	0.00	0.00	<b>37,981,437.73</b>
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	30,863,233.04	0.00	0.00	<b>30,863,233.04</b>
Ppto. Devengado	31,352,181.58	0.00	0.00	<b>31,352,181.58</b>
Pagado Real	13,741,416.88	0.00	0.00	<b>13,741,416.88</b>
Estimado a fin de año	* 31,352,181.58	0.00	0.00	<b>31,352,181.58</b>
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-488,948.54	0.00	0.00	<b>-488,948.54</b>
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 101.58 %	0.00 %	0.00 %	<b>101.58 %</b>
Ppto. Codificado 998	6,289,352.21	0.00	0.00	<b>6,289,352.21</b>
Ppto. Devengado 998	6,289,352.21	0.00	0.00	<b>6,289,352.21</b>

\* Ppto. Devengado

**OBJETIVOS ALINEADOS**

**Objetivos Operativos**

13	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
14	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
15	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
16	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA - FISCALIZACION	ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	06/01/2017
2	ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL	ACTA_DE_RECEPCION_PROVISIONAL.pdf	06/01/2017
3	ASOCIACION HITO 1.-CONTRATO DE OBRA	A.1.pdf	16/01/2014

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
4	ASOCIACIÓN HITO 17.-ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL	F.9.PDF	13/01/2015
5	CONTRATO COMPLEMENTARIO #1-CONTRATISTA	C.6.pdf	31/03/2014
6	CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 - FISCALIZACION	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_1.pdf	06/01/2017
7	CONTRATO COMPLEMENTARIO 2 - FISCALIZACION	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_2.pdf	06/01/2017
8	CONTRATO ORIGINAL - CONTRATISTA	CONTRATO_ORIGINAL.pdf	06/01/2017
9	CONTRATO ORIGINAL DE LA FISCALIZACIÓN	A.2.pdf	16/01/2014
10	COSTO MAS PORCENTAJE-CONTRATISTA	A.3.pdf	16/01/2014
11	FOTOGRAFIAS MES DE DICIEMBRE	A.5.pdf	16/01/2014
12	FOTOGRAFIAS MES DE ENERO 2014	C.5.pdf	04/03/2014
13	FOTOGRAFIAS MES DE FEBRERO 2014	C.8.pdf	21/04/2014
14	FOTOGRAFIAS MES DE MARZO 2014	C.9.pdf	26/04/2014
15	FOTOGRAFIAS MES DE NOVIEMBRE	A.4.pdf	16/01/2014
16	INFORME DE VIABILIDAD	D.3.pdf	31/05/2014
17	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2017	GestionReporteFN(118).pdf	03/07/2017
18	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2016	GestionReporteFN-2.pdf	15/06/2016
19	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	GestionReporteFN(111).pdf	03/05/2017
20	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	GestionReporteFN(115).pdf	05/06/2017
21	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2016	GestionReporteFN-6.pdf	05/09/2016
22	INFORME EJECUTIVO DE DIC 2017	INFORME_EJECUTIVO_DE_DIC._2017_BB.pdf	04/01/2018
23	INFORME EJECUTIVO DEL SITOP AGOSTO 2017	INFORME_EJECUTIVO_DEL_SITOP_AGOSTO_2017.pdf	05/09/2017
24	INFORME EJECUTIVO DEL SITOP JULIO 2017	INFORME_EJECUTIVO_DEL_SITOP_JULIO_2017.pdf	05/09/2017
25	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2016	GestionReporteFN(99).pdf	06/01/2017
26	INFORME EJECUTIVO ENERO 2017	GestionReporteFN(100).pdf	02/02/2017
27	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2017	INFORME_FEBRERO_2017.pdf	05/03/2017
28	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2016	GestionReporteFN-2.pdf	12/07/2016
29	INFORME EJECUTIVO MARZO 2017	GestionReporteFN(108).pdf	05/04/2017
30	INFORME EJECUTIVO MAYO 2016	GestionReporteFN-2.pdf	24/06/2016
31	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2016	GestionReporteFN(98).pdf	06/01/2017
32	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2016	GestionReporteFN-11.pdf	16/11/2016
33	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	informe_de_octubre_de_2017.pdf	01/11/2017
34	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2016	GestionReporteFN-7.pdf	10/10/2016
35	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2017	informe_ejecutivo_de_septiembre_de_2017.pdf	03/10/2017
36	INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2013	B.3.pdf	16/01/2014
37	INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2014	D.1.pdf	12/05/2014
38	INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2015	G.5.pdf	11/05/2015
39	INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2013	B.7.pdf	16/01/2014
40	INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2015	GestionReporteFN(53).pdf	08/09/2015
41	INFORME EJECUTIVO SITOP DICIEMBRE 2012	A.8.pdf	16/01/2014
42	INFORME EJECUTIVO SITOP DICIEMBRE 2013	C.2.pdf	16/01/2014
43	INFORME EJECUTIVO SITOP DICIEMBRE 2014	F.3.pdf	06/01/2015
44	INFORME EJECUTIVO SITOP DICIEMBRE 2015	GestionReporteFN(96).pdf	04/01/2016
45	INFORME EJECUTIVO SITOP ENERO 2013	A.9.pdf	16/01/2014
46	INFORME EJECUTIVO SITOP ENERO 2014	C.3.pdf	03/03/2014
47	INFORME EJECUTIVO SITOP ENERO 2015	G.1.pdf	10/02/2015
48	INFORME EJECUTIVO SITOP FEBRERO 2013	B.1.pdf	16/01/2014
49	INFORME EJECUTIVO SITOP FEBRERO 2014	C.4.pdf	03/03/2014
50	INFORME EJECUTIVO SITOP FEBRERO 2015	G.2.pdf	11/03/2015
51	INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2013	B.6.pdf	16/01/2014

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
52	INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2014	D.4.pdf	13/08/2014
53	INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2015	GestionReporteFN(50).pdf	05/08/2015
54	INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2013	B.5.pdf	16/01/2014
55	INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2014	D.3.pdf	08/07/2014
56	INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2015	GestionReporteFN(26).pdf	09/07/2015
57	INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2013	B.2.pdf	16/01/2014
58	INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2014	C.7.pdf	31/03/2014
59	INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2015	G.3.pdf	07/04/2015
60	INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2013	B.4.pdf	16/01/2014
61	INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2014	D.2.pdf	31/05/2014
62	INFORME EJECUTIVO SITOP NOBIEMBRE 2015	GestionReporteFN(93).pdf	10/12/2015
63	INFORME EJECUTIVO SITOP NOVIEMBRE 2012	A.7.pdf	16/01/2014
64	INFORME EJECUTIVO SITOP NOVIEMBRE 2013	C.1.pdf	16/01/2014
65	INFORME EJECUTIVO SITOP NOVIEMBRE 2014	D.9.pdf	10/12/2014
66	INFORME EJECUTIVO SITOP OCTUBRE 2012	A.6.pdf	16/01/2014
67	INFORME EJECUTIVO SITOP OCTUBRE 2013	B.9.pdf	16/01/2014
68	INFORME EJECUTIVO SITOP OCTUBRE 2014	D.7.pdf	05/11/2014
69	INFORME EJECUTIVO SITOP OCTUBRE 2015	GestionReporteFN(78).pdf	09/11/2015
70	INFORME EJECUTIVO SITOP SEPTIEMBRE 2013	B.8.pdf	16/01/2014
71	INFORME EJECUTIVO SITOP SEPTIEMBRE 2014	D.6.pdf	07/10/2014
72	INFORME EJECUTIVO SITOP SEPTIEMBRE 2015	GestionReporteFN(56).pdf	12/10/2015
73	MEMORANDO No MTOP-DCAC-2014-70-ME	D.9.pdf	10/11/2014
74	MEMORANDO No MTOP-DEV-2014-1173-ME	F.1.pdf	10/11/2014
75	MEMORANDO No MTOP-DPR-2014-2629-ME	D.8.pdf	10/11/2014
76	ORDEN DE CAMBIO #1-CONTRATISTA	D.5.pdf	09/09/2014
77	PLANILLA 29 DE MANTENIMIENTO	5099_PM29.pdf	05/06/2017

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Ajoy Jaramillo, Daniel Mauricio	Patrocinador Ejecutivo	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Guayas	dajoy@mtop.gob.ec	
Alvarado Hidalgo, Gabriela	Supervisor Financiero	Supervisora Financiero	galvarado@mtop.gob.ec	
Fierro Aguilera, Mery Elizabeth	Titular del Proyecto		salio@mtop.gob.ec	
Pulecio Montalvo, Roger Alberto	Líder del Proyecto	Director Distrital de Guayas	rpulecio@mtop.gob.ec	023974600

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
55413_1.jpg	04/06/2018
