

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 2
Dirección Provincial Napo

PROYECTO: K018 MTOP - Construcción del Puente sobre el río Chontayacu de 50 metros de longitud.

Líder del Proyecto:	Dias Mayorga, Daniel Andrés (ddias@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Benavides Morillo, Omar Alexander	Programas Relacionados:	CONSTRUCCION DEL PUENTE CHONTAYACU E45A ("Y" DE NARUPA - HOLLIN - LLORETO), Provincia - Napo, Proyectos Emblemáticos, Proyectos Prioritarios PAI
Titular:	Mora Orozco, Fabián Alberto	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	1.41
CUP:	175200000.23.4949	TIR:	16.60 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	375,600.00
Viabilidad Técnica:	Muy Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,353,240.09
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	22/11/2010 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	02/08/2018	Fecha de Fin Base:	30/12/2012
Modificado por:	Mora Orozco, Fabián Alberto	Fecha del siguiente Hito:	11/06/2018

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES

Descripción

Construcción del puente sobre el río Chontayacu, de 50m de longitud, ubicado Vía Y de Narupa - Pasohurco. Uniendo la Provincia del Napo con la de Orellana, complementado el anillo vial: Napo - Sucumbios - Orellana

Objetivo

Interconectar las Regiones 1,2,3,6 y 7 desde el Puente Internacional sobre el Río San Miguel, en la frontera con Colombia, hasta el límite sur en la frontera con Perú, en el puente Balzas.

Estrategia

1. Supervisión técnica permanente
2. Disponibilidad de cupo presupuestario
3. Pago oportuno de planilla
4. Seguimiento al plan de obra
5. Aseguramiento del control de calidad

CONTRATISTA: Cuerpo de Ingenieros del Ejército

Beneficios Cualitativos

Se disminuirá el riesgo de accidente por el paso vehicular sobre los puentes provisionales que ya cumplieron su tiempo de servicio.

La calidad de la infraestructura vial mejorará el servicio a la circulación vehicular.

Influirá en beneficio del desarrollo de las comunidades del sector al acortar los tiempos de movilización de mercadería, personal, turismo y comercio.

Tipo de Beneficiario

Del Sectores:

Petrolero

Turístico

A la comunidad local: Loreto y Archidona

Restricciones

Tiempo. La entrega de la obra según cronograma, plazo 06 meses para culminación del contrato.

Recursos:

La mano de obra calificada requerida para la Ejecución del Proyecto considerando la experiencia que cada uno de los miembros del personal técnico mínimo deberá acreditar como mínimo, ya sea en años, número o monto de proyectos en los que haya participado.

Restricciones

Los Equipos y Materiales utilizados son de excelente calidad y rendimiento con el fin de desarrollar de manera afectiva y en el plazo estimado sumando al desarrollo del País con obras emblemáticas.


Alcance:

Las especificaciones técnicas que regirán cada uno de los Proyectos contratados por medio del MTOP Napo serán las "Especificaciones generales para la ejecución de puentes y caminos MOP-001-F 2002", del MTOP del Ecuador.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado **Congelado** Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 94.90 %
 Fecha de Inicio: 22/11/2010 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

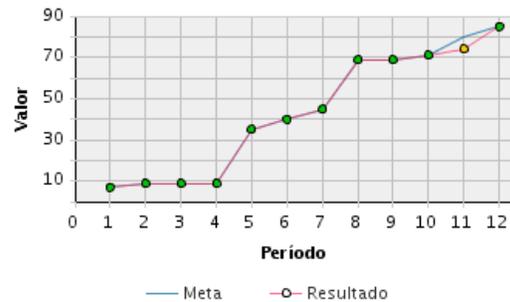

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2011	Avance programado acumulado											
	7 %	9 %	9 %	9 %	35 %	40 %	45 %	69 %	69 %	71 %	80 %	85 %
	Avance real acumulado											
	7 %	9 %	9 %	9 %	35 %	40 %	45 %	69 %	69 %	71 %	74 %	85 %
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▼	●

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2018: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 este monto incluye IVA, correspondiente al pago de Planilla de Reajuste Definitivo. Se encuentra incluido en el PAI 2018 y se está tramitando el pago respectivo.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 04:04 PM
JUNIO 2018: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 este monto incluye IVA, correspondiente al pago de Planilla de Reajuste Definitivo que se encuentra tramitando en el área financiera para su respectivo pago. Para lo cual se solicitó la apertura de parámetros del contrato en sistema e-sigef.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 04:04 PM
MAYO 2018: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 este monto incluye IVA, correspondiente al pago de Planilla de Reajuste Definitivo que se encuentra tramitando en el área financiera para su respectivo pago. Para lo cual se solicitó la apertura de parámetros del contrato en sistema e-sigef.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 04:04 PM
ABRIL 2018: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 este monto incluye IVA, correspondiente al pago de Planilla de Reajuste Definitivo que se encuentra tramitando en el área financiera para su respectivo pago. Para lo cual se solicitó la apertura de parámetros del contrato en sistema e-sigef.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 04:02 PM
MARZO 2018: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 este monto incluye IVA, correspondiente al pago de Planilla de Reajuste Definitivo que se encuentra tramitando en el área financiera para su respectivo pago. Para lo cual se solicitó la apertura de parámetros del contrato en sistema e-sigef.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 03:59 PM
FEBRERO 2018: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,00 este monto incluye IVA, correspondiente al pago de Planilla de Reajuste Definitivo que se encuentra tramitando en el área	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 03:59 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
financiera para su respectivo pago. Para lo cual se solicitó la apertura de parámetros del contrato en sistema e-sigef.		
ENERO 2018: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,00 este monto incluye IVA, correspondiente al pago de Planilla de Reajuste Definitivo que se encuentra tramitando en el área financiera para su respectivo pago. Para lo cual se solicitó la apertura de parámetros del contrato en sistema e-sigef.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 03:58 PM
DICIEMBRE 2017: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,00 este monto incluye IVA, correspondiente al pago de Planilla de reajuste definitivo que se encuentra tramitando en el área financiera para su respectivo pago. Para lo cual se solicitó la apertura de parámetros del contrato en sistema e-sigef.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	02/01/2018 - 04:21 PM
NOVIEMBRE 2017: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,00 este monto incluye IVA, correspondiente al pago de Planilla de reajuste definitivo que se encuentra tramitando en el área financiera para su respectivo pago.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	04/12/2017 - 02:03 PM
OCTUBRE 2017: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 correspondiente al pago de Planilla de reajuste definitivo, debido a que los técnicos responsables del proyecto no se encuentran laborando en la institución, el supervisor del proyecto remite un informe técnico a fin de que se emita criterio jurídico para la legalización de la planilla.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	06/11/2017 - 11:46 AM
SEPTIEMBRE 2017: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 correspondiente al pago de Planilla de reajuste definitivo, se espera que el pago se efectúe a fines del mes de OCTUBRE de 2017.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	04/10/2017 - 06:37 PM
AGOSTO 2017: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 correspondiente al pago de Planilla de reajuste definitivo, se espera que el pago se efectúe a fines del mes de SEPTIEMBRE de 2017.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	05/09/2017 - 11:25 AM
JULIO 2017: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 correspondiente al pago de Planilla de reajuste definitivo, se espera que el pago se efectúe a fines del mes de SEPTIEMBRE de 2017.	Solano Pineda, Oscar Santiago	03/08/2017 - 04:39 PM
JUNIO 2017: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 correspondiente al pago de Planilla de reajuste definitivo, se espera que el pago se efectúe a fines del mes de AGOSTO de 2017.	Solano Pineda, Oscar Santiago	05/07/2017 - 09:33 AM
MAYO 2017: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 correspondiente al pago de Planilla de reajuste definitivo, se espera que el pago se efectúe a fines del mes de JULIO de 2017.	Solano Pineda, Oscar Santiago	05/06/2017 - 12:17 PM
MAYO 2017: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 correspondiente al pago de Planilla de reajuste definitivo, se espera que el pago se efectúe a fines del mes de JUNIO de 2017.	Solano Pineda, Oscar Santiago	05/05/2017 - 12:14 AM
MARZO 2017: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 correspondiente al pago de Planilla de reajuste definitivo, se espera que el pago se efectúe a fines del mes de MAYO de 2017.	León Fernández, Jhoer Gustavo	03/04/2017 - 03:13 PM
FEBRERO 2017: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 correspondiente al pago de Planilla de reajuste definitivo, se espera que el pago se efectúe a fines del mes de Marzo de 2017.	Zarate Iñiguez, Luis Santiago	02/03/2017 - 09:55 AM
Marzo 2014: El acta de recepción de recepción definitiva de la construcción del puente se encuentra Legalizada por lo que se procede a completar este proyecto.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	05/06/2014 - 12:07 PM
Noviembre - Diciembre 2013: El acta de recepción de recepción definitiva de la construcción del puente se encuentra en trámite.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	07/01/2014 - 09:58 AM
Julio - Octubre 2013: El acta de recepción de recepción definitiva se encuentra en trámite.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	21/10/2013 - 10:07 AM
Mayo - Junio 2013: El acta de recepción de recepción definitiva se encuentra en trámite además de su liquidación económica.	Cevallos Castillo, Eduardo Ramiro	04/07/2013 - 04:45 PM
Abril 2013: El acta de recepción de recepción definitiva se encuentra en trámite además de su liquidación económica.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	16/05/2013 - 11:37 AM
Marzo: El acta de recepción de recepción definitiva se encuentra en trámite además de su liquidación económica.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	16/04/2013 - 07:26 AM
Febrero 2013: El acta de recepción de recepción definitiva se encuentra en trámite además de su liquidación económica.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	16/04/2013 - 07:23 AM
Enero 2013: El acta de recepción de recepción definitiva se encuentra en trámite además de su liquidación económica.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	16/04/2013 - 07:22 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Diciembre 2012: El acta de recepción definitiva se encuentra en tramite.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	16/04/2013 - 07:20 AM
NOVIEMBRE 2012: Con Memorando N° MTOP-SUBREG2-2012-0122-O con fecha 26 de Septiembre se nombra una comisión para la entrega recepción definitiva. Se realiza trámites correspondientes para liquidación económica.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	16/04/2013 - 07:19 AM
OCTUBRE 2012: Fiscalización entrega los documentos habilitantes para el pago de las planillas de liquidación	Avilés Castillo, Byron Alfonso	10/12/2012 - 08:29 AM
SEPTIEMBRE - 2012: Trámite para el pago de obras adicionales, y el cierre económico del proyecto. AGOSTO - 2012: Trámite para el pago de obras adicionales, y el cierre económico del proyecto. JULIO - 2012: Trámite para el pago de obras adicionales, y el cierre económico del proyecto. JUNIO - 2012: Trámite para el pago de obras adicionales, y el cierre económico del proyecto. MAYO - 2012: Trámite para el pago de obras adicionales, y el cierre económico del proyecto. ABRIL - 2012: Trámite para el pago de obras adicionales, y el cierre económico del proyecto. MARZO - 2012: Se realiza trámite para el pago de obras adicionales, y el cierre económico del proyecto. FEBRERO-2012: Se realiza trámite para el pago de obras adicionales, y el cierre económico del proyecto. ENERO-2012: Se realiza señalización horizontal y vertical. DICIEMBRE-2011: Se realizo cunetas laterales y se trabaja en la conformación de los accesos al puente lado norte y lado sur NOVIEMBRE 2011: Armado de la losa y fundición 1, se concluye con el montaje del acero estructural. OCTUBRE 2011: EL 25% del montaje de acero estructural SEPTIEMBRE 2011: El 25% del montaje de acero estructural y 25% de pintura AGOSTO -2011: Se colocan placas de neopreno, el 50% del montaje de acero estructural y el 25% limpieza y pintura de acero estructural JULIO - 2011: Se termino la fabricación de acero estructural, limpieza y pintura JUNIO - 2011: Infraestructura: excavación y relleno, hormigón estructural, material filtrante para drenaje Superestructura: fabricación de acero estructural MAYO - 2011: Infraestructura: excavación y relleno, hormigón estructural y acero de refuerzo, material filtrante para drenaje Superestructura: fabricación de acero estructural ABRIL - 2011: Infraestructura: excavación y relleno para puentes, hormigón ciclópeo, hormigón estructural y acero de refuerzo, gaviones Superestructura: suministro y montaje de acero estructural. MARZO - 2011: Infraestructura: Cimentación - excavación y relleno para puentes, hormigón estructural y acero de refuerzo, drenaje, escombreras FEBRERO - 2011: Infraestructura: hormigón estructural y acero de refuerzo Señalización y comunicados, (rubros ambientales) ENERO - 2011: Infraestructura: Excavación y relleno para puentes, hormigón estructural y acero de refuerzo, mejoramiento de la subrasante. Señalización y comunicados, (rubros ambientales) DICIEMBRE -2010: Entrega de anticipo, instalación de campamento y construcción de taller de carpintería	Avilés Castillo, Byron Alfonso	07/11/2012 - 02:47 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Revisión de documentación para la liquidación económica	19/02/2018	Rolando Alberto Villacis Miranda	50	50	25	0/1

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Recursos. La falta de Recursos económicos CAUSARÍA el retraso del cierre del proyecto en General.	19/02/2018	Rolando Alberto Villacis Miranda	50 %	50	25	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Archidona

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Firma de contrato, realizado	3-Adjudicación	25/11/2010		25/11/2010		Sí	5.0
2	PLANEACIÓN: Entrega de anticipo, realizado	4-Inicio de Trabajo	22/12/2010		22/12/2010		Sí	2.0
3	PLANEACIÓN: Rubros Ambientales. Señalización, realizado	4-Inicio de Trabajo	28/02/2011		28/02/2011		Sí	2.0
4	EJECUCIÓN: Infraestructura. Acero de refuerzo en barras, realizado	5-Entregables Intermedios	06/05/2011		06/05/2011		Sí	7.0
5	EJECUCIÓN: Infraestructura. Hormigón estructural B f'c=240 y tubos PVC, realizado	5-Entregables Intermedios	06/05/2011		06/05/2011		Sí	10.0
6	EJECUCIÓN: Infraestructura. Hormigón estructural; Placas de Neopreno , realizado	5-Entregables Intermedios	10/05/2011		10/05/2011		Sí	5.0
7	EJECUCIÓN: Infraestructura. Señales al lado de la carretera; Excavación y Relleno para puentes, realizado	5-Entregables Intermedios	10/05/2011		10/05/2011		Sí	4.0
8	EJECUCIÓN: Infraestructura. Material filtrante; Gaviones con revestimiento, realizado	5-Entregables Intermedios	05/06/2011		05/06/2011		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Superestructura. Metal miscelaneos para puentes, Juntas de dilatación y tubos PVC, realizado	5-Entregables Intermedios	01/07/2011		01/07/2011		Sí	5.0
10	EJECUCIÓN: Superestructura. Suministro, fabricación, montaje, limpieza y pintura de acero estructural, realizado	5-Entregables Intermedios	01/08/2011		01/08/2011		Sí	24.0
11	EJECUCIÓN: Superestructura. Acero de refuerzo en barras, realizado	5-Entregables Intermedios	01/10/2011		01/10/2011		Sí	1.0
12	EJECUCIÓN: Accesos. Excavación en suelo; acabado de obra básica existente, realizado	5-Entregables Intermedios	25/10/2011		25/10/2011		Sí	1.0
13	EJECUCIÓN: Infraestructura. Limpieza y reconfiguración de cauce, realizado	5-Entregables Intermedios	10/11/2011		10/12/2011		Sí	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
14	EJECUCIÓN: Accesos. Desbroce, desbosque y limpieza, realizado	5-Entregables Intermedios	15/11/2011		15/11/2011		Sí	1.0
15	EJECUCIÓN: Accesos. Mejoramiento de la subrasante, realizado	5-Entregables Intermedios	15/11/2011		15/11/2011		Sí	1.0
16	EJECUCIÓN: Accesos. Sub base clase III, base clase I, asfalto RC250, capa de rodadura, realizado	5-Entregables Intermedios	20/11/2011		20/11/2011		Sí	1.0
17	EJECUCIÓN: Accesos. Hormigón estructural Df'c=180 cunetas, limpieza y re conformación del cauce, realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2011		30/12/2011		Sí	2.0
18	EJECUCIÓN: Superestructura. Capa de rodadura; Hormigón estructural, realizado	5-Entregables Intermedios	12/12/2011		12/12/2011		Sí	2.0
19	EJECUCIÓN: Superestructura. Barandales de Hormigón , realizado	5-Entregables Intermedios	15/12/2011		15/12/2011		Sí	3.0
20	EJECUCIÓN: Infraestructura: señalización a lado de la carretera (informativa), realizado	5-Entregables Intermedios	30/01/2012		30/01/2012		Sí	1.0
21	EJECUCIÓN: Señalización horizontal y vertical, realizado	1-Solicitud de Información	29/02/2012		03/02/2012		Sí	3.0
22	CIERRE: Acta entrega recepción provisional, realizado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/10/2012		30/10/2012		Sí	2.0
23	CIERRE: Acta entrega recepción definitiva, firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2012		17/03/2014		Sí	6.0
24	CIERRE: Liquidación económica del contrato, pagada	9-Entregables Formales	21/05/2018	11/06/2018			No	3.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Historico -	Carrera Lopez, Milton Salomón	{PR} - Provincia - NAPO	08/12/2011

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de infraestructura ejecutado		100.00 %	100	100	01/01/2011	Diciembre
2	Porcentaje de Superestructura ejecutado		94.60 %	100	94.6	01/04/2011	Diciembre
3	Porcentaje de Accesos ejecutado		90.92 %	100	90.92	01/06/2011	Diciembre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	359,687.93
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,353,240.09 **
Costo Total:	899,219.83
Total Devengado:	916,522.65
% Costo Total Devengado:	101.92 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 101.92 %

Perfil Económico 2011

	Años Previos	Año Actual (2011)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	907,219.84	1,049,219.83	1,956,439.67
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	434,314.67	150,000.00	584,314.67
Ppto. Codificado	0.00	304,020.26	620,640.87	924,661.13
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	475.64	475.64
Planeado - Codificado (2011)		603,199.58		
Programado a Devengar	0.00	304,020.26	612,502.39	916,522.65
Ppto. Devengado	0.00	304,020.26	612,502.39	916,522.65
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	304,020.26	612,502.39	916,522.65
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2011

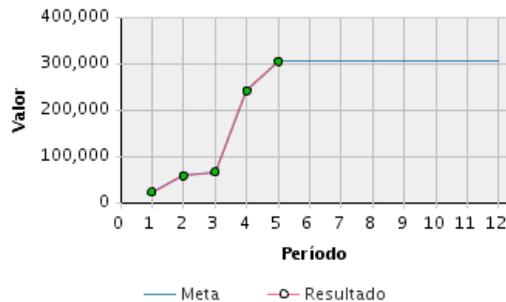

Presupuesto Mensual 2011

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	21,726.16	21,726.16	21,726.16	21,726.16	100.00 %	●	7.15 %

Presupuesto Mensual 2011							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	35,458.23	35,458.23	57,184.39	57,184.39	100.00 %		18.81 %
Mar	8,316.98	8,316.98	65,501.37	65,501.37	100.00 %		21.55 %
Abr	175,800.85	175,800.85	241,302.22	241,302.22	100.00 %		79.37 %
May	62,718.04	62,718.04	304,020.26	304,020.26	100.00 %		100.00 %
Jun	0.00		304,020.26				
Jul	0.00		304,020.26				
Ago	0.00		304,020.26				
Sep	0.00		304,020.26				
Oct	0.00		304,020.26				
Nov	0.00		304,020.26				
Dic	0.00		304,020.26				
Total	304,020.26	304,020.26					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta de Recepción Provisional de la Construcción del Puente Chontayacu	acta_recepcion_provisional_Puente_Chontayacu.pdf	16/05/2013
2	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	A7.pdf	05/06/2014
3	Contrato Complementario del Proyecto Puente Chontayacu	A9.pdf	02/03/2017
4	Contrato del Proyecto Puente Chontayacu	A8.pdf	02/03/2017
5	CROQUIS AVANCE DE OBRA	PUENTE_CHONTAYACU.pdf	05/06/2012
6	Fotos del puente sobre el Rio Chontayacu	Fotos.doc	22/05/2012
7	Informe Ejecutivo al mes de Mayo -2011: La obra se encuentra concluida	INFORME_EJECUTIVO_2011-MAYO-_CHONTAYACU-RURAYACU.pdf	06/07/2011
8	PAGOS SEGUN ESIGEF ENE-AGO 2012	CHONTAYACU.pdf	10/09/2012
9	Planilla 11 Pág. 1 al 60 E INFORMES	B1.pdf	05/04/2017
10	Planilla 11 Pág. 60 al 130 E INFORMES	B2.pdf	05/04/2017
11	Planilla Costo + % Pág. 1 al 51	B3.pdf	05/04/2017
12	Planilla de Liquidación Pág. 1 al 52	B4.pdf	05/04/2017
13	Planilla de Liquidación Pág. 53 al 115	B5.pdf	05/04/2017
14	Proyecto Priorizado SENPLADES	INFORME_DEFINITIVO-VIABILIDAD_CHONTAYACU.DOC	04/05/2012

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	Asistente de Ingeniería			
López Manito, Pedro Simón	Subsecretario Regional 2		salio@mtop.gob.ec	
Solano Pineda, Oscar Santiago	Director Provincial (Encargado)	Analista de Infraestructura Distrital 1	osolano@mtop.gob.ec	023974600

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Solano Pineda, Oscar Santiago	Supervisor de Obra	Analista de Infraestructura Distrital 1	osolano@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
18195_1.jpg	19/02/2018
