

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 3
Dirección Provincial Cotopaxi

PROYECTO: K018 MTOP- Rehabilitación del Anillo vial cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi de 9.75 Km de longitud

Líder del Proyecto:	Medina Castillo, Pedro Vinicio (vmedina@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Gamboa López, Enma Katherine	Programas Relacionados:	Provincia - Cotopaxi, REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO PROVINCIA DE COTOPAXI DE 9.75 KM. DE LONGITUD, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Espín Iñiguez, Patricio Israel	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.375366	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	12,167,937.54
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	15/03/2013 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	30/07/2018	Fecha de Fin Base:	22/05/2015
Modificado por:	Medina Castillo, Pedro Vinicio	Fecha del siguiente Hito:	30/08/2018

DATOS GENERALES

Descripción

LINEA BASE: La vía esta caracterizada por una estructura de mejoramiento en malas condiciones. OBJETIVO: Rehabilitación del anillo vial de Salcedo de 9.5 Km de longitud, Con la finalidad de incrementar la afluencia turística de la zona y un descongestionamiento vehicular en el Cantón Salcedo.

MONTO: USD 10.850.036,10 Dolares. CONTRATISTA: IMBAVIAL EP
 fiscalización: 726.108,22 (ASOCIACIÓN CONSULNAC RHV)
 +reajuste: 463.045,77
 + iva: 1389129,8244
 COSTO TOTAL: 13'42.8319,91

Beneficios Cualitativos

Disminución del tiempo de desplazamiento
 Seguridad vial
 Ordenamiento territorial del espacio comprendido entre la vía existente y el trazado del anillo vial

Tipo de Beneficiario

Población asentada a lo largo del anillo vial (Salcedo)
 Población agrícola, ganadera y turística
 Población local y nacional


Restricciones

Costo: 13'947.758,67
 Recursos: Fiscales
 Tiempo de ejecución: 39 meses
 Alcance: El cantón Salcedo presenta un congestionamiento vehicular de gran magnitud por el paso del transporte que diariamente se moviliza desde las provincias del Oriente ecuatoriano, Chimborazo y Tungurahua hacia la capital de la República, motivo que decidió que el gobierno nacional disponga la construcción de una vía alterna que permita la movilización de todo el transporte por un paso lateral que brinda la facilidades de seguridades técnicas para descongestionar el tráfico en el cantón Salcedo.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 92.82 %
 Fecha de Inicio: 15/03/2013 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Julio 2018 la obra continua paralizada temporalmente, La Patrocinadora Ejecutiva del proyecto se encuentra gestionando actos administrativos, previo a la firma del contrato complementario No. 2, con el proposito de que el proyecto se CIERRE. A la fecha el MTOP, se encuentra a la espera de que el Ministerio de Economía y Finanzas restituya los fondos para la culminación del proyecto, se solcita que el proyecto pase de fase de "EJECUCIÓN a "CONGELACO"</p>	Medina Castillo, Pedro Vinicio	30/07/2018 - 02:30 PM
<p>JUNIO/2018 La obra se encuentra suspendida temporalmente, nos encontramos realizando los actos administrativos correspondientes para la firma de un contrato complementario para la terminación el proyecto</p>	Medina Castillo, Pedro Vinicio	05/07/2018 - 08:13 AM
<p>Mayo/2018, la obra se encuentra paralizada a partir del 19 de abril de2018, hasta tener una respuesta positiva de la solicitud 451</p>	Medina Castillo, Pedro Vinicio	05/06/2018 - 08:11 AM
<p>ABRIL2018: SITUACIÓN ACTUAL La empresa IMBAVIAL E.P. responsable de la obra; en la actualidad se encuentra trabajando en la construcción de los puentes sobre las quebradas Langaza y Compadre Huayco</p>	Medina Castillo, Pedro Vinicio	31/05/2018 - 08:19 AM
<p>Enero - Marzo 2018: mediante - Memorando Nro. MTOP-DDCO-2018-31-ME, Enero 04, 2018, se me designa como fiscalizador y mediante Memorando Nro. MTOP-DDCO_2018-141-ME como lider del proyecto La empresa IMBAVIAL E.P. responsable de la obra; en la actualidad se encuentra trabajando en la construcción de los puentes sobre las quebradas Langaza y Compadre Huayco</p>	Villamarin Navarro, José	13/04/2018 - 10:05 AM
<p>Diciembre 2017.- Se firma contrato complementario para el reinicio de los trabajos en el Anillo Vial, con fecha 24 de Octubre, y se da orden de reinicio de los mismos, especificamente con la construcción de los puentes</p>	Meza, Orlando	01/01/2018 - 09:47 PM
<p>Noviemb 2017.- Se firma contrato complementario para el reinicio de los trabajos en el Anillo Vial, con fecha 24 de Octubre, y se da orden de reinicio de los mismos, especificamente con la construcción de los puentes</p>	Meza, Orlando	05/12/2017 - 04:04 PM
<p>Octub 2017.- Se firma contrato complementario para el reinicio de los trabajos en el Anillo Vial, con fecha 24 de Octubre, y se da orden de reinicio de los mismos, especificamente con la construcción de los puentes</p>	Meza, Orlando	01/11/2017 - 10:28 AM
<p>Sept 2017.- Mediante oficio N° MTOP-DDCO-2016-038-A-OF de fecha 10 de Agosto del 2016, se procedió a la suspensión temporal parcial de trabajos del proyecto Rehabilitación del Anillo Vial de Salcedo de 9.5 Km de longitud, los mismos que hasta la presente fecha continúan paralizados</p>	Meza, Orlando	05/10/2017 - 09:13 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Julio 2017.- Mediante oficio N° MTOP-DDCO-2016-038-A-OF de fecha 10 de Agosto del 2016, se procedió a la suspensión temporal parcial de trabajos del proyecto Rehabilitación del Anillo Vial de Salcedo de 9.5 Km de longitud, los mismos que hasta la presente fecha continúan paralizados	Meza, Orlando	02/08/2017 - 03:41 PM
Junio 2017.- Mediante oficio N° MTOP-DDCO-2016-038-A-OF de fecha 10 de Agosto del 2016, se procedió a la suspensión temporal parcial de trabajos del proyecto Rehabilitación del Anillo Vial de Salcedo de 9.5 Km de longitud, los mismos que hasta la presente fecha continúan paralizados	Meza, Orlando	05/07/2017 - 11:16 AM
Mayo 2017.- Mediante oficio N° MTOP-DDCO-2016-038-A-OF de fecha 10 de Agosto del 2016, se procedió a la suspensión temporal parcial de trabajos del proyecto Rehabilitación del Anillo Vial de Salcedo de 9.5 Km de longitud, los mismos que hasta la presente fecha continúan paralizados	Meza, Orlando	02/06/2017 - 11:57 AM
Abril 2017.- Mediante oficio N° MTOP-DDCO-2016-038-A-OF de fecha 10 de Agosto del 2016, se procedió a la suspensión temporal parcial de trabajos del proyecto Rehabilitación del Anillo Vial de Salcedo de 9.5 Km de longitud, los mismos que hasta la presente fecha continúan paralizados	Meza, Orlando	05/05/2017 - 10:10 AM
Abril 2017.- Mediante oficio N° MTOP-DDCO-2016-038-A-OF de fecha 10 de Agosto del 2016, se procedió a la suspensión temporal parcial de trabajos del proyecto Rehabilitación del Anillo Vial de Salcedo de 9.5 Km de longitud, los mismos que hasta la presente fecha continúan paralizados	Meza, Orlando	04/05/2017 - 04:24 PM
Marzo 2017.- Mediante oficio N° MTOP-DDCO-2016-038-A-OF de fecha 10 de Agosto del 2016, se procedió a la suspensión temporal parcial de trabajos del proyecto Rehabilitación del Anillo Vial de Salcedo de 9.5 Km de longitud, los mismos que hasta la presente fecha continúan paralizados	Meza, Orlando	04/04/2017 - 04:49 PM
Febrero 2017.- Mediante oficio N° MTOP-DDCO-2016-038-A-OF de fecha 10 de Agosto del 2016, se procedió a la suspensión temporal parcial de trabajos del proyecto Rehabilitación del Anillo Vial de Salcedo de 9.5 Km de longitud	Meza, Orlando	02/03/2017 - 04:33 PM
Enero 2017.- Mediante oficio N° MTOP-DDCO-2016-038-A-OF de fecha 10 de Agosto del 2016, se procedió a la suspensión temporal parcial de trabajos del proyecto Rehabilitación del Anillo Vial de Salcedo de 9.5 Km de longitud	Meza, Orlando	01/02/2017 - 02:45 PM
Noviembre 2016.- Mediante oficio N° MTOP-DDCO-2016-038-A-OF de fecha 10 de Agosto del 2016, se procedió a la suspensión temporal parcial de trabajos del proyecto Rehabilitación del Anillo Vial de Salcedo de 9.5 Km de longitud	Meza, Orlando	02/12/2016 - 01:54 PM
Octubre 2016.- Mediante oficio N° MTOP-DDCO-2016-038-A-OF de fecha 10 de Agosto del 2016, se procedió a la suspensión temporal parcial de trabajos del proyecto Rehabilitación del Anillo Vial de Salcedo de 9.5 Km de longitud	Meza, Orlando	07/11/2016 - 08:59 AM
Septiembre 2016.- Mediante oficio N° MTOP-DDCO-2016-038-A-OF de fecha 10 de Agosto del 2016, se procedió a la suspensión temporal parcial de trabajos del proyecto Rehabilitación del Anillo Vial de Salcedo de 9.5 Km de longitud	Meza, Orlando	30/09/2016 - 11:57 AM
Agosto 2016.- se realizan trabajos de movimiento de tierra en el sector Langaza, se continúa con la fundición de aceras y bordillos, la poca colaboración del GAD Cantonal en la reubicación de las tuberías existentes en la vía impiden el cumplimiento de la obra de acuerdo a cronograma , Plazo de contrato según orden de cambio N° 4 culminó el 23 de Agosto del 2016, se solicita reunión de la Comisión Especial 451 para solicitar ampliación del plazo	Meza, Orlando	05/09/2016 - 10:19 PM
Julio 2016.- se realizan trabajos de movimiento de tierra en el sector Langaza, se continúa con la fundición de aceras y bordillos, la poca colaboración del GAD Cantonal en la reubicación de las tuberías existentes en la vía impiden el cumplimiento de la obra de acuerdo a cronograma ,	Meza, Orlando	02/08/2016 - 10:30 PM
Junio 2016.- se realizan trabajos de movimiento de tierra en el sector Langaza, se continúa con la fundición de aceras y bordillos, la poca colaboración del GAD Cantonal en la reubicación de las tuberías existentes en la vía impiden el cumplimiento de la obra de acuerdo a cronograma Meza, Orlando 05/07/2016 - 03:38 PM	Meza, Orlando	05/07/2016 - 03:41 PM
Mayo 2016.- se realizan trabajos de movimiento de tierra en el sector Langaza, se continúa con la fundición de aceras y bordillos, la poca colaboración del GAD Cantonal en la reubicación de las tuberías existentes en la vía impiden el cumplimiento de la obra de acuerdo a cronograma	Meza, Orlando	05/07/2016 - 03:38 PM
bril 2016 .- Se presentan lluvias intensas en la zona, se interviene en tramo de Langaza, donde se ejecutan trabajos de movimientos de tierra	Meza, Orlando	03/06/2016 - 11:56 AM
Abril 2016 .- Empresa Imbavial no avanza en ejecución de trabajos, son múltiples los llamados de atención, no cumplen disposición 451, solo laboran de lunes a viernes., no existen avances significativos	Meza, Orlando	06/05/2016 - 11:37 AM
No .- Empresa Imbavial no avanza en ejecución de trabajos, son múltiples los llamados de atención, no cumplen disposición 451, solo laboran de lunes a viernes., no existen avances significativos	Meza, Orlando	05/05/2016 - 03:01 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Marzo.- Empresa Imbavial no avanza en ejecución de trabajos, son múltiples los llamados de atención, no cumplen disposición 451, solo laboran de lunes a viernes.	Meza, Orlando	05/05/2016 - 02:56 PM
Febrero 2016.- Se concluyó con la construcción de Hormigonado de muro tipo ciclopeo de protección de canal y vía 8+600-8+700 de altura variable; encofrado y Hormigonado de canal de riego 8+700-8+500, se concluyó tubería de canal de acceso 6+675-6+740; construcción de muros, canales y bordillos; se asfaltó desde el km 7+980- 8+700, carril izquierdo ancho 5 metros, km 4+000-4+400, con fecha 20 de Enero del 2016 se reunió la comisión especial 451, y aprobó la ampliación del plazo para la culminación total de la obra hasta el 23 de Agosto del 2016, y, la entrega total de los estudios a cargo de la Consultora Consulnac, hasta fines del mes de Febrero del 2016	Meza, Orlando	04/03/2016 - 10:03 PM
Enero 2016.- Se continúa con la construcción de Hormigonado de muro tipo ciclopeo de protección de canal y vía 8+600-8+700 de altura variable; encofrado y Hormigonado de canal de riego 8+700-8+500, se concluyó tubería de canal de acceso 6+675-6+740; construcción de muros, canales y bordillos; se imprimó desde el km 7+980- 8+700, carril izquierdo ancho 5 metros, colocación y tendido de material de subbase en el km 4+000-4+400	Meza, Orlando	09/02/2016 - 04:45 PM
Diciembre 2015.- Se continúa con la construcción de Hormigonado de muro tipo ciclopeo de protección de canal y vía 8+450-8+600 de altura variable; encofrado y Hormigonado de canal de riego 8+700-8+900, tubería de canal de acceso 6+675-6+740; construcción de muros, canales y bordillos; tendido de material de base clase 2 desde el km 7+980- 8+700, carril izquierdo ancho 5 metros, colocación y tendido de material de subbase en el km 4+000-4+400	Meza, Orlando	05/01/2016 - 02:07 PM
Noviembre 2015.- Se continúa con la construcción de Hormigonado de muro tipo ciclopeo de protección de canal y vía 8+450-8+600 de altura variable; encofrado y Hormigonado de canal de riego 8+700-8+900, tubería de canal de acceso 6+675-6+740	Meza, Orlando	03/12/2015 - 11:34 AM
Octubre 2015.- Se continúa con la construcción de encofrado, y Hormigonado de muro tipo ciclopeo de protección de canal y vía 8+450-8+600 de altura variable; encofrado y Hormigonado de canal de riego 8+540-8+700, tubería de canal de acceso 6+675-6+740	Meza, Orlando	06/11/2015 - 11:11 AM
Septiembre del 2015. La contratista trabaja en instalación de tubería de agua potable abscisa 2+400, construcción de muro abscisa 5+200 y tendido de base abscisa 6+000 - 6+300.	Meza, Orlando	08/10/2015 - 09:12 AM
Agosto 2015 Se firmo la ampliación de plazo, el mismo que concluye en el mes de Enero del 2016	Meza, Orlando	07/09/2015 - 09:03 AM
Julio 2015 Se firmo la ampliación de plazo, el mismo que concluye en el mes de Enero del 2016	Meza, Orlando	07/09/2015 - 08:58 AM
Junio 2015 Se firmo la ampliación de plazo por seis meses, de acuerdo al decreto 451, el nuevo plazo de terminación es en el mes de mayo 2015; por tal motivo se solicitó autorización al señor Subsecretario Regional 3 para la modificación de los hitos, se presentó necesidad de incremento de plazo adicional del contratista hasta el mes de Diciembre del 2015, se ejecutan rubros de Hormigón asfáltico, Hormigón estructural para bordillos	Meza, Orlando	12/08/2015 - 04:46 PM
Junio 2015 Se firmo la ampliación de plazo por seis meses, de acuerdo al decreto 451, el nuevo plazo de terminación es en el mes de mayo 2015; por tal motivo se solicitó autorización al señor Subsecretario Regional 3 para la modificación de los hitos, se presentó necesidad de incremento de plazo adicional del contratista hasta el mes de Diciembre del 2015, se ejecutan rubros de Hormigón asfáltico, Hormigón estructural para bordillos	Meza, Orlando	10/07/2015 - 09:56 AM
Mayo 2015 Se firmo la ampliación de plazo por seis meses, de acuerdo al decreto 451, el nuevo plazo de terminación es en el mes de mayo 2015; por tal motivo se solicitó autorización al señor Subsecretario Regional 3 para la modificación de los hitos, se presentó necesidad de incremento de plazo adicional de parte del contratista, así como la necesidad de un contrato complementario de la Fiscalización del proyecto, en la actualidad se continúa con la colocación de carpeta asfáltica desde las abscisas 4+000-5+600, se colocaron 405 mts de alcantarilla para el alcantarillado pluvial M	Meza, Orlando	09/06/2015 - 02:12 PM
Abril 2015 Se firmo la ampliación de plazo por seis meses, de acuerdo al decreto 451, el nuevo plazo de terminación es en el mes de mayo 2015; por tal motivo se solicitó autorización al señor Subsecretario Regional 3 para la modificación de los hitos, se presentó necesidad de incremento de plazo adicional de parte del contratista, así como la necesidad de un contrato complementario de la Fiscalización del proyecto, en la actualidad se continúa con la colocación de carpeta asfáltica desde las abscisas 4+000-5+600, se colocaron 405 mts de alcantarilla para el alcantarillado pluvial	Meza, Orlando	12/05/2015 - 03:43 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Marzo 2015</p> <p>Se firmo la ampliación de plazo por seis meses, de acuerdo al decreto 451, el nuevo plazo de terminación es en el mes de mayo 2015; por tal motivo se solicitó autorización al señor Subsecretario Regional 3 para la modificación de los hitos, se presentó necesidad de incremento de plazo adicional de parte del contratista, así como la necesidad de un contrato complementario de la Fiscalización del proyecto</p>	Meza, Orlando	09/04/2015 - 02:50 PM
<p>Enero 2015</p> <p>Se firmo la ampliación de plazo por seis meses, de acuerdo al decreto 451, el nuevo plazo de terminación es en el mes de mayo 2015; por tal motivo se solicitó autorización al señor Subsecretario Regional 3 para la modificación de los hitos</p> <p>Se asfalta desde la 0+020 hasta la 1+660 todo el ancho</p> <p>Se asfalta desde la 1+880 hasta la 2+200 ancho 5 metros lateral izquierda</p> <p>Se encuentran construidos bordillos internos desde la 0+020 1+660 y 1+880 2+200 2+600 2+800</p> <p>Se encuentra reconformado y tendiendo la sub base desde la 3+360 3+800</p>	Meza, Orlando	10/02/2015 - 08:59 AM
<p>Diciembre de 2014</p> <p>Se firmo la ampliación de plazo por seis meses, de acuerdo al decreto 451, el nuevo plazo de terminación es en el mes de mayo 2015; por tal motivo se solicitó autorización al señor Subsecretario Regional 3 para la modificación de los hitos</p> <p>Se iniciaron los trabajos de excavación para bordillo, actualmente se encuentran en fundición en el lado derecho 0+500 y lado izquierdo 0+550</p> <p>Se está realizando el último tramo del colector de alcantarillado y se funden los últimos pozos</p> <p>Se imprimó el lado izquierdo desde la 0+020 al 0+390 con 10 metros de ancho para el posterior asfaltado</p> <p>Se están construyendo acometidas al sistema de alcantarillado desde la 7+760 hasta el final del tramo</p>	Meza, Orlando	07/01/2015 - 02:28 PM
<p>Noviembre de 2014</p> <p>Se firmo la ampliación de plazo por seis meses, de acuerdo al decreto 451</p> <p>El nuevo plazo de terminación es en el mes de mayo 2015</p> <p>Esta firmado el convenio para el pago de las expropiaciones faltantes, y se comenzo el pago de las mismas</p> <p>Tendido y compactación de base en la abscisa 1+600</p> <p>Construcción de acometidas de alcantarillado y limpieza de pozos de revisión</p>	Meza, Orlando	07/01/2015 - 12:54 PM
<p>Septiembre 2014.- Se realizó la colocación de tubería de alcantarillado</p>	Meza, Orlando	14/10/2014 - 12:52 PM
<p>Agosto 2014.- Se ejecutan trabajos de colocación de Sub-base, base y alcantarillado pluvial, muros de protección y gaviones</p>	Meza, Orlando	05/09/2014 - 12:08 PM
<p>JuLIO 2014</p> <p>La contratista IMBAVIAL. E.P. se encuentra trasportando material de base , construcción de bordillos y cunetas , en la abscisa 6+000 la contratista esta colocando sub base y continua con la construcción del alcantarillado pluvial .Ademas se han realizado trabajos con Hormigòn estructural fc=210 Kg/cm2</p>	Meza, Orlando	07/08/2014 - 11:42 AM
<p>Junio 2014</p> <p>La contratista IMBAVIAL. E.P. se encuentra trasportando material de base , construcción de bordillos y cunetas , en la abscisa 5+000 la contratista esta colocando sub base y continua con la construcción del alcantarillado pluvial .Ademas se han realizado trabajos con Hormigòn estructural fc=210 Kg/cm2</p>	Meza, Orlando	01/07/2014 - 03:46 PM
<p>Abril 2014.</p> <p>La fiscalización externa conosco que esta contratada , pero no entra a laborar ,Continua los trabajos el contratista en construcción de bordillos en la abscisa 0+000 a la 1+000 , muro de gaviones . transporte y colocación de sub base y movimiento de tierras .</p>	Flores Fernández, César Aníbal	04/05/2014 - 07:09 PM
<p>Marzo 2014</p> <p>No tenemos Fiscalización , continua los trabajos la contratista en construcción de posos de alcantarillado , colocación de sub base desde la 0+000 a 1+040 .</p>	Flores Fernández, César Aníbal	06/04/2014 - 05:46 PM
<p>Febrero 2014</p> <p>No hay Fiscalización , la contratista trabaja en : excavación sin clasificar , estabilización de taludes , alcantarillado Pluvial ,excavación para estructuras menores y transporte de material excavado a escombrera.</p>	Flores Fernández, César Aníbal	05/03/2014 - 02:10 PM
<p>Enero del 2014.</p> <p>Hasta la presente fecha no se contrata la fiscalización , la contratista trabaja en movimiento de tierras ,excavación y relleno para estructuras menores, construcción de alcantarillado Pluvial. transporte de sub base y base</p>	Flores Fernández, César Aníbal	14/02/2014 - 09:26 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Diciembre 2013. No se contrata la fiscalización . La contratista continua con movimiento de tierras , rellenos , cajeras para colocación de material de sub base , el GAD de Salcedo continua con las indemnizaciones .	Flores Fernández, César Aníbal	05/02/2014 - 02:56 PM
Noviembre 2013. No se contrata la fiscalización . La contratista trabaja en movimiento de tierras , el GAD de Salcedo esta Atrazado en las Indemnizaciones (144 predios liberados hasta la presente fecha).	Flores Fernández, César Aníbal	05/02/2014 - 02:56 PM
Octubre del 2013. La contratista continua con movimiento de tierra , reparación del alcantarillado existente por el paso de la via . No se contrata la fiscalización , el GAD de Salcedo continua con las indemnizaciones para que la contratista pueda trabajar con normalidad .	Flores Fernández, César Aníbal	22/11/2013 - 02:21 PM
Septiembre 2013 . Hasta la presente fecha no se contrata la fiscalización, se trabaja en movimiento de tierra y transporte a escombreras y rellenos, el GAD de Salcedo continua con las indemnizaciones.	Flores Fernández, César Aníbal	04/10/2013 - 09:33 AM
Agosto 2013 La contratista trabaja en Desbroce,desbosque y limpieza, hasta la abscisa 3+000, excavación sin clasificar y transporte a escombrera.	Flores Fernández, César Aníbal	04/09/2013 - 09:48 AM
Julio 2013. La contratista esta trabajando en movimiento de tierra y desalojo	Flores Fernández, César Aníbal	04/09/2013 - 09:48 AM
Junio 2013. El contratista esta realizando el replanteo del proyecto , el GAD de Salcedo se ha comprometido a entregar liberado los terrenos y a dar linea para la colocación de las nuevos sitios donde seran construidos los canales de agua de regadio . En razón de existir una partida presupuestaria es necesario que se contrate la fiscalización inmediatamente y los trabajos continuen con normalidad.	Flores Fernández, César Aníbal	03/07/2013 - 09:21 AM
Mayo 2013. El 22 de mayo fue acreditado el anticipo ala Contratista IMBAVIAL E. P. , y se encuentra replanteando el proyecto	Flores Fernández, César Aníbal	03/07/2013 - 09:21 AM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Falta de recursos para continuar con el proyecto	30/07/2018	Pedro Vinicio Medina Castillo	90	90	81	0/1

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Costo. Insuficiente recurso economico para pago planillas CAUSARIA paralización de los trabajos	30/07/2018	Pedro Vinicio Medina Castillo	70 %	60	42	0/1
5- PROYECTO. * General. Malas condiciones climáticas CAUSARIA retraso en la culminación de los trabajos	30/07/2018	Pedro Vinicio Medina Castillo	50 %	60	30	0/1
5- PROYECTO. Recursos. Falta de recursos CAUSARIA impedimentos para su culminación de los estudios	30/07/2018	Pedro Vinicio Medina Castillo	50 %	50	25	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 3


LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
No hay información disponible	

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Contrato obra firmado	3-Adjudicación	15/03/2013		15/03/2013		Sí	1.0
2	EJECUCION: Inicio de trabajos , ejecutado	4-Inicio de Trabajo	22/05/2013		22/05/2013		Sí	2.0
3	EJECUCION: Replanteo Tramo 1 , ejecutado	5-Entregables Intermedios	01/08/2013		01/08/2013		Sí	5.0
4	EJECUCION: Alcantarillado Pluvial 50%	5-Entregables Intermedios	22/10/2013		31/03/2016		Sí	5.0
5	EJECUCION: Alcantarillado Pluvial 100%	5-Entregables Intermedios	31/01/2014		30/04/2016		Sí	5.0
6	EJECUCION: Capa rodadura hormigón asfáltico (caliente) 7.5cm 50%	5-Entregables Intermedios	15/05/2014		30/06/2016		Sí	10.0
7	EJECUCION: Excavación y relleno para estructuras menores 50%	5-Entregables Intermedios	31/05/2014		30/04/2016		Sí	5.0
8	EJECUCION: Sub base y Base 50%	5-Entregables Intermedios	31/05/2014		30/12/2015		Sí	5.0
9	EJECUCION: Excavación sin clasificar 50%	5-Entregables Intermedios	15/06/2014		30/12/2015		Sí	2.5
10	EJECUCION: Drenaje	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/05/2016		Sí	7.0
11	EJECUCION: Puentes Langaza y Compadre Huayco Construidos	5-Entregables Intermedios	31/07/2014	30/08/2018			No	5.0
12	EJECUCION: Acabado obra basica	5-Entregables Intermedios	30/08/2014	30/12/2018			No	4.0
13	EJECUCION: Capa rodadura hormigón asfáltico (caliente) 7.5cm 75%	5-Entregables Intermedios	31/08/2014		10/06/2016		Sí	5.0
14	EJECUCION: Sub base y Base 75%	5-Entregables Intermedios	31/08/2014		10/06/2016		Sí	3.0
15	EJECUCION: Sub base y Base 100%	5-Entregables Intermedios	30/09/2014	30/12/2018			No	5.0
16	EJECUCION: Excavación sin clasificar 100%	5-Entregables Intermedios	30/10/2014		31/05/2016		Sí	2.5
17	EJECUCION: Capa rodadura hormigón asfáltico (caliente) 7.5cm 100%	5-Entregables Intermedios	31/10/2014	30/12/2018			No	10.0
18	EJECUCION: Excavación y relleno para estructuras menores 100%	5-Entregables Intermedios	31/10/2014	30/12/2018			No	5.0
19	EJECUCION: Señalización	5-Entregables Intermedios	20/11/2014	30/12/2018			No	2.0
20	EJECUCION: Trabajo Ambientales	5-Entregables Intermedios	20/11/2014	30/12/2018			No	5.0
21	CIERRE: Recepción Provisional	5-Entregables Intermedios	22/11/2014	30/12/2018			No	1.0
22	CIERRE: Liquidación económica realizada.	5-Entregables Intermedios	22/05/2015	30/12/2018			No	1.0


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
23	COMPLETADO: Recepción Definitiva	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	22/05/2015	30/12/2018			No	4.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	ANILLO VIAL	Gonzalez Jara, Hector Guillermo	{PR} - Provincia - COTOPAXI	30/11/2017
2	ANILLO VIAL	Gonzalez Jara, Hector Guillermo	{PR} - Provincia - COTOPAXI	28/08/2017
3	Anillo vial cantón Salcedo	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	07/07/2017
4	ANILLO VIAL SALCEDO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	11/01/2017
5	ANILLO VIAL SALCEDO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	30/12/2016
6	ANILLO VIAL SALCEDO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	11/01/2017
7	ANILLO VIAL SALCEDO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	30/11/2016
8	ANILLO VIAL	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	30/09/2016
9	ANILLO VIAL	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	29/08/2016
10	ANILLO VIAL	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	30/04/2016
11	Anillo vial cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi de 9.75 Km de longitud	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	31/03/2016
12	Anillo vial cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi de 9.75 Km de longitud	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	29/02/2016
13	Anillo vial cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi de 9.75 Km de longitud	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	29/01/2016
14	ANILLO VIAL	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	30/12/2015
15	ANILLO VIAL	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	30/11/2015
16	Anillo vial cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	29/10/2015
17	ANILLO VIAL	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	27/08/2015
18	VÍA DEL ANILLO VIAL	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	27/05/2015
19	VÍA DEL ANILLO VIAL	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	29/06/2015
20	VÍA DEL ANILLO VIAL	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	22/04/2015
21	VÍA DEL ANILLO VIAL	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	25/03/2015
22	VÍA DEL ANILLO VIAL	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	20/02/2015
23	REHABILITACIÓN DEL ANILLO VIAL	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	15/12/2014
24	REHABILITACIÓN DEL ANILLO VIAL	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	22/10/2014
25	ANILLO VÍA	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	24/08/2014
26	REHABILITACIÓN DEL ANILLO VIAL DEL CANTÓN SALCEDO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	15/07/2014
27	REHABILITACIÓN DEL ANILLO VIAL DEL CANTÓN SALCEDO	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	29/05/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de cumplimiento de avance físico		84.21 %	95	80	22/05/2013	Abr-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	3,255,010.83
Estimado Al Fin Del Proyecto:	12,167,937.54 **
Costo Total:	13,428,319.91
Total Devengado:	6,897,391.51
% Costo Total Devengado:	51.36 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 51.36 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	8,724,220.56	0.00	0.00	8,724,220.56
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	13,174,381.53	9,622.76	0.00	13,184,004.29
Ppto. Codificado	12,322,848.74	9,622.76	0.00	12,332,471.50
Ppto. Comprometido	10,370,234.80	0.00	0.00	10,370,234.80
Planeado - Codificado (2018)		-9,622.76		
Programado a Devengar	14,436,698.81	5,270,546.03	0.00	19,707,244.84
Ppto. Devengado	6,897,391.51	0.00	0.00	6,897,391.51
Pagado Real	6,569,291.51	0.00	0.00	6,569,291.51
Estimado a fin de año	* 6,897,391.51	0.00	0.00	6,897,391.51
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	7,539,307.30	5,270,546.03	0.00	12,809,853.33
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 47.78 %	0.00 %	0.00 %	35.00 %
Ppto. Codificado 998	3,552,442.56	0.00	0.00	3,552,442.56
Ppto. Devengado 998	1,601,802.11	0.00	0.00	1,601,802.11

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

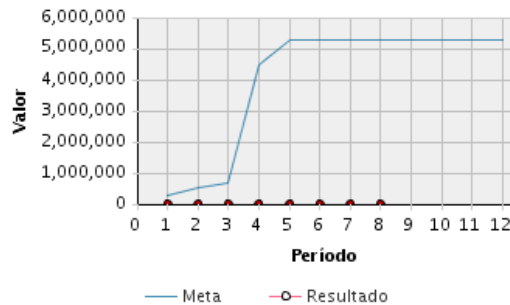

Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	257,476.23	0.00	257,476.23	0.00	0.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	243,752.65	0.00	501,228.88	0.00	0.00 %		0.00 %
Mar	157,545.86	0.00	658,774.74	0.00	0.00 %		0.00 %
Abr	3,818,608.28	0.00	4,477,383.02	0.00	0.00 %		0.00 %
May	793,163.01	0.00	5,270,546.03	0.00	0.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	5,270,546.03	0.00	0.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	5,270,546.03	0.00	0.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	5,270,546.03	0.00	0.00 %		0.00 %
Sep	0.00		5,270,546.03				
Oct	0.00		5,270,546.03				
Nov	0.00		5,270,546.03				
Dic	0.00		5,270,546.03				
Total	5,270,546.03	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
14	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
15	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		SECCION_TIPICA_414.jpg	07/06/2013
2		SECCION_TIPICA_420.jpg	02/07/2013
3		DSC00450.JPG	17/07/2013
4		informe__anillo_vial_salcedo.pdf	09/08/2013
5		ANILLO_VIAL_SALCEDO.pdf	30/09/2013
6	A.7 Informe Ejecutivo Anillo Vial Marzo 2015	Informe_Ejecutivo__Anillo_Vial_Marzo_2015.pdf	13/04/2015
7	A07 Informe ejecutivo SITOP Noviembre 2014	A07_Informe_ejecutivo_SITOP_Noviembre_2014.pdf	09/12/2014
8	A11 EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	Noviembre_Salcedo.pdf	08/12/2014
9	A12 informe de diciembre 2014	Anillo_Vial_Salcedo.pdf	06/01/2015
10	A12 Informe SITOP Diciembre 2014	A12_Informe_SITOP_Diciembre_2014.pdf	07/01/2015
11	A12-1 trabajos mes de Diciembre 2014	Oficios_2015.docx	06/01/2015
12	A13 Reporte Informe Ejecutivo SITOP Enero 2015	A13_Reporte_Informe_Ejecutivo_SITOP_Enero_2015.pdf	05/02/2015
13	A4 informe ejecutivo JULIO 2014 SITOP	A4_informe_ejecutivo_SITOP_Julio_2014.pdf	07/08/2014
14	A5. Informe ejecutivo SITOP Septiembre 2014	A5_Informe_Ejecutivo_SITOP_Septiembre_2014.pdf	08/10/2014
15	A6 Informe ejecutivo SITOP Octubre 2014	A6_Informe_ejecutivo_SITOP_Octubre_2014.pdf	17/11/2014
16	Acta de inicio de Trabajos	SECCION_TIPICA_413.jpg	07/06/2013
17	B1 Informe ejecutivo SITOP Abril 2015	B1_Informe_ejecutivo_SITOP_Abril_2015.pdf	12/05/2015
18	B2 Informe Ejecutivo SITOP Junio 2015	B2_Informe_Ejecutivo_SITOP_Junio_2015.pdf	10/07/2015
19	B3 Informe ejecutivo SITOP julio 2015	B3_Informe_ejecutivo_SITOP_julio_2015.pdf	12/08/2015
20	B4 Informe ejecutivo SITOP agosto 2015	B4_Informe_ejecutivo_SITOP_agosto_2015.pdf	08/10/2015
21	B5 Informe ejecutivo SITOP septiembre 2015	B5_Informe_ejecutivo_SITOP_septiembre_2015.pdf	08/10/2015
22	B6 Informe Ejecutivo SITOP Noviembre 2015	B6_Informe_Ejecutivo_SITOP_Noviembre_2015.pdf	04/12/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
23	C1 Informe SITOP Febrero 2017	C1_Informe_SITOP_Febrero_2017.pdf	04/03/2017
24	CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 ANILLO VIAL IMBAVIAL COMPLETO	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_1_ANILLO_VIAL_IMBAVIAL_COMPLETO.pdf	23/02/2018
25	Dictámen de Prioridad	dictamen_senplades_2015__Anillo_vial_Salcedo.pdf	13/11/2015
26	Escombrera	DSC00447.JPG	17/07/2013
27	Expropiaciones realizadas por el GAD de Salcedo hasta Noviembre 2013	SECCION_TIPICA_505.jpg	14/11/2013
28	Informe ejecutivo de Diciembre 2013	ANILLO_VIAL_SALCEDO.pdf	02/01/2014
29	Informe ejecutivo de Febreo 2014	FEBREO_2014.pdf	08/03/2014
30	Informe ejecutivo Sitop abril 2014	A.2_Informe_ejecutivo_SITOP_Abril_2014.pdf	08/05/2014
31	Informe ejecutivo Sitop noviembre 2013	A01_sitop_Anillo_Vial_de_Salcedo_informe_ejecutivo_noviembre_2013.pdf	10/11/2013
32	Informe ejecutivo Sitop septiembre 2013	Informe_Sitop_septiembre_2013.pdf	04/10/2013
33	Informe Rehabilitación Anillo Vial Salcedo Marzo/2018	INFORME_REHABILITACION_ANILLO_VIAL_SALCEDO_MARZO_2018.pdf	13/03/2018
34	Informe SITOP julio 2013	anillo_vial_salcedo_julio_2013.pdf	09/08/2013
35	informe Sitop junio 2014	A3_Informe_ejecutivo_SITOP_Junio_2014.pdf	02/07/2014
36	Octubre 2013 abscisa 5+100	DSC01135.JPG	18/10/2013
37	Octubre 2013 Abscisa 3+650	DSC01136.JPG	18/10/2013
38	Oficio MTOP-DDCO-2016-038-A-OF	Oficio_MTOP-DDCO-2016-038-A-OF.pdf	21/04/2017
39	Resumen ejecutivo SITOP mayo 2016	Resumen_Ejecutivo_SITOP_Mayo_2016.pdf	04/06/2016
40	SITOP RESUMEN EJECUTIVO JUNIO 2018	SITOP_RESUMEN_EJECUTIVO_JUNIO_2018.pdf	05/07/2018

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	Fiscalizador			
Espinel García, Ángel	Administrador Regional	Subsecretario Zonal 3, Encargado	aespinel@mtop.gob.ec	023974600
Espín Iñiguez, Patricio Israel	Supervisor	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Cotopaxi, Encargado	pespin@mtop.gob.ec	023974600
Villamarin Navarro, José	Administrador		salio@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
69758_1.jpg	31/05/2018
