

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 6
Dirección Provincial Azuay

PROYECTO: K011 MTOP -Terminación de la Carretera Puente de Chicti - Sevilla de Oro - Guarumales - Méndez, Tramo 1: Puente de Chicti- Sevilla de Oro, de 27.05 Km. de longitud, Ubicada en la provincia del Azuay (Azuay)

Líder del Proyecto:	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano (otintin@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Quezada Jara, Mónica Fabiola	Programas Relacionados:	Provincia - Azuay, TERMINACION DE LA C. PUENTE CHICTI - SEVILLA DE ORO - GUARUMALES - MENDEZ TRAMO 1 PUENTE CHICTI - SEVILLA DE ORO D
Titular:	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.766.3232	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	9,835,924.22
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/04/2006 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	02/08/2018	Fecha de Fin Base:	20/05/2013
Modificado por:	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	Fecha del siguiente Hito:	31/08/2018

DATOS GENERALES

Descripción

Terminación de la Carretera Puente de Chicti - Sevilla de Oro - Guarumales - Méndez, Tramo 1: Puente de Chicti- Sevilla de Oro, de 27.05 Km. de longitud, Ubicada en la provincia del Azuay (Azuay).
 "Programa Construcciones Viales Rehabilitación Carretera Puente Chicti - Sevilla de Oro (mantenimiento por contrato e imprevistos) " Carretera de 27.08 Km. de longitud a nivel de carpeta asfáltica, en un plazo de 36 meses y mantenimiento de 24 meses.
 1.- Vía principal que une las Provincias del Azuay con Morona Santiago
 Al momento se encuentra en etapa de mantenimiento.
 Contratista: Cuerpo de Ingenieros del Ejército
 Fiscalizador. Ing. Ezequiel Calle

Beneficios Cualitativos

Mejorar el nivel de servicio, disminuir el costo operativo de los vehículos, disminuir el tiempo de traslado desde y hacia el oriente ecuatoriano, mejorar el nivel de vida de los usuarios directos de la vía.

Tipo de Beneficiario

Usuarios de la vía y ciudadanía en general, para apoyar la integración social y territorial, así como el desarrollo socio económico del país


Restricciones

Costo: USD \$ 12.481.870,93
 Tiempo: 9 años (2008 - 2017)
 Alcance: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUENTE CHICTI - SEVILLA DE ORO - GUARUMALES - MENDEZ, TRAMO 1 PUENTE CHICTI - SEVILLA DE ORO DE 27.08 KM
 Recursos: MTOP - Equipo Técnico Dirección Distrital del Azuay

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 96.74 %
 Fecha de Inicio: 01/04/2006 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Julio 2018: Con fecha 08/06/2018 se suscribe el convenio de pago, se realizan los trámites correspondientes para realizar el pago del valor adeudado.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	02/08/2018 - 10:25 AM
Junio 2018: Con fecha 08/06/2018 se suscribe el convenio de pago, se realizan los trámites correspondientes para realizar el pago del valor adeudado.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	05/07/2018 - 03:42 PM
Mayo 2018: Se cuenta con el aval para el convenio de pago, se remitió al Ministro la documentación correspondiente para la legalización del convenio de pago, hasta la fecha no se cuenta con respuesta.	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	03/07/2018 - 08:05 AM
Abril 2018: Se cuenta con el aval para el convenio de pago, se remitió al Ministro la documentación correspondiente para la legalización del convenio de pago, hasta la fecha no se cuenta con respuesta.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	04/05/2018 - 02:58 PM
Marzo 2018: Se cuenta con el aval para el convenio de pago, se remitió al Ministro la documentación correspondiente para la legalización del convenio de pago.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	05/04/2018 - 06:03 PM
Febrero 2018: Mediante Memorando Nro. MTOP-CGJ-2017-1411-ME, la Coordinación General de Asesoría Jurídica menciona que "Se establece que los documentos presentados admiten el trámite del Convenio de Pago para cancelar los valores al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y artículo 66, numeral 17 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que la Coordinación General de Asesoría Jurídica, considera procedente continuar con el trámite y suscripción del mencionado Convenio de Pago, para cuyo efecto corresponde a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica y Dirección de Planificación, realizar el trámite pertinente para obtener de ser el caso el Aval y Partida Presupuestaria que se aplicaría al pago de las obligaciones que se deriven del mencionado acto administrativo".	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	05/04/2018 - 04:53 PM
Enero 2018: Mediante Memorando Nro. MTOP-CGJ-2017-1411-ME, la Coordinación General de Asesoría Jurídica menciona que "Se establece que los documentos presentados admiten el trámite del Convenio de Pago para cancelar los valores al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y artículo 66, numeral 17 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que la Coordinación General de Asesoría Jurídica, considera procedente continuar con el trámite y suscripción del mencionado Convenio de Pago, para cuyo efecto corresponde a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica y Dirección de Planificación, realizar el trámite pertinente para obtener de ser el caso el Aval y Partida Presupuestaria que se aplicaría al pago de las obligaciones que se deriven del mencionado acto administrativo".	Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	08/03/2018 - 08:17 AM
Diciembre 2017: Mediante Memorando Nro. MTOP-CGJ-2017-1411-ME, la Coordinación General de Asesoría Jurídica menciona que "Se establece que los documentos presentados admiten el trámite del Convenio de Pago para cancelar los valores al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	19/01/2018 - 03:54 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y artículo 66, numeral 17 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que la Coordinación General de Asesoría Jurídica, considera procedente continuar con el trámite y suscripción del mencionado Convenio de Pago, para cuyo efecto corresponde a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica y Dirección de Planificación, realizar el trámite pertinente para obtener de ser el caso el Aval y Partida Presupuestaria que se aplicaría al pago de las obligaciones que se deriven del mencionado acto administrativo".		
Noviembre 2017: Con memorando Nro. MTOP-DDAZ-2017-2382-ME de fecha Cuenca, 04 de diciembre de 2017 el Director Distrital del Azuay solicita el pago planillas No.59, 60 61 y 62 correspondiente a los trabajos ejecutados en los periodos de los meses de enero, febrero, marzo del 2013.	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/12/2017 - 02:57 PM
Octubre 2017 El proyecto tiene recepción definitiva. Se encuentra en trámite las planillas de mantenimiento Nro. 59, 60, 61, 62. La Orden de Trabajo No. 2, se tramitará como Convenio de Pago, se envió documentación a Planta Central. Se esta a la espera de la aprobación del aval por parte del Señor Ministro.	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	14/11/2017 - 04:39 PM
Septiembre 2017 El proyecto tiene recepción definitiva. Se encuentra en trámite las planillas de mantenimiento Nro. 59, 60, 61, 62. La Orden de Trabajo No. 2, se tramitará como Convenio de Pago, se envió documentación a Planta Central. Se esta a la espera de la aprobación del aval por parte del Señor Ministro.	Brito Puni, Andrea Valerie	05/10/2017 - 05:11 PM
Agosto 2017 El proyecto tiene recepción definitiva. Se encuentra en trámite las planillas de mantenimiento Nro. 59, 60, 61, 62. La Orden de Trabajo No. 2, se tramitará como Convenio de Pago, se envió documentación a Planta Central. Se analiza forma de pago de valores adeudados por cuanto son valores excedidos del monto contractual.. Se ha solicitado el aval al Señor Ministro.	Brito Puni, Andrea Valerie	11/09/2017 - 10:14 PM
Julio 2017: El proyecto tiene recepción definitiva. Se encuentra en trámite las planillas de mantenimiento Nro. 59, 60, 61, 62 y la Orden de Trabajo No. 2. Se analiza forma de pago de valores adeudados por cuanto son valores excedidos del monto contractual.. Se ha solicitado el aval al Señor Ministro.	Brito Puni, Andrea Valerie	04/08/2017 - 08:15 PM
Junio 2017: El proyecto tiene recepción definitiva. Se encuentra en trámite las planillas de mantenimiento Nro. 59, 60, 61, 62. Se analiza forma de pago de valores adeudados por cuanto son valores excedidos del monto contractual.. En proceso elaboración de documentación que permita dar cumplimiento a la solicitud de aval, con el fin de realizar pago de haberes. Planta Central ha informado que estamos a la espera de la aprobación de la Reforma Intra a cargo del Ministerio de Finanzas	Brito Puni, Andrea Valerie	05/07/2017 - 04:58 PM
Mayo 2017: El proyecto tiene recepción definitiva. Se encuentra en trámite las planillas de mantenimiento Nro. 59, 60, 61, 62. Se analiza forma de pago de valores adeudados por cuanto son valores excedidos del monto contractual.. En proceso elaboración de documentación que permita dar cumplimiento a la solicitud de aval, con el fin de realizar pago de haberes.	Brito Puni, Andrea Valerie	05/06/2017 - 04:58 PM
Abril 2017: El proyecto tiene recepción definitiva. Se encuentra en trámite las planillas de mantenimiento Nro. 59, 60, 61, 62. Se analiza forma de pago de valores adeudados por cuanto son valores excedidos del monto contractual.. En proceso elaboración de documentación que permita dar cumplimiento a la solicitud de aval, con el fin de realizar pago de haberes.	Cordero Figueroa, Pablo Antonio	05/05/2017 - 12:24 PM
Marzo 2017: El proyecto tiene recepción definitiva. Se encuentra en trámite las planillas de mantenimiento Nro. 59, 60, 61, 62. Se analiza forma de pago de valores adeudados por cuanto son valores excedidos del monto contractual.	Arévalo Salazar, Darwin Jacinto	14/04/2017 - 02:51 PM
NOVIEMBRE 2013: El contratista continúa con trabajos de mantenimiento, especialmente en lo que se refiere a bacheo de la capa de rodadura de hormigón asfáltico como paso previo a la solicitud de recepción definitiva de la obra, correspondiente al hito 22, recepción definitiva.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/12/2013 - 03:18 PM
OCTUBRE 2013: El contratista continúa con trabajos de mantenimiento, especialmente en lo que se refiere a bacheo de la capa de rodadura de hormigón asfáltico como paso previo a la solicitud de recepción definitiva de la obra; trabajos que se han visto retrasados debido a las lluvias presentes en el sector; a demás es de señalar que debido al intenso tráfico pesado que soporta la vía por el transporte de materiales hacia los proyectos sevilla de oro - San Pablo, Proyecto hidroeléctrico Sopladora y el transporte de calizas desde la ciudad de Mendez hacia Azogues para la empresa de cementos Guapán, el desgaste de la capa de rodadura y su deterioro es continuo y prematuro.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	06/11/2013 - 03:57 PM
SEPTIEMBRE 2013: El contratista continúa con trabajos de mantenimiento, especialmente en lo que se refiere a bacheo de la capa de rodadura de hormigón asfáltico como paso previo a	Calle Calle , Ezequiel	04/10/2013 - 08:57 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>la solicitud de recepción definitiva de la obra; trabajos que se han visto retrasados debido a las lluvias presentes en el sector; a demás es de señalar que debido al intenso tráfico pesado que soporta la vía por el transporte de materiales hacia los proyectos sevilla de oro - San Pablo, Proyecto hidroeléctrico Sopladora y el transporte de calizas desde la ciudad de Mendez hacia Azogues para la empresa de cementos Guapán, el desgaste de la capa de rodadura y su deterioro es continuo y prematuro.</p>		
<p>AGOSTO 2013: El Contratista continúa con trabajos de mantenimiento rutinario, limpieza de derrumbes, y reparaciones de la calzada, trabajos previos a la recepción definitiva que debía cumplirse el 31 de marzo del 2013; sin embargo debido al invierno que se presenta en la zona y especialmente al intenso tráfico que soporta la vía por la circulación de las volquetas que transportan los materiales para la reconstrucción del tramo Sevilla de Oro- San Pablo a cargo de CELEC con la empresa HIDALGO e HIDALGO, lo que esta causando un desgaste prematuro de la capa de rodadura en los 25 Km. desde Chicti - sevilla de Oro, razón por la cual el contratista se ve en la necesidad de realizar continuas reparaciones a la calzada especialmente con el sello de fisuras y bacheos, trabajos necesarias para que la vía se encuentre en condiciones ha ser recibida de manera definitiva; el contratista está proxima a cumplir estas labores y procederá a solicitar la recepción definitiva.</p>	Calle Calle , Ezequiel	05/09/2013 - 09:15 AM
<p>JULIO 2013: Se han concluido los trabajos de señalización y reparaciones de la mesa de la vía considerados en la orden de trabajo y los correspondientes al mantenimiento rutinario de conformidad al contrato; se continua con la limpieza de pequeños derrumbos producido por el invierno presente en la zona, el tráfico se mantiene normal. La solicitud para recepción definitiva aún no procede en vista de encontrarse inconvenientes en la calzada ocasionadas por el invierno.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/08/2013 - 02:59 PM
<p>JUNIO 2013: Se han concluido los trabajos de señalización y reparaciones de la mesa de la vía considerados en la orden de trabajo y los correspondientes al mantenimiento rutinario de conformidad al contrato; se continua con la limpieza de pequeños derrumbos producido por el invierno presente en la zona, el tráfico se mantiene normal. Concluidos estos trabajos el contratista deberá presentar la solicitud para recepción definitiva.</p>	Calle Calle , Ezequiel	04/07/2013 - 04:12 PM
<p>MAYO 2013: Se realiza el bacheo con mezcla asfáltica y sello asfáltico en varios sectores de la vía, a más del mantenimiento rutinario; luego de terminados los trabajos correspondientes a la Orden de trabajo, se completará los trabajos de señalización vertical y horizontal. ABRIL 2013: Se realiza el bacheo con mezcla asfáltica y sello asfáltico en varios sectores de la vía, a más del mantenimiento rutinario; luego de terminados los trabajos correspondientes a la Orden de trabajo, se completará los trabajos de señalización vertical y horizontal. MARZO 2013: Se continúa con el mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y encauzamientos, desbroce) además con la Orden de Trabajo para las reparaciones de la mesa de la vía (hundimientos, fallas, reparación de cunetas, limpieza de derrumbes etc.) FEBRERO 2013: Actualmente se ejecuta la Orden de Trabajo para reparaciones de la mesa de la vía, limpieza y desalojo de derrumbes, reparación de cunetas revestidas. El transporte de materiales desde Paute a través de esta tramo de vía la para la reconstrucción del tramo Sevilla de Oro - San Pablo a cargo de CELEC EP con la Cía HIDALGO - HIDALGO como también el transporte de materiales para la Empresa de Cementos Guapán, está causando problemas a la estructurales a la vía y la señalización horizontal; el invierno presentado en la zona afecta los trabajos, tráfico normal. ENERO 2013: Los trabajo de mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y encauzamientos, desbroce) se ejecutan normalmente, el invierno se hace presente en la zona. Calle Calle , Ezequiel 19/02/2013 - 10:00 AM DICIEMBRE 2012: Se continua de manera normal con el mantenimiento de la vía, el invierno presentado en la zona afecta los trabajos, tráfico normal.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	03/06/2013 - 11:02 AM
<p>ENERO 2013: Los trabajo de mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y encauzamientos, desbroce) se ejecutan normalmente, el invierno se hace presente en la zona.</p>	Calle Calle , Ezequiel	19/02/2013 - 10:00 AM
<p>DICIEMBRE 2012: Se continua de manera normal con el mantenimiento de la vía, el invierno presentado en la zona afecta los trabajos, tráfico normal.</p>	Calle Calle , Ezequiel	19/02/2013 - 09:58 AM
<p>NOVIEMBRE 2012: Se continua con el mantenimiento de la vía por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, limpieza de cunetas, retiro de escombros, roza a mano.</p>	Soria Novoa, César	20/12/2012 - 10:00 AM
<p>OCTUBRE 2012: Proyecto en fase de mantenimiento, limpieza de derrumbes, cunetas, alcantarillas , etc. Se trabaja en la orden de trabajo # 2 para las reparaciones en la mesa de la vía afectadas por el invierno. SEPTIEMBRE 2012: Proyecto en fase de mantenimiento: limpieza de derrumbes, de cunetas, alcantarillas, retiro de piedras que caen de los taludes. AGOSTO 2012: Proyecto en fase de mantenimiento: limpieza de derrumbes, de cunetas, alcantarillas JULIO: Proyecto en fase de mantenimiento, limpieza de derrumbes, de cunetas, alcantarillas.</p>	Calle Calle , Ezequiel	08/11/2012 - 03:54 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JUNIO 2012: Continúa el proyecto en la etapa de mantenimiento, con servicio normal</p> <p>MAYO 2012: El proyecto esta en fase de mantenimiento (Limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, desbroce)</p> <p>ABRIL 2012: El proyecto continúa en la etapa de mantenimiento (Limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, desbroce)</p> <p>MARZO 2012: El proyecto esta en fase de mantenimiento (Limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, desbroce)</p> <p>FEBRERO 2012: El proyecto continúa en fase de mantenimiento (Limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, desbroce)</p> <p>ENERO 2012: El proyecto se encuentra en la fase de mantenimiento.</p> <p>AGOSTO 2011: el proyecto se encuentra en la fase de mantenimiento.</p> <p>JULIO 2011: el proyecto se encuentra en la fase de mantenimiento.</p> <p>JUNIO 2011: el proyecto se encuentra en la fase de mantenimiento. ENERO 2011: El proyecto se halla en trámite de Recepción Provisional</p> <p>MAYO 2011: el proyecto se encuentra en la fase de mantenimiento.</p> <p>ABRIL 2011: el proyecto se encuentra en la fase de mantenimiento.</p> <p>MARZO 2011: El proyecto se halla en trámite de Recepción Provisional; El Acta de recepción provisional se legaliza el 26 de marzo del 2011</p> <p>FEBRERO 2011: El proyecto se halla en trámite de Recepción Provisional</p> <p>En los rubros de mantenimiento, no consta el rubro limpieza y desalojo de derrumbes, los que se han producido de manera continua por causa del invierno presente en la zona; por esta causa el contratista ha solicitado que su pago se lo realice mediante Ordenes de Trabajo, la Fiscalización ha solicitado al Director del MTOP - Azuay la respectiva autorización para la cancelación de estos trabajos (el contratista de manera permanente realiza la limpieza de derrumbes para mantener un buen nivel de servicio)</p>		

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>5- PROYECTO. * General.</p> <p>El Invierno causaría derrumbes que afectarían los trabajos para el mantenimiento</p>	02/08/2018	Olmedo Justiniano Tintin Ordoñez	60 %	70	42	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Azuay > Paute

HITOS

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Anteproyecto- Definición	1-Solicitud de Información	01/04/2006		01/04/2006	●	3.0
2	Presupuesto	2-Publicación de Pliegos	15/09/2006		15/09/2006	●	2.0
3	Convocatoria	2-Publicación de Pliegos	30/03/2007		30/03/2007	●	3.0
4	Fecha Contrato	3-Adjudicación	21/06/2007		21/06/2007	●	5.0


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
5	Anticipo	4-Inicio de Trabajo	04/07/2007		04/07/2007		Sí	5.0
6	Dre Menor 0+000 - 18+000	5-Entregables Intermedios	15/03/2008		15/03/2008		Sí	6.0
7	Dre Menor 18+000 - 25+720	5-Entregables Intermedios	30/08/2008		15/04/2008		Sí	5.0
8	Estab Talud 0+000 - 18+000	5-Entregables Intermedios	30/10/2008		30/10/2008		Sí	4.0
9	Calzada 0+000 - 18+000	5-Entregables Intermedios	30/11/2008		30/11/2008		Sí	8.0
10	M. Tierras 18+000- 25+720	5-Entregables Intermedios	20/12/2008		20/12/2008		Sí	6.0
11	M. Tierras 0+000- 18+000	5-Entregables Intermedios	30/12/2008		30/12/2008		Sí	7.0
12	Estab Talud 18+000 - 25+720	5-Entregables Intermedios	10/05/2009		10/05/2009		Sí	4.0
13	Impacto Ambiental	5-Entregables Intermedios	20/05/2009		20/05/2009		Sí	2.0
14	Muros Cont y borde	5-Entregables Intermedios	15/08/2009		15/08/2009		Sí	5.0
15	Mantto Puentes	5-Entregables Intermedios	20/09/2009		20/09/2009		Sí	5.0
16	Señalización	5-Entregables Intermedios	25/05/2010		25/05/2010		Sí	2.0
17	Calzada 18+000 - 25+720	5-Entregables Intermedios	30/05/2010		30/05/2010		Sí	4.0
18	Recepción Provisional	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	26/03/2011		26/03/2011		Sí	2.0
19	Mantenimiento año 1 (terminado)	5-Entregables Intermedios	31/12/2011		31/12/2011		Sí	1.5
20	Mantenimiento año 2 (terminado)	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	1.5
21	Mantenimiento año 3 (terminado)	5-Entregables Intermedios	31/03/2013		15/05/2013		Sí	10.0
22	CIERRE: Acta de entrega - recepción definitiva.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/04/2013		28/12/2015		Sí	2.0
23	CIERRE: Liquidación de contrato	9-Entregables Formales	30/04/2013	31/08/2018			No	2.0
24	CIERRE: Recepción definitiva (terminado)	9-Entregables Formales	30/04/2013	31/08/2018			No	5.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Ing. Xavier M. Enderica Salgado	Enderica Salgado, Xavier Mauricio	{PR} - Provincia - AZUAY	29/12/2017
2	Supervisión por cierre de la entrega de la Obra.	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	25/10/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Numero de informes técnicos de control de obra.		100.00 %	1	1	01/01/2017	Ene-Jun

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	3,913,872.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	9,835,924.22 **
Costo Total:	9,600,527.19
Total Devengado:	10,110,867.83
% Costo Total Devengado:	105.32 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 105.32 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	10,928,818.31	0.00	0.00	10,928,818.31
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	9,843,311.92	437,124.86	0.00	10,280,436.78
Ppto. Codificado	9,814,094.11	274,943.61	0.00	10,089,037.72
Ppto. Comprometido	162,181.25	274,943.61	0.00	437,124.86
Planeado - Codificado (2018)		-274,943.61		
Programado a Devengar	10,984,056.52	0.00	0.00	10,984,056.52
Ppto. Devengado	9,835,924.22	274,943.61	0.00	10,110,867.83
Pagado Real	17,376.56	29,458.24	0.00	46,834.80
Estimado a fin de año	* 9,835,924.22	0.00	0.00	9,835,924.22
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,148,132.30	0.00	0.00	1,148,132.30
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 89.55 %	-	0.00 %	92.05 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

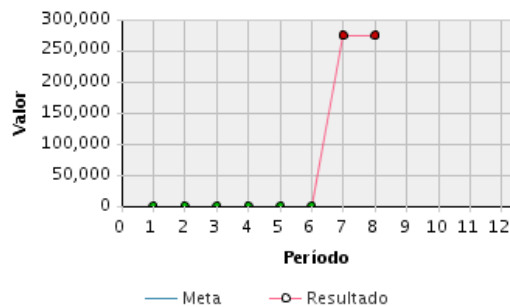

Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	100.00 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jul	0.00	274,943.61	0.00	274,943.61	115.00 %		115.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	274,943.61	115.00 %		115.00 %
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00	274,943.61					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
13	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
14	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
16	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta de Entrega-Recepción Definitiva Puente Chicti-Sevilla de Oro	Acta_de_Entrega-Recepción_Definitiva_Puente_Chicti-Sevilla_de_Oro.pdf	05/03/2017
2	Ayuda Memoria Chicty Sevilla Noviembre 2017	AYUDA_MEMORIA_CHICTI-SEVILLA_Noviembre_2017.pdf	05/12/2017
3	CONVENIO DE PAGO	CONVENIO_DE_PAGO_CHICTI-SEVILLA_8-06-2018.pdf	05/07/2018
4	Fotos	11+250.JPG	21/06/2012
5	Fotos	14+700.JPG	21/06/2012
6	Fotos	19+400.JPG	21/06/2012
7	IE Chicti - Sevilla de Oro Julio 2017	IE_Chicti_-_Sevilla_de_Oro_Julio_2017.pdf	04/08/2017
8	Inf. Ejecutivo SITOP enero 2012	Reporte__SITOP_enero_2012.pdf	08/08/2012
9	Inf. Ejecutivo SITOP febrero 2012	Reporte_SITOP_febrero_2012.pdf	08/08/2012
10	Inf. ejecutivo SITOP julio 2012	Reporte_SITOO_julio_2012.pdf	08/08/2012
11	Inf. ejecutivo SITOP junio 2012	Reporte__SITOP_junio_2012.pdf	08/08/2012
12	Inf. Ejecutivo SITOP marzo 2012	Reporte_SITOP_marzo_2012.pdf	08/08/2012
13	INFORMACIÓN EJECUTIVP - CHICTI - SEVILLA DE ORO - ABRIL	INFORME_EJECUTIVO_-_CHITI-SEVILLA_DE_ORO_ABRIL_2017.pdf	05/05/2017
14	Informe Ejecutivo - Junio 2017	INFORME_EJECUTIVO_-_CHITI-SEVILLA_DE_ORO_JUNIO_2017.pdf	05/07/2017
15	Informe Ejecutivo abril 2018	Informe_Ejecutivo_Chicti_Sevilla_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
16	INFORME EJECUTIVO CHICTI SEVILLA MAYO 2018	INFORME_EJECUTIVO_CHICTI_SEVILLA_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
17	INFORME EJECUTIVO CHICTI_SEP-2017	INFORME_EJECUTIVO_CHICTI_SEP-2017.pdf	05/10/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
18	Informe Ejecutivo correspondiente al mes de Julio SITOP	Informe_ejecutivo_Chicti_-_Sevilla_de_Oro_julio_2012_SITOP.pdf	21/08/2012
19	Informe Ejecutivo Diciembre 2017	INFORME_EJECUTIVO_Chicti_-_Sevilla_de_Oro..pdf	19/01/2018
20	Informe Ejecutivo julio 2018	Informe_Ejecutivo_Chicti_Sevilla_JULIO_2018.pdf	02/08/2018
21	Informe Ejecutivo junio 2018	Informe_Ejecutivo_Chicti_Sevilla_JUNIO_2018.pdf	03/07/2018
22	Informe Ejecutivo Mayo 2017	INFORME_EJECUTIVO_-_CHITI-SEVILLA_DE_ORO_MAYO_2017.pdf	05/06/2017
23	Informe Ejecutivo mayo 2018	Informe_Ejecutivo_Chicti_Sevilla_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
24	Informe ejecutivo Octubre 2012	Informe_ejecutivo_octubre_Puente_Chicti.pdf	08/11/2012
25	Informe ejecutivo SITOP	Informe_ejecutivo_Abril-2012.pdf	28/05/2012
26	Informe Ejecutivo SITOP Agosto 2013	resumen_ejecutivo_Chicti_-_Sevilla_de_Oro_Agosto_2013.pdf	05/09/2013
27	Informe Ejecutivo SITOP Enero 2013	Informe_ejecutivo_Puente_Chiti-Sevilla_de_Oro_Enero_2013.pdf	19/02/2013
28	Informe Ejecutivo SITOP junio 2013	resumen_ejecutivo_Chicti_-_Sevilla_de_Oro_Junio_2013.pdf	04/07/2013
29	Informe Ejecutivo SITOP septiembre 2013	Informe_ejecutivo_Puente_Chiti-Sevilla_de_Oro_Sept._2013.pdf	04/10/2013
30	informe ejecutivo SITOP, agosto 2012	Informe_ejecutivo_SITOP__Agosto_2012.pdf	14/09/2012
31	Informe ejecutivo SITOP, julio 2013	Informe_ejecutivo_SITOP__julio_2013.pdf	05/08/2013
32	Informe ejecutivo SITOP, mayo 2013	Informe_ejecutivo_SITOP__mayo_2013.pdf	03/06/2013
33	Informe ejecutivo SITOP, noviembre 2012	Informe_ejecutivo_SITOP__Noviembre_2012.pdf	20/12/2012
34	Informe ejecutivo SITOP, noviembre 2013	Informe_ejecutivo_SITOP__Noviembre_2013.pdf	05/12/2013
35	Informe ejecutivo SITOP, octubre 2013	Informe_ejecutivo_SITOP__Octubre_2013.pdf	06/11/2013
36	RESUMEN EJECUTIVO MARZO SITOP	EJECUTIVO_SITOP_MARZO.pdf	30/04/2013
37	SITOP - Mayo	REPORTE_SITOP_CHICTI_-_SEVILLA_DE_ORO.pdf	21/06/2012

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	Administrador	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Azuay	lalban@mtop.gob.ec	
Quezada Jara, Mónica Fabiola	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretaria Zonal 6	mquezada@mtop.gob.ec	023974600
Tintin Ordoñez, Olmedo Justiniano	Lider del proyecto	Miembro de Equipo del Azuay	otintin@mtop.gob.ec	023974600
