

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 3
Dirección Provincial Cotopaxi

PROYECTO: K025 MTOP - Construcción de la vía Sigchos - Chugchilan

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Líder del Proyecto: | Espín Iñiguez, Patricio Israel (pespin@mtop.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Gamboa López, Enma Katherine | Programas Relacionados: | CONSTRUCCION DE LA VIA SIGCHOS CHUGCHILAN, Provincia - Cotopaxi |
| Titular: | Espín Iñiguez, Patricio Israel | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 175200000.0000.374473 | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 1 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Media | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 19,335,228.77 |
| Localidad de Gestión: | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2014 - 30/12/2018 |
| Fecha de última actualización: | 06/08/2018 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2015 |
| Modificado por: | Espín Iñiguez, Patricio Israel | Fecha del siguiente Hito: | 31/08/2018 |

DATOS GENERALES

Descripción

OBJETIVO: Rehabilitación del a vía Sigchos Chugchilan, de 24 Km de longitud, ubicada en el cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi con la finalidad de impulsar el desarrollo económico, comercial y turístico de la zona. Además de mejorar los tiempos de traslado y brindar seguridad a los usuarios, siguiendo los lineamientos del Plan Estratégico de Movilidad (PEM).
 CONTRATISTA: CONSORCIO CCECC
 MONTO: 19737277.58

Beneficios Cualitativos

Mejorar la calidad de los servicios del usuario

Tipo de Beneficiario

La comunicación entre los diferentes sectores y la capital provincial se lo hace de mejor manera
 Facilita el traslado entre os diferentes sectores aledaños


Restricciones

Falta de recursos asignados por su demora
 Calidad del tiempo para el desarrollo de las obras de construcción que pueden retrasar los trabajos

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO



% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 93.48 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2014 Fecha de Fin: 30/12/2018

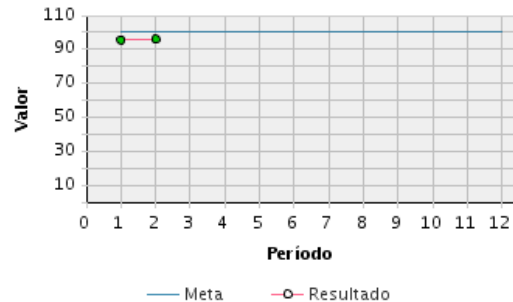AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2018 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 96 % | 96 % | | | | | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <p>JULIO 2018 (Hito 38)</p> <p>Se trabaja en las observaciones previas a la recepción provisional del proyecto.</p> | Espín Iñiguez, Patricio Israel | 06/08/2018 - 12:24 PM |
| <p>JUNIO 2018 (Hito 38)</p> <p>Se trabaja en las observaciones previas a la recepción provisional del proyecto.</p> | Espín Iñiguez, Patricio Israel | 06/08/2018 - 12:24 PM |
| <p>MAYO 2018 (Hito 38)</p> <p>Se trabaja en las observaciones previas a la recepción provisional del proyecto.</p> | Espín Iñiguez, Patricio Israel | 05/06/2018 - 08:05 PM |
| <p>ABRIL 2018 (Hito 38)</p> <p>Se trabaja en los informes previos a la recepción provisional del proyecto.</p> | Espín Iñiguez, Patricio Israel | 05/05/2018 - 09:26 PM |
| <p>MARZO 2018 (Hito 38)</p> <p>Se ha realizado remediación de algunas observaciones en el proyecto previas a la recepción provisional del proyecto.</p> | Espín Iñiguez, Patricio Israel | 05/04/2018 - 04:44 PM |
| <p>FEBRERO 2018 (Hito 36)</p> <p>La contratista realiza trabajos de acuerdo al siguiente detalle:</p> <p>Terminación de la colocación de señalización vertical.</p> | Espín Iñiguez, Patricio Israel | 05/04/2018 - 04:40 PM |
| <p>ENERO 2018 (Hito 36)</p> <p>La contratista realiza trabajos de acuerdo al siguiente detalle:</p> <p>Colocación de señalización vertical en el proyecto.</p> | Espín Iñiguez, Patricio Israel | 05/04/2018 - 04:38 PM |
| <p>DICIEMBRE 2017 (Hito 17 y 36)</p> <p>La contratista realiza trabajos de acuerdo al siguiente detalle:</p> <p>Abscisa 15+598,50 - 15+574,25, 15+603 - 15+782,10, y 17+842 - 17+857,30, Construcción de cunetas revestidas. Abscisa 8+000 - 22+000, 7+279 - 22+400, 8+408 - 21+284, 0+253 - 22+059,50 Señalización horizontal y vertical.</p> | Espín Iñiguez, Patricio Israel | 05/04/2018 - 04:33 PM |
| <p>OCTUBRE 2017 (Hito 32)</p> <p>Se estan concluyendo los trabajos de colocación de carpeta asfáltica</p> <p>La contratista realiza trabajos de acuerdo al siguiente detalle:</p> <p>Abscisa 10+900, Colocación de carpeta asfáltica. Abscisa 15+780, Construcción de cunetas. Abscisa 15+500 Construcción de bajantes de cunetas de coronación.</p> <p>Se debe culminar de colocar carpeta asfáltica entre las abscisas 5+600 - 5+850 (Puente Gualligua), y la 13+500 a la 13+750.</p> | Espín Iñiguez, Patricio Israel | 01/11/2017 - 11:42 AM |
| <p>SEPTIEMBRE</p> <p>Se ha concluido el movimiento de tierras en todo el proyecto, la vía se encuentra a nivel de mejoramiento y se esta colocando base estabilizada en los pocos tramos que faltan, en el puente</p> | Espín Iñiguez, Patricio Israel | 05/10/2017 - 06:02 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <p>Galligua abscisa 5+700 la contratista se encuentra realizando muros de gaviones para luego colocar base y carpeta asfáltica.</p> <p>En la abscisa 16+848 se construye cunetas revestidas.</p> | | |
| <p>AGOSTO 2017</p> <p>La contratista realiza trabajos de acuerdo al siguiente detalle:</p> <p>Abscisa 8+000, Colocación de carpeta asfáltica. Abscisa 9+400, Excavación para construcción de cunetas. Abscisa 17+230-17+470,11+806-12+108 Construcción de cunetas lado derecho. Abscisa 13+400, Movimiento de tierras de transporte. Abscisa 16+720, Movimiento de tierras con transporte. Abscisa 16+930, Tendido, compactación e hidratación de mejoramiento. Abscisa 21+800, Colocación de alcantarilla. Abscisas 13+230-13+700,14+180-14+460, 16+519-16+950 colocación de base</p> | Espín Iñiguez, Patricio Israel | 05/09/2017 - 10:00 PM |
| <p>JULIO 2017</p> <p>La contratista realiza trabajos de acuerdo al siguiente detalle:</p> <p>Abscisa 5+700 el puente sobre el río Galligua se encuentra habilitado al tráfico Vehicular, se le ha indicado al superintendente que debe iniciar la construcción de muros de gaviones (como muro de ala) de acuerdo a los estudios. Abscisa 8+330 Construcción de cabezal de entrada y salida de alcantarilla de 1500 mm Abscisa 8+450 lado izquierdo construcción de cunetas revestidas de hormigón simple verificación espesor (15 cm por ser relleno). Abscisa 8+710 excavación para cunetas. Abscisa 10+650 escombrera que está siendo utilizada al momento. Abscisa 13+400 movimiento de tierras. Abscisa 14+190 colocación de mejoramiento. Abscisa 21+800 construcción de muro de hormigón armado para completar la sección típica de la vía. Abscisa 22+600 colocación de mejoramiento.</p> | Espín Iñiguez, Patricio Israel | 02/08/2017 - 12:11 PM |
| <p>JUNIO 2017</p> <p>La contratista realiza trabajos de acuerdo al siguiente detalle:</p> <p>Acceso al puente Construcción de entradas a predios Colocación de alcantarilla Excavación y colocación de subdrenes Excavación a nivel de subrasante Colocación de base estabilizada con cemento Colocación de material de mejoramiento para construcción de muro y completar la sección típica. Movimiento de tierras con transporte a escombrera.</p> | Espín Iñiguez, Patricio Israel | 05/07/2017 - 04:27 PM |
| <p>MAYO 2017</p> <p>La contratista realiza trabajos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Limpieza de cunetas -Limpieza de derrumbes (se ha producido destrucción de parte de las cunetas de coronación). -Excavación para cajeras. -Colocación de mejoramiento. -Excavación para cunetas de coronación -Fundición de cunetas de coronación. -Movimiento de tierras. <p>Entre las abscisas 3+150 a la 16+700.</p> | Espín Iñiguez, Patricio Israel | 05/06/2017 - 09:42 PM |
| <p>ABRIL 2017</p> <p>En el proyecto se ejecuta al 25 de abril 2017 los siguientes trabajos:</p> <p>Abscisa 5+700 desencofrado de puente, retiro de material y limpieza para construcción de muro de ala. Fundición de cunetas de coronación abscisa 9+800 Abscisa 9+320 transporte de base. Según lo reportado por la fiscalización en memorando No. MTOP-CONS_COT-2017-117-ME de fecha 28 de abril 2017.</p> | Espín Iñiguez, Patricio Israel | 05/05/2017 - 10:29 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <p>MARZO 2017 Abscisas 4+050, 4+900, 6+900 y 16+450 se está construyendo cunetas de coronación revestidas de hormigón simple, Abscisa 5+700 , luego de que la semana pasada se fundió las 2 últimas vigas del puente misma que fue supervisada por el Laboratorista de planta central, e día 29 de marzo se verifico que el contratista se encuentra armando el tablero y se pudo revisar el armado del hierro y está de acuerdo a los estudios y se nos ha indicado que la próxima semana se fundirá la superestructura, abscisa 9+450 continúa con la construcción del alcantarillado en el sector de Canjalo, movimiento de tierras en las abscisas 13+350 y 17+035, por el crudo invierno en el sector hay derrumbes que la contratista se encuentra limpiando abscisas 5+950, 7+785,8+924, 11+700 y 14+250.</p> | Espín Iñiguez, Patricio Israel | 05/04/2017 - 11:58 AM |
| <p>FEBRERO 2017.- Actualmente se está realizando la construcción de los estribos del puente en la abscisa 5+700, se trabaja en movimiento de tierras entre las abscisas 8+300 y 8+900 y se coloca guardavías entre las abscisa 2+000 a la 10+000</p> | Espín Iñiguez, Patricio Israel | 03/03/2017 - 04:38 PM |
| <p>ENERO 2017 Proyecto en ejecución, se encuentran trabajando en diferentes frentes en movimiento de tierra y transporte de material a escombreras, mejoramiento de sub rasante, colocación de base estabilizada con cemento, colocación de alcantarillas.</p> | Espín Iñiguez, Patricio Israel | 05/02/2017 - 03:17 PM |
| <p>Diciembre 2016 Proyecto en ejecución, se encuentran trabajando en diferentes frentes en movimiento de tierra y transporte de material a escombreras, mejoramiento de base estabilizada con cemento, colocación de alcantarillas.</p> | Espín Iñiguez, Patricio Israel | 05/01/2017 - 11:24 AM |
| <p>Noviembre 2016 Proyecto en ejecución, se encuentran trabajando en diferentes frentes en movimiento de tierra y transporte de material a escombreras, tendido de carpeta asfáltica, mejoramiento de base estabilizada con cemento, colocación de alcantarillas.</p> | Espín Iñiguez, Patricio Israel | 05/12/2016 - 02:55 PM |
| <p>Octubre 2016. Proyecto en ejecución, se encuentran trabajando en diferentes frentes en movimiento de tierra, tendido de carpeta asfáltica, mejoramiento de base, colocación de pasos de agua</p> | Espín Iñiguez, Patricio Israel | 07/11/2016 - 01:51 PM |
| <p>Septiembre 2016: La contratista continua con el movimiento de tierras en diferentes abscisas, trasporte a escombreras ,colocación de alcantarillas y construcción de cabezales de entrada y salida en diferentes abscisas, construcción de subdrenes en tramos que indican los estudios, construcción de cunetas revestidas de hormigón simple, construcción de muros de hormigón armado</p> | Espín Iñiguez, Patricio Israel | 07/11/2016 - 01:50 PM |
| <p>Julio 2016. La contratista continua con el movimiento de tierras en diferentes abscisas, trasporte a escombreras ,colocación de alcantarillas y construcción de cabezales de entrada y salida en diferentes abscisas, construcción de subdrenes en tramos que indican los estudios, construcción de cunetas revestidas de hormigón simple, construcción de muros de hormigón armado</p> | Espinoza Vivanco, Darwin Gonzalo | 04/08/2016 - 12:41 PM |
| <p>Junio 2016. La contratista continua con el movimiento de tierras en diferentes abscisas, trasporte a escombreras ,colocación de alcantarillas y construcción de cabezales de entrada y salida en diferentes abscisas, construcción de subdrenes en tramos que indican los estudios, construcción de cunetas revestidas de hormigón simple, construcción de muros de hormigón armado</p> | Espinoza Vivanco, Darwin Gonzalo | 04/08/2016 - 12:39 PM |
| <p>Mayo 2016 Avance físico es del 35,35%,hasta el 31 de mayo de 2016, el cronograma avanza con limitaciones por planillas pendientes de pago. Se firmó contrato complementario por creación de un rubro y ampliación de plazo en 182 días, hasta el 20 de junio de 2017, no modifica el monto original. La reprogramación de obra fue aprobada por el fiscalizador. Rubros representativos: Excavación sin clasificar en un 55,56%, Excavación en roca 54,07%, excavación en marginal en un 52,94., realizados alrededor de 6,5 KM del rubro Base de agregados estabilizado con cemento portland es decir 35,90%, colocación de alcantarillas, construcción de cunetas de hormigón simple.en un 9,34% OBSERVACIONES: La falta de pago de las planillas (11 hasta abril 2016) y la presencia de las lluvias en la zona del proyecto OCASIONARÍA que la obra tenga retrasos en el cronograma de obra. El 21 de marzo de 2016 el Ministerio de Finanzas transfiere a la cuenta de la contratista el valor del segundo anticipo Con fecha 4 de mayo de 2016 se firma el contrato complementario, creación de nuevo rubro, ampliación de plazo por 182 días hasta el 20 de junio de 2017</p> | Vargas Morejon, Luis Ramiro | 07/06/2016 - 08:21 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Se aprueba la segunda reprogramación del cronograma valorado de obra, por falta de pago de las planillas, de acuerdo la cláusula 12.03 del contrato | | |
| <p>Mayo 2016.</p> <p>La contratista continua con el movimiento de tierras, transporte a escombreras, colocación de alcantarillas, construcción de cabezales de entrada y salida, construcción de subdrenes en tramos que indican los estudios y construcción de cunetas revestidas</p> | Vargas Morejon, Luis Ramiro | 03/06/2016 - 08:51 AM |
| <p>Abril 2016.</p> <p>La contratista trabaja en movimiento de tierras en las abscisas:(1+540 -2+060); (3+470-3+560); (5+340-5+660); (10+770-10+820) , dicho material es transportado a las escombreras ubicadas en: las abscisas 2+500; 3+724;11+380).</p> <p>Continúa con la construcción de cabezales de alcantarillas en diferentes abscisas, tendido de base estabilizada con cemento portland en los siguientes tramos: (15+010-15+220); (15+341-15+970);(16+100 -16+519);(17+170-17+316);(17+470-18+415);(18+450-18+590), se coloca RC en varios tramos.</p> <p>La falta de la entrega del segundo anticipo, el no pago de las planillas (nueve hasta febrero 2016) y la presencia de las lluvias en la zona del proyecto ocasionaría que la obra tenga retrasos en el cronograma de obra.</p> <p>Se espera legalización de los actos administrativos por el cambio de la sección típica</p> <p>OBSERVACIONES:</p> <p>La falta de pago de las planillas (10 hasta marzo 2016) y la presencia de las lluvias en la zona del proyecto OCASIONARÍA que la obra tenga retrasos en el cronograma de obra.</p> <p>El 21 de marzo de 2016 el Ministerio de Finanzas transfiere a la cuenta de la contratista el valor del segundo anticipo</p> <p>Se están legalizando los actos administrativos por el cambio de la sección típica</p> <p>Se aprueba la reprogramación del cronograma valorado de obra mediante Memorando Nro. MTOP-DPCO-2016-148-ME de fecha 12 de febrero de 2016, por falta de pago de las planillas, de acuerdo la cláusula 12.03 del contrato</p> | Vargas Morejon, Luis Ramiro | 03/06/2016 - 08:51 AM |
| <p>Diciembre 2015</p> <p>La contratista se encuentra trabajando en movimiento de tierras , colocación de alcantarillas y trabajo hasta el 18 de diciembre del 2015, salen de jornada , se ha tramitado 6 planillas por parte de la fiscalización encargada, esto es de junio- noviembre de 2015 , pero hasta la presente fecha no se ha cancelado .</p> | Vargas Morejon, Luis Ramiro | 05/01/2016 - 09:07 AM |
| <p>Noviembre de 2015</p> <p>Hasta el 31 de octubre de 2015 se han tramitado 5 planillas por un valor de 3'055.202,67 USD, encontrándose en trámite el pago de las mismas.</p> <p>El valor antes indicado es superior al anticipo entregado de 2'960.591,63 USD</p> <p>Avance físico: (14.78%), hasta el 31 de Octubre de 2015</p> <p>La contratista se encuentra trabajando dentro de los rubros más importantes los mismos que son: Excavación en suelo, en diferentes abscisas: 3+560-4+070, 5+740-5+850, 13+240-14+300</p> <p>Mejoramiento de suelo seleccionado, está ejecutado en las siguientes abscisas: 12+040.00 - 12+650.00, 14+420.00 - 16+530, 17+140-17+360, 17+455-18+127</p> <p>Mediante Memorando Nro. MTOP-DPCO-2015-1237-ME de fecha 27 de noviembre de 2015, se insiste para que se realice los trámites administrativos para el cambio de sección típica por la no construcción de la ciclo vía</p> | Vargas Morejon, Luis Ramiro | 05/01/2016 - 09:07 AM |
| <p>Octubre 2015</p> <p>Hasta la fecha presente fecha se han tramitado 4 planillas por un valor de 2'382.958,24 USD, encontrándose en trámite el pago de las mismas.</p> <p>El Consorcio CCECC está trabajando en los siguientes rubros más representativos: Desbroce, desbosque y limpieza abscisas 12+039-12+792, 13+430 hasta 13+510</p> <p>Excavación en suelo, está ejecutado hasta en las abscisas 13+430-13+610, 12+039 -13+240, 14+420.00 hasta la 15+500, 17+110 hasta 17+40014+420</p> <p>Remoción de hormigón en 7 alcantarillas existente (abscisas: 12+220,12+670,12+945,14+987,15+210,15+420,15+570)</p> <p>Colocación de alcantarillas de D= 1200 mm e=2 mm en las abscisas: 17+850,18+260,18+886,19+140,19+390,19+614,19+980,20+745,21+140,21+700</p> <p>Material Filtrante y colocación de Geotextil para sub dren en las siguientes abscisas: 17+200-17+400, 17+460-17+600, 18+247-18+400</p> <p>Mejoramiento de suelo seleccionado, está ejecutado hasta la abscisa 12+040.00 - 12+650.00, 14+420.00 - 16+530, 17+140-17+360, 17+455-18+127</p> <p>La Supervisión con Memrando Nro.MTOP-DPCO-2015-ME de fecha 12 de octubre dirigida al Administrador de la obra solicita realizar el contrato modificatorio para el cambio de la sección típica</p> | Castellano Tovar, Wilmer Javier | 06/11/2015 - 12:09 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <p>Septiembre 2015. La contratista trabaja en movimiento de tierras y trasporte a escombreras, excavación en suelo a nivel de sub rasante en las abscisas 12+040, 13+240, 14+420, 21+700 Mejoramiento de suelos seleccionado se encuentran ejecutando en las abscisas 12+040, 12+650, 14+420, 21+700 Se encuentra colocando alcantarillas en las siguientes abscisas 19+380,19+633,19+712,19+980,20+745,21+140,21+700 Construcción de subdrenos abscisa 18+247- 18+400</p> | Flores Fernández, César Aníbal | 28/10/2015 - 08:37 AM |
| <p>Agosto 2015.- Los trabajos se realizan de acuerdo a cronograma de oferta, obra en proceso constructivo, se realizan trabajos de movimiento de tierra y colocación de alcantarillas</p> | Meza, Orlando | 07/09/2015 - 09:18 AM |
| <p>Julio 2015. Se hizo la entrega del anticipo correspondiente, por lo cual el Consorcio Chino Civil-Cia Verdú SA contratista de la obra, realiza los trabajos de acuerdo al cronograma de oferta, se ejecutan rubros de movimiento de tierra, y se planifica mapa de expropiaciones</p> | Meza, Orlando | 07/09/2015 - 09:18 AM |
| <p>Junio 2015. Hasta la presente fecha no se le acredita el anticipo al Contratista, pero la contratista está trabajando en movimiento de tierras desde Chugchilán</p> | Meza, Orlando | 10/07/2015 - 10:24 AM |

Problemas cerrados: 4, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <p>5- PROYECTO. Recursos. La no cancelación de las planillas de avance de obras CAUSARÍA que se retrase la liquidación económica del proyecto.</p> | 05/07/2018 | Patricio Israel Espín Iñiguez | 70 % | 70 | 49 | 4/5 |
| <p>5- PROYECTO. * General. Presencia de fuertes lluvias en el sector CAUSARÍA retraso en la entrega de la obra</p> | 05/07/2018 | Patricio Israel Espín Iñiguez | 50 % | 40 | 20 | 2/2 |

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 2

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1 | Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Sigchos |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | PLANEACIÓN: Contrato obra firmado | 3-Adjudicación | 09/04/2015 | | 09/04/2015 | | Sí | 1.0 |
| 2 | EJECUCIÓN: Inicio de trabajos , ejecutado | 4-Inicio de Trabajo | 18/06/2015 | | 18/06/2015 | | Sí | 1.0 |
| 3 | EJECUCION: Excavacion en suelo 10Km; realizada. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015 | | 31/12/2015 | | Sí | 2.0 |
| 4 | EJECUCION: Limpieza de derrumbos 10Km; realizada. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015 | | 29/02/2016 | | Sí | 2.0 |
| 5 | EJECUCION: Transporte de material de excavación 10Km; realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015 | | 31/12/2015 | | Sí | 2.0 |
| 6 | EJECUCIÓN: Asfalto RC para imprimacion y Capa de | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015 | | 31/07/2016 | | Sí | 4.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | rodadura de hormigón asfáltico 5Km; realizado. | | | | | | | |
| 7 | EJECUCIÓN: Base de agregados estabilizada con cemento portland 10KM; realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015 | | 30/01/2017 | | Sí | 3.0 |
| 8 | EJECUCIÓN: Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado 10KM; realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015 | | 31/07/2016 | | Sí | 2.0 |
| 9 | EJECUCIÓN: Asfalto RC para imprimacion y Capa de rodadura de hormigón asfáltico 10Km; realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/03/2016 | | 31/01/2017 | | Sí | 4.0 |
| 10 | EJECUCION: Desbroce, desbosque y limpieza 15Km; realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2016 | | 31/07/2016 | | Sí | 2.0 |
| 11 | EJECUCION: Excavacion en roca y marginal 15Km; realizada. | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2016 | | 29/12/2016 | | Sí | 2.0 |
| 12 | EJECUCION: Excavacion en suelo 15Km; realizada. | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2016 | | 30/01/2017 | | Sí | 2.0 |
| 13 | EJECUCION: Limpieza de derrumbos 15Km; realizada. | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2016 | | 31/07/2016 | | Sí | 2.0 |
| 14 | EJECUCION: Transporte de material de excavación 15Km; realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2016 | | 30/01/2017 | | Sí | 2.0 |
| 15 | EJECUCIÓN: Base de agregados estabilizada con cemento portland 15KM; realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2016 | | 31/08/2017 | | Sí | 3.0 |
| 16 | EJECUCIÓN: Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado 15KM; realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2016 | | 01/09/2017 | | Sí | 2.0 |
| 17 | EJECUCIÓN: Sistema de drenaje sanitario y pluvial; realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2016 | | 15/10/2017 | | Sí | 2.0 |
| 18 | EJECUCIÓN: Asfalto RC para imprimacion y Capa de rodadura de hormigón asfáltico 15Km; realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2016 | | 18/03/2017 | | Sí | 4.0 |
| 19 | EJECUCION: Desbroce, desbosque y limpieza 20Km; realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2016 | | 18/07/2017 | | Sí | 2.0 |
| 20 | EJECUCION: Excavacion en roca y marginal 20Km; realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2016 | | 18/07/2017 | | Sí | 2.0 |
| 21 | EJECUCION: Excavacion en suelo 20Km; realizada. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2016 | | 18/07/2017 | | Sí | 2.0 |
| 22 | EJECUCION: Limpieza de derrumbos 20Km; realizada. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2016 | | 30/11/2016 | | Sí | 2.0 |
| 23 | EJECUCION: Transporte de material de excavación 20Km; realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2016 | | 18/07/2017 | | Sí | 2.0 |
| 24 | EJECUCIÓN: Base de agregados estabilizada con cemento portland 20KM; realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2016 | | 25/10/2017 | | Sí | 3.0 |
| 25 | EJECUCIÓN: Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado 20KM; realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2016 | | 18/07/2017 | | Sí | 2.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 26 | EJECUCIÓN: Muro de hormigón armado, construido. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2016 | | 15/09/2017 | | Sí | 2.0 |
| 27 | EJECUCION: Desbroce, desbroce y limpieza 24Km; realizado. | 5-Entregables Intermedios | 19/12/2016 | | 20/09/2017 | | Sí | 2.0 |
| 28 | EJECUCION: Excavacion en roca y marginal 24Km; realizada. | 5-Entregables Intermedios | 19/12/2016 | | 20/09/2017 | | Sí | 2.0 |
| 29 | EJECUCION: Excavacion en suelo 24Km; realizada. | 5-Entregables Intermedios | 19/12/2016 | | 20/09/2017 | | Sí | 2.0 |
| 30 | EJECUCION: Limpieza de derrumbos 24Km; realizada. | 5-Entregables Intermedios | 19/12/2016 | 28/09/2018 | | | No | 2.0 |
| 31 | EJECUCION: Transporte de material de excavación 24Km; realizado. | 5-Entregables Intermedios | 19/12/2016 | | 20/10/2017 | | Sí | 3.0 |
| 32 | EJECUCIÓN: Asfalto RC para imprimacion y Capa de rodadura de hormigón asfáltico 24Km; realizado. | 5-Entregables Intermedios | 19/12/2016 | | 30/10/2017 | | Sí | 2.0 |
| 33 | EJECUCIÓN: Base de agregados estabilizada con cemento portland 24KM; realizado. | 5-Entregables Intermedios | 19/12/2016 | | 20/10/2017 | | Sí | 3.0 |
| 34 | EJECUCIÓN: Ciclovia construida. | 5-Entregables Intermedios | 19/12/2016 | | 30/09/2017 | | Sí | 0.5 |
| 35 | EJECUCIÓN: Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado 24KM; realizado. | 5-Entregables Intermedios | 19/12/2016 | | 20/09/2017 | | Sí | 2.0 |
| 36 | EJECUCIÓN: Señalización, concluida. | 5-Entregables Intermedios | 19/12/2016 | | 28/02/2018 | | Sí | 0.5 |
| 37 | EJECUCIÓN: Trabajo Ambientales, ejecutados. | 5-Entregables Intermedios | 19/12/2016 | 28/09/2018 | | | No | 0.5 |
| 38 | EJECUCIÓN: Recepción Provisional etapa 1 legalizada . | 5-Entregables Intermedios | 15/01/2017 | 31/08/2018 | | | No | 0.5 |
| 39 | EJECUCIÓN: Puente, construido. | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2017 | | 30/10/2017 | | Sí | 2.0 |
| 40 | EJECUCIÓN: Liquidación económica etapa 1 realizada. | 5-Entregables Intermedios | 15/02/2017 | 30/09/2018 | | | No | 0.5 |
| 41 | EJECUCION: Desbroce, desbroce y limpieza 5Km; realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2017 | | 30/08/2015 | | Sí | 1.0 |
| 42 | EJECUCION: Excavacion en roca y marginal 10Km; realizada. | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2017 | | 29/02/2016 | | Sí | 2.0 |
| 43 | EJECUCION: Excavacion en suelo 5Km; realizada. | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2017 | | 30/08/2015 | | Sí | 1.0 |
| 44 | EJECUCION: Limpieza de derrumbos 5Km; realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2017 | | 30/08/2015 | | Sí | 2.0 |
| 45 | EJECUCION: Transporte de material de excavación 5Km; realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2017 | | 30/08/2015 | | Sí | 2.0 |
| 46 | EJECUCIÓN: Asfalto RC para imprimacion y Capa de rodadura de hormigón asfáltico 20Km; realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2017 | | 18/07/2017 | | Sí | 2.0 |
| 47 | EJECUCIÓN: Base de agregados estabilizada con cemento portland 5KM; realizada. | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2017 | | 31/05/2016 | | Sí | 3.0 |


HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 48 | EJECUCIÓN: Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado 5KM; realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2017 | | 30/08/2015 |  | Sí | 2.0 |
| 49 | EJECUCION: Desbroce, desbroce y limpieza 10Km; realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2017 | | 31/12/2015 |  | Sí | 2.0 |
| 50 | EJECUCION: Excavacion en roca y marginal 5Km; realizada. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2017 | | 31/12/2015 |  | Sí | 1.0 |
| 51 | COMPLETADO: Recepción Definitiva, legalizada. | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/07/2017 | 30/09/2018 | |  | No | 0.5 |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | CONSTRUCCION DE LA VIA SIGCHOS CHUCCHILAN | Gonzalez Jara, Hector Guillermo | {PR} - Provincia - COTOPAXI | 27/11/2017 |
| 2 | CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA SIGCHOS - CHUGCHILÁN | Gonzalez Jara, Hector Guillermo | {PR} - Provincia - COTOPAXI | 25/10/2017 |
| 3 | CONSTRUCCION DE LA VIA SIGCHOS CHUCCHILAN | Suarez Granja, Milton Fernando | {PR} - Provincia - COTOPAXI | 30/06/2017 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de obra |  | 100.00 % | 0 | 0 | 01/01/2018 | Jul-Sep |

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 19,335,228.77 ** |
| Costo Total: | 19,737,277.56 |
| Total Devengado: | 20,089,062.35 |
| % Costo Total Devengado: | 101.78 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 101.78 %

Perfil Económico 2018

| | Años Previos | Año Actual (2018) | Años Futuros | Total |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado | 13,850,039.86 | 0.00 | 0.00 | 13,850,039.86 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 27,944,164.44 | 0.00 | 0.00 | 27,944,164.44 |
| Ppto. Codificado | 31,486,994.92 | 4,090,945.96 | 0.00 | 35,577,940.88 |
| Ppto. Comprometido | 23,214,681.46 | 1,156,061.25 | 0.00 | 24,370,742.71 |
| Planeado - Codificado (2018) | | -4,090,945.96 | | |
| Programado a Devengar | 29,902,336.19 | 0.00 | 0.00 | 29,902,336.19 |
| Ppto. Devengado | 19,335,228.77 | 753,833.58 | 0.00 | 20,089,062.35 |
| Pagado Real | 18,501,810.91 | 637,451.39 | 0.00 | 19,139,262.30 |
| Estimado a fin de año | * 19,335,228.77 | 0.00 | 0.00 | 19,335,228.77 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 10,567,107.42 | 0.00 | 0.00 | 10,567,107.42 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 64.66 % | - | 0.00 % | 67.18 % |
| Ppto. Codificado 998 | 5,986,062.91 | 976,165.48 | 0.00 | 6,962,228.39 |
| Ppto. Devengado 998 | 3,477,035.75 | 196,476.50 | 0.00 | 3,673,512.25 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

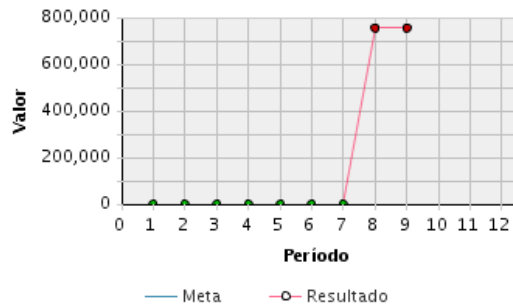

Presupuesto Mensual 2018

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | ● | 100.00 % |

| Presupuesto Mensual 2018 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 100.00 % |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 100.00 % |
| Abr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 100.00 % |
| May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 100.00 % |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 100.00 % |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 100.00 % |
| Ago | 0.00 | 753,833.58 | 0.00 | 753,833.58 | 115.00 % | | 115.00 % |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 753,833.58 | 115.00 % | | 115.00 % |
| Oct | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Nov | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Dic | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Total | 0.00 | 753,833.58 | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1 | | INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2017.pdf | 05/04/2018 |
| 2 | | ejecutivo_septiembre_2015_(2).pdf | 06/10/2015 |
| 3 | | B13_Informe_Ejecutivo_Enero_2016.pdf | 04/02/2016 |
| 4 | A0 Contrato Principal Consorcio C.C.E.C.C. | Contrato_Principal_Consorcio_C.C.E.C.C..pdf | 29/12/2016 |
| 5 | A00 Contrato Modificatorio | Contrato_Modificatorio.pdf | 29/12/2016 |
| 6 | A1 Informe ejecutivo SITOP Julio 2015 | A1_Informe_ejecutivo_SITOP_Julio_2015.pdf | 12/08/2015 |
| 7 | AYUDA MEMORIA SITOP ABRIL 2017 | AYUDA_MEMORI_SITOP_ABRIL_2017.pdf | 05/05/2017 |
| 8 | B 10 Informe Ejecutivo Octubre 2015 | B10_OCTUBRE_2015.pdf | 05/11/2015 |
| 9 | B11 informe Sitop Noviembre 2015 | B11_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_NOVIEMBRE_2015.pdf | 03/12/2015 |
| 10 | B12 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2015 | B12_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2015.pdf | 04/01/2016 |
| 11 | B8 informe ejecutivo agosto 2015 | ejecutivo_agosto_2015.pdf | 28/09/2015 |
| 12 | B9 informe ejecutivo septiembre 2015 | ejecutivo_septiembre_2015_(2).pdf | 06/10/2015 |
| 13 | C1 informe ejecutivo enero 2016 | C1_ejecutivo_de_enero_2016.pdf | 01/02/2016 |
| 14 | C2 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2016 | C2_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2016.pdf | 07/03/2016 |
| 15 | C3 INFORME EJECUTIVO MARZO 2016 | C3_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2016.pdf | 05/04/2016 |
| 16 | C4-INFORME EJECUTIVO ABRIL 2016 | C4_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2016.pdf | 05/05/2016 |
| 17 | C5-INFORME EJECUTIVO MAYO 2016 | C5-INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2016.pdf | 07/06/2016 |
| 18 | C6 Informe SITOP Septiembre 2016 | Informe_SITOP_Septiembre_2016.pdf | 05/10/2016 |
| 19 | C7 Informe SITOP Octubre 2016 | C7_Informe_SITOP_Octubre_2016.pdf | 07/11/2016 |
| 20 | C8 Informe SITOP noviembre 2016 | INFORME_SITOP_NOVIEMBRE_2016.pdf | 05/12/2016 |
| 21 | C9 Informe SITOP diciembre 2016 | C9_Informe_SITOP_diciembre_2016.pdf | 05/01/2017 |
| 22 | D1. INFORME EJECUTIVO SITOP MES DE FEBRERO 2017 | D1._INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MES_DE_FEBRERO_2017.pdf | 04/03/2017 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 23 | Dictamen proyecto: "Construcción de la vía Sigchos Chugchilán" | Dictamen_proyecto.pdf | 11/07/2015 |
| 24 | INFORME EJECUTIVO DE ABRIL 2018 | INFORME_EJECUTIVO_DE_ABRIL_2018.pdf | 05/05/2018 |
| 25 | INFORME EJECUTIVO DE AGOSTO 2017 | INFORME_EJECUTIVO_DE_AGOSTO.pdf | 05/09/2017 |
| 26 | INFORME EJECUTIVO DE MAYO 2018 | INFORME_EJECUTIVO_DE_MAYO_2018.pdf | 05/06/2018 |
| 27 | INFORME EJECUTIVO ENERO 2018 | INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2018.pdf | 05/04/2018 |
| 28 | INFORME EJECUTIVO ENERO2017 | AYUDA_MEMORIA_ENERO_2017.pdf | 05/02/2017 |
| 29 | INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2018 | INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2018.pdf | 05/04/2018 |
| 30 | INFORME EJECUTIVO JULIO 2017 | INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2017.pdf | 02/08/2017 |
| 31 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018 | INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2018.pdf | 05/07/2018 |
| 32 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2018 | INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2018.pdf | 05/04/2018 |
| 33 | INFORME EJECUTIVO MAYO 2017 | INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2017.pdf | 05/06/2017 |
| 34 | INFORME EJECUTIVO MES DE JUNIO 2017 | INFORME_EJECUTIVO_MES_DE_JUNIO..pdf | 05/07/2017 |
| 35 | INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017 | INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2017.pdf | 05/12/2017 |
| 36 | INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017 | INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2017.pdf | 01/11/2017 |
| 37 | INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2017 | INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2017.pdf | 05/10/2017 |
| 38 | Memorando Nro. MTOP-DPCO-2015-1067-ME de fecha 12 de octubre 2015, solicitando reaizar contrato modificadorio por la no construcción de la ciclovía | Memorando_Nro._MTOP-DPCO-2015-1067-ME_de_fecha_12_de_octubre_2015.pdf | 16/11/2015 |
| 39 | Memorando Nro. MTOP-DPCO-2015-1153-ME de fecha 09 de noviembre 2015, insistiendo reaizar contrato modificadorio por la no construcción de la ciclovía | Memomorando_Nro._MTOP-DPCO-2015-1153-ME_de_fecha_9_de_noviembre_de_2015.pdf | 16/11/2015 |
| 40 | Resumen ejecutivo SITOP mayo 2016 | Resumen_Ejecutivo_SITOP_Mayo_2016.pdf | 04/06/2016 |
| 41 | Sigchos Chugchilán - Ficha SENPLADES | Sigchos_-_Chugchilán___Ficha_Senplades.pdf | 09/09/2015 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Espín Iñiguez, Patricio Israel | Administrador | Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Cotopaxi, Encargado | pespin@mtop.gob.ec | 023974600 |
| Gamboa López, Enma Katherine | Adminstrador Regional | Subsecretaria Zonal 3, Encargada | egamboa@mtop.gob.ec | 023974600 |
| Medina Castillo, Pedro Vinicio | Supervisor | Analista de Infraestructura 1 | vmedina@mtop.gob.ec | 0991560304 |

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

| Archivo | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 97565_1.jpg | 05/04/2018 |
