

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 3
Dirección Provincial Cotopaxi

PROYECTO: K016 MTOP-Estudios de factibilidad, impactos ambientales e ingeniería definitivos para la rectificación y mejoramiento del tramo: Sigchos - Las Pampas Alluriquin

Líder del Proyecto:	Meza, Orlando (omeza@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Paula López, Ricardo Octavio	Programas Relacionados:	ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA SIGCHOS ¿ SANTO DOMINGO, TRAMO: SIGCHOS ¿ LAS PAMPAS - ALLURIQUIN, Provincia - Cotopaxi, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Espín Iñiguez, Patricio Israel	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.860.7426	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,430,452.61
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	27/07/2012 - 31/08/2016
Fecha de última actualización:	16/11/2017	Fecha de Fin Base:	31/10/2013
Modificado por:	Gonzalez Jara, Hector Guillermo	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

LINEA BASE: El desarrollo del proyecto esta constituido de una estructura preliminar de material de mejoramiento en malas condiciones, lo que impide una circulación vehicular normal, casi intransitable. OBJETIVO: Los estudios de la via Sigchos-Las Pampas-Alluriquin se contrataron con la finalidad de dar servicio a esta zona que se caracteriza por ser eminentemente agrícola y ganadera
 Contratista: Idrovo Asociado & AD Consultores. MONTO DE LA OBRA: USD 2.364.026,80 DOLARES

Beneficios Cualitativos

Los estudios de la via Sigchos-Las Pampas-Alluriquin se contrataron con la finalidad de dar servicio a esta zona que se caracteriza por ser eminentemente agrícola y ganadera

Tipo de Beneficiario

Agrícola y ganadero

Restricciones

Nubosidad de la zona impide un normal desarrollo de los trabajos

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre **Completado** Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 27/07/2012 Fecha de Fin: 31/08/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

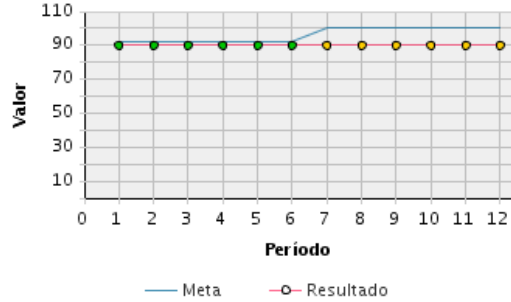

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2014	Avance programado acumulado											
	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Estado												
	●	●	●	●	●	●	▼	▼	▼	▼	▼	▼

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Diciembre 2016.- Los estudios se encuentran terminados en su totalidad con la aprobación respectiva, se hace la entrega a la Dirección Provincial con la finalidad de que se nombre comisión para la recepción del acta definitiva, la misma que está integrada por el Ing Javier Castellano, e Ing Cesar Flores, en vista de nuevo administrador provincial, se esperan nuevas disposiciones para integrar la comisión	Meza, Orlando	02/12/2016 - 01:48 PM
Noviembre 2016.- Los estudios se encuentran terminados en su totalidad con la aprobación respectiva, se hace la entrega a la Dirección Provincial con la finalidad de que se nombre comisión para la recepción del acta definitiva, la misma que está integrada por el Ing Javier Castellano, e Ing Cesar Flores, en vista de nuevo administrador provincial, se esperan nuevas disposiciones para integrar la comisión	Meza, Orlando	02/12/2016 - 01:47 PM
Octubre 2016.- Los estudios se encuentran terminados en su totalidad con la aprobación respectiva, se hace la entrega a la Dirección Provincial con la finalidad de que se nombre comisión para la recepción del acta definitiva, la misma que está integrada por el Ing Javier Castellano, e Ing Cesar Flores, en vista de nuevo administrador provincial, se esperan nuevas disposiciones para integrar la comisión	Meza, Orlando	07/11/2016 - 08:55 AM
Septiembre 2016.- Los estudios se encuentran terminados en su totalidad con la aprobación respectiva, se hace la entrega a la Dirección Provincial con la finalidad de que se nombre comisión para la recepción del acta definitiva, la misma que está integrada por el Ing Javier Castellano, e Ing Cesar Flores, en vista de nuevo administrador provincial, se esperan nuevas disposiciones para integrar la comisión	Meza, Orlando	30/09/2016 - 11:54 AM
Agosto 2016.- Los estudios se encuentran terminados en su totalidad con la aprobación respectiva, se hace la entrega a la Dirección Provincial con la finalidad de que se nombre comisión para la recepción del acta definitiva, la misma que está integrada por el Ing Javier Castellano, e Ing Cesar Flores, en vista de nuevo administrador provincial, se esperan nuevas disposiciones para integrar la comisión	Meza, Orlando	05/09/2016 - 09:48 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Julio 2016.- Los estudios se encuentran terminados en su totalidad con la aprobación respectiva, se hace la entrega a la Dirección Provincial con la finalidad de que se nombre comisión para la recepción del acta definitiva, la misma que está integrada por el Ing Javier Castellano, e Ing Cesar Flores, en vista de nuevo administrador provincial, se esperan nuevas disposiciones para integrar la comisión Meza, Orlando		
Junio 2016.- Los estudios se encuentran terminados en su totalidad con la aprobación respectiva, se hace la entrega a la Dirección Provincial con la finalidad de que se nombre comisión para la recepción del acta definitiva, la misma que está integrada por el Ing Javier Castellano, e Ing Cesar Flores, en vista de nuevo administrador provincial, se esperan nuevas disposiciones para integrar la comisión	Meza, Orlando	05/07/2016 - 03:34 PM
Mayo 2016.- Los estudios se encuentran terminados en su totalidad con la aprobación respectiva, se hace la entrega a la Dirección Provincial con la finalidad de que se nombre comisión para la recepción del acta definitiva, la misma que está integrada por el Ing Javier Castellano, e Ing Cesar Flores, en vista de nuevo administrador provincial, se esperan nuevas disposiciones para integrar la comisión	Meza, Orlando	03/06/2016 - 11:52 AM
Abril 2016.- Los estudios se encuentran terminados en su totalidad con la aprobación respectiva, se hace la entrega a la Dirección Provincial con la finalidad de que se nombre comisión para la recepción del acta definitiva, la misma que está integrada por el Ing Javier Castellano, e Ing Cesar Flores	Meza, Orlando	05/05/2016 - 02:47 PM
Marzo 2016.- Los estudios se encuentran terminados en su totalidad con la aprobación respectiva, se hace la entrega a la Dirección Provincial con la finalidad de que se nombre comisión para la recepción del acta definitiva	Meza, Orlando	05/05/2016 - 02:47 PM
Febrero 2016.- Los estudios se encuentran terminados en su totalidad con la aprobación respectiva, se hace la entrega a la Dirección Provincial con la finalidad de que se nombre comisión para la recepción del acta definitiva	Meza, Orlando	04/03/2016 - 09:58 PM
Enero 2016.- Los estudios se encuentran terminados en su totalidad con la aprobación respectiva, se hace la entrega a la Dirección Provincial con la finalidad de que se nombre comisión para la recepción del acta definitiva	Meza, Orlando	09/02/2016 - 04:41 PM
Diciembre 2015.- Los estudios se encuentran terminados en su totalidad con la aprobación respectiva, se hace la entrega a la Dirección Provincial con la finalidad de que se nombre comisión para la recepción del acta definitiva Meza, Orlando 03/12/2015 - 11:11 AM	Meza, Orlando	05/01/2016 - 03:17 PM
Noviembre 2015.- Los estudios se encuentran terminados en su totalidad con la aprobación respectiva, se hace la entrega a la Dirección Provincial con la finalidad de que se nombre comisión para la recepción del acta definitiva	Meza, Orlando	03/12/2015 - 11:11 AM
Octubre 2015.- Los estudios se encuentran terminados en su totalidad con la aprobación respectiva, se hace la entrega a la Dirección Provincial con la finalidad de que se nombre comisión para la recepción del acta definitiva	Meza, Orlando	06/11/2015 - 11:10 AM
Septiembre 2015.- Los estudios se encuentran terminados y aprobados en su totalidad, con fecha 3 de Septiembre del 2015 se realizará la exposición del proyecto en el Cantón Sigchos, con la finalidad de socializar el proyecto, como requisito para la obtención del respectivo certificado Ambiental, se realiza la firma del acta provisional de los estudios	Meza, Orlando	08/10/2015 - 09:00 AM
Agosto 2015.- Los estudios se encuentran terminados y aprobados en su totalidad, con fecha 3 de Septiembre del 2015 se realizará la exposición del proyecto en el Cantón Sigchos, con la finalidad de socializar el proyecto, como requisito para la obtención del respectivo certificado Ambiental	Meza, Orlando	07/09/2015 - 09:00 AM
Julio 2015.- Los estudios se encuentran totalmente terminados y revisados por la Supervisión de los mismos, se tiene previsto hasta fines de Julio remitir los documentos a la Subsecretaría Regional	Castellano Tovar, Wilmer Javier	07/08/2015 - 04:09 PM
Junio 2015.- Con oficio N° 2015-0605-ME del mes de Abril del 2015, la Subsecretaría Regional hace la devolución de los estudios para que se continúe con la revisión en la Dirección Provincial, la misma que al continuarse se aprueban los siguientes rubros: Ubicación del Proyecto, Selección de Rutas, Normas de diseño, señalización; mediante memorando N° MTOP-CON-COT-2015-019-ME de fecha 24 de Abril del 2015 se remiten los planos aprobados por esta supervisión para que en organo regular se recepcen las firmas respectivas: Diseño geométrico-planta y perfil 79, señalización horizontal y vertical 42, curvas de masas 13, sección transversal de alcantarilla 27	Castellano Tovar, Wilmer Javier	09/07/2015 - 04:35 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Mayo 2015.- Con oficio N° 2015-0605-ME del mes de Abril del 2015, la Subsecretaría Regional hace la devolución del los estudios para que se continúe con la revisión en la Dirección Provincial, la misma que al continuarse se aprueban los siguientes rubros: Ubicación del Proyecto, Selección de Rutas, Normas de diseño, señalización; mediante memorando N° MTOP-CON-COT-2015-019-ME de fecha 24 de Abril del 2015 se remiten los planos aprobados por esta supervisión para que en organo regular se recepen las firmas respectivas:Diseño geométrico-planta y perfil 79, señalización horizontal y vertical 42, curvas de masas 13, sección transversal de alcantarilla 27	Meza, Orlando	09/06/2015 - 02:08 PM
Abril 2015.- Con oficio N° 2015-0605-ME del mes de Abril del 2015, la Subsecretaría Regional hace la devolución del los estudios para que se continúe con la revisión en la Dirección Provincial, la misma que al continuarse se aprueban los siguientes rubros: Ubicación del Proyecto, Selección de Rutas, Normas de diseño, señalización; mediante memorando N° MTOP-CON-COT-2015-019-ME de fecha 24 de Abril del 2015 se remiten los planos aprobados por esta supervisión para que en organo regular se recepen las firmas respectivas:Diseño geométrico-planta y perfil 79, señalización horizontal y vertical 42, curvas de masas 13, sección transversal de alcantarilla 27	Meza, Orlando	12/05/2015 - 03:31 PM
Marzo 2015.- Con oficio N° 2015-0605-ME del mes de Abril del 2015, la Subsecretaría Regional hace la devolución del los estudios para que se continúe con la revisión en la Dirección Provincial	Meza, Orlando	09/04/2015 - 02:36 PM
Febrero 2015: Los estudios fueron remitidos de la Subsecretaria Regional al Supervisor del proyecto para su revisión de las observaciones emitidas	Meza, Orlando	17/03/2015 - 08:56 AM
Enero 2015: Los estudios fueron remitidos de la Subsecretaria Regional al Supervisor del proyecto para su revisión de las observaciones emitidas	Meza, Orlando	10/02/2015 - 08:38 AM
Diciembre 2014: Los estudios fueron remitidos a la Subsecretaria regional en el mes de Mayo del 2014 para la revisión y aprobación definitiva	Meza, Orlando	07/01/2015 - 12:17 PM
Noviembre 2014: Los estudios fueron remitidos a la Subsecretaria regional en el mes de Mayo del 2014 para la revisión y aprobación definitiva	Meza, Orlando	07/01/2015 - 12:16 PM
Septiembre 2014: Los estudio fueron remitidos a la Subsecretaria regional en el mes de Mayo del 2014 para la revisión y aprobación definitiva	Meza, Orlando	08/10/2014 - 02:24 PM
Agosto 2014: Los estudio fueron remitidos a la Subsecretaria regional en el mes de Mayo del 2014 para la revisión y aprobación definitiva	Meza, Orlando	05/09/2014 - 11:46 AM
Julio 2014: Los estudio fueron remitidos a la Subsecretaria regional en el mes de Mayo del 2014 para la revisión y aprobación definitiva	Meza, Orlando	07/08/2014 - 11:20 AM
Junio 2014; Los estudios se encuentran en etapa de revisión por los técnicos de la Subsecretaria Regional para la aprobación definitiva	Meza, Orlando	01/07/2014 - 03:37 PM
Mayo 2014; Los estudios se encuentran en etapa de revisión por los técnicos de la Subsecretaria Regional para la aprobación definitiva	Meza, Orlando	01/07/2014 - 03:36 PM
Abril 2014.-La revisión de los estudios en la etapa concernientes a la Supervisión fueron concluidos, lo que permitió que se los enviara a la Subsecretaria Regional para la revisión y aprobación definitiva....	Meza, Orlando	05/05/2014 - 10:57 AM
Marzo 2014.- Los trabajos de estudios se encuentran concluidos en su totalidad, los mismos que están en etapa de revisión en el área de la supervisión para el consiguiente traslado a la Subsecretaria Regional con la finalidad de la aprobación definitiva.	Meza, Orlando	07/04/2014 - 11:38 AM
Febrero 2014.- Los trabajos de estudios se encuentran concluidos en su totalidad, los mismos que están en etapa de revisión en el área de la supervisión para el consiguiente traslado a la Subsecretaria Regional con la finalidad de la aprobación definitiva.	Meza, Orlando	12/03/2014 - 10:58 AM
Enero 2014.- Los trabajos de estudios se encuentran concluidos en su totalidad, los mismos que están en etapa de revisión en el área de la supervisión para el consiguiente traslado a la Subsecretaria Regional con la finalidad de la aprobación definitiva.	Meza, Orlando	12/03/2014 - 10:58 AM
Diciembre 2013.- Los trabajos de estudios se encuentran concluidos en su totalidad, los mismos que están en etapa de revisión en el área de la supervisión para el consiguiente traslado a la Subsecretaria Regional con la finalidad de la aprobación definitiva.	Meza, Orlando	09/01/2014 - 04:27 PM
Noviembre 2013.- Los trabajos de estudios se encuentran concluidos en su totalidad, los mismos que están en etapa de revisión en el área de la supervisión para el consiguiente traslado a la Subsecretaria Regional con la finalidad de la aprobación definitiva.	Meza, Orlando	09/01/2014 - 09:43 AM
Octubre 2013.- Los trabajos de estudios se encuentran concluidos en su totalidad, los mismos que están en etapa de revisión en el área de la supervisión para el consiguiente traslado a la Subsecretaria Regional con la finalidad de la aprobación definitiva.	Meza, Orlando	21/11/2013 - 08:34 AM
Septiembre 2013.- Los trabajos fueron concluidos en su totalidad y se encuentran en proceso de revision para la aprobación respectiva	Meza, Orlando	04/10/2013 - 12:03 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Agosto 2013.- Los trabajos se encuentran en su etapa definitiva se han receptado el borrador de los estudios en un 90%, hasta el momento se encuentra realizando las observaciones correspondientes.	Meza, Orlando	04/10/2013 - 12:02 PM
Julio 2013.- Los trabajos se encuentran en su etapa definitiva se han receptado el borrador de los estudios en un 90%, en la actualidad se encuentra definiendo el intercambiador que se ha asignado su ubicación en Alluriquin	Meza, Orlando	05/08/2013 - 11:52 AM
Junio 2013.- Se continuan con los trabajos programados y se pone a consideracion de esta supervision el anteproyecto del intercambiador para el analisis respectivo.	Meza, Orlando	09/07/2013 - 09:59 AM
Mayo 2013.- Con fecha 10 de Abril del 2013 se aprueba un contrato complementario por un monto de 729629.80 y un plazo adicional de tres meses, es decir que la nueva fecha de terminacion de estos estudios sera el 27 de Agosto del 2013, considerando los estudios para la ubicacion de un intercambiador en la parroquia Alluriquin.	Meza, Orlando	09/07/2013 - 09:57 AM
ABRIL 2013.- El plazo para la entrega de los estudios definitivos para este proyecto concluyen en el mes de mayo 2013, se ha solicitado la aprobacion para la firma de un contrato complementario considerando que es necesario incluir en estos estudios rubros que no fueron considerados en el contrato original, asi como la ubicacion de un intercambiador en Alluriquin, asi mismo se solicita la ampliacion del plazo en seis meses para la conclusion definitiva de los estudios	Meza, Orlando	07/05/2013 - 09:08 AM
Marzo 2013 Los Estudios definitivos para la rectificaciòn y mejoramiento de la carretera Sigchos-Santo Domingo-Las Pampas Alluriquin se encuentran con un avance fisico del 80.0% en su parte contractual donde practicamente se han concluido con los rubros: Estudios de factibilidad, evaluaciòn y mitigaciòn de impactos ambientales, selecciòn de rutas, estudio preliminar, estudios definitivos de ingenieria. se continua con la selecciòn de rutas alternas o pasos laterales en poblados los mismos que no fueron incluidos en terminos contractuales , asi como tambien la ubicacion del intercambiador en Alluriquin	Meza, Orlando	07/05/2013 - 09:01 AM
Febrero 2013 Estudios en ejecuciòn, trabajos se encuentran con un avance físico del 43%, clausula décima contractual ampara al contratista a presentar producto de consultoría	Meza, Orlando	08/03/2013 - 01:13 PM
Enero 2013 Estudios en ejecuciòn, trabajos se encuentran con un avance físico del 30%, clausula décima contractual ampara al contratista a presentar producto de consultoría	Meza, Orlando	08/03/2013 - 01:12 PM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay informaciòn disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	INICIO: trabajos iniciados	4-Inicio de Trabajo	27/07/2012		27/07/2012		Sí	2.0
2	EJECCION: Selecciòn de rutas realizada	5-Entregables Intermedios	30/08/2012		30/08/2012		Sí	8.0
3	EJECCION: Estudios preliminar realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2012		31/10/2012		Sí	10.0
4	EJECCION: Estudios de evaluaciòn y mitigaciòn de impactos ambientales, realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	8.0
5	EJECCION: Estudios de factibilidad, entregados	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	8.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
6	EJECCION: Estudios definitivos-trabajos de campo, entregados	5-Entregables Intermedios	31/03/2013		31/03/2013		Sí	9.0
7	EJECCION: Estudios estructurales pasos peatonales, realizados	5-Entregables Intermedios	15/04/2013		15/04/2013		Sí	9.0
8	EJECCION: Estudios y diseños estructurales de puentes, realizados	5-Entregables Intermedios	15/04/2013		15/04/2013		Sí	9.0
9	EJECCION: Obras complementarias, realizados	5-Entregables Intermedios	15/04/2013		15/04/2013		Sí	9.0
10	EJECCION: Estudios geotécnicos, entregados	5-Entregables Intermedios	30/04/2013		30/04/2013		Sí	9.0
11	EJECCION: Estudios hidrológicos-hidráulicos, entregados	5-Entregables Intermedios	30/04/2013		30/04/2013		Sí	9.0
12	CIERRE: Informe definitivo entregado	5-Entregables Intermedios	24/08/2013		30/11/2015		Sí	2.0
13	CIERRE: Liquidación económica realizada.	5-Entregables Intermedios	30/07/2014		31/08/2016		Sí	3.0
14	COMPLETADO: Acta entrega única firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/07/2014		31/08/2016		Sí	5.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Sigchos - Las Pampas Alluriquin (Santo Domingo)	Gonzalez Jara, Hector Guillermo	{PR} - Provincia - COTOPAXI	16/11/2017
2	VÍA SIGCHOS - LAS PAMPAS -ALLURIQUIN	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	27/01/2015
3	TRAMO: SIGCHOS - LAS PAMPAS - ALLURIQUIN	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	14/03/2014
4	VISITA AL TRAMO SIGCHOS - LAS PAMPAS Y ALLURIQUIN	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	23/08/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de obra		95.00 %	100	95	27/07/2012	Diciembre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	817,198.50
Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,430,452.61 **
Costo Total:	3,561,546.39
Total Devengado:	2,431,593.99
% Costo Total Devengado:	68.27 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 68.27 %

Perfil Económico 2014

	Años Previos	Año Actual (2014)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1,927,149.39	1,376,592.00	256,221.00	3,559,962.39
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	1,927,149.39	0.00	0.00	1,927,149.39
Ppto. Codificado	1,827,149.39	1,065,421.34	256,221.77	3,148,792.50
Ppto. Comprometido	0.00	1,065,421.33	256,221.77	1,321,643.10
Planeado - Codificado (2014)		311,170.66		
Programado a Devengar	1,109,950.89	1,064,280.72	256,221.00	2,430,452.61
Ppto. Devengado	1,109,950.89	1,065,421.33	256,221.77	2,431,593.99
Pagado Real	0.00	1,065,421.33	115,617.67	1,181,039.00
Estimado a fin de año	* 1,109,950.89	1,376,592.00	256,000.00	2,742,542.89
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	-312,311.28	221.00	-312,090.28
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	100.11 %	100.00 %	100.05 %
Ppto. Codificado 998	0.00	627,037.96	0.00	627,037.96
Ppto. Devengado 998	0.00	627,037.95	0.00	627,037.95

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2014

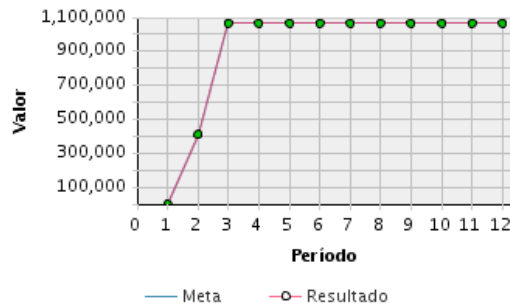

Presupuesto Mensual 2014

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2014							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	410,472.66	411,613.27	410,472.66	411,613.27	100.28 %		38.68 %
Mar	653,808.06	653,808.06	1,064,280.72	1,065,421.33	100.11 %		100.11 %
Abr	0.00	0.00	1,064,280.72	1,065,421.33	100.11 %		100.11 %
May	0.00	0.00	1,064,280.72	1,065,421.33	100.11 %		100.11 %
Jun	0.00	0.00	1,064,280.72	1,065,421.33	100.11 %		100.11 %
Jul	0.00	0.00	1,064,280.72	1,065,421.33	100.11 %		100.11 %
Ago	0.00	0.00	1,064,280.72	1,065,421.33	100.11 %		100.11 %
Sep	0.00	0.00	1,064,280.72	1,065,421.33	100.11 %		100.11 %
Oct	0.00	0.00	1,064,280.72	1,065,421.33	100.11 %		100.11 %
Nov	0.00	0.00	1,064,280.72	1,065,421.33	100.11 %		100.11 %
Dic	0.00	0.00	1,064,280.72	1,065,421.33	100.11 %		100.11 %
Total	1,064,280.72	1,065,421.33					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
8	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
11	Incrementar la eficiencia de control para el cumplimiento de los contratos MEDIANTE un plan de verificación y coordinación de acciones paralelas con la administración la fiscalización y supervisión acorde al cronograma de obra y económico

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.6 Informe Ejecutivo Pampas Alluriquin MARzo 2015	Informe_Ejecutivo_Pampas_Alluriquin.pdf	13/04/2015
2	A07 Informe ejecutivo SITOP Noviembre 2014	A07_Informe_ejecutivo_SITOP_Noviembre_2014.pdf	09/12/2014
3	A08 Reporte Informe Ejecutivo SITOP Febrero 2015	A08_Reporte_Informe_Ejecutivo_SITOP_Febrero_2015.pdf	17/03/2015
4	A2 Informe ejecutivo SITOP Abril 2014	A.2_Informe_Ejecutivo_SITOP_ABRIL_2014.pdf	05/05/2014
5	A3 informe ejecutivo Julio 2014	A3_informe_ejecutivo_SITOP_Julio_2014.pdf	07/08/2014
6	A4 Informe ejecutivo SITOP Septiembre 2014	A4.Informe_Ejecutivo_Sitop_Septiembre_2014.pdf	08/10/2014
7	A5 Informe ejecutivo SITOP Octubre 2014	A5_Informe_ejecutivo_SITOP_Octubre_2014.pdf	17/11/2014
8	A9 Informe ejecutivo SITOP Abril 2015	A9_Informe_ejecutivo_SITOP_Abril_2015.pdf	12/05/2015
9	B1 Informe Ejecutivo SITOP Junio 2015	B1_Informe_Ejecutivo_SITOP_Junio_2015.pdf	10/07/2015
10	B2 Informe ejecutivo SITOP julio 2015	B2_Informe_ejecutivo_SITOP_julio_2015.pdf	12/08/2015
11	B3 Informe ejecutivo SITOP agosto 2015	B3_Informe_ejecutivo_SITOP_agosto_2015.pdf	08/10/2015
12	B4 Informe ejecutivo SITOP septiembre 2015	B4_Informe_ejecutivo_SITOP_septiembre_2015.pdf	08/10/2015
13	E1 Acta de entrega definitiva	Acta_unica.pdf	20/03/2017
14	INFORME EJECUTIVO SITOP NOVIEMBRE 2013	A01_SITOP_SIGCHOS_LAS_PAMPAS_ALLURIQUIN_INFORME EJECUTIVO_NOVIEMB	
15	Informe SITOP julio 2013	alluriquin_julio_2013.pdf	09/08/2013
16	Resumen ejecutivo SITOP mayo 2016	Resumen_Ejecutivo_SITOP_mayo_2016.pdf	04/06/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Abedrabbo García, Jorge Farah	Administrador Regional		salio@mtop.gob.ec	023974600
Espinoza Vivanco, Darwin Gonzalo	Administrador	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Cotopaxi	despinoza@mtop.gob.ec	023974600
Meza, Orlando	Supervisor	Supervisor de Conservación Dirección Distrital de Cotopaxi	omeza@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
65767_1.jpg	31/05/2016
