

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial Loja

PROYECTO: K018 MTOP - Reconstrucción y Mantenimiento (48 meses) carretera Rio Pindo-Amaluza-Jimbura-El Refugio (incluye Fiscalización).

Líder del Proyecto:	Alvarado Espejo, Paola (palvarado@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Calderón Ojeda, Jaime Ramiro	Programas Relacionados:	Provincia - Loja, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO -48 MESES- CARRETERA RIO PINDO - AMALUZA - JIMBURA - EL REFUGIO.- -INCLUYE LA FI, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Rojas Cazar, Walter Emilio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.372275	TIR:	19.25 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	9,784,059.76
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	23,699,529.25
Localidad de Gestión:	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/03/2021
Fecha de última actualización:	03/09/2018	Fecha de Fin Base:	30/09/2018
Modificado por:	Rojas Cazar, Walter Emilio	Fecha del siguiente Hito:	31/03/2018

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN: Este proyecto contempla la reconstrucción y mantenimiento de la Red Vial Provincial tramo Rio Pindo - Amaluza de 24.86 Km., e incluye los accesos a los barrios: Cangochara, Socchibamba, Tiopamba, Faical-El Llano, El Tingo, Jibiruche, El Airo, La Florida y Junta de Regantes con una longitud de accesos de 16.36 Km., dando una longitud total del proyecto 41.22 Km., como apoyo al Gobierno Provincial de Loja.

Coordenadas de inicio: N 9493436 E 674817 Altitud: 1716 msnm
 Coordenadas de fin: N 9512699 E 672417 Altitud: 1116 msnm
 Ancho calzada: 8.00 m
 Cunetas: 0.90 m
 Capa de rodadura: Carpeta Asfáltica de 7.5 cm. y D.T.S.B.
 Tipo de Vía: Tipo IV
 Plazo Total: (construcción 720 días: mantenimiento: 3 años)
 TIR: 19.25%
 VAN: 9'784.059,76

LINEA BASE: El proyecto permite la conexión intercantonal en la provincia de Loja, además este proyecto conectará a las provincia de LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, y en un futuro la República del Ecuador y Perú.

PRODUCTO/SERVICIO: Garantizar una red de Transporte seguro y competitivo.

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al desarrollo del País a través de la formulación de políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos, que garanticen un Sistema Nacional del Transporte Intermodal y Multimodal, sustentado en una red de Transporte con estándares internacionales de calidad, alineados con las directrices económicas, sociales, medioambientales y el plan nacional de desarrollo.

OBJETIVO ESPECIFICOS: Mejorar la calidad en la vialidad, en beneficio de las diferentes comunidades, ofreciendo un mejor servicio en la transportación y movilidad, así como la seguridad en la transportación, beneficios en el desarrollo de las comunidades y por ende del País, permitir la comunicación interprovincial, regional e internacional.

Beneficios Cualitativos

Incremento del turismo, conectividad hacia los cantones de la Provincia de Loja.
 Mejora el comercio y calidad de vida de las poblaciones.

Beneficios Cualitativos

Reduce gastos de operación de los vehículos.

Tipo de Beneficiario

Agricultores, comerciantes, población del sur del país en general y conectividad con el vecino país del Perú.

Restricciones


El proyecto se debe realizar conforme los cronogramas establecidos y presupuesto referencial, cumpliendo las especificaciones técnicas a fin de obtener una obra de calidad.

Para la ejecución de la obra debe contarse con el presupuesto y cronograma bien formulado, a fin de obtener una obra de buena calidad que brinde mejor transitabilidad, disminución en el tiempo de traslado, y que sea entregada en la fecha establecida en el contrato.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 68.76 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/03/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
La vía Rio Pindo - Amaluza - Jimbura - El Refugio, se encuentra en etapa de mantenimiento: Limpieza de alcantarillas en la vía principal desde la abscisa 1+600 hasta 8+000.	Alvarado Espejo, Paola	03/08/2018 - 12:03 PM
Junio 2018.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de: Limpieza de cunetas a mano en las parroquias EL Ingenio y Naranja, limpieza de derrumes en la Parroquia El Ingenio y roza a mano en la parroquia La Naranja, barrio El Faical y Llanos, limpieza de alcantarillas	Bustamante Rivera, Esner Fidel	05/07/2018 - 05:50 PM
Mayo 2018.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de: Limpieza de cunetas a mano en las parroquias EL Ingenio y Naranja, limpieza de derrumes en la Parroquia El Ingenio y roza a mano en la parroquia La Naranja, barrio El Faical y Llanos, limpieza de alcantarillas	Alvarado Espejo, Paola	04/07/2018 - 08:48 PM
Mayo 2018.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de roza a mano en la vía principal y en la parroquia El Ingenio, limpieza de cunetas en la vía principal y en la parroquia El Ingenio	Alvarado Espejo, Paola	04/06/2018 - 11:05 AM
Abril 2018.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de roza a mano en la vía principal, limpieza de cunetas en la vía principal, limpieza de alcantarillas en la vía principal, limpieza de alcantarillas.	Alvarado Espejo, Paola	02/05/2018 - 02:13 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Marzo 2018.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Río Pindo - Amaluz y sus accesos, realiza los trabajos de roza a mano en la vía principal, limpieza de cunetas en la vía principal, limpieza de alcantarillas en la vía principal.	Alvarado Espejo, Paola	03/04/2018 - 11:04 AM
Febrero 2018.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Río Pindo - Amaluz y sus accesos, realiza los trabajos de Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de derrumbes a mano, roza a mano en el Barrio El Tingo.	Alvarado Espejo, Paola	02/03/2018 - 09:00 AM
Enero 2018.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Río Pindo - Amaluz y sus accesos, realiza los trabajos de Limpieza de cunetas en el acceso a la Parroquia El Ingenio, limpieza de alcantarillas en la vía principal y Parroquia El Ingenio, limpieza de derrumbes a mano en el acceso a la Parroquia El Ingenio.	Alvarado Espejo, Paola	01/02/2018 - 12:05 PM
Diciembre 2017.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Río Pindo - Amaluz y sus accesos, realiza los trabajos de Limpieza de cunetas en los accesos, limpieza de alcantarillas en la vía principal, limpieza de derrumbes a mano y sellado de fisuras.	Alvarado Espejo, Paola	02/01/2018 - 09:47 AM
Noviembre 2017.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Río Pindo - Amaluz y sus accesos, realiza los trabajos de Limpieza de cunetas en el Barrio Cangochara, limpieza de alcantarillas en la vía principal.	Alvarado Espejo, Paola	04/12/2017 - 09:53 AM
Octubre 2017.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Río Pindo - Amaluz y sus accesos, realiza trabajos de limpieza de cunetas a mano y roza a mano en accesos.	Alvarado Espejo, Paola	05/11/2017 - 10:05 AM
Septiembre 2017.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Río Pindo - Amaluz y sus accesos, realiza trabajos de limpieza de derrumbes a máquina y limpieza de alcantarillas a mano	Alvarado Espejo, Paola	03/10/2017 - 10:01 AM
Julio 2017.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Río Pindo - Amaluz y sus accesos, realiza trabajos de limpieza de cunetas a mano, limpieza de alcantarillas a mano.	Alvarado Espejo, Paola	04/08/2017 - 08:18 AM
JUNIO 2017.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Río Pindo - Amaluz y sus accesos, realiza trabajos de limpieza de cunetas a mano, limpieza de alcantarillas a mano.	Alvarado Espejo, Paola	03/07/2017 - 08:14 AM
MAYO 2017.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Río Pindo - Amaluz y sus accesos, realiza trabajos de roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de alcantarillas a mano y limpieza de derrumbes a mano.	Alvarado Espejo, Paola	02/06/2017 - 12:22 PM
ABRIL 2017.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Río Pindo - Amaluz y sus accesos, realiza trabajos de roza a mano, bacheo asfáltico menor, limpieza de cuentas a mano, limpieza de alcantarillas a mano y limpieza de derrumbes a mano.	Alvarado Espejo, Paola	04/05/2017 - 05:02 PM
Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Río Pindo - Amaluz y sus accesos, realiza trabajos de roza a mano, bacheo asfáltico menor, limpieza de cuentas a mano, limpieza de alcantarillas a mano y limpieza de derrumbes a mano.	Alvarado Espejo, Paola	04/05/2017 - 05:00 PM
MARZO 2017.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Río Pindo - Amaluz y sus accesos, realiza trabajos de roza a mano, bacheo asfáltico menor, mantenimiento de señalización vertical y reposición de tachas.	Alvarado Espejo, Paola	05/04/2017 - 03:30 PM
Febrero 2017.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Río Pindo Amaluz y sus accesos, realiza trabajos de bacheo asfáltico.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/04/2017 - 03:05 PM
ENERO 2017: Con fecha 04 de enero de 2017 se suscribe el Acta de Recepción Provisional.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/03/2017 - 03:33 PM
DICIEMBRE 2016: Mediante Oficio Nro. MTOP-DDL-16-445-OF, de fecha 22 de septiembre del 2016, la Ing. Natalia Peña, Directora Provincial de Loja, solicita a la Contratista que en un plazo no mayor de 15 días se corrijan las observaciones emitidas por la Comisión, a fin de proceder con la Recepción Provisional de la Obra. Hasta la presente fecha la contratista no ha procedido a realizar las correcciones respectivas a la vía.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	30/12/2016 - 12:06 PM
NOVIEMBRE 2016: Mediante Oficio Nro. MTOP-DDL-16-445-OF, de fecha 22 de septiembre del 2016, la Ing. Natalia Peña, Directora Provincial de Loja, solicita a la Contratista que en un plazo no mayor de 15 días se corrijan las observaciones emitidas por la Comisión, a fin de proceder con la Recepción Provisional de la Obra. Hasta la presente fecha la contratista no ha procedido a realizar las correcciones respectivas a la vía.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	13/12/2016 - 09:28 AM
OCTUBRE 2016: Mediante Oficio Nro. MTOP-DDL-16-445-OF, de fecha 22 de septiembre del 2016, la Ing. Natalia Peña, Directora Provincial de Loja, solicita a la Contratista que en un plazo	CECIBEL DEL CARMEN,	08/11/2016 - 07:46 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
no mayor de 15 días se corrijan las observaciones emitidas por la Comisión, a fin de proceder con la Recepción Provisional de la Obra.	VARGAS PINEDA	
SEPTIEMBRE 2016: Mediante Oficio Nro. MTOP-DDL-16-445-OF, de fecha 22 de septiembre del 2016, la Ing. Natalia Peña, Directora Provincial de Loja, solicita a la Contratista que en un plazo no mayor de 15 días se corrijan las observaciones emitidas por la Comisión, a fin de proceder con la Recepción Provisional de la Obra.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	10/10/2016 - 08:50 AM
AGOSTO 2016: En trámite acta de Recepción Definitiva, mediante memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2016-150-ME, la comisión emite informe sobre las condiciones actuales en que se encuentra la vía, hasta la presente fecha no hay respuesta por parte de la contratista referente a las observaciones realizada por la comisión.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	09/09/2016 - 12:14 PM
JULIO 2016: En trámite acta de Recepción Definitiva, mediante memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2016-150-ME, la comisión emite informe sobre las condiciones actuales en que se encuentra la vía.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	09/08/2016 - 04:57 PM
JUNIO 2016: En trámite acta de Recepción Definitiva, mediante memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2016-150-ME, la comisión emite informe sobre las condiciones actuales en que se encuentra la vía.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	05/07/2016 - 03:07 PM
MAYO 2016: En trámite acta de Recepción Definitiva, mediante memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2016-150-ME, la comisión emite informe sobre las condiciones actuales en que se encuentra la vía.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	02/06/2016 - 04:16 PM
ABRIL 2016: En trámite acta de Recepción Definitiva, mediante memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2016-150-ME, la comisión emite informe sobre las condiciones actuales en que se encuentra la vía.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	04/05/2016 - 02:04 PM
MARZO 2016: Con fecha 07 de marzo del 2016 concluyó la obra conforme plazo contractual, la misma fue inaugurada por el señor Presidente de la República con fecha 04 de marzo del 2016, actualmente la compañía realiza trabajos de limpieza de la vía conforme lo solicitado por autoridad competente.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	05/04/2016 - 12:23 PM
FEBRERO 2016: Obra en ejecución con fecha de termino el 07 de marzo del 2016. Se encuentra realizando trabajos de colocación de señalización tanto horizontal como vertical, colocación de vallas.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	07/03/2016 - 04:11 PM
ENERO 2016: La comisión 451, aprueba la ampliación de plazo por 90 días	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	11/02/2016 - 12:17 PM
DICIEMBRE 2015: El proyecto se encuentra suspendido conforme notificación realizada por el Fiscalizador del proyecto a la Contratista .La constructora solicita una nueva ampliación de plazo lo que motivo la convocatoria para la comisión especial 451, con fecha 28 de agosto del 2015.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	31/12/2015 - 01:03 PM
DICIEMBRE 2015.- La constructora solicitó una nueva ampliación de plazo la misma que motivó la convocatoria para la comisión especial 451, con fecha 28 de agosto del 2015.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	31/12/2015 - 12:40 PM
NOVIEMBRE 2015.- Se continúa ejecutando trabajos en el centro de la ciudad de Amaluza (tendido de material de sub-base, base e imprimación) , trabajos de asfaltado de accesos, construcción de cunetas revestidas.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	31/12/2015 - 12:40 PM
OCTUBRE 2015.- Se continúa ejecutando trabajos en el centro de la ciudad de Amaluza (tendido de material de sub-base, base e imprimación) , trabajos de asfaltado de accesos, construcción de cunetas revestidas.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	06/11/2015 - 03:26 PM
SEPTIEMBRE 2015.- Se continúa ejecutando trabajos en el centro de la ciudad de Amaluza (tendido de material de sub-base, base e imprimación) , trabajos de asfaltado de accesos, construcción de cunetas revestidas. AGOSTO 2015.- Se continúa ejecutando trabajos en el centro poblado de la ciudad de Amaluza , se están retrasando debido a que la Municipalidad de Espíndola está reubicando la tubería de algunos sistemas sanitarios por encontrarse muy superficiales.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	08/10/2015 - 12:04 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2015.- Se encuentran ejecutando trabajos en el centro poblado de la ciudad de Amaluza se están retrasando por encontrarse diversidad de tuberías e instalaciones sanitarias y se han destruido por el paso de la maquinaria.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	10/09/2015 - 11:53 AM
Junio 2015: Se ejecutan trabajos de Limpieza de derrumbes, transporte de material de subbase, obras de drenaje, construcción de cunetas revestidas y muros, colocación de alcantarillas en accesos. La fuerte temporada invernal que azota la zona impide avanzar normalmente con los trabajos, situación que se trasmite en bajos rendimientos Mayo 2015: Se ejecutan trabajos de Limpieza de derrumbes, transporte de material de subbase, obras de drenaje, construcción de cunetas revestidas y muros, colocación de alcantarillas en accesos. La fuerte temporada invernal que azota la zona impide avanzar normalmente con los trabajos, situación que se trasmite en bajos rendimientos	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	10/09/2015 - 11:45 AM
Marzo 2015: Se ejecutan trabajos de Limpieza de derrumbes, transporte de material de subbase, obras de drenaje, construcción de cunetas revestidas y muros, colocación de alcantarillas en accesos. La fuerte temporada invernal que azota la zona impide avanzar normalmente con los trabajos, situación que se trasmite en bajos rendimientos.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	08/04/2015 - 12:47 PM
Febrero 2015: Se ejecutan trabajos de colocación base, obras de drenaje, construcción de cunetas revestidas en la vía principal. Trabajos de movimiento de tierras, colocación de material de mejoramiento, subbase, obras de drenaje en accesos a barrios y parroquias.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	06/03/2015 - 01:01 PM
Enero 2015: Continúan trabajos de colocación de subbase, base y carpeta asfáltica, construcción de cunetas revestidas en la vía principal, trabajos de movimiento de tierras, colocación de material de mejoramiento y obras de drenaje en accesos.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	06/02/2015 - 10:49 AM
Diciembre 2014: Continúan trabajos de colocación de subbase, base y carpeta asfáltica, construcción de cunetas revestidas en la vía principal, trabajos de movimiento de tierras, colocación de material de mejoramiento y obras de drenaje en accesos.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	07/01/2015 - 08:25 AM
Noviembre 2014: Se continúa con trabajos de Movimiento de tierras en accesos a barrios, Estabilización de taludes , Colocación de material de Subbase y Base, Colocación de carpeta asfáltica de e= 7,5 cm, Construcción de subdrenes, construcción cunetas revestidas, construcción de cabezales, además se ejecutan rubros ambientales como conformación de escombreras, agua para control de polvo, etc.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	05/12/2014 - 01:23 PM
Octubre 2014: Se ejecutan trabajos de Movimiento de tierras en accesos a barrios, Estabilización de taludes , Colocación de material de Subbase y Base, Colocación de carpeta asfáltica de e= 7,5 cm, Construcción de subdrenes, construcción cunetas revestidas, construcción de cabezales, se trabaja ejecutan rubros ambientales como conformación de escombreras agua para control de polvo.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	06/11/2014 - 01:43 PM
Septiembre 2014: Se ejecutan trabajos de Mov. de tierras, Estab. de taludes en accesos a barrios, Construc. de subdrenes, cunetas de coronación, colocación de alcantarillas, construcción de cabezales. trabajos en calzada como colocación de material de mejoramiento, material de Sub-base y Base. Rubros ambientales, se inicia trabajos de imprimación previo a colocacion de carpeta asfaltica. El contratista tiene ubicada la planta asfáltica en sitio, se realizan comprobaciones de los diseños de mezcla asfáltica para colocación de carpeta asfáltica de e= 7,5 cm., con la finalidad de iniciar los trabajos en el mes de octubre de 2104.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	08/10/2014 - 01:57 PM
Agosto 2014: Se continua con trabajos de Mov. de tierras, Estab. de taludes. Construcción de subdrenes, cunetas de coronación, colocación de alcantarillas, construcción de cabezales. trabajos en calzada como Colocación de material de mejoramiento, material de Sub-base y Base. Rubros ambientales (Reconformación de escombreras, agua para control de polvo. Además, se inicia trabajos de imprimación previo a colocacion de carpeta asfaltica. El avance es superior al normal.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	10/09/2014 - 09:53 PM
Julio2014: Se continua con trabajos de Mov. de tierras, Estab. de taludes. Construcción de subdrenes, cunetas de coronación, colocación de alcantarillas, construcción de cabezales. trabajos en calzada como Colocación de material de mejoramiento, material de Sub-base y Base. Rubros ambientales (Reconformación de escombreras, agua para control de polvo. Etc. El avance es superior al normal.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	10/09/2014 - 09:52 PM
Junio2014: Se continua con trabajos de Mov. de tierras, Estab. de taludes. Construcción de subdrenes, cunetas de coronación, colocación de alcantarillas, construcción de cabezales. trabajos en calzada como Colocación de material de mejoramiento, material de Sub-base y Base. Rubros ambientales (Reconformación de escombreras, agua para control de polvo. Etc. El avance es superior al normal.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	04/08/2014 - 03:36 PM
Mayo 2014: Se continúa con la producción de material para sub base y agregados para los hormigones; colocación de subbase; trabajos de movimiento detierras, obras de drenaje, obras opara estructuras menores y estructura de calzada con rendimientos normales. Avance de la obra mayo al avance programado.	Paredes Ortega, Ángel Alberto	07/07/2014 - 10:59 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Mayo 2014: Se continúa con la producción de material para sub base y agregados para los hormigones; colocación de subbase; trabajos de movimiento detierras, obras de drenaje, obras opara estructuras menores y estructura de calzada con rendimientos normales. Los trabajos vanzan de acuerdo a la nueva reprogramación según Orden de Cambio Nro. 1	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	10/06/2014 - 11:13 AM
Abril 2014: Se continúa con la producción de material para sub base y agregados para los hormigones; se ejecutan trabajos de movimiento detierras, drenaje, obras opara estructuras menores y estructura de calzada con rendimientos normales.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	07/05/2014 - 03:04 PM
Marzo 2014: La constructora a iniciado la producción de material para sub base y agregados para los hormigones; adicionalmente se encuentra ejecutando el movimiento detierras , drenaje, obras opara estructuras menores y estructura de calzada con rendimientos normales.	Paredes Ortega, Ángel Alberto	07/04/2014 - 06:01 PM
Febrero 2014: La constructora se encuentra ejecutando el movimiento detierras a partir del puente sobre el Rio Pindo lo que permite avanzar con lo programado. La intervención en el km 14 falla se realizo de acuerdo a las recomendaciones del estudio	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	08/03/2014 - 01:11 PM
Enero 2014.- La constructora ejecuta trabajos de movimiento de tierras en taludes y plataformas, Mejoramiento de subrasante con suelo seleccionado, Colocación de alcantarillas, construcción de subdrenes. El material proveniente del movimiento de tierras es transportado a las escombreras determinadas por la Fiscalización. Diciembre 2013: La constructora ejecuta trabajos de movimiento de tierras en taludes y plataformas, Mejoramiento de subrasante con suelo seleccionado, Colocación de alcantarillas, construcción de subdrenes. El material proveniente del movimiento de tierras es transportado a las escombreras determinadas por la Fiscalización.	Ramon Bustamante, Victor Manuel	10/02/2014 - 12:20 AM
Noviembre 2013: La constructora se encuentra ejecutando el movimiento de tierras en taludes y plataformas, en los cuales se ha encontrado gran cantidad de roca. Los trabajos se desarrollan con normalidad, así mismo se ejecutan trabajos de colocación de material de mejoramiento obras de arte, subdrenes, etc., existiendo un avance mayor al programado.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	09/12/2013 - 11:39 AM
Octubre 2013: Los trabajos avanzan con normalidad; se ejecutan actividades de movimiento de tierras, colocación de material de mejoramiento, construccion de alcantarillas, obras de arte y subdrenes. Además se avnza con la construcción de los accesos a Sta. Teresita y Cangochara. el avance físico real del proyecto está sobre el programado. Septiembre de 2013; Los trabajos avanzan con normalidad, se ejecutan rubros de operaciones preliminares, movimiento de tierras en entrada de Sta. Teresita y en el acceso a Cangochara, estabilización de taludes, trabajos de mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado, colocación de alcantarillas y obras de control ambiental.	Carrión Rojas, Hernán	05/11/2013 - 08:20 AM
Agosto 2013: Los trabajos se desarrollan con normalidad, se trabaja en movimiento de tierras desde Amaluza hacia Rio Pindo. Además se está colocando y reemplazando tubería de acero corrugado para alcanytarillas desde el Km. 0+000 al 5+100. Julio 2013: El proyecto recién se inicia, ya que el 24 de julio de 2013 se les hace efectivo la entrega del anticipo, por lo que se ha podido constatar que la compañía contratista esta ingresando maquinaria, colocando datos topográficos y ha iniciado el movimiento de tierras desde Amaluza hacia Rio Pindo. Aún no se cuenta con la reprogramación correspondiente para definir indicadores. Una vez que se cuente con esta información se llenaran los campos correspondientes. No se puede adjuntar el informe ejecutivo porque todavía no existe planilla. Abril 2013: Certificación presupuestaria, aprobación y publicación de pliegos el 05 de abril de 2013; se estima adjudicación para el 30 de abril de 2013	Carrión Rojas, Hernán	10/09/2013 - 09:10 PM
Marzo 2013: Pliegos en elaboración. Febrero 2013: Pliegos en elaboración. Enero 2013: Proyecto incluido en PAI2013.	Carrión Rojas, Hernán	18/04/2013 - 03:11 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Presencia de derrumbes por estación invernal retrasaran la recepción de la Obra provisionalmente, con la cual se podría iniciar el mantenimiento vial	18/05/2017	Danny Andrei Ocampo Veintimilla	20	10	2	0/1

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Presencia de derrumbes por estación invernal causaría retraso para recibir la Obra provisionalmente, con la cual se podría iniciar el mantenimiento vial	24/04/2017	Danny Andrei Ocampo Veintimilla	10 %	10	1	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja
2	Zona 7 - Sur > Loja > Espíndola

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANIFICACIÓN: Proyecto incluido en PAI 2013, ejecutada.	1-Solicitud de Información	01/01/2013		01/01/2013		Sí	2.0
2	PLANIFICACIÓN: Certificación Presupuestaria ejecutada.	1-Solicitud de Información	05/04/2013		05/04/2013		Sí	2.0
3	PLANIFICACIÓN: Publicación de Pliegos en el portal de compras públicas, terminado.	2-Publicación de Pliegos	05/04/2013		05/04/2013		Sí	2.0
4	PLANIFICACIÓN: Contrato Adjudicado	3-Adjudicación	06/06/2013		06/06/2013		Sí	2.0
5	EJECUCIÓN: Anticipo entregado e inicio de trabajos, ejecutados.	4-Inicio de Trabajo	24/07/2013		24/07/2013		Sí	2.0
6	EJECUCIÓN: Operaciones preliminares ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		30/09/2013		Sí	1.0
7	EJECUCIÓN: Puentes, Superestructura ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		15/11/2015		Sí	2.0
8	EJECUCIÓN: Trabajos de calzada: Base ejecutado 50%.	5-Entregables Intermedios	03/03/2015		31/03/2015		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Trabajos de calzada: Sub-base ejecutado 50%	5-Entregables Intermedios	10/03/2015		31/03/2015		Sí	5.0
10	EJECUCIÓN: Trabajos de calzada: Capa de rodadura ejecutada 50%.	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	8.0
11	EJECUCIÓN: Trabajos de calzada: Mejoramiento ejecutado.	5-Entregables Intermedios	07/04/2015		30/04/2015		Sí	12.0
12	EJECUCIÓN: Estabilización de taludes ejecutado.	5-Entregables Intermedios	13/05/2015		31/05/2015		Sí	1.0
13	EJECUCIÓN: Movimiento de tierras ejecutado.	5-Entregables Intermedios	13/05/2015		31/05/2015		Sí	25.0
14	EJECUCIÓN: Obras de drenaje: colocación de alcantarillas ejecutado.	5-Entregables Intermedios	13/05/2015		31/05/2015		Sí	1.5
15	EJECUCIÓN: Trabajos de calzada: Sub-base ejecutado 100%	5-Entregables Intermedios	08/10/2015		31/10/2015		Sí	5.0
16	EJECUCIÓN: Trabajos de calzada: Base ejecutado 100%.	5-Entregables Intermedios	15/10/2015		31/10/2015		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
17	EJECUCIÓN: Puentes, Infraestructura ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/10/2015		01/10/2015		Sí	2.0
18	EJECUCIÓN: Obras de drenaje: construcción de cunetas revestidas ejecutado.	5-Entregables Intermedios	18/11/2015		30/11/2015		Sí	1.5
19	EJECUCIÓN: Trabajos de señalización ejecutada.	5-Entregables Intermedios	27/11/2015		30/11/2015		Sí	1.75
20	CIERRE: Trabajos de obra ejecutados.	5-Entregables Intermedios	29/01/2016		29/01/2016		Sí	1.0
21	EJECUCIÓN: Trabajos de calzada: Capa de rodadura ejecutada 100%.	5-Entregables Intermedios	26/09/2016		26/02/2016		Sí	8.0
22	COMPLETADO: Acta Recepción Provisional de la obra y acta suscrita.	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		04/01/2017		Sí	0.5
23	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto PRIMER AÑO, 1er. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.25
24	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto PRIMER AÑO, 2do. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.25
25	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto PRIMER AÑO, 3er. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2017		30/09/2017		Sí	0.25
26	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto PRIMER AÑO, 4to. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		31/12/2017		Sí	0.25
27	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto SEGUNDO AÑO, 1er. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2018	31/03/2018			No	0.25
28	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto SEGUNDO AÑO, 2do. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2018	30/06/2018			No	0.25
29	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto SEGUNDO AÑO, 3er. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2018	30/09/2018			No	0.25
30	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto SEGUNDO AÑO, 4to. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2018	31/12/2018			No	0.25
31	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, 1er. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2019	31/03/2019			No	0.25
32	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, 2do. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2019	30/06/2019			No	0.25
33	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, 3er. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2019	30/09/2019			No	0.25
34	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, 4to. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019			No	0.25
35	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto CUARTO AÑO, 1er. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2020	31/03/2020			No	0.25
36	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto CUARTO AÑO, 2do. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	30/06/2020			No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
37	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto CUARTO AÑO, 3er. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2020	30/09/2020			No	0.25
38	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto CUARTO AÑO, 4to. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	04/01/2021	04/01/2021			No	0.25
39	CIERRE: Liquidación económica ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/01/2021	29/01/2021			No	0.25
40	COMPLETADO: Recepción definitiva de la obra y acta de recepción suscrita.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	29/01/2021	29/01/2021			No	0.5



SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Acta de recepción provisional de la obra suscrita.	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	02/02/2017
2	Vía y accesos presentan daños	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	27/07/2016
3	Vía inaugurada recientemente presenta problemas	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	28/04/2016
4	Reinicio de trabajos en vía	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	25/02/2016
5	Trabajo en vía paralizados	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	29/12/2015
6	Construcción de carretera y accesos avanzan satisfactoriamente	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	27/10/2015
7	Construcción de carretera y accesos avanzan satisfactoriamente	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	28/08/2015
8	Reconstrucción de carretera Río Pindo avanza según lo planificado	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	30/07/2015
9	Visita de seguimiento al proyecto Reconstrucción y Mantenimiento (48 meses) carretera Río Pindo-Amaluzá-Jimbura-El Refugio (incluye Fiscalización)	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	29/01/2015
10	Vía avanza satisfactoriamente	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	27/05/2015
11	Avance carretera Río Pindo-Amaluzá positivo	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	24/03/2015
12	Recorrido de la vía efectuado por la Gobernadora de Loja Lic. Johanna Ortiz.	Ojeda Valarezo, Tania Verónica	{PR} - Provincia - LOJA	27/11/2014
13	Avance de trabajos vía Río Pindo -Amaluzá	Ojeda Valarezo, Tania Verónica	{PR} - Provincia - LOJA	27/08/2014
14	Reconstrucción carretera Río Pindo-Amaluzá	Torres Paz, Marcelo Vinicio	{PR} - Provincia - LOJA	22/10/2013
15	Proyecto Río Pindo-Amaluzá-El Refugio	Torres Paz, Marcelo Vinicio	{PR} - Provincia - LOJA	27/06/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de colocación de Pavimento Flexible		100.00 %	100	100	01/10/2013	Julio
2	Operaciones prelim.; Movimiento de tierras y Estabilizac. de taludes		100.00 %	100	100	01/08/2013	Julio
3	Porcentaje de colocación de obras de drenaje		100.00 %	100	100	01/08/2013	Julio

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
4	Puentes nuevos		100.00 %	100	100	01/12/2014	Julio
5	Porcentaje de mantenimiento rutinario		100.00 %	14.56	14.56	04/01/2017	Julio


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	5,219,537.66
Estimado Al Fin Del Proyecto:	23,699,529.25 **
Costo Total:	18,278,688.65
Total Devengado:	23,600,529.25
% Costo Total Devengado:	129.12 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 129.12 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	20,184,665.56	99,000.00	0.00	20,283,665.56
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	20,955,526.31	36,000.00	0.00	20,991,526.31
Ppto. Codificado	29,624,016.36	99,000.00	0.00	29,723,016.36
Ppto. Comprometido	28,322,686.08	0.00	0.00	28,322,686.08
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	17,115,019.78	99,000.00	0.00	17,214,019.78
Ppto. Devengado	23,600,529.25	0.00	0.00	23,600,529.25
Pagado Real	19,062,571.84	0.00	0.00	19,062,571.84
Estimado a fin de año	* 23,600,529.25	0.00	0.00	23,600,529.25
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-6,485,509.47	99,000.00	0.00	-6,386,509.47
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 137.89 %	0.00 %	0.00 %	137.10 %
Ppto. Codificado 998	5,462,098.68	0.00	0.00	5,462,098.68
Ppto. Devengado 998	5,336,098.58	0.00	0.00	5,336,098.58

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

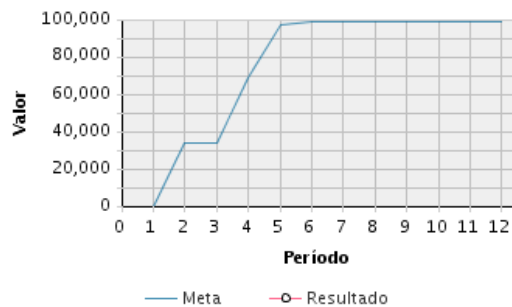

Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	33,868.63		33,868.63				
Mar	1.00		33,869.63				
Abr	35,000.00		68,869.63				
May	28,000.00		96,869.63				
Jun	2,124.37		98,994.00				
Jul	1.00		98,995.00				
Ago	1.00		98,996.00				
Sep	1.00		98,997.00				
Oct	1.00		98,998.00				
Nov	1.00		98,999.00				
Dic	1.00		99,000.00				
Total	99,000.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
15	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
16	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
17	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
18	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ACTA DE RECEPCIION PROVISIONAL	ACTA_DE_RECEPCION_PROVISIONAL.pdf	04/05/2017
2	aprobacion_pliegos_convocatoria_portal_compras_publicas	aprobacion_pliegos_convocatoria_portal_compras_publicas.pdf	08/04/2013
3	B.1 Informe ejecutivo junio 2013	Infor-ejecutivo_junio_2013.pdf	09/09/2014
4	B.2 Informe ejecutivo julio 2013	Infor-ejecutivo_Julio_2013.pdf	09/09/2014
5	B.3 Informe ejecutivo agosto 2013	Infor-ejecutivo_agosto_2013.pdf	09/09/2014
6	B.4 Informe ejecutivo septiembre 2013	Infor-ejecutivo_Septiembre_2013.pdf	09/09/2014
7	B.5 Informe ejecutivo octubre 2013	Infor-Ejecutivo_octubre_2013.pdf	09/09/2014
8	B.6 Informe ejecutivo noviembre 2013	Infor-Ejecutivo_noviembre_2013.pdf	09/09/2014
9	B.7 Informe ejecutivo diciembre 2013	Infor-Ejecutivo_diciembre_2013.pdf	09/09/2014
10	C.1 Informe ejecutivo enero 2014	INF._EJEC._ENERO_2014.pdf	09/09/2014
11	C.2 Informe ejecutivo febrero 2014	Informe_Ejecutivo_FEBRERO_2014.pdf	09/09/2014
12	C.3 Informe ejecutivo marzo 2014	INF._EJECUTIVO_MARZO_2014.pdf	09/09/2014
13	C.4 Informe ejecutivo abril 2014	INF._EJECUTIVO_ABRIL_2014.pdf	09/09/2014
14	C.5 Informe ejecutivo mayo 2014	INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2014.pdf	09/09/2014
15	C.6 Informe ejecutivo junio 2014	INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2014.pdf	09/09/2014
16	C.7 Informe ejecutivo julio 2014	INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2014.pdf	09/09/2014
17	C.8 Informe ejecutivo agosto 2014	INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2014.pdf	11/09/2014
18	C.9 Informe ejecutivo septiembre 2014	INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2014.pdf	08/10/2014
19	C10 Informe ejecutivo octubre 2014	INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2014.pdf	07/11/2014
20	C11 Informe ejecutivo noviembre 2014	INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2014.pdf	05/12/2014
21	C12 Informe ejecutivo diciembre 2014	Infor-ejecutivo_Dic-2014.pdf	06/01/2015
22	CONTRATO COMPLEMENTARIO 01	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_01.pdf	04/05/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
23	CONTRATO COMPLEMENTARIO 02	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_02.pdf	04/05/2017
24	CONTRATO ORIGINAL 01	CONTRATO_ORIGINAL_01.pdf	04/05/2017
25	CONTRATO ORIGINAL 02	CONTRATO_ORIGINAL_02.pdf	04/05/2017
26	CONTRATO ORIGINAL 03	CONTRATO_ORIGINAL_03.pdf	04/05/2017
27	D.1 Informe ejecutivo enero 2015	INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2015.pdf	06/03/2015
28	D.12 Informe Ejecutivo Diciembre 2015	D.12_Informe_Ejecutivo_Diciembre_2015.pdf	31/12/2015
29	D.2 Informe ejecutivo febrero 2015	INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2015.pdf	06/03/2015
30	D.3 Informe ejecutivo marzo 2015	Informe_ejecutivo_marzo_2015.pdf	08/04/2015
31	D.4 Informe ejecutivo abril-2015	Infor-ejecutivo_abril_2015.pdf	06/05/2015
32	D.5 Informe ejecutivo mayo 2015	Infor-ejecutivo_mayo-2015.pdf	09/06/2015
33	D.6 Informe ejecutivo jun-2015	Infor-ejecutivo_junio-2015.pdf	09/07/2015
34	D.7 Informe ejecutivo julio 2015	Informe_ejecutivo_julio_2015.pdf	06/08/2015
35	D.8 Informe ejecutivo agosto 2015	Informe_ejecutivo_agosto_2015.pdf	09/09/2015
36	D.9 Informe ejecutivo septiembre 2015	Informe_ejecutivo_septiembre_2015.pdf	08/10/2015
37	D10 Informe ejecutivo octubre 2015	Informe_ejecutivo_octubre_2015.pdf	06/11/2015
38	D11 Informe ejecutivo noviembre-2015	Infor-ejecutivo_noviembre-2015.pdf	10/12/2015
39	E. 6 Informe Ejecutivo Junio 2016	Informe_Ejecutivo_Junio_2016.pdf	05/07/2016
40	E. 6 Informe Ejecutivo Junio 2016	Informe_Ejecutivo_Junio_2016.pdf	06/07/2016
41	E.2 Informe Ejecutivo Febrero 2016	E.1_Informe_Ejecutivo_Enero_2016.pdf	07/03/2016
42	E.2 Informe Ejecutivo Febrero 2016	E.2_Informe_Ejecutivo_Febrero_2016.pdf	07/03/2016
43	E.3 Informe Ejecutivo Marzo 2016	E.3_Informe_Ejecutivo_Marzo_2016.pdf	05/04/2016
44	E.4 Informe Ejecutivo Abril 2016	Informe_Ejecutivo_Abril_2016.pdf	04/05/2016
45	E.5 Informe Ejecutivo Mayo 2016	E.5_Informe_Ejecutivo_Mayo_2016.pdf	03/06/2016
46	E.5 Informe Ejecutivo Mayo 2016	E.5_Informe_Ejecutivo_Mayo_2016.pdf	03/06/2016
47	E.7 Informe Ejecutivo Julio 2016	E.7_Informe_Ejecutivo_Julio_2016.pdf	11/08/2016
48	E.8 Informe Ejecutivo Agosto 2016	E.8_Informe_Ejecutivo_Agosto_2016.pdf	09/09/2016
49	E.9 Informe Ejecutivo Septiembre 2016	E.9_Informe_Ejecutivo_Septiembre_2016.pdf	10/10/2016
50	M1. Enero 2017. Informe Ejecutivo Enero 2017	ENERO_2017.pdf	05/04/2017
51	M10. Informe ejecutivo Octubre 2017	OCTUBRE_2017.pdf	06/11/2017
52	M11. INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE_2017.pdf	04/12/2017
53	M12. INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE_2017.pdf	02/01/2018
54	M13. INFORME EJECUTIVO ENERO 2018	ENERO_2018.pdf	01/02/2018
55	M14. INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2018	FEBRERO_2018.pdf	02/03/2018
56	M15. INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	MARZO_2018.pdf	03/04/2018
57	M16. INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	ABRIL_2018.pdf	02/05/2018
58	M17. INFORME EJECUTIVO MAYO 2018	MAYO_2018.pdf	04/06/2018
59	M18. INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2018.pdf	04/07/2018
60	M19. INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2018.pdf	03/08/2018
61	M2. Febrero 2017. Informe Ejecutivo Febrero 2017	FEBRERO_2017.pdf	05/04/2017
62	M3. Marzo 2017. Informe Ejecutivo Marzo 2017	MARZO_2017.pdf	05/04/2017
63	M4. Informe Ejecutivo Abril 2017	ABRIL_2017.pdf	04/05/2017
64	M5. Informe Ejecutivo Mayo 2017	MAYO_2017.pdf	02/06/2017
65	M6. Informe Ejecutivo Junio 2017	JUNIO_2017.pdf	03/07/2017
66	M7. Informe Ejecutivo Julio 2017	JULIO_2017.pdf	04/08/2017
67	M8. Informe Ejecutivo Agosto 2017	AGOSTO_2017.pdf	04/09/2017
68	M9. Informe ejecutivo Septiembre 2017	SEPTIEMBRE_2017.pdf	03/10/2017
69	Oficio Nro. MTOP-DDL-16-445-OF	Oficio_Nro._MTOP-DDL-16-445-OF.pdf	10/10/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Calderón Ojeda, Jaime Ramiro	Subsecretario Regional 7	Subsecretario Regional 7	jcalderon@mtop.gob.ec	023974600
CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	Lider de Proyecto	Experto Infraestructura	jcruz@mtop.gob.ec	
Pineda Betancourt, Gabriela Del Cisne	Coordinadora de Planificación Zonal 7	Coordinadora de Planificación Zonal 7	gpineda@mtop.gob.ec	023974600
Rojas Cazar, Walter Emilio	Directora Provincial de Loja	Experto de Infraestructura Provincial	wrojas@mtop.gob.ec	023974600
Rojas Cazar, Walter Emilio	Administrador del Proyecto	Experto de Infraestructura Provincial	wrojas@mtop.gob.ec	023974600
Vega Silva, Andrea Karla	Coordinador Técnico de Infraestructura Provincial	Coordinadora de Infraestructura Provincial	avega@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
67934_1.jpg	03/08/2018
