

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 6
Dirección Provincial Azuay

PROYECTO: K006 MTOP - Rehabilitación carretera Cumbe-Oña: Tramo Cumbe - La Jarata

Líder del Proyecto:	Guamán Vicuña, Juan Carlos (jguaman@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Quezada Jara, Mónica Fabiola	Programas Relacionados:	Provincia - Azuay, Provincia - Loja, REHABILITACION C. CUMBE - OÑA TRAMO 1: CUMBE - LA JARATA DE 40 60 KM, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.766.3221	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	24,056,268.49
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	24/07/2007 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	03/09/2018	Fecha de Fin Base:	05/04/2016
Modificado por:	Guamán Vicuña, Juan Carlos	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCION: Proyecto anterior a formato SENPLADES, no se dispone de toda la información que actualmente se solicita.
 Tramo 1: Cumbe - La Jarata, de 40.60 km (Azuay)
 Rehabilitación de la carretera Cumbe - Oña, tramo Cumbe - La Jarata, de 40.60 km. de longitud, a nivel de pavimento rígido
 MONTO DEL CONTRATO: \$ 16.912.840,57
 PLAZO ORIGINAL: 24 meses
 MONTO MANTENIMIENTO: \$ 109.787,60 a partir de 03/04/2012
 PLAZO DE MANTENIMIENTO: 4 años, hasta 03/04/2016
 CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1 suscrito el 15/04/2011 por ampliación de plazo 5.0 MESES
 CONTRATO COMPLEMENTARIO N°2 suscrito el 28/10/2011
 ORDEN DE CAMBIO N°1 suscrito el 07/07/2010 por un monto de \$ 2.597.086,51
 ORDEN DE CAMBIO N°2 suscrito el 15/09/2011 por ampliación de plazo 45.0 DÍAS
 COSTO MAS PORCENTAJE N° 1 suscrito el 08/03/2010 por un monto de \$ 424.428,50
 JUSTIFICACION DE PLAZO N°1 suscrito el 25/10/2010 por 30.0 DÍAS
 JUSTIFICACION DE PLAZO N°2 suscrito el 31/03/2011 por 16.0 DÍAS

1.- Vía principal que une las Provincias del Azuay con Loja

Al momento se encuentra en etapa de Mantenimiento

Contratista. Consorcio Vial Manabí

Fiscalizador: IPH Consultores

Supervisor: Ing. Cecilia Álvarez

2.- PRODUCTO/SERVICIO: Vía de vital importancia para el turismo y de unión entre las Provincias del Azuay y Loja, se entrega a los usuarios en perfecto estado de circulación, con toda la señalización respectiva y cumpliendo las normas y especificaciones técnicas existentes.

Dentro de este CUP hay un contrato de consultoría de evaluación estructural y unional del pavimento rígido de la carretera Cumbe - Oña - Saraguro de \$51.960

Beneficios Cualitativos

Rehabilitar y mejorar la infraestructura de la vía, seguridad en la vía, mejorar tiempos de viaje, disminución del costo operativo del vehículo.

Tipo de Beneficiario

Usuarios de la vía, sector Ganadero en su mayoría, la ciudadanía en general para apoyar la integración social y desarrollo socioeconómico del país.

Restricciones

El plazo de ejecución del proyecto es de 24 meses y un periodo de 4 años de mantenimiento

Restricciones


El costo del proyecto es de: 20.415.994,87
 El proyecto se ubica entre la parroquia Cumbe y Jarata en la provincia del Azuay,
 El proyecto contempla una calzada de 40.6 km de longitud en pavimento rígido, con un espesor de 22 cm,
 contempla la construcción de veredas y ciclovías y tiene una sección transversal variable.
 La DPA a través de la Supervisión del Proyecto, vigilará que la Fiscalización haga cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en los documentos contractuales, así como el personal técnico requerido.

TIEMPO: Los Trabajos de infraestructura a cargo de la empresa municipal ETAPA, retrasaron el cumplimiento de construcción de los accesos, problema solucionado en su totalidad, la via se encuentra terminada se ha realizado la recepción provisional.
 El acceso a la parroquia Cumbe sufre deterioros por falla en la infraestructra sanitaria realizada por ETAPA EP.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre **Completado** Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 97.13 %
 Fecha de Inicio: 24/07/2007 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

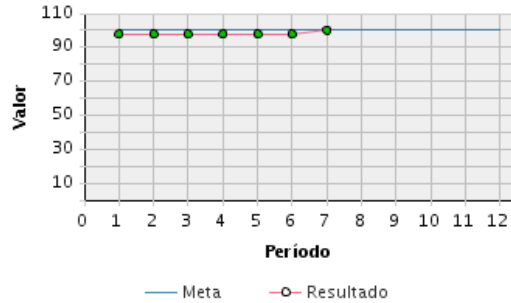

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	100 %					
	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●					

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2018 EL 2 DE JULIO DE 2018 SE FIRMA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA. ENTRAMITE LOS ACTOS ADAMIISTRATIVOS PARA EL CIERRE	Guamán Vicuña, Juan Carlos	03/09/2018 - 03:08 PM
JULIO 2018 La Contratista con oficio Nro. DTG-050-2018 de fecha 22 de junio de 2018 informa que se ha terminado con los trabajos previo a la recepción definitiva, según acta compromiso firmada el 23 de abril de 2018. EL 2 DE JULIO DE 2018 SE FIRMA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA.	Guamán Vicuña, Juan Carlos	01/08/2018 - 03:33 PM
JUNIO 2018 En los kms 6,5 y 14,5 se evidencia la presencia de un deslizamiento activo, se solicita con Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2017-1490-ME de fecha 26 de julio de 2017 a Director Distrital del Azuay un estudio integral para solucion definitiva. SE HA CANCELADO PLANILLA DEL MANTENIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES.	Guamán Vicuña, Juan Carlos	04/07/2018 - 12:52 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SIGUE PENDIENTE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA,</p> <p>La Contratista con oficio Nro. DTG-022-2018 de fecha 28 de MARZO de 2018 presenta propuesta para reparación y remediación, con carpeta asfáltica de 4 cm, la misma que se solicita el análisis a la Ing. Especialista Geotécnica.</p> <p>Memorando Nro. MTOP-EITZ6-2018-71-ME de fecha 4 de abril de 2018 Especialista Geotecnia entrega informe donde da su aceptación para colocar carpeta de 4 cm. Con oficio Nro. MTOP-DDAZ-2018-00181-OF de fecha 18 de abril de 2018 se comunica al Contratista aceptación para colocar 4 cm de carpeta asfáltica y se adjunta ACTA COMPROMISO, para la firma,</p> <p>EL MIERCOLES 17 DE MAYO SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE REMEDICACION Y REPARACIÓN.</p> <p>La Contratista con oficio Nro. DTG-050-2018 de fecha 22 de junio de 2018 informa que se ha terminado con los trabajos previo a la recepción definitiva, según acta compromiso firmada el 23 de abril de 2018.</p> <p>EN TRAMITE ELABORACION Y FIRMA DEL ACTA RECEPCION DEFINITIVA</p>		
<p>En los kms 6,5 y 14,5 se evidencia la presencia de un deslizamiento activo, se solicita con Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2017-1490-ME de fecha 26 de julio de 2017 a Director Distrital del Azuay un estudio integral para solucion definitiva.</p> <p>SE HA CANCELADO PLANILLA DEL MANTENIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES. SIGUE PENDIENTE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA,</p> <p>La Contratista con oficio Nro. DTG-022-2018 de fecha 28 de MARZO de 2018 presenta propuesta para reparación y remediación, con carpeta asfáltica de 4 cm, la misma que se solicita el análisis a la Ing. Especialista Geotécnica.</p> <p>Memorando Nro. MTOP-EITZ6-2018-71-ME de fecha 4 de abril de 2018 Especialista Geotecnia entrega informe donde da su aceptación para colocar carpeta de 4 cm. Con oficio Nro. MTOP-DDAZ-2018-00181-OF de fecha 18 de abril de 2018 se comunica al Contratista aceptación para colocar 4 cm de carpeta asfáltica y se adjunta ACTA COMPROMISO, para la firma,</p> <p>EL MIERCOLES 17 DE MAYO SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE REMEDICACION Y REPARACIÓN.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>04/06/2018 - 11:48 AM</p>
<p>ABRIL DE 2018:</p> <p>En los kms 6,5 y 14,5 se evidencia la presencia de un deslizamiento activo, se solicita con Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2017-1490-ME de fecha 26 de julio de 2017 a Director Distrital del Azuay un estudio integral para solucion definitiva.</p> <p>SE HA CANCELADO PLANILLA DEL MANTENIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES. SIGUE PENDIENTE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA,</p> <p>La Contratista con oficio Nro. DTG-022-2018 de fecha 28 de MARZO de 2018 presenta propuesta para reparación y remediación, con carpeta asfáltica de 4 cm, la misma que se solicita el análisis a la Ing. Especialista Geotécnica.</p> <p>Memorando Nro. MTOP-EITZ6-2018-71-ME de fecha 4 de abril de 2018 Especialista Geotecnia entrega informe donde da su aceptación para colocar carpeta de 4 cm. Con oficio Nro. MTOP-DDAZ-2018-00181-OF de fecha 18 de abril de 2018 se comunica al Contratista aceptación para colocar 4 cm de carpeta asfáltica y se adjunta ACTA COMPROMISO, para la firma, AL MOMENTO SE ESPERA QUE LA CONTRATISTA FIRME EL ACTA COMPROMISOS DE LOS TRABAJOS DE REMEDIACION.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>02/05/2018 - 03:41 PM</p>
<p>MARZO DE 2018:</p> <p>Con Oficio Nro. MTOP-DDAZ-2017-000486-OF de fecha 27 de noviembre de 2017 se convoca a reunión a la Contratista y realiza inspección a la via para ver los trabajos de remediación y reparación que son necesarios previo a la Recepción Definitiva.</p> <p>En los kms 6,5 y 14,5 se evidencia la presencia de un deslizamiento activo, se solicita con Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2017-1490-ME de fecha 26 de julio de 2017 a Director Distrital del Azuay un estudio integral para solucion definitiva.</p> <p>SE HA CANCELADO PLANILLA DEL MANTENIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>03/04/2018 - 10:08 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SIGUE PENDIENTE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA, La Contratista con oficio Nro. DTG-008-2018 de fecha 22 de enero de 2018 presenta propuesta para reparación y remediación, la misma que se solicita el análisis a la Ing. Especialista Geotécnica. Se realizada inspección el jueves 22 de febrero de 2018 con la Ing. Especialista en Geotecnia y contratista se determina sectores a intervenir y los trabajos de remediación y reparación, que la contrasita tendra que acojer o rechazar oficialmente.</p> <p>La Contratista con oficio Nro. DTG-022-2018 de fecha 28 de MARZO de 2018 presenta propuesta para reparación y remediación, con carpeta asfaltica de 4 cm, la misma que se solicita el análisis a la Ing. Especialista Geotécnica.</p>		
<p>FEBRERO DE 2018:</p> <p>Con Oficio Nro. MTOP-DDAZ-2017-000486-OF de fecha 27 de noviembre de 2017 se convoca a reunión a la Contratista y realiza inspección a la via para ver los trabajos de remediación y reparación que son necesarios previo a la Recepción Definitiva.</p> <p>En los kms 6,5 y 14,5 se evidencia la presencia de un deslizamiento activo, se solicita con Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2017-1490-ME de fecha 26 de julio de 2017 a Director Distrital del Azuay un estudio integral para solucion definitiva.</p> <p>SE HA CANCELADO PLANILLA DEL MANTENIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES. SIGUE PENDIENTE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA, La Contratista con oficio Nro. DTG-008-2018 de fecha 22 de enero de 2018 presenta propuesta para reparación y remediación, la misma que se solicita el análisis a la Ing. Especialista Geotécnica. Se realizada inspección el jueves 22 de febrero de 2018 con la Ing. Especialista en Geotecnia y contratista se determina sectores a intervenir y los trabajos de remediación y reparación, que la contrasita tendra que acojer o rechazar oficialmente.</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	05/03/2018 - 12:20 PM
<p>ENERO DE 2018:</p> <p>Con Oficio Nro. MTOP-DDAZ-2017-000486-OF de fecha 27 de noviembre de 2017 se convoca a reunión a la Contratista y realiza inspección a la via para ver los trabajos de remediación y reparación que son necesarios previo a la Recepción Definitiva.</p> <p>En los kms 6,5 y 14,5 se evidencia la presencia de un deslizamiento activo, se solicita con Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2017-1490-ME de fecha 26 de julio de 2017 a Director Distrital del Azuay un estudio integral para solucion definitiva.</p> <p>SE HA CANCELADO PLANILLA DEL MANTENIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES. SIGUE PENDIENTE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA, La Contratista con oficio Nro. DTG-008-2018 de fecha 22 de enero de 2018 presenta propuesta para reparación y remediación, la misma que se solicita el análisis a la Ing. Especialista Geotécnica.</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	02/02/2018 - 02:45 PM
<p>ENERO DE 2017:</p> <p>Con Oficio Nro. MTOP-DDAZ-2017-000486-OF de fecha 27 de noviembre de 2017 se convoca a reunión a la Contratista y realiza inspección a la via para ver los trabajos de remediación y reparación que son necesarios previo a la Recepción Definitiva.</p> <p>En los kms 6,5 y 14,5 se evidencia la presencia de un deslizamiento activo, se solicita con Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2017-1490-ME de fecha 26 de julio de 2017 a Director Distrital del Azuay un estudio integral para solucion definitiva.</p> <p>SE HA CANCELADO PLANILLA DEL MANTENIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES. SIGUE PENDIENTE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA, La Contratista con oficio Nro. DTG-008-2018 de fecha 22 de enero de 2018 presenta propuesta para reparación y remediación, la misma que se solicita el análisis a la Ing. Especialista Geotécnica.</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	02/02/2018 - 02:44 PM
<p>DICIEMBRE DE 2017:</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	02/01/2018 - 03:36 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Con Oficio Nro. MTOP-DDAZ-2017-000486-OF de fecha 27 de noviembre de 2017 se convoca a reunión a la Contratista y realiza inspección a la vía para ver los trabajos de remediación y reparación que son necesarios previo a la Recepción Definitiva.</p> <p>En los kms 6,5 y 14,5 se evidencia la presencia de un deslizamiento activo, se solicita con Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2017-1490-ME de fecha 26 de julio de 2017 a Director Distrital del Azuay un estudio integral para solución definitiva.</p> <p>SE HA CANCELADO PLANILLA DEL MANTENIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES. SIGUE PENDIENTE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA, NO SE RECIBE RESPUESTA DE LA CONTRATISTA CON PROPUESTA PARA REMEDIACION Y REPARACION DE OBSERVACIONES A LA VIA</p>		
<p>NOVIEMBRE 2017:</p> <p>Con Oficio Nro. MTOP-DDAZ-2017-000486-OF de fecha 27 de noviembre de 2017 se convoca a reunión a la Contratista y realiza inspección a la vía para ver los trabajos de remediación y reparación que son necesarios previo a la Recepción Definitiva.</p> <p>En los kms 6,5 y 14,5 se evidencia la presencia de un deslizamiento activo, se solicita con Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2017-1490-ME de fecha 26 de julio de 2017 a Director Distrital del Azuay un estudio integral para solución definitiva.</p> <p>SE HA CANCELADO PLANILLA DEL MANTENIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES. SIGUE PENDIENTE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA, NO SE DEFINE RESPONSABILIDADES SOBRE FRACASO DE LOSAS EN ACCESO A CUMBE</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	01/12/2017 - 12:05 PM
<p>OCTUBRE 2017:</p> <p>Con memorando Memorando Nro. MTOP-EITZ6-2017-228-ME la Ing. Especialista Geotecnia entrega ultimo informe Estructural y Funcional de la vía, el mismo que se hace conocer a la contratista para corregir las observaciones mediante Oficio Nro. MTOP-DDAZ-2017-000299-OF, Se insiste arreglo a observaciones con Oficio Nro. MTOP-DDAZ-2017-000363-OF de fecha 4 de septiembre de 2017.</p> <p>Con oficio No. 00035 C.J. 2017 de fecha 12 de octubre la contratista solicita reunión con técnicos del Ministerio para buscar solución a la observaciones planteadas en el análisis de la evaluación funcional y estructural de la vía, reunión llevada a cabo el día viernes de 20 de octubre donde se concluye que la contratista realizara nuevas pruebas para determinar la macrotextura y en los lugares donde no se cumpla se hara las remediaciones correspondientes.</p> <p>Se realiza visita de campo para verificar los trabajos desarrollado en las losas fracasadas del acceso a Cumbe, en trabajo en general esta bien, pero especialista geotécnica recomienda que el bacheo asfáltico se lo realice en todo el ancho de la calzada por aspectos estéticos principalmente.</p> <p>En los kms 6,5 y 14,5 se evidencia la presencia de un deslizamiento activo, se solicita con Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2017-1490-ME de fecha 26 de julio de 2017 a Director Distrital del Azuay un estudio integral para solución definitiva.</p> <p>SE HA CANCELADO PLANILLA DEL MANTENIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES. SIGUE PENDIENTE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA, NO SE DEFINE RESPONSABILIDADES SOBRE FRACASO DE LOSAS EN ACCESO A CUMBE</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	01/11/2017 - 09:33 AM
<p>SEPTIEMBRE 2017:</p> <p>Con memorando Memorando Nro. MTOP-EITZ6-2017-228-ME la Ing. Especialista Geotecnia entrega ultimo informe Estructural y Funcional de la vía, el mismo que se hace conocer a la contratista para corregir las observaciones mediante Oficio Nro. MTOP-DDAZ-2017-000299-OF, Se insiste arreglo a observaciones con Oficio Nro. MTOP-DDAZ-2017-000363-OF de fecha 4 de septiembre de 2017.</p> <p>En los kms 6,5 y 14,5 se evidencia la presencia de un deslizamiento activo, se solicita con Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2017-1490-ME de fecha 26 de julio de 2017 a Director Distrital del Azuay un estudio integral para solución definitiva.</p> <p>SE HA CANCELADO PLANILLA DEL MANTENIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES. SIGUE PENDIENTE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA, NO SE DEFINE RESPONSABILIDADES SOBRE FRACASO DE LOSAS EN ACCESO A CUMBE</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	02/10/2017 - 04:11 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2017:</p> <p>Con memorando Memorando Nro. MTOP-EITZ6-2017-228-ME la Ing. Especialista Geotecnia entrega ultimo informe Estructural y Funcional de la vía, el mismo que se hace conocer a la contratista para corregir las observaciones mediante Oficio Nro. MTOP-DDAZ-2017-000299-OF</p> <p>En los kms 6,5 y 14,5 se evidencia la presencia de un deslizamiento activo, se solicita con Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2017-1490-ME de fecha 26 de julio de 2017 a Director Distrital del Azuay un estudio integral para solucion definitiva.</p> <p>SE HA TOMADO NÚCLEOS DE VARIOS TRAMOS PARA HACER ENSAYOS DE COMPRESIÓN, SE ESPERA RESULTADOS. SE HA CANCELADO PLANILLA DEL MANTENIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES. SIGUE PENDIENTE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA, NO SE DEFINE RESPONSABILIDADES SOBRE FRACASO DE LOSAS EN ACCESO A CUMBE</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	05/09/2017 - 12:19 PM
<p>JULIO 2017:</p> <p>Con memorando Memorando Nro. MTOP-EITZ6-2017-228-ME la Ing. Especialista Geotecnia entrega ultimo informe Estructural y Funcional de la vía, el mismo que se hace conocer a la contratista para corregir las observaciones mediante Oficio Nro. MTOP-DDAZ-2017-000299-OF</p> <p>En los kms 6,5 y 14,5 se evidencia la presencia de un deslizamiento activo, se solicita inspeccion conjunta con especialistas de la subsecretaria zonal 6, es necesario un estudio integral para solucion definitiva.</p> <p>SE HA TOMADO NÚCLEOS DE VARIOS TRAMOS PARA HACER ENSAYOS DE COMPRESIÓN, SE ESPERA RESULTADOS. SE HA CANCELADO PLANILLA DEL MANTENIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES. SIGUE PENDIENTE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA, NO SE DEFINE RESPONSABILIDADES SOBRE FRACASO DE LOSAS EN ACCESO A CUMBE</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	01/08/2017 - 02:49 PM
<p>JUNIO 2017:</p> <p>SE HA TOMADO NÚCLEOS DE VARIOS TRAMOS PARA HACER ENSAYOS DE COMPRESIÓN, SE ESPERA RESULTADOS. SE HA CANCELADO PLANILLA DEL MANTENIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES. SIGUE PENDIENTE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA, NO SE DEFINE RESPONSABILIDADES SOBRE FRACASO DE LOSAS EN ACCESO A CUMBE</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	03/07/2017 - 04:31 PM
<p>MAYO 2017:</p> <p>SE HA TOMADO NÚCLEOS DE VARIOS TRAMOS PARA HACER ENSAYOS DE COMPRESIÓN, SE ESPERA RESULTADOS. SE HA CANCELADO PLANILLA DEL MANTENIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES. SIGUE PENDIENTE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA, NO SE DEFINE RESPONSABILIDADES SOBRE FRACASO DE LOSAS EN ACCESO A CUMBE</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	05/06/2017 - 02:40 PM
<p>ABRIL 2017:</p> <p>SE HA TOMADO NÚCLEOS DE VARIOS TRAMOS PARA HACER ENSAYOS DE COMPRESIÓN, SE ESPERA RESULTADOS. SE HA CANCELADO PLANILLA DEL MANTENIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES. SIGUE PENDIENTE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA, NO SE DEFINE RESPONSABILIDADES SOBRE FRACASO DE LOSAS EN ACCESO A CUMBE</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	04/05/2017 - 04:23 PM
<p>MARZO 2017:</p> <p>SE HA TOMADO NÚCLEOS DE VARIOS TRAMOS PARA HACER ENSAYOS DE COMPRESIÓN, SE ESPERA RESULTADOS. SE HA CANCELADO PLANILLA DEL MANTENIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES. SIGUE PENDIENTE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA, NO SE DEFINE RESPONSABILIDADES SOBRE FRACASO DE LOSAS EN ACCESO A CUMBE</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	04/04/2017 - 09:18 AM
<p>FEBRERO 2017:</p> <p>SE HA TOMADO NÚCLEOS DE VARIOS TRAMOS PARA HACER ENSAYOS DE COMPRESIÓN, SE ESPERA RESULTADOS. SE HA CANCELADO PLANILLA DEL MANTENIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES. SIGUE PENDIENTE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA,</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	01/03/2017 - 03:05 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO 2017:</p> <p>SE HA TOMADO NÚCLEOS DE VARIOS TRAMOS PARA HACER ENSAYOS DE COMPRESIÓN, SE ESPERA RESULTADOS. SIGUE PENDIENTE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA, SE HA CANCELADO PLANILLA DEL MANTENIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES.</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	05/02/2017 - 11:26 PM
<p>DICIEMBRE 2016:</p> <p>SE HA TOMADO NÚCLEOS DE VARIOS TRAMOS PARA HACER ENSAYOS DE COMPRESIÓN, SE ESPERA RESULTADOS. SIGUE PENDIENTE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA, SE HA CANCELADO PLANILLA DEL MANTENIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES.</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	03/01/2017 - 02:54 PM
<p>NOVIEMBRE 2016:</p> <p>SE HA TOMADO NÚCLEOS DE VARIOS TRAMOS PARA HACER ENSAYOS DE COMPRESIÓN, SE ESPERA RESULTADOS. SIGUE PENDIENTE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA, SE ENCUENTRA PENDIENTE PAGO DE PLANILLAS DEL MANTENIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES, LA CONTRATISTA NO PRESENTAN LAS PLANILLAS</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	02/12/2016 - 04:04 PM
<p>OCTUBRE 2016:</p> <p>Ni contratista ni ETAPA, se responsabilizan del fracaso de las losas en el Cumbe, POR ESTE MOTIVO NO SE PUEDE PROCERDER CON LA RECEPCION DEFINITIVA., se recomienda el Adminstrado del Contrato (Director Provincial del Azuay), se contratar estudio o pronunciamiento de entes de contral, para determinar responsabilidades.</p> <p>SE HA TOMADO NUCLEOS DE VARIOS TRAMOS PARA HACER ENSAYOS DE COMPRESION, SE ESPERA RESULTADOS. SIGUE PENDIENTE LA RECEPCION DEFINITIVA, SE ENCUENTRA PENDDIENTE PAGO DE PLANILLAS DEL MANTENIMIENTO Y LIQUIDACION DE REAJUSTES, LA CONTRATISTA NO PRESENTAN LAS PLANILLAS</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	01/11/2016 - 09:00 PM
<p>SEPTIEMBRE 2016:</p> <p>No se encuentra solucion al problema de las losas fracasadas en el acceso a Cumbe, por lo que no se puede hacer la recepción definitiva.</p> <p>Ni contratista ni ETAPA, se responsabilizan del fracaso de las losas en el Cumbe, POR ESTE MOTIVO NO SE PUEDE PROCERDER CON LA RECEPCION DEFINITIVA., se recomienda el Adminstrado del Contrato (Director Provincial del Azuay), se contratar estudio o pronunciamiento de entes de contral, para determinar responsabilidades.</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	05/10/2016 - 10:41 AM
<p>AGOSTO 2016:</p> <p>Ni contratista ni ETAPA, se responsabilizan del fracaso de las losas en el Cumbe, POR ESTE MOTIVO NO SE PUEDE PROCERDER CON LA RECEPCION DEFINITIVA., se recomienda el Adminstrado del Contrato (Director Provincial del Azuay), se contratar estudio o pronunciamiento de entes de contral, para determinar responsabilidades.</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	02/09/2016 - 04:48 PM
<p>JULIO 2016:</p> <p>Se solicita nuevamente a ETAPA, el expediente del proceso constructivo del alcantarillado en el acceso a Cumbe, a finde determinar causante del deterioro del las losas del acceso y poder proceder con al reccion definitiva. POR ESTE MOTIVO NO SE PUEDE PROCERDER CON LA RECEPCION DEFINITIVA.</p> <p>La contratista ha solicitado la liquidación de los reajuste, luego de la revisión correspondiente se solicita arreglos, arreglos que hasta la fecha no han sido presentados nuevamente. La contratista tambien no presenta la planilla del periodo del mantenimiento.</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	03/08/2016 - 08:58 AM
<p>JUNIO 2016:</p> <p>Se solicita nuevamente a ETAPA, el expediente del proceso constructivo del alcantarillado en el acceso a Cumbe, a finde determinar causante del deterioro del las losas del acceso y poder proceder con al reccion definitiva.</p> <p>La contratista ha solicitado la liquidación de los reajuste, luego de la revisión correspondiente se solicita arreglos, arreglos que hasta la fecha no han sido presentados nuevamente..</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	04/07/2016 - 10:14 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO 2016:</p> <p>El 4 de abril de 2016 se termino la etapa de mantenimiento (4 AÑOS) por parte del Consorcio Vial MANABI (VERDU & HIDALGO & HIDALGO S.A.); la contratista ha solicitado la recepcion definitiva, Se realiza tramites para la recepcion definitiva, no se define el causante de las fallas de las losas en el acceso a Cumbe. Contratista y Etapa deslindan responsabilidades.</p> <p>La contratista ha solicitado la liquidación de los reajuste, luego de la revisión correspondiente se solicita arreglos.</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	06/06/2016 - 09:06 PM
<p>ABRIL 2016:</p> <p>El 4 de abril de 2016 se termino la etapa de mantenimiento (4 AÑOS) por parte del Consorcio Vial MANABI (VERDU & HIDALGO & HIDALGO S.A.); la contratista ha solicitado la recepcion definitiva por lo que al momento esta realizando algunos arreglos solicitados por parte del Ministerio.</p> <p>La contratista ha solicitado la liquidación de los reajuste, luego de la revisión correspondiente se solicita arreglos.</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	04/05/2016 - 10:49 PM
<p>MARZO 2016:</p> <p>El proyecto se encuentra en la etapa de mantenimiento (4 AÑOS) por parte del Consorcio Vial MANABI (VERDU & HIDALGO & HIDALGO S.A.); los trabajos que se vienen ejecutando en la vía son de manera esporadica son : Roza a Mano, limpieza alcantarillas, limpieza de cunetas y encauzamiento a mano, POR CUANTO DURANTE LOS AÑOS DE MANTENIMIENTO NO SE CONTADO CON PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE ESTOS RUBROS YA QUE NO SE HA REALIZADO EL TRAMITE PARA LA INCLUSION EN EL PAI DE ESTE PROYECTO. POR LA ETAPA INVERNAL SE HAN PRODUCIDO PEQUEÑOS DERRUMBES QUE ESTAN SIENDO LIMPIADOS .</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	04/04/2016 - 11:59 AM
<p>FEBRERO 2016:</p> <p>El proyecto se encuentra en la etapa de mantenimiento (4 AÑOS) por parte del Consorcio Vial MANABI (VERDU & HIDALGO & HIDALGO S.A.); los trabajos que se vienen ejecutando en la vía son: Roza a Mano, limpieza alcantarillas, limpieza de cunetas y encauzamiento a mano, POR LA ETAPA INVERNAL SE HAN PRODUCIDO PEQUEÑOS DERRUMBES QUE ESTAN SIENDO LIMPIADOS .</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	01/03/2016 - 04:11 PM
<p>ENERO 2016:</p> <p>El proyecto se encuentra en la etapa de mantenimiento (4 AÑOS) por parte del Consorcio Vial MANABI (VERDU & HIDALGO & HIDALGO S.A.); los trabajos que se vienen ejecutando en la vía son: Roza a Mano, limpieza alcantarillas, limpieza de cunetas y encauzamiento a mano, POR LA ETAPA INVERNAL SE HAN PRODUCIDO PEQUEÑOS DERRUMBES QUE ESTAN SIENDO LIMPIADOS .</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	03/02/2016 - 12:40 PM
<p>DICIEMBRE 2015:</p> <p>El proyecto se encuentra en la etapa de mantenimiento (4 AÑOS) por parte del Consorcio Vial MANABI (VERDU & HIDALGO & HIDALGO S.A.); los trabajos que se vienen ejecutando en la vía son: Roza a Mano, limpieza alcantarillas, limpieza de cunetas y encauzamiento a mano.</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	04/01/2016 - 02:11 PM
<p>NOVIEMBRE 2015:</p> <p>El proyecto se encuentra en mantenimiento (4 AÑOS) por parte del Consorcio Vial MANABI (VERDU & HIDALGO & HIDALGO S.A.); los trabajos que se vienen ejecutando en la vía son: Roza a Mano, limpieza alcantarillas, limpieza de cunetas y encauzamiento a mano.</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	02/12/2015 - 02:58 PM
<p>OCTUBRE 2015:</p> <p>El proyecto se encuentra en mantenimiento por parte del Consorcio Vial MANABI (VERDU & HIDALGO & HIDALGO S.A.); los trabajos que se vienen ejecutando en la vía son: Roza a Mano, limpieza alcantarillas, limpieza de cunetas y encauzamiento a mano.</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	04/11/2015 - 12:20 PM
<p>SEPTIEMBRE 2015:</p> <p>El proyecto se encuentra en mantenimiento por parte del Consorcio Vial MANABI (VERDU & HIDALGO & HIDALGO S.A.); los trabajos que se vienen ejecutando en la vía son: Roza a Mano, limpieza alcantarillas, limpieiza de cunetas y encauzamiento a mano.</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	06/10/2015 - 10:20 AM
<p>AGOSTO 2015:</p> <p>El proyecto se encuentra en mantenimiento por parte del Consorcio Vial MANABI (VERDU & HIDALGO & HIDALGO S.A.); los trabajos que se vienen ejecutando en la vía son limpieza de varios derrumbes provocados por la época invernal que soporta la zona.</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	07/09/2015 - 03:02 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2015: El proyecto se encuentra en mantenimiento por parte del Consorcio Vial Manabí; los trabajos que se vienen ejecutando en la vía son roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarilla, limpieza de varios derrumbes provocados por la época invernal que soporta la zona. (Hito Nro. 17).	Plaza Quintuña, Galo Patricio	06/08/2015 - 02:57 PM
JUNIO 2015: El proyecto se encuentra en mantenimiento por parte del Consorcio Vial Manabí; los trabajos que se vienen ejecutando en la vía son roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarilla, limpieza de varios derrumbes provocados por la época invernal que soporta la zona. (Hito Nro. 17).	Plaza Quintuña, Galo Patricio	06/08/2015 - 02:44 PM
MAYO 2015: El proyecto se encuentra en mantenimiento por parte del Consorcio Vial Manabí; los trabajos que se vienen ejecutando en la vía son roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarilla, limpieza de varios derrumbes provocados por la época invernal que soporta la zona. (Hito Nro. 16).	Ricaurte Valdivieso, María Belen	24/06/2015 - 08:54 AM
ABRIL 2015: El proyecto se encuentra en mantenimiento por parte del Consorcio Vial Manabí; los trabajos que se vienen ejecutando en la vía son roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarilla, limpieza de varios derrumbes provocados por la época invernal que soporta la zona. (Hito Nro. 16).	Alvarez Ordoñez, Cecilia	06/05/2015 - 08:06 AM
MARZO 2015: El proyecto se encuentra en mantenimiento por parte del Consorcio Vial Manabí; los trabajos que se vienen ejecutando en la vía son roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarilla, limpieza de calzada (Hito Nro. 16).	Alvarez Ordoñez, Cecilia	07/04/2015 - 01:28 PM
FEBRERO 2015: Se realiza mantenimiento de la vía; las actividades que se realizan son roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarilla, limpieza de calzada (Hito Nro. 16).	Alvarez Ordoñez, Cecilia	05/03/2015 - 02:11 PM
ENERO 2015: Limpieza de alcantarillas, cunetas, derrumbes y roza a mano; correspondiente al año 3 de mantenimiento (hito 16).	Sánchez Zamora, Iván Patricio	03/02/2015 - 01:34 PM
DICIEMBRE 2014: Limpieza de alcantarillas, cunetas, derrumbes y roza a mano; correspondiente al año 2 de mantenimiento (hito 15).	Sánchez Zamora, Iván Patricio	06/01/2015 - 08:53 AM
NOVIEMBRE 2014: Limpieza de alcantarillas, cunetas y roza a mano; correspondiente al año 2 de mantenimiento (hito 15).	Sánchez Zamora, Iván Patricio	03/12/2014 - 10:30 AM
OCTUBRE 2014: Limpieza de alcantarillas y cunetas; correspondiente al año 2 de mantenimiento (hito 15).	Sánchez Zamora, Iván Patricio	07/11/2014 - 08:40 AM
SEPTIEMBRE DEL 2014: Limpieza de alcantarillas y roza a mano, trabajos correspondientes al mantenimiento de año 2 (hito 15).	Sánchez Zamora, Iván Patricio	07/11/2014 - 08:39 AM
AGOSTO 2014: Mantenimiento rutinario: limpieza de derrumbes, cunetas, roza a mano.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	04/09/2014 - 09:51 AM
JULIO 2014: Mantenimiento rutinario: limpieza de derrumbes, cunetas, roza a mano.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	18/08/2014 - 07:55 AM
JUNIO 2014: Mantenimiento rutinario: limpieza de derrumbes, cunetas, roza a mano.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	01/07/2014 - 02:01 PM
MAYO 2014: Mantenimiento rutinario: limpieza de derrumbes, cunetas, roza a mano.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	01/07/2014 - 02:00 PM
ABRIL 2014: Mantenimiento rutinario: limpieza de derrumbes, cunetas, roza a mano.	Astudillo Calle, Jaime Rolando	15/05/2014 - 10:05 AM
MARZO 2014: HITO N° 15: Las actividades efectuadas son: roza a mano y limpieza de cunetas	Plaza Quintuña, Galo Patricio	01/04/2014 - 12:08 PM
FEBRERO 2014: HITO N° 15: Las actividades efectuadas son: roza a mano y limpieza de cunetas	Plaza Quintuña, Galo Patricio	08/03/2014 - 10:02 AM
ENERO 2014: HITO N° 15: Las actividades efectuadas son: roza a mano y limpieza de cunetas	Plaza Quintuña, Galo Patricio	06/02/2014 - 08:52 AM
DICIEMBRE 2013: Las actividades efectuadas son: roza a mano y limpieza de cunetas; estas actividades corresponden al hito #15.	Astudillo Calle, Jaime Rolando	06/01/2014 - 11:54 AM
NOVIEMBRE 2013: Mantenimiento de la vía se realiza limpieza de la calzada, correspondiente al Hito 15, mantenimiento año 2	Plaza Quintuña, Galo Patricio	07/12/2013 - 06:58 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
OCTUBRE 2013: Mantenimiento de la vía se realiza limpieza de la calzada.	Astudillo Calle, Jaime Rolando	05/11/2013 - 02:23 PM
SEPTIEMBRE 2013: Limpieza de la vía y roza a mano. Se encuentra en la etapa de mantenimiento vial.	Astudillo Calle, Jaime Rolando	04/10/2013 - 08:28 AM
AGOSTO 2013.- Se realiza el mantenimiento de la vía: roza a mano, limpieza de escombros y limpieza de cunetas.	Astudillo Calle, Jaime Rolando	04/09/2013 - 11:09 AM
JULIO 2013: Se encuentra en etapa de mantenimiento, limpieza de cunetas y roza a mano. Reposición de señalización.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/08/2013 - 02:38 PM
JUNIO 2013: Se encuentra en etapa de mantenimiento, limpieza de cunetas y roza a mano. Reposición de señalización.	Astudillo Calle, Jaime Rolando	04/07/2013 - 01:50 PM
MAYO 2013: Se encuentra en etapa de mantenimiento, limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano	Plaza Quintuña, Galo Patricio	03/06/2013 - 11:15 AM
ABRIL 2013: Se encuentra en etapa de mantenimiento, limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano	Plaza Quintuña, Galo Patricio	07/05/2013 - 09:21 AM
Marzo 2013.- Trabajos de mantenimiento: Limpieza de cunetas y roza a mano.	Astudillo Calle, Jaime Rolando	05/04/2013 - 10:03 AM
FEBRERO 2013.- Vía en período de mantenimiento, se realiza trabajos de limpieza de escombros y cunetas ENERO 2013.- Se realiza trabajos de mantenimiento: limpieza de cunetas y roza a mano	Astudillo Calle, Jaime Rolando	05/04/2013 - 10:02 AM
DICIEMBRE 2012: Se realiza trabajos de mantenimiento, limpieza de escombros de la vía y roza a mano. Nota: Los trabajos en los puntos críticos detallados en el comentario anterior corresponden al segundo tramo de la carretera Cumbe - Oña	Soria Novoa, César	07/01/2013 - 11:30 AM
Trabajos en puntos críticos km 72+600 - 75+200 - 75+480 -79+590 y reparaciones de losas previo a la recepción definitiva.	Astudillo Calle, Jaime Rolando	28/12/2012 - 12:31 PM
NOVIEMBRE 2012: Etapa de mantenimiento: limpieza de cunetas, retiro de escombros en la vía, roza a mano OCTUBRE 2012: Etapa de mantenimiento: limpieza de cunetas. SEPTIEMBRE 2012: Etapa de mantenimiento: limpieza de cunetas, retiro de escombros en la vía. AGOSTO 2012: Etapa de mantenimiento: limpieza de cunetas, retiro de escombros en la vía, roza a mano JULIO 2012.Etapa de Mantenimiento (limpieza de escombros de la vía y rosa mano) JUNIO 2012: Etapa de Mantenimiento (limpieza de escombros de la vía y rosa mano) MAYO 2012: Etapa de Mantenimiento (limpieza de escombros de la vía y rosa mano) ABRIL 2012: Se suscribe el acta de recepción provisional el 3 de abril; se empieza etapa de mantenimiento (Limpieza de rosa mano y derrumbes) MARZO 2012: Se realizan los trabajos observados en el mes de febrero, de reparación de losas FEBRERO 2012: Se realiza inspección para constatar los trabajos de reparación de losas ejecutados, se debe completar reparaciones ENERO 2012: El contratista termina los trabajos de limpieza y reparación de losas; solicita la Recepción Provisional DICIEMBRE 2011: Se concluyen los trabajos de pavimentación de los accesos a la parroquia Cumbe, el contratista inicia trabajos de limpieza y reparación de losas previo a la Recepción Provisional. SEPTIEMBRE 2011: Se solucionaron los problemas presentados al mes de junio. Se trabaja en pavimentación de los accesos a la parroquia de Cumbe, se concluyó la señalización con la colocación de tachas reflectivas. JUNIO 2011: Se encuentran concluidos los trabajos de construcción de la vía principal a nivel de capa de rodadura de hormigón hidráulico. Se ha realizado la señalización horizontal y vertical, se complementará la señalización horizontal con colocación de tachas reflectivas.	Soria Novoa, César	20/12/2012 - 09:57 AM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
DEFORMACION DE LA CALZADA	03/09/2018	Juan Carlos Guamán Vícuña	20	20	4	0/1

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Azuay > Oña

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICION:: Anteproyecto aprobado	1-Solicitud de Información	24/07/2007		24/07/2007		Sí	1.0
2	DEFINICION: Aprobación interna, realizada	1-Solicitud de Información	01/12/2007		01/12/2007		Sí	2.0
3	PLANEACION: Presupuesto-Pliegos, aprobados	1-Solicitud de Información	01/03/2008		01/03/2008		Sí	5.0
4	PLANEACION.: Fecha contrato, aprobado	5-Entregables Intermedios	26/06/2008		26/06/2008		Sí	1.0
5	EJECUCION: Anticipo entregado	5-Entregables Intermedios	11/07/2008		11/07/2008		Sí	1.0
6	EJECUCION: Pavimento rígido Vía principal, realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2010		30/11/2010		Sí	70.0
7	EJECUCION: Impactos ambientales, controlado	5-Entregables Intermedios	01/02/2011		01/02/2011		Sí	2.0
8	EJECUCION: Plan Manejo ambiental, aprobado	5-Entregables Intermedios	01/08/2011		01/08/2011		Sí	1.0
9	EJECUCION: Terracería, realizado	5-Entregables Intermedios	01/08/2011		01/08/2011		Sí	2.0
10	EJECUCION: Pavimento rígido Accesos Cumbe, realizado	1-Solicitud de Información	31/10/2011		31/10/2011		Sí	2.0
11	EJECUCION: Señalización, realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2011		31/10/2011		Sí	1.0
12	EJECUCION: Limpieza para Recepción, realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2012		03/04/2012		Sí	2.0
13	CIERRE: Acta de Recepción Provisional, aprobado	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	1.0
14	EJECUCION: Mantenimiento Año 1, realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		31/12/2013		Sí	1.0
15	EJECUCION: Mantenimiento Año 2, realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	1.0
16	EJECUCION: Mantenimiento Año 3, realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.0
17	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, derrumbes.	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.0
18	EJECUCION: Mantenimiento Año 4, realizado	5-Entregables Intermedios	05/04/2016		04/04/2016		Sí	1.0
19	CIERRE: Liquidación proyecto, aprobado	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/01/2017		Sí	2.0
20	COMPLETADO Acta de Recepción Definitiva, aprobado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		02/07/2018		Sí	2.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	ING. XAVIER M. ENDERICA SALGADO	Enderica Salgado, Xavier Mauricio	{PR} - Provincia - AZUAY	30/11/2017
2	Verificación de estado de la obra.	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	02/12/2016
3	Supervisión positiva al cumplimiento del programa en el Azuay	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	20/01/2016
4	Supervisión satisfactoria al estado de la vía y al mantenimiento oportuno que se da.	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	25/06/2015
5	SUPERVISION SATISFACTORIA AL ESTADO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	30/03/2015
6	SUPERVISION SATISFACTORIA AL ESTADO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	30/03/2015
7	Supervisión al funcionamiento del proyecto	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	31/10/2014
8	Verificación de la fase actual de proyecto	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	23/07/2014
9	Supervisión de Proyecto.	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	22/01/2014
10	Supervisión por cierre de la entrega de la Obra.	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	25/10/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	7,610,778.26
Estimado Al Fin Del Proyecto:	24,056,268.49 **
Costo Total:	23,800,000.00
Total Devengado:	24,056,268.49
% Costo Total Devengado:	101.08 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 101.08 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	24,179,236.77	0.00	0.00	24,179,236.77
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	25,017,999.92	0.00	0.00	25,017,999.92
Ppto. Codificado	24,316,293.81	0.00	0.00	24,316,293.81
Ppto. Comprometido	318,268.52	0.00	0.00	318,268.52
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	23,974,469.77	0.00	0.00	23,974,469.77
Ppto. Devengado	24,056,268.49	0.00	0.00	24,056,268.49
Pagado Real	3,582,332.07	0.00	0.00	3,582,332.07
Estimado a fin de año	* 24,056,268.49	0.00	0.00	24,056,268.49
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-81,798.72	0.00	0.00	-81,798.72
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.34 %	0.00 %	0.00 %	100.34 %
Ppto. Codificado 998	25,980.00	0.00	0.00	25,980.00
Ppto. Devengado 998	25,980.00	0.00	0.00	25,980.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018



Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
13	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
14	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
16	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		SITOP_- _Sistema_Integrado_de_Transporte_y_Obras_Publicas.htm	01/03/2013
2	A.10 Informe ejecutivo SITOP, octubre 2014	A.10_Informe_Ejecutivo_mes_de_Octubre_del_2014.pdf	07/11/2014
3	A.11 Informe ejecutivo Noviembre 2014	A.11_Informe_ejecutivo_mes_de_Noviembre.pdf	03/12/2014
4	A.12 Informe ejecutivo Dic 2014	A.12_Informe_ejecutivo_dic_2014_Cumbe_- _La_Jarata.pdf	06/01/2015
5	A.1: Informe ejecutivo SITOP, enero 2014.pdf	A.1_Informe_Ejecutivo_SITOP__Enero_2014.pdf	12/03/2014
6	A.2 Informe ejecutivo SITOP, Febrero 2014	A.2_Informe_Ejecutivo_SITOP__Febrero_2014.pdf	12/03/2014
7	A.3 Informe Ejecutivo SITOP, marzo 2014	A.3_Informe_Ejecutivo_SITOP__marzo_2014.pdf	01/04/2014
8	A.4 Informe Ejecutivo SITOP mes de abril	A.4_Informe_ejecutivo_SITOP__Cumbe_-La_Jarata.pdf	15/05/2014
9	A.5 Informe Ejecutivo SITOP, mayo 2014	A.5_Informe_Ejecutivo_SITOP__mayo_2014__Cumbe_- _La_Jarata.pdf	01/07/2014
10	A.6 Informe Ejecutivo SITOP, junio 2014	A.6_Informe_Ejecutivo_SITOP__junio_2014__Cumbe_- _La_Jarata.pdf	01/07/2014
11	A.7 Informe Ejecutivo SITOP, julio 2014	A.7_Informe_Ejecutivo_SITOP__julio_2014__Cumbe_- _La_Jarata.pdf	04/09/2014
12	A.8 Informe Ejecutivo SITOP, agosto 2014	A.8_Informe_Ejecutivo_SITOP__agosto_2014__Cumbe_- _La_Jarata.pdf	04/09/2014
13	ACTA COMPROMISO PARA REMEDIACION	ACTA_COMPROMISO_PARA_REMEDIACION_CUMBE_LA_OÑA_2010.pdf	04/06/2015
14	Acta Definitiva Evaluación Estructural	ACTA_DEFINITIVA_EVAL_FUNCION_ESTRUCTURAL_FUNCION_CUMBE_OÑA_SARATA.pdf	24/06/2015
15	Acta Justificación de Plazo Cumbe Oña 2010	ACTA_JUSTIFICACION_DE_PLAZO_CUMBE_OÑA_2010.pdf	24/06/2015
16	Acta Justificación de Plazo Cumbe Oña 2011	ACTA_JUSTIFICACION_DE_PLAZO_CUMBE_OÑA_2011.pdf	24/06/2015
17	ACTA RECEPCION DEFINITIVA	ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	04/07/2018
18	ACTA RECEPCION DEFINITIVA calles parroquia Cumbe	ACTA_DE_ENTREGA_RECEPCION_VÍAS_CUMBE.pdf	30/08/2018
19	Acta Recepcion Provisional	ACTA_RECEPCIÓN_PROVISIONAL.pdf	24/06/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
20	Acta recepción Provisional Cumbe - La Jarata	acta_provisional_Cumbe_-_la_Jarata.pdf	23/07/2012
21	Ayuda Memoria	AYUDA_MEMORIA.pdf	24/06/2015
22	B.1 Informe ejecutivo Cumbe - la Jarata Enero 2015	B.1_Informe_ejecutivo_Cumbe_-_la_Jarata_Enero_2015.pdf	03/02/2015
23	B.2 Informe ejecutivo Cumbe - la Jarata - Febrero 2015	B.2_Informe_ejecutivo_Cumbe_-_La_Jarata_Febrero_2015.pdf	06/03/2015
24	B.3 Informe ejecutivo Cumbe - la Jarata Marzo 2015	B.3_Informe_ejecutivo_Cumbe_-_la_Jarata_Marzo_2015.pdf	07/04/2015
25	B.4 Informe ejecutivo Cumbe - la Jarata Abril 2015	B.4_Informe_ejecutivo_Cumbe_-_la_Jarata_Abril_2015.pdf	06/05/2015
26	Contrato Complementario 1	CONTR_COMPLEM_1.pdf	24/06/2015
27	Contrato Complementario 2	CONTR_COMPLEM_2.pdf	24/06/2015
28	Contrato Original	CONTRATO_ORIGINAL.pdf	24/06/2015
29	DICTAMEN DE PRIORIDAD	DICTAMEN_PRIORIDAD.pdf	24/06/2015
30	Estado actual de la via (mayo 2012)	Foto_1.bmp	28/05/2012
31	Evaluación Estructural Contrato Cumbe - Oña	EVALUAC_ESTRUCTU_CONTR_CUMBE_OÑA_SARAGURO.pdf	24/06/2015
32	informe de especialista ambiental	MTOP-SAMZ6-2016-059-ME(entrega_informe_ambiental).pdf	18/04/2016
33	Informe ejecutivio sitop mayo2016	Informe_ejecutivo_mayo2016.pdf	06/06/2016
34	Informe ejecutivo abril2017	Informe_ejecutivo_abril2017.pdf	04/05/2017
35	Informe Ejecutivo Agosto 2015	Informe_SITOP_Agosto_2015_-_Cumbe_-_La_Jarata.pdf	07/09/2015
36	Informe ejecutivo agosto 2017	SITOP_Informe_Ejecutivo_agosto_2017_(Cumbe_Oña).pdf	05/09/2017
37	Informe ejecutivo agosto2016	Informe_ejecutivo_agosto2016.pdf	05/09/2016
38	Informe Ejecutivo correspondiente al mes de Julio SITOP	Informe_ejecutivo_Cumbe_-_La_Jarata_julio_2012.pdf	21/08/2012
39	Informe Ejecutivo correspondiente al mes de Septiembre 2012 SITOP	SITOP-_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2012.pdf	05/10/2012
40	INFORME EJECUTIVO DE LA VIA CUMBE - LA JARARA NOVIEMBRE/2015	INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE2015.pdf	02/12/2015
41	Informe Ejecutivo del mes septiembre_2015	INFOPRME_E_SEPTIEMBRE-2015.pdf	06/10/2015
42	Informe Ejecutivo enero2017	Informe_ejecutivo_enero2017.pdf	05/02/2017
43	Informe ejecutivo febrero2017	Informe_ejecutivo_febrero2017.pdf	01/03/2017
44	Informe ejecutivo julio2016	Informe_ejecutivo_julio2016.pdf	03/08/2016
45	Informe ejecutivo junio2017	Informe_ejecutivo_junio2017.pdf	03/07/2017
46	Informe ejecutivo mayo2017	Informe_ejecutivo_mayo2017.pdf	05/06/2017
47	Informe Ejecutivo mes Octubre SITOP	resumen_ejecutivo_SITOP_Octubre-2012.pdf	31/10/2012
48	Informe ejecutivo noviembre 2016	Informe_ejecutivo_noviembre2016.pdf	02/12/2016
49	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2015 VÍA CUMBE-OÑA TRAMO CUMBE-LA JARATA	IEOCTUBRE2015.pdf	04/11/2015
50	Informe ejecutivo octubre2016	Informe_ejecutivo_octubre2016.pdf	01/11/2016
51	Informe ejecutivo octubre2017	Informe_ejecutivo_octubre2017.pdf	01/11/2017
52	Informe ejecutivo septiembre 2017	Informe_ejecutivo_septiembre2017.pdf	02/10/2017
53	Informe ejecutivo septiembre2016	Informe_ejecutivo_septiembre2016.pdf	05/10/2016
54	Informe Ejecutivo SITOP	Informe_Ejecutivo_enero_2012.pdf	07/02/2012
55	Informe Ejecutivo SITOP Abril 2013	resumen_ejecutivo_Cumbe_-_La_Jarata_Abril_.pdf	08/05/2013
56	INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2018	Informe_ejecutivo_abril2018.pdf	02/05/2018
57	Informe Ejecutivo Sitop abril2016	Informe_ejecutivo_abril2016.pdf	04/05/2016
58	Informe Ejecutivo SITOP Agosto 2013	Informe_ejecutivo_Cumbe_-_La_Jarata_Agosto_2013.pdf	04/09/2013
59	Informe Ejecutivo SITOP Diciembre 2013	Informe_ejecutivo_Cumbe_-_La_Jarata_Diciembre_2013.pdf	06/01/2014
60	Informe Ejecutivo SITOP Diciembre 2012	resumen_ejecutivo_Cumbe_-_La_Jarata_Diciembre.pdf	28/12/2012
61	Informe Ejecutivo Sitop diciembre 2016	Informe_ejecutivo_diciembre2016.pdf	03/01/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
62	INFORME EJECUTIVO SITOP DICIEMBRE 2017	Informe_ejecutivo_diciembre2017.pdf	02/01/2018
63	Informe ejecutivo Sitop Diciembre2015	Informe_ejecutivo_diciembre2015.pdf	04/01/2016
64	Informe Ejecutivo SITOP Enero 2013	Cumbe_-la_Jarata_Enero_2013.pdf	18/02/2013
65	INFORME EJECUTIVO SITOP ENERO 2018	Informe_ejecutivo_enero2018.pdf	05/03/2018
66	informe ejecutivo sitop enero2016	Informe_Ejecutivo_enero2016.pdf	03/02/2016
67	Informe ejecutivo SITOP Febrero 2013	SITOP_- _Sistema_Integrado_de_Transporte_y_Obras_Publicas.htm	01/03/2013
68	INFORME EJECUTIVO SITOP FEBRERO 2018	Informe_ejecutivo_febrero2018.pdf	05/03/2018
69	Informe Ejecutivo Sitop Febrero2016	Informe_ejecutivo_febrero2016.pdf	01/03/2016
70	INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2018	Informe_ejecutivo_julio2018.pdf	01/08/2018
71	Informe Ejecutivo SITOP junio 2013	resumen_ejecutivo_Cumbe_-La_Jarata_junio_2013.pdf	04/07/2013
72	INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2018	Informe_ejecutivo_junio2018.pdf	04/07/2018
73	Informe ejecutivo sitop junio2016	Informe_ejecutivo_junio2016.pdf	04/07/2016
74	Informe Ejecutivo SITOP Marzo 2013	Informe_ejecutivo_Cumbe_-La_Jarata_Marzo_2013.pdf	05/04/2013
75	Informe Ejecutivo Sitop marzo 2017	Informe_ejecutivo_marzo2017.pdf	04/04/2017
76	INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2018	Informe_ejecutivo_marzo2018.pdf	03/04/2018
77	Informe Ejecutivo Sitop marzo2016	Informe_ejecutivo_marzo2016.pdf	04/04/2016
78	INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2018	Informe_ejecutivo_mayo2018.pdf	04/06/2018
79	INFORME EJECUTIVO SITOP NOVIEMBRE2017	Informe_ejecutivo_noviembre2017.pdf	01/12/2017
80	Informe Ejecutivo SITOP Octubre 2013	Informe_ejecutivo_Cumbe_- _La_Jarata_Octubre_2013.pdf	05/11/2013
81	Informe Ejecutivo SITOP Septiembre 2013	Informe_ejecutivo_Cumbe_- _La_Jarata_Septiembre_2013.pdf	04/10/2013
82	informe ejecutivo SITOP, abril 2012	Informe_Ejecutivo_SITOP__abril_2012.pdf	27/08/2012
83	Informe ejecutivo SITOP, abril 2013	Informe_Ejecutivo_Abril_2013__Cumbe-La_Jarata.pdf	07/05/2013
84	Informe ejecutivo SITOP, abril 2013	Informe_Ejecutivo_Abril_2013__Cumbe-La_Jarata.pdf	07/05/2013
85	informe ejecutivo SITOP, agosto 2012	Informe_Ejecutivo_SITOP__Agosto_2012.pdf	14/09/2012
86	informe ejecutivo SITOP, febrero 2012	Informe_ejecutivo_SITOP__febrero_2012.pdf	27/08/2012
87	Informe ejecutivo SITOP, julio 2013	Informe_ejecutivo_SITOP__julio_2013.pdf	05/08/2013
88	Informe ejecutivo SITOP, julio 2015	Informe_ejecutivo_SITOP__julio_2015.pdf	07/08/2015
89	informe ejecutivo SITOP, junio 2012	Informe_ejecutivo_SITOP__junio_2012.pdf	27/08/2012
90	Informe ejecutivo SITOP, junio 2015	Informe_ejecutivo_SITOP__junio_2015.pdf	07/08/2015
91	informe ejecutivo SITOP, marzo 2012	Informe_Ejecutivo_SITOP__marzo_2012.pdf	27/08/2012
92	Informe ejecutivo SITOP, mayo 2013	Informe_ejecutivo_SITOP__mayo_2013.pdf	03/06/2013
93	Informe ejecutivo SITOP, mayo 2015	Informe_ejecutivo_SITOP__mayo_2015.pdf	07/08/2015
94	Informe ejecutivo SITOP, noviembre 2013	Informe_ejecutivo_SITOP__noviembre_2013.pdf	05/12/2013
95	Informe ejecutivo SITOP, septiembre 2014	A.9_Informe_Ejecutivo_Septiembre_del_2014.pdf	07/11/2014
96	INFORME EJECUTVIO DE JULIO 2017	SITOP_Informe_Ejecutivo_Julio_2017_(Cumbe_Oña).pdf	01/08/2017
97	Informe SITOP mayo	AYUDA_MEMORIA.pdf	24/06/2015
98	Informe sobre deslizamiento de especialista Geologia	MTOP-EITZ6-2016-186-ME(_especialista_geologia).pdf	18/04/2016
99	Informe sobre deslizamiento de especialista Geotecnia	MTOP-EITZ6-2016-186-ME(_especialista_geotecnico).pdf	18/04/2016
100	liquidacion de Reajustes	LIQUIDACION_DE_REAJUSTES.pdf	28/03/2017
101	Orden de Cambio 1	ORDEN_CAMBIO_1.pdf	24/06/2015
102	Orden de Cambio 2	ORDEN_CAMBIO_2.pdf	24/06/2015
103	Planilla unica de mantenimiento rutinario	PLANILLA_MANTENIMIENTO_CUMBE-OÑA.pdf	28/03/2017
104	SITOP - Mayo	REPORTE_SITOP_CUMBE_-LA_JARATA.pdf	22/06/2012

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	Administrador	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Azuay	lalban@mtop.gob.ec	
Guamán Vicuña, Juan Carlos	Lider del proyecto	Experto en Infraestructura Provincial	jguaman@mtop.gob.ec	023974600
Quezada Jara, Mónica Fabiola	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretaria Zonal 6	mquezada@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
4873_1.jpg	04/07/2018
