

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 6**  
**Dirección Provincial Azuay**

**PROYECTO: K013** MTOP -Construcción del Intercambiador de Transito en la intersección de la Avenida Gran Colombia, Avenida de las Américas y Avenida Ordoñez Lazo, ubicada en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay

Líder del Proyecto:	Brito Puni, Andrea Valerie (abrito@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Quezada Jara, Mónica Fabiola	Programas Relacionados:	CONSTRUCCION INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA , DE LAS AMERIC, Provincia - Azuay
Titular:	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	5.21
CUP:	175200000.0000.372211	TIR:	67.00 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	16,332.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	5,671,854.48
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	30/08/2011 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	04/09/2018	Fecha de Fin Base:	08/03/2013
Modificado por:	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	Fecha del siguiente Hito:	

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Construcción del Intercambiador de Transito en la intersección de la Avenida Gran Colombia, Avenida de las Américas y Avenida Ordoñez Lazo, ubicada en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay  
 Construcción del intercambiador en el área urbana de la ciudad para mejorar el tráfico vehicular, en este sector de la Av. Américas e intersección de la Av. Gran Colombia y Av. Ordoñez Lazo  
 Contratista, Consorcio Vasquez Andrade  
 Fiscalización: Consorcio CIAR-RHV  
 Monto Contrato Original: 4'264.325,72  
 Contrato Complementario: 1'071.410,50  
 C + % N° 1: 283.952,19  
 Situación Actual: Se ha realizado la recepción definitiva  
 C + % N° 2: 184.926,76  
 Reajuste Definitivo: 97.018,63  
 Fiscalización RHV-CIAR (Original): 248.597,93  
 Fiscalización RHV-CIAR (Complementario): 79.291,61  
 Reajuste Definitivo Fiscalización: 10.884.33  
 Valor Total Invertido: 6'240.407,67

**Beneficios Cualitativos**

Mejora el tráfico vehicular en el área urbana de la ciudad de Cuenca, brindar seguridad en el intercambiador, facilidad de entrada y salida de vehículos que ingresan a la ciudad disminuyendo el tiempo de viaje por el descongestionamiento vehicular que antes se ocasionaba.

**Tipo de Beneficiario**

Habitantes de la Ciudad de Cuenca y turismo tanto nacional como de extranjeros


**Restricciones**

AUDITORÍA AMBIENTAL DEL INTERCAMBIADOR DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO  
 Tiempo: 45 días plazo para el proceso de Consultoría a partir de la entrega del anticipo  
 Costo: USD \$ 20.736,52  
 Alcance: Auditoria Ambiental del Intercambiador de la Av. Ordoñez Lazo  
 Recursos: MTOP - Equipo Técnico Dirección Distrital del Azuay y Subsecretaría Regional 6

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	<b>Cierre</b>	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



**Transcurrido:** 96.57 %  
**Fecha de Inicio:** 30/08/2011    **Fecha de Fin:** 31/12/2018

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO: Se realizan las gestiones correspondientes para proceder al pago de los valores adeudados al Contratista de la Auditoría Ambiental	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	04/09/2018 - 05:21 PM
JULIO 2018: Una vez que el proyecto fue incluido en el PAI 2018, se realizan las gestiones correspondientes para proceder al pago de los valores adeudados al Contratista	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	03/08/2018 - 04:27 PM
JUNIO 2018: Mediante memorando Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2018-774-ME, de fecha 20 de junio de 2018 se informa que mediante Oficio No. SENPLADES-SIP-2018-0486-of del 14 de junio de 2018, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES emite el Dictamen de Inclusión en el PAI 2018 del MTOP del proyecto, se procedera a realizar las gestiones correspondientes para el pago de los valores adeudados.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	05/07/2018 - 04:06 PM
JUNIO 2018:  Con fecha 07 de Noviembre de 2017, mediante oficio S/N, se entrega el producto de la consultoría. Con Oficio Nro. MTOP-CONS_AZU-17-81-OF, de fecha 17 de noviembre de 2017, se informa de la Conformidad emitida por el Ing. Rene Coronel, Fiscalizador de la auditoría. Con fecha 27 de febrero de 2018, se remite la planilla revisada y aprobada por la Fiscalización y Supervisión de la Auditoría para el trámite correspondiente. Con fecha 16 de marzo de 2018, el Administrador realiza el trámite correspondiente para el pago de la planilla. Con fecha 21 de marzo de 2018, el Departamento Financiero indica que no se puede proceder al pago de la planilla, el proyecto no se encuentra en el PAI del presente año. Se ha solicitado la inclusión del proyecto al PAI 2018, se ha enviado la documentación a Planta Central	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	05/07/2018 - 04:00 PM
MAYO 2018:  Con fecha 07 de Noviembre de 2017, mediante oficio S/N, se entrega el producto de la consultoría. Con Oficio Nro. MTOP-CONS_AZU-17-81-OF, de fecha 17 de noviembre de 2017, se informa de la Conformidad emitida por el Ing. Rene Coronel, Fiscalizador de la auditoría. Con fecha 27 de febrero de 2018, se remite la planilla revisada y aprobada por la Fiscalización y Supervisión de la Auditoría para el trámite correspondiente. Con fecha 16 de marzo de 2018, el Administrador realiza el trámite correspondiente para el pago de la planilla.	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	05/06/2018 - 05:18 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Con fecha 21 de marzo de 2018, el Departamento Financiero indica que no se puede proceder al pago de la planilla, el proyecto no se encuentra en el PAI del presente año. Se ha solicitado la inclusión del proyecto al PAI 2018, se ha enviado la documentación a Planta Central</p>		
<p><b>ABRIL 2017:</b></p> <p>Con fecha 07 de Noviembre de 2017, mediante oficio S/N, se entrega el producto de la consultoría. Con Oficio Nro. MTOP-CONS_AZU-17-81-OF, de fecha 17 de noviembre de 2017, se informa de la Conformidad emitida por el Ing. Rene Coronel, Fiscalizador de la auditoría. Con fecha 27 de febrero de 2018, se remite la planilla revisada y aprobada por la Fiscalización y Supervisión de la Auditoría para el trámite correspondiente. Con fecha 16 de marzo de 2018, el Administrador realiza el trámite correspondiente para el pago de la planilla. Con fecha 21 de marzo de 2018, el Departamento Financiero indica que no se puede proceder al pago de la planilla, el proyecto no se encuentra en el PAI del presente año. Se ha solicitado la inclusión del proyecto al PAI 2018, se ha enviado la documentación a Planta Central</p>	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	04/05/2018 - 03:03 PM
<p><b>Marzo 2017:</b></p> <p>Con fecha 07 de Noviembre de 2017, mediante oficio S/N, se entrega el producto de la consultoría. Con Oficio Nro. MTOP-CONS_AZU-17-81-OF, de fecha 17 de noviembre de 2017, se informa de la Conformidad emitida por el Ing. Rene Coronel, Fiscalizador de la auditoría. Con fecha 27 de febrero de 2018, se remite la planilla revisada y aprobada por la Fiscalización y Supervisión de la Auditoría para el trámite correspondiente. Con fecha 16 de marzo de 2018, el Administrador realiza el trámite correspondiente para el pago de la planilla. Con fecha 21 de marzo de 2018, el Departamento Financiero indica que no se puede proceder al pago de la planilla, el proyecto no se encuentra en el PAI del presente año. Se ha solicitado la inclusión del proyecto al PAI 2018, se ha enviado la documentación a Planta Central.</p>	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	05/04/2018 - 02:50 PM
<p><b>Febrero 2017:</b></p> <p>Con fecha 07 de Noviembre de 2017, mediante oficio S/N, se entrega el producto de la consultoría. Con Oficio Nro. MTOP-CONS_AZU-17-81-OF, de fecha 17 de noviembre de 2017, se informa de la Conformidad emitida por el Ing. Rene Coronel, Fiscalizador de la auditoría. Con fecha 27 de febrero de 2018, se presenta la planilla una vez que se han realizado las correcciones, para el trámite correspondiente.</p>	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	05/04/2018 - 02:49 PM
<p><b>Enero 2018:</b></p> <p>Con fecha 07 de Noviembre de 2017, mediante oficio S/N, se entrega el producto de la consultoría. Con Oficio Nro. MTOP-CONS_AZU-17-81-OF, de fecha 17 de noviembre de 2017, se informa de la Conformidad emitida por el Ing. Rene Coronel, Fiscalizador de la auditoría. Se insiste en presentación de planilla con todos los justificativos correspondientes.</p>	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	05/04/2018 - 02:36 PM
<p><b>Diciembre 2017:</b></p> <p>Con fecha 07 de Noviembre de 2017, mediante oficio S/N, se entrega el producto de la consultoría. Con Oficio Nro. MTOP-CONS_AZU-17-81-OF, de fecha 17 de noviembre de 2017, se informa de la Conformidad emitida por el Ing. Rene Coronel, Fiscalizador de la auditoría. Se insiste en presentación de planilla con todos los justificativos correspondientes.</p>	Brito Puni, Andrea Valerie	05/01/2018 - 09:02 PM
<p><b>Noviembre 2017:</b></p> <p>Con fecha 07 de Noviembre de 2017, mediante oficio S/N, se entrega el producto de la consultoría. Con Oficio Nro. MTOP-CONS_AZU-17-81-OF, de fecha 17 de noviembre de 2017, se informa de la Conformidad emitida por el Ing. Rene Coronel, Fiscalizador de la auditoría. Con oficio Oficio Nro. MTOP-CONS_AZU-17-85-OF, de fecha 01 de diciembre de 2017, se informa que se debe solicitar recepción de auditoría, así como la entrega de la planilla de liquidación, para el cierre de la misma.</p>	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/12/2017 - 04:35 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Octubre 2017:</p> <p>Se realizó la inspección en el área de estudio en cual estuvieron presentes todo el equipo de consultoría conjuntamente con el especialista Socio-Ambiental de la Z6. Además se realizaron las encuestas de percepción pública en el área del proyecto por parte del consultor. Se ha realizado la valoración del componente biótico por parte del consultor y posterior procesamiento de la información.</p> <p>A la presente fecha, la consultoría se ha desarrollado en un 90% , ya que se ha procesado toda la información entregada por parte del Ministerio de Transporte y Obras Pública.</p>	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/12/2017 - 04:29 PM
<p>Septiembre de 2017: Con fecha 02 de septiembre de 2017, se ha firmado el contrato con el procedimiento de contratación directa de la CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y CIERRE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR ENTRE LA AV. GRAN COLOMBIA Y DE LAS AMÉRICAS, adjudicado al señor Ing. Diego Fernando Nuñez Vasquez. El monto total de los servicios de consultoría es de \$16.723 más IVA. Con fecha de 04 de octubre, se realizó el pago del anticipo correspondiente al 50% del valor del contrato sin embargo hasta la presente fecha dicho pago no se ha efectivizado por parte del MINFIN. Mediante Memorando N° MTOP-SUBZ6-2017-1185-ME, de fecha 05 de octubre de 2017, se solicitó el cambio de estado a EJECUTADO del proyecto K013.</p>	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/10/2017 - 02:12 PM
<p>AGOSTO 2017:</p> <p>Se inició nuevamente el trámite para el inicio del proceso de contratación. Se elaboró y subió documentación del nuevo proceso al Portal de Compras Públicas.</p>	Brito Puni, Andrea Valerie	11/09/2017 - 10:06 PM
<p>JULIO 2017:</p> <p>Debido a la Declaración del Proceso Desierto, se inició nuevamente el trámite para el inicio del proceso de contratación. se elabora documentación para el lanzamiento del proceso en el Portal de Compras Públicas.</p>	Brito Puni, Andrea Valerie	04/08/2017 - 07:20 PM
<p>JUNIO 2017:</p> <p>DECLARACIÓN DESIERTA, EN CONSIDERACIÓN DE QUE LA OFERTA PRESENTADA NO CUMPLE CON LO REQUERIDO; UNA VEZ DECLARADO DESIERTO, SE PROCEDERÁ CON LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO.</p>	Brito Puni, Andrea Valerie	05/07/2017 - 04:02 PM
<p>MAYO 2017</p> <p>Proyecto incluido en el PAI 2017, se cuenta con recursos para la contratación de la Auditoria Ambiental, en proceso de revisión TdRs para elaboración de pliegos por parte de la Dirección Distrital del Azuay</p>	Brito Puni, Andrea Valerie	05/06/2017 - 05:06 PM
<p>ABRIL 2017</p> <p>Proyecto incluido en el PAI 2017, se cuenta con recursos para la contratación de la Auditoria Ambiental, en proceso de revisión TdRs para elaboración de pliegos por parte de la Dirección Distrital del Azuay</p>	Cordero Figueroa, Pablo Antonio	05/05/2017 - 12:51 PM
<p>NOVIEMBRE 2013: Se legaliza el acta de recepción definitiva de la obra al Consorcio Vazquez-Andrade. Se legaliza y aprueba el Acta de Recepción Única de la Fiscalización por los servicio prestados por el Consorcio RHV y CIAR, una vez que se aprobó el informe final y los planos As built.. Hito 15: Recepción definitiva</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/12/2013 - 03:41 PM
<p>OCTUBRE 2013: Se realiza la recepción definitiva de la obra al Consorcio Vazquez-Andrade. Se legaliza y aprueba el Acta de Recepción Única de la Fiscalización por los servicio prestados por el Consorcio RHV y CIAR, una vez que se aprobó el informe final y los planos As built.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	06/11/2013 - 04:01 PM
<p>JULIO 2013: Se realiza observaciones al contratista para arreglos de la calzada, para dar el informe favorable a la Recepción Definitiva, que solicita el Contratista.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/08/2013 - 03:03 PM
<p>MAYO 2013: Se realiza la limpieza de la obra para solicitar la Recepción Definitiva</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	03/06/2013 - 11:44 AM
	Bonilla Ochoa, René Marcelo	20/05/2013 - 12:14 PM
<p>ABRIL 2013: Se realiza la limpieza de la obra para solicitar la Recepción Definitiva</p> <p>MARZO 2013: Para la Recepción Definitiva se limpia y se arregla la señalización horizontal al igual que se realiza bacheos pequeños.</p> <p>FEBRERO 2013: Se insiste a la fiscalización RHV-CIAR entregar los planos finales para proceder a suscribir la correspondiente Acta de recepción por parte de los delegados, por tal motivo está pendiente el pago de la última planilla de reajuste definitivo por los servicios prestados de fiscalización.</p>	Bonilla Ochoa, René Marcelo	20/05/2013 - 12:12 PM
<p>ENERO 2013: Esta supervisión exige a la fiscalización la entrega de los planos finales (ASBUILT) que falta en el informe final, para dar por terminado el contrato de fiscalización con la firma</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	28/02/2013 - 12:05 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>del Acta respectiva la misma que el Subsecretario nombro la comisión de recepción para la suscripción de la misma.</p> <p>DICIEMBRE 2012: Se ha suscrito el Acta de Recepción Provisional. La Fiscalización RHV-CIAR, ha presentado la planilla de reajuste definitivos de los servicios prestados y prepara el Informe Final y la Acta de la Entrega Recepción del Contrato de Fiscalización, por lo tanto este mes será el último informe ejecutivo que ingresa la Fiscalización.</p> <p>NOVIEMBRE 2012: Se tramita planillas de Reajuste Definitivo de los contratos y la Orden de Trabajo N° 2, esta en proceso de la firma de la Acta Recepción Provisional, la Fiscalización contratada RHV y CIAR prepara Informe Final y la acta de terminación correspondiente. L a constructora Vásquez- Andrade, realiza el mantenimiento de la obra hasta que se realice la Recepción Definitiva.</p> <p>OCTUBRE 2012: Se tramito la planilla N° 11 de liquidación de los trabajos, se prepara la planilla de reajustes definitivos, la Fiscalización contratada RHV y CIAR prepara la planilla ultima y el informe final con los documentos de la evaluación funcional y estructural del pavimento, también la auditoria de seguridad vial y de los avances logrados durante la ejecución de los trabajos, grado de cumplimiento de construcción, resumen de los costos incurridos y planos As Built, etc.</p> <p>SEPTIEMBRE 2012: Los trabajos fueron terminados dentro del plazo que contempla el contrato, se realizo la inauguración de la obra el 17 de septiembre del 2012. El informe del STOP de este mes es provisional hasta que se tenga la planilla liquidación última de obra y económica, la miasma que se esta preparando luego de la Recepción Provisional que se realizo el 03 de octubre del 2012.</p> <p>AGOSTO 2012: Se está revisando la planilla N° 9 por el mes de agosto, Previa la ultima de liquidación</p> <p>JULIO 2012: Se ha dado trámite a la planilla Nro. 8 por el mes de julio, se legaliza el acta de la delegación para el Contrato Completaría. Se ha enviado los informes que la CAF solicito para realizar el respectivo desembolso de los recursos necesarios para la terminación de la obra.</p> <p>JUNIO 2012: Se está preparando planilla Nro. 7 por el mes de junio, además el Contratista solicita un Contrato Completaría por incremento y disminución de cantidades y rubros nuevos por un valor aproximado de USD. 1´360168,34, sin ampliación de plazos.</p> <p>MAYO 2012: Los trabajos están con un buen avance, se tramita un Contrato Complementario por disminución y aumento de cantidades y rubros nuevos. Se realiza cambios en los carriles que está proyectado pase el Tranvía, en coordinación con la Municipalidad de Cuenca.</p> <p>ABRIL 2012: En este mes se ha realizado toda la colocación de las vigas del paso elevado y se ha fundido el tablero en las 2/3 partes, se termina los muros del paso deprimido, el avance físico estimado hasta abril es de un 67%. Se pide e la Constructora y Fiscalización que prepare las cantidades y valores que aumentan o disminuyen para realizar el respectivo tramite.</p> <p>MARZO 2012: Los trabajos se encuentran con un avance acumulado del 50%, se continúa con el lanzamiento de las vigas sobre el paso deprimido.</p> <p>FEBRERO 2012: Se tiene un avance acumulado del 27.77% versus lo programado de 3.94% para el mes de febrero. Se tramita la planilla Nro. 3 de febrero.</p> <p>ENERO 2012: Se ha tramitado la planilla N° 1, se continua con los trabajos según el cronograma, se prepara planilla N° 2 por el mes de enero 2012, para la revisión de la fiscalización contratada a cargo del Consorcio RHV y CIAR.</p> <p>DICIEMBRE 2011: Se inicia la ejecución de la obra el 13 de diciembre una vez notificado la entrega de USD. 1´ 279.297,72 (30%) como anticipo.</p>		

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Azuay > Cuenca

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Definición	1-Solicitud de Información	30/08/2011		16/09/2011		Sí	2.0
2	Planificación	2-Publicación de Pliegos	17/09/2011		31/10/2011		Sí	2.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
3	Contratación	3-Adjudicación	01/11/2011		01/12/2011		Sí	4.0
4	Fecha entrega anticipo	4-Inicio de Trabajo	13/12/2011		13/12/2011		Sí	1.0
5	Movimiento de tierras terminados	5-Entregables Intermedios	30/04/2012		30/04/2012		Sí	6.0
6	Sistema telefónico terminados	1-Solicitud de Información	31/07/2012		31/07/2012		Sí	3.0
7	Obras Hidrosanitarias terminados	1-Solicitud de Información	31/08/2012		01/08/2012		Sí	5.0
8	Sistema de Iluminación terminados	5-Entregables Intermedios	31/08/2012		31/08/2012		Sí	8.0
9	Calzada terminados	5-Entregables Intermedios	07/09/2012		07/09/2012		Sí	25.0
10	Impacto ambiental terminados	5-Entregables Intermedios	07/09/2012		07/09/2012		Sí	2.0
11	Infraestructura y Superestructura terminados	1-Solicitud de Información	07/09/2012		31/05/2012		Sí	27.0
12	Recepcion provisional	9-Entregables Formales	03/10/2012		03/10/2012		Sí	3.0
13	Fiscalización a cargo del Consorcio RHV y CIAR	9-Entregables Formales	08/10/2012		08/10/2012		Sí	5.0
14	Acta de Liquidación	5-Entregables Intermedios	17/10/2012		24/10/2013		Sí	7.0
15	Recepción Definitiva	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	08/03/2013		04/10/2013		Sí	0.0

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	ING. XAVIER M. ENDERICA SALGADO	Enderica Salgado, Xavier Mauricio	{PR} - Provincia - AZUAY	22/11/2017
2	Verificación obra concluida	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	25/10/2013
3	Verificación de Proyecto con la entrega Definitiva.	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	24/07/2013

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Numero de informes técnicos de control de obra.		100.00 %	1	1	01/01/2017	Ene-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	1,316,587.40
Estimado Al Fin Del Proyecto:	5,671,854.48 **
Costo Total:	5,671,854.48
Total Devengado:	5,689,256.77
% Costo Total Devengado:	100.31 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 100.31 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	5,544,372.30	0.00	0.00	5,544,372.30
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	3,233,625.93	0.00	0.00	3,233,625.93
Ppto. Codificado	5,356,472.82	20,602.74	0.00	5,377,075.56
Ppto. Comprometido	16,723.00	17,402.29	0.00	34,125.29
Planeado - Codificado (2018)		-20,602.74		
Programado a Devengar	5,520,736.30	0.00	0.00	5,520,736.30
Ppto. Devengado	5,671,854.48	17,402.29	0.00	5,689,256.77
Pagado Real	0.00	1,864.53	0.00	1,864.53
Estimado a fin de año	* 5,671,854.48	0.00	0.00	5,671,854.48
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-151,118.18	0.00	0.00	-151,118.18
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 102.74 %	-	0.00 %	103.05 %
Ppto. Codificado 998	0.00	8,361.50	0.00	8,361.50
Ppto. Devengado 998	0.00	8,361.50	0.00	8,361.50

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

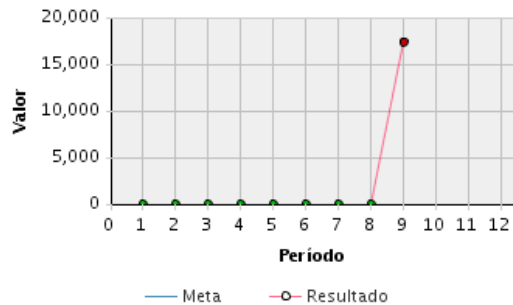

Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	100.00 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Sep	0.00	17,402.29	0.00	17,402.29	115.00 %		115.00 %
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>17,402.29</b>					

## OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
13	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
14	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
16	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta de Entrega Recepción Única de fa Fiscalización del proyecto	ACTA_DE_ENTREGA_RESEPCIÓN_ÚNICA.pdf	04/10/2013
2	Acta Definitiva	Acta_Definitiva_Ordóñez_Lazo.pdf	12/11/2013
3	ACTA RECEPCION PROVISIONAL INTERCAMBIADOR	ACTA_RECEPCION_PROVISIONAL_INTERCAMBIADOR.pdf	10/01/2013
4	Archivo fotográfico de la obra	Fotor_Intercambiador_Av_Ordóñez_Lazo_y_Américas_1.pdf	07/11/2012
5	Conformidad de la auditoría	MTOP-CONS_AZU-17-81-OF.pdf_(conformidad_de_auditoría).pdf	05/12/2017
6	Contrato Complementario Fiscalización del Intercambiador	Contrato_Complementario_FISCALIZACIÓN.pdf	17/09/2012
7	Contrato Complementario Intercambiador	cont._complementario_intercambiador.pdf	31/08/2012
8	Contrato de Auditoría de Cierre Ambiental	Contrato_Auditoría_de_cierre.pdf	05/10/2017
9	DICTAMEN DE INCLUSIÓN FAVORABLE	DICTAMEN_FAVORABLE.pdf	05/07/2018
10	Entrega de planilla y solicitud de Entrega-Recepción	planilla_unica_01_de_liquidacion.pdf	05/12/2017
11	Informe de Avance de Auditoría	informe_de_avance_de_auditoria.pdf	01/11/2017
12	Informe Ejecutivo Fiscalización SITOP mes mayo 2013	SITOP_mayo_2013_Fis.pdf	05/06/2013
13	Informe Ejecutivo SITOP mes abril 2013	SITOP_abril_2013.pdf	02/05/2013
14	Informe Ejecutivo SITOP mes agosto 2013	SITOP_agosto_2013.pdf	03/09/2013
15	Informe Ejecutivo SITOP mes diciembre 2012	SITOP_diciembre_2012.pdf	10/01/2013
16	Informe Ejecutivo SITOP mes enero 2012	GestionReporteFN_mes_de_enero_2012.pdf	22/02/2012
17	Informe Ejecutivo SITOP mes enero 2013	SITOP_enero_2013.pdf	14/02/2013
18	Informe Ejecutivo SITOP mes febrero 2012	SITOP_febrero_2012.pdf	13/03/2012



## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
19	Informe Ejecutivo SITOP mes febrero 2013	SITOP_febrero_2013.pdf	01/03/2013
20	Informe Ejecutivo SITOP mes julio 2012	SITOP_julio_2012.pdf	20/08/2012
21	Informe Ejecutivo SITOP mes junio 2012	SITOP_junio_2012.pdf	17/07/2012
22	Informe Ejecutivo SITOP mes junio 2013	SITOP_junio_2013.pdf	03/07/2013
23	Informe Ejecutivo SITOP mes marzo 2012	SITOP_marzo_2012.pdf	17/04/2012
24	Informe Ejecutivo SITOP mes marzo 2013	SITOP_marzo_2013.pdf	02/04/2013
25	Informe Ejecutivo SITOP mes mayo 2012	SITOP_mayo_2012.pdf	13/06/2012
26	Informe Ejecutivo SITOP mes mayo 2013	SITOP_mayo_2013.pdf	05/06/2013
27	Informe Ejecutivo SITOP mes noviembre 2012	SITOP_noviembre_2012.pdf	20/12/2012
28	Informe Ejecutivo SITOP mes octubre 2012	SITOP_octubre_2012.pdf	19/11/2012
29	Informe Ejecutivo SITOP mes septiembre 2012	SITOP_septiembre_2012.pdf	31/10/2012
30	Informe Ejecutivo SITOP mes septiembre 2013	SITOP_septiembre_2013.pdf	04/10/2013
31	informe ejecutivo SITOP, agosto 2012	Informe_ejecutivo_SITOP__agosto_2012.pdf	14/09/2012
32	Informe ejecutivo SITOP, julio 2013	Informe_ejecutivo_SITOP__julio_2013.pdf	05/08/2013
33	Informe ejecutivo SITOP, octubre 2013	Informe_ejecutivo_SITOP__octubre_2013.pdf	06/11/2013
34	Informe semanal correspondiente al 30 de marzo 2012	INFORME_30_MARZO.doc	17/04/2012
35	Orden de Trabajo (Costo más porcentaje)	ORDEN_DE_TRABAJO_INTERCAMBIADOR.pdf	31/08/2012
36	Orden de Trabajo N° 2 Autorizado	Oficio_Nº_014_Autorización_Orden_de_Trabajo_Nº_2.pdf	17/12/2012
37	Producto de la Consultoría	producto_de_consultoria.pdf	05/12/2017
38	Proyecto Priorizado SENPLADES	PROYECTO_INTERCAMBIADOR_DE_TRANSITO_PROV. AZUAY	30/07/2012
39	Revisión y Aprobación del Informe de Avance de Auditoría	MTOP-SAMZ6-2017-190-ME_(aprobacion_del_informe_de_avance).pdf	01/11/2017
40	Solicitud de cambio de estado a EJECUCIÓN	MTOP-SUBZ6-2017-1185-ME.pdf	05/10/2017
41	Solicitud de Recepción de auditoría	MTOP-CONS_AZU-17-85-OF.pdf(solicitud_de_recepcion).pdf	05/12/2017

## EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	Administrador	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Azuay	lalban@mtop.gob.ec	
Quezada Jara, Mónica Fabiola	Patrocinador	Subsecretaria Zonal 6	mquezada@mtop.gob.ec	023974600

## FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
5149_1.jpg	01/11/2017
