

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 3

Dirección Provincial Chimborazo

PROYECTO: K015 MTOP - Rehabilitación C Huigra Piedreros

Líder del Proyecto:	Horna Sanipatín, Wilson (whorna@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Gamboa López, Enma Katherine	Programas Relacionados:	Provincia - Chimborazo, REHABILITACION C. HUIGRA - PIEDREROS, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.21.3438	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	13,295,724.81
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2012 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	03/09/2018	Fecha de Fin Base:	30/07/2015
Modificado por:	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2018

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Rehabilitación de la carretera Huigra - Piedreros
 Contratista: China Road Bridge Corporation
 Los trabajos inician a partir del octavo mes de la firma del contrato.

MONTO: 10.287.400,24 USD

PRODUCTO/SERVICIO:

Los habitantes de la zona de influencia del proyecto serán los beneficiarios directos, con una vía de 72km pavimentado, transitable todos los meses del año
 Los costos de operación y transporte se reducirán así como los tiempos de viaje que permitirá mejorar las condiciones para implementar el turismo nacional y extranjero, fomentar el desarrollo empresarial y micro empresarial.

LINEA BASE: Al cumplir la vida útil el asfalto se encontraba en malas condiciones lo que generaba problemas de tráfico.

OBJETIVO GENERAL: Rehabilitar la vía Huigra - Piedrero mediante la implementación de obras de infraestructura vial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Implementar obras complementarias que permitan facilitar el tráfico vehicular y proporcionar seguridad al tránsito vehicular y peatonal.
 Contar con un plan de manejo ambiental que permita mitigar el impacto en la ejecución de proyectos.
 Dotar de un sistema de señalización acorde a las especificaciones técnicas del MTOP e INEN, mediante la aplicación de señalética horizontal y vertical que permita a los usuarios de las vías el uso adecuado de las mismas.

Beneficios Cualitativos

Seguridad vial
 Protección a la inversión pública
 Los costos de operación y transporte se reducirán así como los tiempos de viaje que permitirá mejorar las condiciones para implementar el turismo nacional y extranjero, fomentar el desarrollo empresarial y micro empresarial

Tipo de Beneficiario

Ciudadanía que transita por la carretera, usuarios de la vía y transportistas.
 Comerciantes
 Turistas


Restricciones

Condiciones climáticas
Asignación de recursos económicos

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución **Cierre** Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 96.40 %
Fecha de Inicio: 01/01/2012 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2018: La obra terminada, actualmente cuenta con acta de recepción provisional; se encuentra pendiente devolución económica y el acta de recepción definitiva, la cual se firmará una vez que el contratista efectúe el mantenimiento a la carretera de acuerdo a las cláusulas del contrato; además una devolución económica por parte de la empresa constructora China Road Bridge Corporation, monto pendiente por devengar .</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/09/2018 - 05:10 PM
<p>JULIO 2018: La obra terminada, actualmente cuenta con acta de recepción provisional; se encuentra pendiente devolución económica y el acta de recepción definitiva, la cual se firmará una vez que el contratista efectúe el mantenimiento a la carretera de acuerdo a las cláusulas del contrato; además una devolución económica por parte de la empresa constructora China Road Bridge Corporation, monto pendiente por devengar</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	02/08/2018 - 11:08 AM
<p>JUNIO 2018: La obra terminada, actualmente cuenta con acta de recepción provisional; se encuentra pendiente devolución económica y el acta de recepción definitiva, la cual se firmará una vez que el contratista efectúe el mantenimiento a la carretera de acuerdo a las cláusulas del contrato; además una devolución económica por parte de la empresa constructora China Road Bridge Corporation, monto pendiente por devengar</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	04/07/2018 - 11:40 AM
<p>MAYO 2018: La obra terminada, actualmente cuenta con acta de recepción provisional; se encuentra pendiente devolución económica y el acta de recepción definitiva, la cual se firmará una vez que el contratista efectúe el mantenimiento a la carretera de acuerdo a las cláusulas del contrato; además una devolución económica por parte de la empresa constructora China Road Bridge Corporation, monto pendiente por devengar</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	04/06/2018 - 09:23 AM
<p>ABRIL 2018: La obra terminada, actualmente cuenta con acta de recepción provisional; se encuentra pendiente devolución económica y el acta de recepción definitiva, la cual se firmará una vez que</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/05/2018 - 09:30 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
el contratista efectúe el mantenimiento a la carretera de acuerdo a las cláusulas del contrato; además una devolución económica por parte de la empresa constructora China Road Bridge Corporation, monto pendiente por devengar		
<p>MARZO 2018: La obra terminada, actualmente cuenta con acta de recepción provisional; se encuentra pendiente devolución económica y el acta de recepción definitiva, la cual se firmará una vez que el contratista efectúe el mantenimiento a la carretera de acuerdo a las cláusulas del contrato; además una devolución económica por parte de la empresa constructora China Road Bridge Corporation, monto pendiente por devengar</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/04/2018 - 11:26 AM
<p>FEBRERO 2018: La obra terminada, actualmente cuenta con acta de recepción provisional; se encuentra pendiente devolución económica y el acta de recepción definitiva, la cual se firmará una vez que el contratista efectúe el mantenimiento a la carretera de acuerdo a las cláusulas del contrato; además una devolución económica por parte de la empresa constructora China Road Bridge Corporation, monto pendiente por devengar</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/03/2018 - 03:29 PM
<p>ENERO 2018: La obra terminada, actualmente cuenta con acta de recepción provisional; se encuentra pendiente devolución económica y el acta de recepción definitiva, la cual se firmará una vez que el contratista efectúe el mantenimiento a la carretera de acuerdo a las cláusulas del contrato; además una devolución económica por parte de la empresa constructora China Road Bridge Corporation, monto pendiente por devengar</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/03/2018 - 03:28 PM
<p>DICIEMBRE 2017: La obra terminada, actualmente cuenta con acta de recepción provisional; se encuentra pendiente devolución económica y el acta de recepción definitiva, la cual se firmará una vez que el contratista efectúe el mantenimiento a la carretera de acuerdo a las cláusulas del contrato; además una devolución económica por parte de la empresa constructora China Road Bridge Corporation, monto pendiente por devengar</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/01/2018 - 10:50 AM
<p>NOVIEMBRE 2017: La obra terminada, actualmente cuenta con acta de recepción provisional; se encuentra pendiente devolución económica y el acta de recepción definitiva, la cual se firmará una vez que el contratista efectúe el mantenimiento a la carretera de acuerdo a las cláusulas del contrato; además una devolución económica por parte de la empresa constructora China Road Bridge Corporation, monto pendiente por devengar</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	04/12/2017 - 11:24 AM
<p>OCTUBRE 2017: La obra terminada, actualmente cuenta con acta de recepción provisional; se encuentra pendiente devolución económica y el acta de recepción definitiva, la cual se firmará una vez que el contratista efectúe el mantenimiento a la carretera de acuerdo a las cláusulas del contrato; además una devolución económica por parte de la empresa constructora China Road Bridge Corporation, monto pendiente por devengar.</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/11/2017 - 10:19 AM
<p>SEPTIEMBRE 2017: La obra terminada, actualmente cuenta con acta de recepción provisional; se encuentra pendiente devolución económica y el acta de recepción definitiva, la cual se firmará una vez que el contratista efectúe el mantenimiento a la carretera de acuerdo a las cláusulas del contrato; además una devolución económica por parte de la empresa constructora China Road Bridge Corporation, monto pendiente por devengar.</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	04/10/2017 - 03:24 PM
<p>AGOSTO 2017: CAUSAS: La obra se encuentra ejecutada y en la actualidad cuenta con acta de recepción provisional; se encuentra pendiente devolución económica y el acta de recepción definitiva. ACCIONES: es necesario para la recepción definitiva que el contratista efectúe el mantenimiento a la carretera de acuerdo a las cláusulas del contrato; además una devolución económica por parte de la empresa constructora china road bridge corporation, monto a devengar para la realización de la recepción definitiva.</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/09/2017 - 02:02 PM
<p>JULIO 2017: CAUSAS: La obra se encuentra ejecutada y en la actualidad cuenta con acta de recepción provisional; se encuentra pendiente devolución económica y el acta de recepción definitiva. ACCIONES: es necesario para la recepción definitiva que el contratista efectúe el mantenimiento a la carretera de acuerdo a las cláusulas del contrato; además una devolución económica por parte de la empresa constructora china road bridge corporation, monto a devengar para la realización de la recepción definitiva.</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/08/2017 - 04:47 PM
<p>JUNIO 2017: OBRA EJECUTADA QUE EN LA ACTUALIDAD CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL.</p>	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/07/2017 - 09:35 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ES NECESARIO PARA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA QUE EL CONTRATISTA EFECTÚE EL MANTENIMIENTO A LA CARRETERA. DE ACUERDO AL CONTRATO.		
MAYO 2017: La obra se encuentra con recepción parcial provisional. Pendiente mantenimiento a efectuarse por el contratista, de acuerdo al contrato, hasta la recepción definitiva.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/06/2017 - 03:38 PM
ABRIL 2017: La obra se encuentra con recepción parcial provisional. Pendiente mantenimiento a efectuarse por el contratista, de acuerdo al contrato, hasta la recepción definitiva.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/05/2017 - 10:39 AM
MARZO 2017: La obra se encuentra con recepción parcial provisional. Pendiente mantenimiento a efectuarse por el contratista, de acuerdo al contrato, hasta la recepción definitiva.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/04/2017 - 11:06 AM
FEBRERO 2017: Obra terminada pero en espera de reparaciones por parte del contratista enviadas mediante oficio 175-INECO-HUIGRA y 180-INECO-HUIGRA. Estabilización de taludes no contemplados en el proyecto. Pendiente pago de planillas de Liquidación del CO y Liquidación del CC.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/03/2017 - 12:49 AM
ENERO 2017: Obra ejecutada. Se ha solicitado la recepción provisional de las obras pero se necesita reparación de baches por parte del contratista. El proyecto parte del macrocontrato, se encuentra suspendido a partir del 20 de Noviembre de 2015 por autorización del Administrador.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	31/01/2017 - 04:03 PM
DICIEMBRE 2016: Obra ejecutada. Se ha solicitado la recepción provisional de las obras pero se necesita reparación de baches por parte del contratista. El proyecto parte del macrocontrato, se encuentra suspendido a partir del 20 de Noviembre de 2015 por autorización del Administrador.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/01/2017 - 09:48 AM
NOVIEMBRE 2016: Obra ejecutada. Se ha solicitado la recepción provisional de las obras pero se necesita reparación de baches por parte del contratista. El proyecto parte del macrocontrato, se encuentra suspendido a partir del 20 de Noviembre de 2015 por autorización del Administrador.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/12/2016 - 05:36 PM
OCTUBRE. 2016 La contratista China Road Bridge Corporation, terminó la rehabilitación de la vía, no se devengó la totalidad del anticipo y no se realiza la Recepción Provisional porque se debe realizar el bacheo en algunos tramos de la vía.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	01/11/2016 - 04:38 PM
SEPTIEMBRE. 2016 La contratista China Road Bridge Corporation, terminó la rehabilitación de la vía, no se devengó la totalidad del anticipo y no se realiza la Recepción Provisional porque se debe realizar el bacheo en algunos tramos de la vía.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/10/2016 - 01:20 PM
AGOSTO. 2016 La contratista China Road Bridge Corporation, terminó la rehabilitación de la vía, no se devengó la totalidad del anticipo y no se realiza la Recepción Provisional porque se debe realizar el bacheo en algunos tramos de la vía.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	01/09/2016 - 07:51 AM
JULIO. 2016 La contratista China Road Bridge Corporation, terminó la rehabilitación de la vía, no se devengó la totalidad del anticipo y no se realiza la Recepción Provisional porque se debe realizar el bacheo en algunos tramos de la vía.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/08/2016 - 02:47 PM
JUNIO. 2016 La contratista China Road Bridge Corporation, terminó la rehabilitación de la vía, no se devengó la totalidad del anticipo y no se realiza la Recepción Provisional porque se debe realizar el bacheo en algunos tramos de la vía.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/07/2016 - 07:37 AM
MAYO. 2016 La contratista China Road Bridge Corporation, terminó la rehabilitación de la vía, no se devengó la totalidad del anticipo y no se realiza la Recepción Provisional porque se debe realizar el bacheo en algunos tramos de la vía.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/06/2016 - 12:21 PM
ABRIL 2016: La contratista China Road Bridge Corporation, terminó la rehabilitación de la vía, no se devengó la totalidad del anticipo y no se realiza la Recepción Provisional porque se debe realizar el bacheo en algunos tramos de la vía.	Paula López, Ricardo Octavio	09/05/2016 - 02:34 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MARZO 2016: La contratista China Road Bridge Corporation, terminó la rehabilitación de la vía, no se devengó la totalidad del anticipo y no se realiza la Recepción Provisional porque se debe realizar el bacheo en algunos tramos de la vía.	Paula López, Ricardo Octavio	08/04/2016 - 12:06 PM
FEBRERO 2016: La contratista China Road Bridge Corporation, terminó la rehabilitación de la vía, no se devengó la totalidad del anticipo y no se realiza la Recepción Provisional porque se debe realizar el bacheo en algunos tramos de la vía.	Paula López, Ricardo Octavio	09/03/2016 - 11:41 PM
ENERO 2016: La contratista China Road Bridge Corporation, terminó la rehabilitación de la vía, no se devengó la totalidad del anticipo y no se realiza la Recepción Provisional porque se debe realizar el bacheo en algunos tramos de la vía.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	10/02/2016 - 10:07 AM
DICIEMBRE 2015: La contratista China Road Bridge Corporation, terminó la rehabilitación de la vía, no se devengó la totalidad del anticipo y no se realiza la Recepción Provisional porque se debe realizar el bacheo en algunos tramos de la vía.	Paula López, Ricardo Octavio	13/01/2016 - 05:41 PM
NOVIEMBRE 2015: La contratista China Road Bridge Corporation, terminó la rehabilitación de la vía, no se devengó la totalidad del anticipo y no se realiza la Recepción Provisional porque se debe realizar el bacheo en algunos tramos de la vía.	Paula López, Ricardo Octavio	08/12/2015 - 08:55 AM
OCTUBRE 2015: La contratista China Road Bridge Corporation, terminó la rehabilitación de la vía, no se devengó la totalidad del anticipo y no se realiza la Recepción Provisional porque se debe realizar el bacheo en algunos tramos de la vía.	Paula López, Ricardo Octavio	09/11/2015 - 03:39 PM
SEPTIEMBRE 2015: -Proyecto terminado. -No se realiza la Recepción Provisional por ser un proyecto macro (varios proyectos a nivel nacional).	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	07/10/2015 - 05:25 PM
AGOSTO 2015: -Proyecto terminado. -No se realiza la Recepción Provisional por ser un proyecto macro (varios proyectos a nivel nacional).	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	08/09/2015 - 12:29 PM
JULIO 2015: -Proyecto terminado. -No se realiza la Recepción Provisional por ser un proyecto macro (varios proyectos a nivel nacional). -La Empresa Estatal China Road And Bridge Corporation, hasta la presente fecha 6-07-2015, No realiza el mantenimiento de la carpeta asfáltica colocada en el tramo Huigra-Piedrero-"Y" del Triunfo	Paula López, Ricardo Octavio	07/08/2015 - 10:01 PM
JUNIO-2015: -Proyecto terminado. -No se realiza la Recepción Provisional por ser un proyecto macro (varios proyectos a nivel nacional). -La Empresa Estatal China Road And Bridge Corporation, hasta la presente fecha 6-07-2015, No realiza el mantenimiento de la carpeta asfáltica colocada en el tramo Huigra-Piedrero-"Y" del Triunfo.	Horna Sanipatín, Wilson	06/07/2015 - 03:38 PM
6-JUNIO-2015: -Proyecto terminado. -No se realiza la Recepción Provisional por ser un proyecto macro (varios proyectos a nivel nacional). -La Empresa Estatal China Road And Bridge Corporation, hasta la presente fecha 6-07-2015, No realiza el mantenimiento de la carpeta asfáltica colocada en el tramo Huigra-Piedrero-"Y" del Triunfo.	Horna Sanipatín, Wilson	06/07/2015 - 03:13 PM
Mayo 2015 Obra ejecutada. Se ha solicitado la recepción provicional de las obras	Paula López, Ricardo Octavio	07/06/2015 - 08:00 AM
Abril 2015 Obra ejecutada. Se ha solicitado la recepción provicional de las obras	Solis Mazón, Nestor Rubén	08/05/2015 - 12:29 AM
Marzo 2015 Obra ejecutada. Se ha solicitado la recepción provicional de las obras.	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/04/2015 - 03:26 PM
Marzo 2015 Obra ejecutada.	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/04/2015 - 03:16 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Febrero 2015: Obra ejecutada. Se ha solicitado la recepción provisional de las obras. No se ha podido realizar la recepción provisional porque este contrato pertenece a un proyecto macro y en los otros proyectos de este contrato existen problemas que aún no ha solucionado el Administrador del proyecto.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	09/03/2015 - 04:12 PM
<p>Enero 2015: Obra ejecutada. Se ha solicitado la recepción provisional de las obras. No se ha podido realizar la recepción provisional porque este contrato pertenece a un proyecto macro y en los otros proyectos de este contrato existen problemas que aún no ha solucionado el Administrador del proyecto.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	09/02/2015 - 10:50 AM
<p>Diciembre 2014: Obra ejecutada. Se ha solicitado la recepción provisional de las obras. No se ha podido realizar la recepción provisional porque este contrato pertenece a un proyecto macro y en los otros proyectos de este contrato existen problemas que aún no ha solucionado el Administrador del proyecto.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	08/01/2015 - 09:53 AM
<p>Noviembre 2014: Obra ejecutada. Se ha solicitado la recepción provisional de las obras. No se ha podido realizar la recepción provisional porque este contrato pertenece a un proyecto macro y en los otros proyectos de este contrato existen problemas que aún no ha solucionado el Administrador del proyecto.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	01/12/2014 - 04:59 PM
<p>Octubre 2014: Obra ejecutada. Se ha solicitado la recepción provisional de las obras.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	01/12/2014 - 04:54 PM
<p>Octubre 2014: Obra ejecutada. Se ha solicitado la recepción provisional de las obras.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/11/2014 - 12:57 PM
<p>Septiembre 2014: Obra ejecutada. Se ha solicitado la recepción provisional de las obras.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/10/2014 - 09:39 AM
<p>Agosto 2014: Proyecto en ejecución. Estabilización de taludes no contemplados en el proyecto. Deslizamiento importante en el kilómetro 10. Se propone un desvío provisional.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	11/09/2014 - 09:37 AM
<p>Julio 2014: Proyecto en ejecución. Estabilización de taludes no contemplados en el proyecto. Deslizamiento importante en el kilómetro 10. Se propone un desvío provisional.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	03/08/2014 - 09:43 PM
<p>Junio 2014: En ejecución, la Fiscalización en el informe ejecutivo del SITOP no detalla los trabajos realizados en este mes.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/07/2014 - 11:15 AM
<p>Mayo 2014: En ejecución, la Fiscalización en el informe ejecutivo del SITOP no detalla los trabajos realizados en este mes.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	06/06/2014 - 12:42 PM
<p>Abril 2014 La Fiscalización informa que el proyecto se encuentra en ejecución y se firmó el contrato complementario con un monto de 4'406.995,02 USD con fecha de 10 de mayo 2013. Se ejecuta los trabajos de acuerdo a lo programado.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/05/2014 - 04:06 PM
<p>Marzo 2014 La Fiscalización informa que el proyecto se encuentra en ejecución y se firmó el contrato complementario con un monto de 4'406.995,02 USD con fecha de 10 de mayo 2013. Se ejecuta los trabajos de acuerdo a lo programado.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/04/2014 - 10:01 AM
<p>Febrero 2014 La Fiscalización informa que el proyecto se encuentra en ejecución y se firmó el contrato complementario con un monto de 4'406.995,02 USD con fecha de 10 de mayo 2013. Se ejecuta los trabajos de acuerdo a lo programado.</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	10/03/2014 - 12:34 PM
<p>Enero 2014: % Economico M.Original: 53.01 % Economico M.Contractual: 52.65 % Fisico 78.37 La Fiscalización informa que el proyecto se encuentra en ejecución y se firmó el contrato complementario con un monto de 4'406.995,02 USD con fecha de 10 de mayo 2013</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	10/02/2014 - 10:14 AM
<p>Diciembre 2013: % Economico M.Original:55.17% Economico M.Contractual:55.17% Fisico74.00 La Fiscalización informa que el proyecto se encuentra en ejecución y se firmó el contrato complementario con un monto de 4'406.995,02 USD con fecha de 10 de mayo 2013</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	06/01/2014 - 12:53 PM
<p>Noviembre 2013: % Economico M.Original: 37.98 % Economico M.Contractual: 39.23 % Fisico 67.00</p>	Solis Mazón, Nestor Rubén	05/12/2013 - 08:14 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
La Fiscalización informa que el proyecto se encuentra en ejecución y se firmó el contrato complementario con un monto de 4'406.995,02 USD con fecha de 10 de mayo 2013		
Octubre 2013: % Economico M.Original: 37.98 % Economico M.Contractual: 39.23 % Fisico 67.00 La Fiscalización informa que el proyecto se encuentra en ejecución y se firmó el contrato complementario con un monto de 4'406.995,02 USD con fecha de 10 de mayo 2013	Solis Mazón, Nestor Rubén	05/12/2013 - 08:13 AM
Octubre 2013: % Economico M.Original: 30.18 % Economico M.Contractual: 30.60 % Fisico 52.15 Se firmó el contrato complementario, se ejecutan los trabajos de acuerdo al cronograma.	Solis Mazón, Nestor Rubén	05/11/2013 - 11:21 PM
Septiembre 2013: % Economico M.Original:25.68% Economico M.Contractual:25.82% Fisico38.04 Se firmó el contrato complementario, se ejecutan los trabajos de acuerdo al cronograma.	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/10/2013 - 10:03 AM
Agosto 2013: % Economico M.Original: 14.95 % Economico M.Contractual: 23.72 % Fisico 32.68 A la espera de la firma del contrato complementario	Solis Mazón, Nestor Rubén	04/09/2013 - 11:07 AM
Julio 2013: % Economico M.Original: 0.73 % Economico M.Contractual: 0.50 % Fisico 0.50 A la espera de la firma del contrato complementario	Solis Mazón, Nestor Rubén	02/08/2013 - 04:26 PM
Junio 2013: No se ha ingresado el informe ejecutivo de junio, responsabilidad Ing. Édgar Cáceres, fiscalizador del proyecto.	Solis Mazón, Nestor Rubén	08/07/2013 - 08:22 AM
Junio 2013: Se realiza trabajos de acuerdo al cronograma % Avance Físico 0.50% % Avance Económico: 0.50	Solis Mazón, Nestor Rubén	04/07/2013 - 11:07 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Devolución económica por parte de la empresa constructora China Road Bridge Corporation	20/02/2018	Wilson Horna Sanipatín	10	10	1	0/1
Tiempo establecido de 6 meses para recepción definitiva.	20/02/2018	Wilson Horna Sanipatín	10	10	1	0/1

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 2

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Recursos. Falta de inclusión en el PAI 2017 y la asignación de recursos, CAUSARÍA retraso en la legalización de las Actas de Entrega Recepción.	20/02/2018	Wilson Horna Sanipatín	10 %	50	5	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Chunchi


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Aprobación Interna Departamento Financiero realizado	1-Solicitud de Información	08/08/2012		08/08/2012		Sí	3.0
2	PLANEACIÓN: Definir Recursos en Senplades realizado	1-Solicitud de Información	09/08/2012		09/08/2012		Sí	1.0
3	PLANEACIÓN: Presupuesto Aprobado realizado	1-Solicitud de Información	12/08/2012		12/08/2012		Sí	1.0
4	PLANEACIÓN: Elaboración de pliegos realizado	1-Solicitud de Información	18/08/2012		18/08/2012		Sí	2.0
5	PLANEACIÓN: Convocatoria realizado	2-Publicación de Pliegos	31/08/2012		31/08/2012		Sí	1.0
6	EJECUCIÓN: Adjudicación del contrato realizado	3-Adjudicación	05/09/2012		05/09/2012		Sí	5.0
7	EJECUCIÓN: Firma del Contrato, anticipo entregado firmado	3-Adjudicación	09/09/2012		09/09/2012		Sí	5.0
8	EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos realizado	4-Inicio de Trabajo	25/04/2013		25/04/2013		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Obras de drenaje realizado	4-Inicio de Trabajo	09/05/2013		09/05/2013		Sí	5.0
10	EJECUCIÓN: Ejecución de orden de trabajo para rubros nuevos realizado	4-Inicio de Trabajo	10/05/2013		10/05/2013		Sí	5.0
11	EJECUCIÓN: Firma Contrato Complementario firmado	4-Inicio de Trabajo	10/05/2013		10/05/2013		Sí	5.0
12	EJECUCIÓN: Colocación de Base clase IV realizado	4-Inicio de Trabajo	13/05/2013		13/05/2013		Sí	20.0
13	EJECUCIÓN: Obras preliminares realizado	4-Inicio de Trabajo	13/05/2013		13/05/2013		Sí	10.0
14	EJECUCIÓN: Señalización Preventiva realizado	4-Inicio de Trabajo	19/05/2013		19/05/2013		Sí	5.0
15	EJECUCIÓN: Capa de rodadura realizado	4-Inicio de Trabajo	10/06/2013		10/06/2013		Sí	5.0
16	CIERRE: Recepción provisional firmada	5-Entregables Intermedios	17/08/2015		01/03/2017		Sí	10.0
17	CIERRE: Liquidación económica, realizada	9-Entregables Formales	20/04/2016	31/12/2018			No	10.0
18	COMPLETADO: Recepción Definitiva firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	22/04/2016	31/12/2018			No	2.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	La obra esta en Curso	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	26/08/2016
2	La obra esgta en proceso de rehabilitacion	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	30/04/2016
3	La oobra esta concluida	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	28/10/2015
4	la obra esta en proceso de rehabilitación	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	29/01/2015
5	La obra esta en curso	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	19/12/2014
6	La obra esta concluida	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	19/08/2014
7	La obra esta por concluir	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	30/04/2014
8	Dr. Hermuy Calle V.	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	26/02/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de Kilómetros rehabilitados de la vía Huigra - Piedreros		100.00 %	100	100	02/02/2013	Agosto

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	4,537,810.96
Estimado Al Fin Del Proyecto:	13,295,724.81 **
Costo Total:	9,287,400.16
Total Devengado:	9,500,232.66
% Costo Total Devengado:	102.29 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 102.29 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	10,414,163.56	5,148,383.67	0.00	15,562,547.23
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	2,982,867.68	1,578,750.31	0.00	4,561,617.99
Ppto. Codificado	8,853,640.13	5,148,383.67	0.00	14,002,023.80
Ppto. Comprometido	3,887,025.76	4,741,723.79	0.00	8,628,749.55
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	8,162,767.42	5,148,383.67	0.00	13,311,151.09
Ppto. Devengado	8,147,341.14	1,352,891.52	0.00	9,500,232.66
Pagado Real	3,887,025.76	1,352,891.52	0.00	5,239,917.28
Estimado a fin de año	* 8,147,341.14	0.00	0.00	8,147,341.14
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	15,426.28	5,148,383.67	0.00	5,163,809.95
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 99.81 %	26.28 %	0.00 %	71.37 %
Ppto. Codificado 998	1,729,576.80	0.00	0.00	1,729,576.80
Ppto. Devengado 998	1,729,576.80	0.00	0.00	1,729,576.80

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

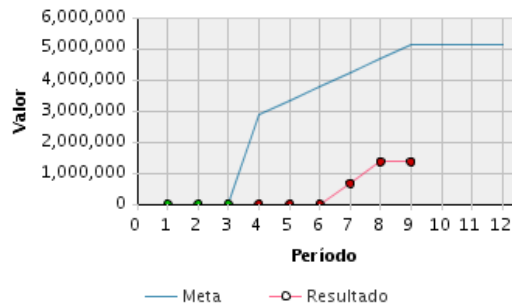

Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	2,850,048.12	0.00	2,850,048.12	0.00	0.00 %		0.00 %
May	459,667.11	0.00	3,309,715.23	0.00	0.00 %		0.00 %
Jun	459,667.11	0.00	3,769,382.34	0.00	0.00 %		0.00 %
Jul	459,667.11	674,631.08	4,229,049.45	674,631.08	15.95 %		13.10 %
Ago	459,667.11	678,260.44	4,688,716.56	1,352,891.52	28.85 %		26.28 %
Sep	459,667.11	0.00	5,148,383.67	1,352,891.52	26.28 %		26.28 %
Oct	0.00		5,148,383.67				
Nov	0.00		5,148,383.67				
Dic	0.00		5,148,383.67				
Total	5,148,383.67	1,352,891.52					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
16	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
19	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO 16: Informe Ejecutivo NOVIEMBRE 2017	K015.pdf	04/12/2017
2	A.1 ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo abril 2013	A.1.pdf	13/03/2014
3	A.2 ASOCIACIÓN HITO 10.- Informe ejecutivo mayo de 2013	A.2.pdf	13/03/2014
4	A.3 ASOCIACIÓN HITO 15.- Informe ejecutivo julio de 2013	A.3.pdf	13/03/2014
5	A.4 ASOCIACIÓN HITO 15.- Informe ejecutivo agosto de 2013	A.4.pdf	13/03/2014
6	A.5 ASOCIACIÓN HITO 15.- Informe ejecutivo septiembre de 2013	A.5.pdf	13/03/2014
7	A.6 ASOCIACIÓN HITO 15.- Informe ejecutivo octubre de 2013	A.6.pdf	13/03/2014
8	A.7 ASOCIACIÓN HITO 15.- Informe ejecutivo noviembre de 2013	A.7.pdf	13/03/2014
9	A.8 ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo diciembre 2013	A.8.pdf	13/03/2014
10	A.9 ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo enero 2014	A.9.pdf	13/03/2014
11	ASOCIACIÓN HITO 16 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2017	k015.pdf	04/01/2018
12	ASOCIACIÓN HITO 16. INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	k015.pdf	03/04/2018
13	B.1 ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo marzo 2014	B.1.pdf	07/04/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
14	B.2 ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo abril 2014	B.2.pdf	07/05/2014
15	B.3 ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo mayo 2014	B.3.pdf	06/06/2014
16	B.4 ASOCIACION HITO 15.- Dictamen de prioridad SENPLADES	B.4.pdf	25/06/2014
17	B.5 ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo junio 2014	B.5.pdf	07/07/2014
18	B.6. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo julio 2014	B.6.pdf	03/08/2014
19	B.7. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo agosto 2014	B.7.pdf	11/09/2014
20	B.8. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo septiembre 2014	B.8.pdf	07/10/2014
21	B.9. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo octubre 2014	B.9.pdf	07/11/2014
22	C.1. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo noviembre 2014	C.1.pdf	01/12/2014
23	C.2. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo diciembre 2014	C.2.pdf	08/01/2015
24	C.3. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo enero 2015	C.3.pdf	09/02/2015
25	C.4. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo febrero 2015	C.4.pdf	09/03/2015
26	C.5. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo marzo 2015	C.5.pdf	07/04/2015
27	C.6. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo abril 2015	C.6.pdf	08/05/2015
28	C.7. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo junio 2015	Anexo_junio_2015.pdf	06/07/2015
29	C.7. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo mayo 2015	C.7.pdf	09/06/2015
30	C.8. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo agosto 2015	C.8.pdf	08/09/2015
31	C.9. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo septiembre 2015	C.9.pdf	07/10/2015
32	CEDULA PRESUPUESTARIA 2012 HUIGRA PIEDREROS	cedula_presupuestaria_2012_Huigra-Piedreros.pdf	30/12/2016
33	CEDULA PRESUPUESTARIA 2013 HUIGRA PIEDREROS	cedula_presupuestaria_2013_huigra_piedreros.pdf	30/12/2016
34	CEDULA PRESUPUESTARIA 2014 HUIGRA PIEDREROS	cedula_presupuestaria_2014_huigra_piedreros.pdf	30/12/2016
35	CEDULA PRESUPUESTARIA 2015 HUIGRA PIEDREROS	cedula_presupuestaria_2015_huigra_piedreros.pdf	30/12/2016
36	CERTIFICACIÓN CONVENIO DE PAGO HUIGRA PIEDREROS	certificacion_convenio_de_pago_huigra_piedreros.pdf	30/12/2016
37	CERTIFICACIÓN DE RECURSOS C.O HUIGRA PIEDREROS	certificacion_huigra_piedreros_CO.pdf	30/12/2016
38	CERTIFICACIÓN DE RECURSOS HUIGRA PIEDREROS	certificacion_complementario_huigra_piedreros.pdf	30/12/2016
39	D.1. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo octubre 2015	D.1.pdf	09/11/2015
40	D.2. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo noviembre 2015	D.2.pdf	08/12/2015
41	D.3. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo diciembre 2015	D.3.pdf	13/01/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
42	D.4. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo enero 2016	D.4..pdf	10/02/2016
43	D.5. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo Febrero 2016	D.5.pdf	09/03/2016
44	D.6. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo Marzo 2016	D.6	08/04/2016
45	D.7. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo abril 2016	D.7.pdf	09/05/2016
46	D.8 ASOCIACIÓN HITO 15: Informe Ejecutivo mayo 2016	D.8.pdf	03/06/2016
47	D.9 ASOCIACIÓN HITO 15: Informe Ejecutivo AGOSTO 2016	D.9.pdf	01/09/2016
48	D.9 ASOCIACIÓN HITO 15: Informe Ejecutivo JULIO 2016	D.9.pdf	03/08/2016
49	D.9 ASOCIACIÓN HITO 15: Informe Ejecutivo JUNIO 2016	D.9.pdf	05/07/2016
50	D.9 ASOCIACIÓN HITO 15: Informe Ejecutivo Octubre 2016	D.8.pdf	01/11/2016
51	D.9 ASOCIACIÓN HITO 15: Informe Ejecutivo Septiembre 2016	D.8.pdf	03/10/2016
52	Dictamen de prioridad	Dictamen_de_prioridad.pdf	08/10/2015
53	E.1 ASOCIACIÓN HITO 15: Informe Ejecutivo Noviembre 2016	E.1.pdf	05/12/2016
54	E.2 ASOCIACIÓN HITO 15: Informe Ejecutivo Diciembre 2016	E.2.pdf	05/01/2017
55	E.3. ASOCIACIÓN HITO 15: Informe Ejecutivo Enero 2017	E.3.pdf	31/01/2017
56	E.4. ASOCIACIÓN HITO 15: Informe Ejecutivo FEBRERO 2017	E.4.pdf	05/03/2017
57	E.5. ASOCIACIÓN HITO 16: Informe Ejecutivo MARZO 2017	E.5.pdf	03/04/2017
58	E.6 ASOCIACIÓN HITO 16: Informe Ejecutivo ABRIL 2017	E.6.pdf	05/05/2017
59	E.7 ASOCIACIÓN HITO 16: Informe Ejecutivo MAYO 2017	E7.pdf	05/06/2017
60	E.8 ASOCIACIÓN HITO 16: Informe Ejecutivo JUNIO 2017	E.8..pdf	05/07/2017
61	E.9 ASOCIACIÓN HITO 16: Informe Ejecutivo JULIO 2017	K015.pdf	04/08/2017
62	F.1 ASOCIACIÓN HITO 16: Informe Ejecutivo AGOSTO 2017	K015.pdf	05/09/2017
63	F.2 ASOCIACIÓN HITO 16: Informe Ejecutivo SEPTIEMBRE 2017	K015.pdf	04/10/2017
64	F.2 ASOCIACIÓN HITO 16: Informe Ejecutivo SEPTIEMBRE 20173	F.3.pdf	01/11/2017
65	INFORME SEMANAL 10,11,12 DE FISCALIZACIÓN-SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2013	INFORMES_SEMANALES_DE_FISCALIZACIÓN_10_11_12-MES_SEPTIEMBRE-OCTUBRE_2013.pdf	30/12/2016
66	INFORME SEMANAL 12,13,14,15,16,17,18 DE FISCALIZACIÓN-JULIO-AGOSTO 2013	INFORMES_SEMANALES_DE_FISCALIZACIÓN_12_13_14_15_16_17_18-MES_JULIO-AGOSTO_2013.pdf	30/12/2016
67	INFORME SEMANAL 13,14 DE FISCALIZACIÓN-OCTUBRE 2013	INFORMES_SEMANALES_DE_FISCALIZACIÓN_13_14-MES_OCTUBRE_2013.pdf	30/12/2016
68	INFORME SEMANAL 14,15,16 DE FISCALIZACIÓN-OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013	INFORMES_SEMANALES_DE_FISCALIZACIÓN_14_15_16-MES_OCTUBRE-NOVIEMBRE_2013.pdf	30/12/2016
69	INFORME SEMANAL 18,19,20 DE FISCALIZACIÓN-NOVIEMBRE 2013	INFORMES_SEMANALES_DE_FISCALIZACIÓN_18_19_20-MES_NOVIEMBRE_2013.pdf	30/12/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
70	INFORME SEMANAL 31,32,33,34,35,36 DE FISCALIZACIÓN-FEBRERO-MARZO 2014	INFORMES_SEMANALES_DE_FISCALIZACIÓN_31_32_33_34_35_36_MES_FEBRERO-MARZO_2014.pdf	30/12/2016
71	INFORME SEMANAL 44,45,46,47,48 DE FISCALIZACIÓN-MAYO-JUNIO 2014	INFORMES_SEMANALES_DE_FISCALIZACIÓN_44_45_46_47_48_MES_MAYO-JUNIO_2014.pdf	30/12/2016
72	INFORME SEMANAL 49,50 DE FISCALIZACIÓN-JUNIO 2014	INFORMES_SEMANALES_DE_FISCALIZACIÓN_49_50_MES_JUNIO_2014.pdf	30/12/2016
73	INFORME SEMANAL 51,52,53 DE FISCALIZACIÓN-JUNIO-JULIO 2014	INFORMES_SEMANALES_DE_FISCALIZACIÓN_51_52_53_MES_JUNIO-JULIO_2014.pdf	30/12/2016
74	INFORME SEMANAL 54 DE FISCALIZACIÓN-JULIO 2014	INFORMES_SEMANALES_DE_FISCALIZACIÓN_54_MES_JULIO_2014.pdf	30/12/2016
75	INFORME SEMANAL 55,56,57 DE FISCALIZACIÓN-JULIO-AGOSTO 2014	INFORMES_SEMANALES_DE_FISCALIZACIÓN_55_56_57_MES_JULIO-AGOSTO_2014.pdf	30/12/2016
76	INFORME SEMANAL 8,9 DE FISCALIZACIÓN-SEPTIEMBRE 2013	INFORMES_SEMANALES_DE_FISCALIZACIÓN_8_9_MES_SEPTIEMBRE_2013.pdf	30/12/2016
77	Orden de cambio 2 22-10-2013	Orden_de_cambio_2_22-10-2013.pdf	02/07/2015
78	Orden de cambio 3 27-01-2014	Orden_de_cambio_3_27-01-2014.pdf	02/07/2015
79	ORGANIGRAMA PERSONAL TÉCNICO-FISCALIZACIÓN 2014	ORGANIGRAMA_PERSONAL_TÉCNICO-FISCALIZACIÓN_2014.pdf	30/12/2016
80	PLANILLA DE FISCALIZACIÓN N°04 C.O. Y N°03 C.C.	PLANILLA_DE_FISCALIZACIÓN_N°04_C.O._Y_N°03_C.C..pdf	30/12/2016
81	PLANILLA DE FISCALIZACIÓN N°05 C.O. Y N°04 C.C.	PLANILLA_DE_FISCALIZACIÓN_N°05_C.O._Y_N°04_C.C..pdf	30/12/2016
82	PLANILLA DE FISCALIZACIÓN N°06 C.C.	PLANILLA_DE_FISCALIZACIÓN_N°06_C.C..pdf	30/12/2016
83	PLANILLA DE FISCALIZACIÓN N°07 C.O.	PLANILLA_DE_FISCALIZACIÓN_N°07_C.O..pdf	30/12/2016
84	PLANILLA DE FISCALIZACIÓN N°12 C.C.	PLANILLA_DE_FISCALIZACIÓN_N°12_C.C..pdf	30/12/2016
85	PLANILLA DE FISCALIZACIÓN N°13 C.C.	PLANILLA_DE_FISCALIZACIÓN_N°13_C.C..pdf	30/12/2016
86	PLANILLA DE FISCALIZACIÓN N°13 C.O.	PLANILLA_DE_FISCALIZACIÓN_N°13_C.O..pdf	30/12/2016
87	PLANILLA DE FISCALIZACIÓN N°14 C.C.	PLANILLA_DE_FISCALIZACIÓN_N°14_C.C..pdf	30/12/2016
88	PLANILLA DE FISCALIZACIÓN N°14 C.C. .	PLANILLA_DE_FISCALIZACIÓN_N°14_C.C._(2).pdf	30/12/2016
89	PLANILLA DE FISCALIZACIÓN N°14 C.O.	PLANILLA_DE_FISCALIZACIÓN_N°14_C.O..pdf	30/12/2016
90	PLANILLA DE FISCALIZACIÓN N°15 C.O.	PLANILLA_DE_FISCALIZACIÓN_N°15_C.O..pdf	30/12/2016
91	PLANILLA DE FISCALIZACIÓN N°15 C.O. Y N°14 C.C.	PLANILLA_DE_FISCALIZACIÓN_N°15_C.O._Y_N°14_C.C..pdf	30/12/2016
92	PLANILLA DE FISCALIZACIÓN N°16 C.O.	PLANILLA_DE_FISCALIZACIÓN_N°16_C.O..pdf	30/12/2016
93	PLANILLA DE LIQUIDACIÓN HUIGRA-PIEDREROS	PLANILLA_DE_LIQUIDACIÓN_HUIGRA-PIEDREROS.pdf	30/12/2016
94	PLANILLA ÚNICA DE OBRA DEL CONVENIO DE PAGO	PLANILLA_UNICA_DE_OBRA_DEL_CONVENIO_DE_PAGO.pdf	30/12/2016
95	PLANILLA ÚNICA DE OBRA DEL CONVENIO DE PAGO 1	PLANILLA_UNICA_DE_OBRA_DEL_CONVENIO_DE_PAGO_1.pdf	30/12/2016
96	PLANILLAS CONTRATO COMPLEMENTARIO	PLANILLAS_CONTRATO_COMPLEMENTARIO.pdf	27/12/2016
97	PLANILLAS CONTRATO ORIGINAL	PLANILLAS_CONTRATO_ORIGINAL.pdf	27/12/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Armijo Logroño, Angel Eduardo	Supervisor Técnico	Experto de Infraestructura Provincial	aarmijo@mtop.gob.ec	
Horna Sanipatín, Wilson	Coordinador Técnico	Supervisor Construcciones	whorna@mtop.gob.ec	023974600
Horna Sanipatín, Wilson	Fiscalizador	Supervisor Construcciones	whorna@mtop.gob.ec	023974600
Narváez , Pablo	Supervisor Financiero			

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Santillan Morocho, Ingrid Pamela	Director Provincial de Chimborazo	Directora Provincial de Chimborazo, Encargada	isantillan@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
18026_1.jpg	05/06/2016
