

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 2**  
**Dirección Provincial Napo**

**PROYECTO: K036** MTOP - Contrucción del Puente sobre el río Rurayacu de 30 metros de longitud.

Líder del Proyecto:	Dias Mayorga, Daniel Andrés (ddias@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Lara Mendoza, Richard Patricio	Programas Relacionados:	CONSTRUCCION DEL PUENTE RURAYACU VIA HOLLIN-LORETO-COCA, Provincia - Napo, Proyectos Emblemáticos, Proyectos Prioritarios PAI, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Mora Orozco, Fabián Alberto	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	1.41
CUP:	175200.000.23.4952	TIR:	16.60 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	375,600.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	698,233.63
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/10/2010 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	26/09/2018	Fecha de Fin Base:	30/12/2012
Modificado por:	Mora Orozco, Fabián Alberto	Fecha del siguiente Hito:	14/09/2018

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Objetivo

Interconectar las Regiones 1,2,3,6 y 7 desde el Puente Internacional sobre el Río San Miguel, en la frontera con Colombia, hasta el límite sur en la frontera con Perú, en el puente Balzas.

Contratista: Cuerpo de Ingenieros del Ejército  
Estrategia

1. Supervisión técnica permanente
2. Disponibilidad de cupo presupuestario
3. Pago oportuno de planilla
4. Seguimiento al plan de obra
5. Aseguramiento del control de calidad

**Beneficios Cualitativos**

Se disminuirá el riesgo de accidente por el paso vehicular sobre los puentes provisionales que ya cumplieron su tiempo de servicio.

La calidad de la infraestructura vial mejorará el servicio a la circulación vehicular.

Influirá en beneficio del desarrollo de las comunidades del sector al acortar los tiempos de movilización de mercadería, personal, turismo y comercio.

**Tipo de Beneficiario**

Agricultores  
Ganaderos  
Turístico  
Petrolero  
Industrial

**Restricciones**

Tiempo. La entrega de la obra según cronograma, plazo 09 meses para culminación del contrato.

Recursos:

La mano de obra calificada requerida para la Ejecución del Proyecto considerando la experiencia que cada uno de los miembros del personal técnico mínimo deberá acreditar como mínimo, ya sea en años, número o monto de proyectos en los que haya participado.

Los Equipos y Materiales utilizados son de excelente calidad y rendimiento con el fin de desarrollar de manera afectiva y en el plazo estimado sumando al desarrollo del País con obras emblemáticas.


**Restricciones**

Alcance:  
Las especificaciones técnicas que regirán cada uno de los Proyectos contratados por medio del MTOP Napo serán las "Especificaciones generales para la ejecución de puentes y caminos MOP-001-F 2002", del MTOP del Ecuador.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado **Congelado** Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 96.95 %  
Fecha de Inicio: 01/10/2010 Fecha de Fin: 31/12/2018

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

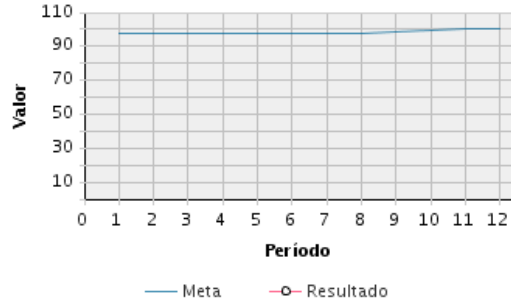

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	99 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2018: Los trabajos se encuentran concluidos. Se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 03 de febrero de 2012 y posterior el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 17 de marzo de 2014, está pendiente el pago de la Planilla de Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 877,42 incluye IVA, lo cual se está gestionando para la inclusión al PAI 2018.	Mora Orozco, Fabián Alberto	04/09/2018 - 05:47 PM
JULIO 2018: Los trabajos se encuentran concluidos. Se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 03 de febrero de 2012 y posterior el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 17 de marzo de 2014, está pendiente el pago de la Planilla de Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 877,42 incluye IVA, lo cual se está gestionando para la inclusión al PAI 2018.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 04:50 PM
JUNIO 2018: Los trabajos se encuentran concluidos. Se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 03 de febrero de 2012 y posterior el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 17 de marzo de 2014, está pendiente el pago de la Planilla de Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 877,42 incluye IVA, lo cual se está gestionando para la inclusión al PAI 2018.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 04:50 PM
MAYO 2018: Los trabajos se encuentran concluidos. Se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 03 de febrero de 2012 y posterior el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 17 de marzo de 2014, está pendiente el pago de la Planilla de Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 877,42 incluye IVA, lo cual se está gestionando para la inclusión al PAI 2018.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 04:50 PM
ABRIL 2018: Los trabajos se encuentran concluidos. Se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 03 de febrero de 2012 y posterior el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 17 de marzo de 2014, está pendiente el pago de la Planilla de Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 877,42 incluye IVA, lo cual se está gestionando para la inclusión al PAI 2018.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 04:49 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MARZO 2018: Los trabajos se encuentran concluidos. Se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 03 de febrero de 2012 y posterior el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 17 de marzo de 2014, está pendiente el pago de la Planilla de Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 877,42 incluye IVA, lo cual se está gestionando para la inclusión al PAI 2018.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 04:49 PM
FEBRERO 2018: Los trabajos se encuentran concluidos. Se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 03 de febrero de 2012 y posterior el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 17 de marzo de 2014, está pendiente el pago de la Planilla de Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 877,42 incluye IVA, lo cual se está gestionando para la inclusión al PAI 2018.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 04:49 PM
ENERO 2018: Los trabajos se encuentran concluidos. Se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 03 de febrero de 2012 y posterior el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 17 de marzo de 2014, está pendiente el pago de la Planilla de Reajuste Definitivo por un monto que asciende USD. \$ 877,42 sin IVA, lo cual se está gestionando para la inclusión al PAI 2018.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/08/2018 - 04:46 PM
DICIEMBRE 2017: Los trabajos se encuentran concluidos. Se firma el acta de Recepción Provisional el 03/02/2012 y posterior el acta de Recepción Definitiva el 17/03/2012, está pendiente el pago por reajuste definitivo de un valor de \$877,42 que se encuentra en el área financiera para su respectivo pago. Para lo cual se solicitó la apertura de parámetros del contrato en sistema e-sigef.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	02/01/2018 - 05:02 PM
NOVIEMBRE 2017: Los trabajos se encuentran concluidos. Se firma el acta de Recepción Provisional el 03/02/2012 y posterior el acta de Recepción Definitiva el 17/03/2012, está pendiente el pago por reajuste definitivo de un valor de \$877,42 que se encuentra en el área financiera para su respectivo pago.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	04/12/2017 - 06:32 PM
OCTUBRE 2017: Los trabajos se encuentran concluidos, Se firma el acta de Recepción Provisional el 03/02/2012 y posterior el acta de Recepción Definitiva el 17/03/2012, está pendiente el pago por reajuste de precios de un valor de \$1.227,00. Debido a que los técnicos responsables del proyecto no se encuentran laborando en la institución, el supervisor del proyecto remite un informe técnico a fin de que se emita criterio jurídico para la legalización de la planilla.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	06/11/2017 - 11:52 AM
SEPTIEMBRE 2017: Los trabajos se encuentran concluidos, Se firma el acta de Recepción Provisional el 03/02/2012 y posterior el acta de Recepción Definitiva el 17/03/2012, está pendiente el pago por Diferencia entre el monto Original y Planillado por un valor de \$1.227,00.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	04/10/2017 - 07:29 PM
AGOSTO 2017: Los trabajos se encuentran concluidos, Se firma el acta de Recepción Provisional el 03/02/2012 y posterior el acta de Recepción Definitiva el 17/03/2012, está pendiente el pago por Diferencia entre el monto Original y Planillado por un valor de \$1.227,00.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	05/09/2017 - 12:06 PM
JULIO 2017: Los trabajos se encuentran concluidos, Se firma el acta de Recepción Provisional el 03/02/2012 y posterior el acta de Recepción Definitiva el 17/03/2012, está pendiente el pago por Diferencia entre el monto Original y Planillado por un valor de \$1.227,00.	Solano Pineda, Oscar Santiago	03/08/2017 - 06:23 PM
JUNIO 2017: Los trabajos se encuentran concluidos, Se firma el acta de Recepción Provisional el 03/02/2012 y posterior el acta de Recepción Definitiva el 17/03/2012, está pendiente el pago por Diferencia entre el monto Original y Planillado por un valor de \$1.227,00.	Solano Pineda, Oscar Santiago	05/07/2017 - 12:12 PM
MAYO 2017: Los trabajos se encuentran concluidos, Se firma el acta de Recepción Provisional el 03/02/2012 y posterior el acta de Recepción Definitiva el 17/03/2012, está pendiente el pago por Diferencia entre el monto Original y Planillado por un valor de \$1.227,00.	Solano Pineda, Oscar Santiago	05/06/2017 - 06:04 PM
ABRIL 2017: Los trabajos se encuentran concluidos, Se firma el acta de Recepción Provisional el 03/02/2012 y posterior el acta de Recepción Definitiva el 17/03/2012, está pendiente el pago por Diferencia entre el monto Original y Planillado por un valor de \$1.227,00.	Solano Pineda, Oscar Santiago	05/05/2017 - 11:24 PM
MARZO 2017: Los trabajos se encuentran concluidos, Se firma el acta de Recepción Provisional el 03/02/2012 y posterior el acta de Recepción Definitiva el 17/03/2012, está pendiente el pago por Diferencia entre el monto Original y Planillado por un valor de \$1.227,00.	Solano Pineda, Oscar Santiago	05/04/2017 - 03:13 PM
FEBRERO 2017: Los trabajos se encuentran concluidos, Se firma el acta de Recepción Provisional el 03/02/2012 y posterior el acta de Recepción Definitiva el 17/03/2012, está pendiente el pago por Diferencia entre el monto Original y Planillado por un valor de \$1.227,00.	Zarate Iñiguez, Luis Santiago	02/03/2017 - 05:44 PM
Diciembre 2013: Se realiza trámites correspondientes para acta de entrega recepción definitiva.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	07/01/2014 - 10:41 AM
Julio - Octubre 2013: Se realiza trámites correspondientes para acta de entrega recepción definitiva.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	21/10/2013 - 02:05 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Mayo-Junio 2013: Se realiza trámites correspondientes para acta de entrega recepción definitiva.	Cevallos Castillo, Eduardo Ramiro	05/07/2013 - 12:10 PM
Diciembre 2012-Abril 2013: Se realiza trámites correspondientes para acta de entrega recepción definitiva.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	16/05/2013 - 12:10 PM
NOVIEMBRE 2012: Se realiza trámites correspondientes para acta de entrega recepción definitiva.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	16/05/2013 - 12:09 PM
OCTUBRE 2012: Se realiza el trámite para la liquidación económica del proyecto.	Avilés Castillo, Byron Alfonso	10/12/2012 - 11:00 AM
SEPTIEMBRE - 2012: Se realiza el trámite para la liquidación económica del proyecto. AGOSTO - 2012: Se realiza el trámite para la liquidación económica del proyecto. JULIO - 2012: Se realiza el trámite para la liquidación económica del proyecto. JUNIO - 2012: Se realiza el trámite para la liquidación económica del proyecto. MAYO - 2012: Se realiza el trámite para la liquidación económica del proyecto. ABRIL - 2012: Se realiza el trámite para la liquidación económica del proyecto. MARZO - 2012: Se realiza el trámite para la liquidación económica del proyecto. Febrero 2012: Se realiza el trámite para la liquidación económica del proyecto ENERO - 2012: Se culmina con los accesos y se realiza señalización horizontal y vertical DICIEMBRE-2011: Hormigonado de cunetas y colocación de subdrenes NOVIEMBRE 2011: Armado de la losa y fundición 1, se concluye con el montaje del acero estructural. OCTUBRE 2011: El 25% del montaje de acero estructural SEPTIEMBRE 2011: El 25% del montaje de acero estructural y 25% de pintura AGOSTO -2011: Se colocan placas de neopreno, el 50% del montaje de acero estructural y el 25% limpieza y pintura de acero estructural JUNIO -2011: Superestructura: juntas de dilatación. Accesos: acabado de obra básica MAYO -2011: Superestructura: hormigón estructural, acero de refuerzo, drenajes, barandales Accesos: excavación sin clasificar y acabado de obra básica ABRIL - 2011: Infraestructura: hormigón estructural y acero de refuerzo, gaviones, material filtrante. Superestructura: hormigón estructural MARZO - 2011: Infraestructura: hormigón ciclópeo, hormigón estructural y acero de refuerzo. Superestructura: acero de refuerzo en barras FEBRERO - 2011: Limpieza y reconfiguración del cauce Infraestructura: Cimentación - excavación y relleno para puentes, hormigón ciclópeo, hormigón estructural y acero de refuerzo, gaviones ENERO - 2011: Infraestructura: Cimentación - excavación y relleno para puentes, hormigón ciclópeo, hormigón estructural y acero de refuerzo. DICIEMBRE - 2010: Limpieza y reconfiguración del cauce, excavación y relleno para puentes, hormigón estructural. Señalización y comunicados, (rubros ambientales) NOVIEMBRE - 2010: Infraestructura: Remoción del puente de hormigón, excavación y relleno para puentes, hormigón estructural y acero de refuerzo. Señalización y comunicados, (rubros ambientales) SEPT. - OCT. -2010: entrega de anticipo, instalación de campamento y construcción de taller de carpintería	Avilés Castillo, Byron Alfonso	07/11/2012 - 03:32 PM

**PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Revisión de la documentación para realizar la liquidación económica pendiente.	23/02/2018	Rolando Alberto Villacis Miranda	50	50	25	0/1

*Problemas cerrados: 2, Abiertos: 1*

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. Recursos.</b> Falta de recursos económicos CAUSARÍA que se prolongue el cierre del proyecto.	23/02/2018	Rolando Alberto Villacis Miranda	30 %	50	15	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Archidona

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Firma del contrato, realizado	3-Adjudicación	25/10/2010		25/10/2010		Sí	2.0
2	PLANEACIÓN: entrega del anticipo, realizado	4-Inicio de Trabajo	10/11/2010		24/01/2011		Sí	3.0
3	PLANEACIÓN: RUBROS AMBIENTALES: señalización, letrina sanitaria, cuñas radiales 50% ,realizados	5-Entregables Intermedios	28/02/2011		28/02/2011		Sí	5.0
4	EJECUCIÓN: ACCESOS:desbroce y limpieza; excavación de suelo y mejoramiento de la subrasante ,realizados	5-Entregables Intermedios	30/03/2011		30/03/2011		Sí	8.0
5	EJECUCIÓN: INFRAESTRUCTURA: Excavación y relleno ,realizados	5-Entregables Intermedios	30/05/2011		30/05/2011		Sí	6.0
6	EJECUCIÓN: INFRAESTRUCTURA: Hormigón Estructural, Acero de refuerzo en barras ,realizados	5-Entregables Intermedios	30/06/2011		30/06/2011		Sí	15.0
7	EJECUCIÓN: INFRAESTRUCTURA: gaviones con revestimiento de pvc ,realizados	5-Entregables Intermedios	30/07/2011		30/07/2011		Sí	4.0
8	EJECUCIÓN: ACCESOS:Sub base, base de hormigón asfáltico y asfalto de imprimación ,realizados	5-Entregables Intermedios	31/10/2011		31/10/2011		Sí	10.0
9	EJECUCIÓN: SUPERESTRUCTURA: Hormigón Estructural, acero de refuerzo en barras, juntas de dilatación ,realizados	5-Entregables Intermedios	31/10/2011		05/11/2011		Sí	11.0
10	EJECUCIÓN: ACCESOS: Capa de rodadura de hormigón asfáltico, Hormigón Estructural en cunetas, pintura marcas de pavimento ,realizados	5-Entregables Intermedios	30/11/2011		30/11/2011		Sí	10.0
11	EJECUCIÓN: INFRAESTRUCTURA: Material filtrante, drenajes,	5-Entregables Intermedios	30/11/2011		30/11/2011		Sí	8.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	limpieza y reconfiguración del cauce ,realizados							
12	EJECUCIÓN: SUPERESTRUCTURA: capa de rodadura, barandales de hormigón ,realizados	5-Entregables Intermedios	30/11/2011		30/11/2011		Sí	3.0
13	EJECUCIÓN: RUBROS AMBIENTALES:cuñas radiales 50% ,realizados	1-Solicitud de Información	16/12/2011		16/12/2011		Sí	2.0
14	EJECUCIÓN: Señalización horizontal y vertical ,realizados	9-Entregables Formales	29/02/2012		15/02/2012		Sí	3.0
15	CIERRE: Acta entrega provisional, firmada	5-Entregables Intermedios	25/10/2012		03/02/2012		Sí	2.0
16	CIERRE: Acta entrega recepción, firmada	9-Entregables Formales	30/11/2012		17/03/2014		Sí	6.0
17	CIERRE: Revisión de la documentación presentada.	5-Entregables Intermedios	10/09/2018	14/09/2018			No	1.0
18	CIERRE: Aprobación de la documentación presentada.	5-Entregables Intermedios	08/10/2018	19/10/2018			No	0.5
19	COMPLETADO: Liquidación económica del proyecto, pagada	9-Entregables Formales	19/11/2018	23/11/2018			No	0.5

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Historico - Ampliación de contrato. Un mes más. Debería ser entregado a fines de diciembre 2011.	Carrera Lopez, Milton Salomón	{PR} - Provincia - NAPO	08/12/2011

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

### COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	177,596.90
Estimado Al Fin Del Proyecto:	698,233.63 **
Costo Total:	698,233.63
Total Devengado:	698,233.63
% Costo Total Devengado:	100.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

### % COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 100.00 %

### Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1,018,233.63	0.00	0.00	1,018,233.63
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
Ppto. Codificado	468,658.91	0.00	0.00	468,658.91
Ppto. Comprometido	94.01	0.00	0.00	94.01
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	708,909.42	0.00	0.00	708,909.42
Ppto. Devengado	698,233.63	0.00	0.00	698,233.63
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 698,233.63	0.00	0.00	698,233.63
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	10,675.79	0.00	0.00	10,675.79
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 98.49 %	0.00 %	0.00 %	98.49 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

### OBJETIVOS ALINEADOS

#### Objetivos Operativos

13	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA RURAYACU	A7.pdf	02/03/2017
2	Acta de Recepción Provisional de la Construcción del Puente Rurayacu	acta_recepcion_provisional_Puente_Rurayacu.pdf	16/05/2013
3	CONTRATO COMPLEMENTARIO RURAYACU	A8.pdf	02/03/2017
4	CONTRATO PUENTE RURAYACU	A9.pdf	02/03/2017
5	CROQUIS AVANCE DE OBRA	PUENTE_RURAYACU-NARUPAYACU.pdf	05/06/2012
6	Fotos del Puente Rurayacu	Fotos.doc	22/05/2012
7	Informe Ejecutivo Sitop-Abril 2017	C1.pdf	05/05/2017

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
8	Informe Ejecutivo Sitop-Marzo 2017	B9.pdf	05/04/2017
9	PAGOS SEGUN ESIGEF ENE-AGO 2012	RURAYACU.pdf	10/09/2012
10	Planilla 10 Pág. 1 al 52 E INFORMES	B1.pdf	05/04/2017
11	Planilla 10 Pág. 53 al 105 E INFORMES	B2.pdf	05/04/2017
12	Planilla 11 Pág. 53 al 106 E INFORMES	B3.pdf	05/04/2017
13	Planilla 11 Pág. 53 al 106 E INFORMES	B4.pdf	05/04/2017
14	Planilla Costo + % Pág. 1 al 54	B8.pdf	05/04/2017
15	Planilla Liquidación Pág. 1 al 68 E INFORMES	B5.pdf	05/04/2017
16	Planilla Liquidación Pág. 110 al 156 E INFORMES	B7.pdf	05/04/2017
17	Planilla Liquidación Pág. 69 al 109 E INFORMES	B6.pdf	05/04/2017
18	Proyecto Priorizado SENPLADES	INFORME_DEFINITIVO-VIABILIDAD_RURAYACU.DOC	04/05/2012

## EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	Asistente de Ingeniería			
León Fernández, Jhoer Gustavo	Subsecretario Regional 2	Analista de Infraestructura Provincial 1	jgleon@mtop.gob.ec	023974600
Solano Pineda, Oscar Santiago	Supervisor de Obra	Analista de Infraestructura Distrital 1	osolano@mtop.gob.ec	023974600
Solano Pineda, Oscar Santiago	Director Provincial (Encargado)	Analista de Infraestructura Distrital 1	osolano@mtop.gob.ec	023974600

## FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
3527_1.jpg	20/02/2018
