

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 5**  
**Dirección Provincial Guayas**

**PROYECTO: K052** MTOP - Programa de apoyo al desarrollo vial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados

Líder del Proyecto:	Calderón Cañar, Edgar Miguel (ecalderon@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	Programas Relacionados:	PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO VIAL DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS, Provincia - Guayas, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Delgado León, Andrés Glen	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	75200000.0000.373954	TIR:	19.46 %
Objetivos Operativos:	5	VAN:	23,852,341.82
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	14,715,838.78
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	16/03/2012 - 03/10/2017
Fecha de última actualización:	27/02/2018	Fecha de Fin Base:	18/05/2014
Modificado por:	Yturralde Escudero, José Miguel Ángel	Fecha del siguiente Hito:	03/10/2017

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

Este proyecto es un camino vecinal ubicado en el cantón Naranjal que se inicia en el KM 18.5 de la vía Naranjal - Machala y avanza hasta la comuna SHUAR, con una longitud de 7,76 KM de longitud y ancho de 6 m.

**PRODUCTO / SERVICIO:**

Ruta de acceso a la Comuna SHUAR.

**LÍNEA BASE:**

Camino vecinal lastrado en mala condiciones.

**OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

Como objetivo general del proyecto será complementar el desarrollo vial y bienestar para los usuarios de la vía con la construcción del proyecto.

**Objetivos específicos:**

Que mejore la infraestructura de transporte de la zona.

Que mejore el turismo en la zona.

**CONTRATOS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA**

C.1 Rehabilitación del camino km 18.5 (Naranjal-Machala) - Comuna Shuar (límite provincial) con una longitud de 7.5 km incluye puentes.

C.2 Colocación de capa de rodadura en vías urbanas - vías de tercer orden de la ciudad General Villamil Playas.

C.3 Convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el Ministerio De Transporte y Obras Públicas, el Banco del Estado y el Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guayas.

C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas.

C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas

**COSTO TOTAL DEL PROYECTO**

Contratos de obra \$ 16,692,199.55

Anexos de obra \$ 863,777.97

**DATOS GENERALES**

Descripción	
Reajustes	\$ 877,798.88
IVA	\$ 2,212,053.17
Fiscalización	\$ 555,921.07
Anexos de fiscalización	\$ 53,493.77
Reajustes	\$ 24,376.59
IVA	\$ 76,054.97
Costo Total	\$ 21,355,675.97

Beneficios Cualitativos	
Mejorar la vida de poblaciones que recorre el proyecto	
VÍA SAN CARLOS - LA JOYA - ABDÓN CALDERÓN	
TIR =	19.46%
VAN =	23'852.341,82
VÍA SAN VICENTE - MACUL	
TIR =	16.60%
VAN =	1'787.096,89

Tipo de Beneficiario	
Sectores agrícolas, ganaderos, comerciales y turístico	


  

Restricciones	
TIEMPO: Terminar el proyecto dentro del tiempo establecido en el contrato.	
COSTO: No excederse del monto presupuestado para el proyecto.	
ALCANCE: Utilizar las canteras o minas según se especifica en los estudios.	
RECURSOS: Utilizar los materiales según las especificaciones técnicas del contrato.	

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución **Cierre** Completado Congelado Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 16/03/2012      Fecha de Fin: 03/10/2017

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

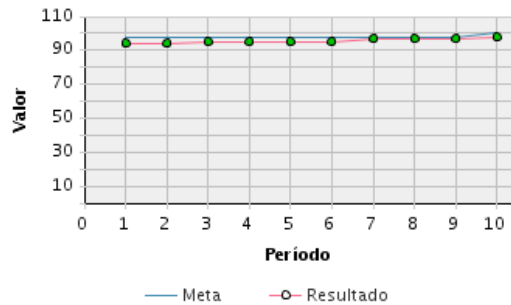

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	100 %	0 %	
	Avance real acumulado											
	94 %	94 %	95 %	95 %	95 %	95 %	97 %	97 %	97 %	98 %		
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2017</p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas.- Esta obra se encuentra en etapa de mantenimiento de prueba a partir del 15/03/2017 que los trabajos fueron concluidos al 100%. Según supervisión realizada en el presente mes la vía se encuentra en buen estado.</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas. - Esta obra se encuentra en etapa de mantenimiento de prueba a partir del Acta de Recepción Provisional Parcial de fecha 30/08/2017. Según inspección realizada en el presente mes, la vía necesita ciertas reparaciones, las mismas que han sido comunicadas al contratista para su inmediata reparación.</p>	<p>Calderón Cañar, Edgar Miguel</p>	<p>29/12/2017 - 09:22 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2017</p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas.- Con fecha 15/03/2017 los trabajos en esta vía fueron concluidos al 100% y se encuentra sirviendo a la comunidad. Esta vía se encuentra recibida con Acta de Recepción Provisional Parcial. Según supervisión mensual realizada en el presente mes la vía se encuentra en buen estado.</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas. - Esta obra se encuentra concluida al 100% y sirviendo a la comunidad. Esta vía se encuentra recibida con Acta de Recepción Provisional Parcial de fecha 30/08/2017. Según inspección realizada en el presente mes, la vía necesita ciertas reparaciones, las mismas que han sido comunicadas al contratista para su inmediata reparación.</p>	<p>Calderón Cañar, Edgar Miguel</p>	<p>05/12/2017 - 08:25 AM</p>
<p>OCTUBRE 2017</p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas.- Con fecha 15/03/2017 los trabajos en esta vía fueron concluidos al 100% y se encuentra sirviendo a la comunidad. Esta vía se encuentra recibida con Acta de Recepción Provisional Parcial.</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas. - Esta obra se encuentra concluida al 100% y sirviendo a la comunidad. Esta vía se encuentra recibida con Acta de Recepción Provisional Parcial de fecha 30/08/2017.</p>	<p>Calderón Cañar, Edgar Miguel</p>	<p>01/11/2017 - 08:40 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2017</p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas.- Con fecha 15/03/2017 los trabajos en esta vía fueron concluidos al 100% y se encuentra sirviendo a la comunidad. Esta vía se encuentra recibida con Acta de Recepción Provisional Parcial.</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas. - Esta obra se encuentra concluida al 100% y sirviendo a la comunidad. Esta vía se encuentra recibida con Acta de Recepción Provisional Parcial.</p>	<p>Calderón Cañar, Edgar Miguel</p>	<p>04/10/2017 - 01:21 PM</p>
<p>AGOSTO 2017</p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas.- Con fecha 15/03/2017 los trabajos en esta vía fueron concluidos al 100% y se encuentra sirviendo a la comunidad. Contratista realizó la reparación del aproche del puente sobre el río Macul, que por presencia del temporal invernal y la crecida del río, erosionó el talud del aproche del lado derecho del puente, además se espera la visita ambiental para su aceptación y cierre del plan ambiental previo a la recepción Provisional..</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas. - Esta obra se encuentra concluida al 100% y sirviendo a la comunidad. Aún no se ha realizado la recepción Provisional debido a que falta concluir por parte del contratista el cierre del plan ambiental.</p>	<p>Calderón Cañar, Edgar Miguel</p>	<p>04/10/2017 - 01:19 PM</p>
<p>JULIO 2017</p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas.- Con fecha</p>	<p>Calderón Cañar, Edgar Miguel</p>	<p>02/08/2017 - 03:38 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>15/03/2017 los trabajos en esta vía fueron concluidos al 100% y se encuentra sirviendo a la comunidad. Contratista realizó la reparación del aproche del puente sobre el río Macul, que por presencia del temporal invernal y la crecida del río, erosiono el talud del aproche del lado derecho del puente, además se espera la visita ambiental para su aceptación y cierre del plan ambiental previo a la recepción Provisional..</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas. - Esta obra se encuentra concluida al 100% y sirviendo a la comunidad. Aún no se ha realizado la recepción Provisional debido a que falta concluir por parte del contratista el cierre del plan ambiental.</p>		
<p><b>JUNIO 2017</b></p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas.- Con fecha 15/03/2017 los trabajos en esta vía fueron concluidos al 100% y se encuentra sirviendo a la comunidad. Aún no se ha realizado la recepción Provisional debido a que aún no se ha realizado por parte del contratista el cierre del plan ambiental.</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas. - Esta obra se encuentra concluida al 100% y sirviendo a la comunidad. Contratista se encuentra ejecutando reparación del aproche del puente sobre el río Macul, que por presencia del temporal invernal la crecida del río erosiono el talud del aproche del lado derecho del puente, trabajos que debe ejecutar el contratista previo a la recepción provisional de la obra.</p>	Calderón Cañar, Edgar Miguel	04/07/2017 - 10:46 AM
<p><b>ABRIL 2017</b></p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas.- Con fecha 15/03/2017 los trabajos en esta vía fueron concluidos, el contratista ha solicitado la recepción provisional de la obra, pero fiscalización ha solicitado ciertas reparaciones previo a la recepción provisional. Contratista por incrementos de lluvias no ha podido realizar reparaciones.</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas. - Luego de ciertas reparaciones a la señalización horizontal y vertical realizadas por el contratista de la ejecución de la obra, esta se ha concluido con todos los trabajos, objeto del contrato el 30/01/2017, además esta vía fue inaugurada el 8/02/2017 por el Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas y se encuentra en trámite la recepción provisional de la obra. Es necesario el levantamiento de minas y campamentos. Se nombrará comisión técnica para el efecto.</p>	Calderón Cañar, Edgar Miguel	03/05/2017 - 10:34 PM
<p><b>MARZO 2017</b></p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas.- Con fecha 15/03/2017 los trabajos en esta vía fueron concluidos, el contratista ha solicitado la recepción provisional de la obra, pero fiscalización ha solicitado ciertas reparaciones previo a la recepción provisional.</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas. - Luego de ciertas reparaciones a la señalización horizontal y vertical realizadas por el contratista de la ejecución de la obra, esta se ha concluido con todos los trabajos, objeto del contrato el 30/01/2017, además esta vía fue inaugurada el 8/02/2017 por el Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas y se encuentra en trámite la recepción provisional de la obra.</p>	Calderón Cañar, Edgar Miguel	04/04/2017 - 10:41 AM
<p><b>FEBRERO 2017</b></p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas.- EN el presente mes se ha fundido el 100% de los estribos del puente sobre el estero Las Piedras de ambas margenes con un hormigón de resistencia a la compresión de <math>f'c = 280\text{Kg/cm}^2</math>, por lo que el porcentaje de avance en la fundición del puente es del 100%, se continúan realizando los rubros de relleno de los aproches; así mismo continúa en trámite actos administrativos por el incremento de cantidades y creación de rubros nuevos para cumplir con el objeto del contrato.</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas. - Se ha concluido con todos los trabajos, objeto del contrato el 30/11/2016, además esta vía fue inaugurada el 8/02/2017 por el Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas.</p>	Calderón Cañar, Edgar Miguel	03/03/2017 - 04:06 PM
<p><b>ENERO 2017:</b></p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas.- En el presente mes se ha fundido el 25% de los estribos del puente sobre el estero Las Piedras de ambas</p>	Calderón Cañar, Edgar Miguel	02/02/2017 - 10:03 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>margenes con un hormigón de resistencia a la compresión de <math>f'c = 280\text{Kg/cm}^2</math>, por lo que el porcentaje de avance en la fundición del puente es del 75%; se encuentra en trámite actos administrativos por el incremento de cantidades y creación de rubros nuevos para cumplir con el objeto del contrato.</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas. - Se ha concluido con todos los trabajos, objeto del contrato el 30/11/2016, pero los trabajos de señalización vertical han sido observados por no cumplir con especificaciones de retroreflectividad, razón por la cual la recepción provisional aún no procede. En la última semana del mes de enero se volvieron a realizar ensayos de retroreflectividad, se espera resultados.</p>		
<p>DICIEMBRE 2016:</p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas.- En el presente mes se ha fundido el 50% de los estribos del puente sobre el estero Las Piedras de ambas margenes con un hormigón de resistencia a la compresión de <math>f'c = 280\text{Kg/cm}^2</math>; se encuentra en trámite actos administrativos por el incremento de cantidades y creación de rubros nuevos para cumplir con el objeto del contrato.</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas. - Se ha concluido con los todos los trabajos el 30/11/2016, pero los trabajos de señalización vertical han sido observados por no cumplir con especificaciones de retroreflectividad, razón por la cual la recepción provisional aún no procede.</p>	Calderón Cañar, Edgar Miguel	05/01/2017 - 08:09 AM
<p>NOVIEMBRE 2016:</p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas.- En el presente mes se ha colocado carpeta asfáltica en un 100%, señales verticales, chevrones y guardavías. En el puente sobre el estero Las Piedras se han derribado los estribos debido a que no cumplían la resistencia especificada que es de <math>f'c = 280\text{Kg/cm}^2</math>, se tiene considerado para el 15/12/2016 esten nuevamente fundido; se encuentra en trámite actos administrativos por el incremento de cantidades y creación de rubros nuevos para cumplir con el objeto del contrato.</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas. - Se ha concluido con los todos los trabajos el 30/11/2016, se solicitará la recepción parcial en próximos días; se encuentra en trámite actos administrativos por el incremento de cantidades y creación de rubros nuevos para cumplir con el objeto del contrato.</p>	Calderón Cañar, Edgar Miguel	05/12/2016 - 08:43 AM
<p>OCTUBRE 2016:</p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas.- En el presente mes se ha colocado carpeta asfáltica en un 100%, se sigue colocando señales verticales, chevrones y guardavías. Se encuentra pendiente de pago las planillas de ejecución de obra (desde la 1 hasta la 22).</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas. - Se ha colocado la carpeta asfáltica desde el Km 0+230 hasta la población de Abdón Calderón Km 10+760, se han concluido los trabajos de construcción de bordillos y cunetas en la población de San Carlos 0+000 - 0+230, además también se han colocado chevrones y se ha realizado marcas de pavimento desde la abscisa 0+230 hasta la 10+760. Se encuentra pendiente de pago las planillas de ejecución de obra (desde la 1 hasta la 21).</p>	Calderón Cañar, Edgar Miguel	01/11/2016 - 04:07 PM
<p>SEPTIEMBRE 2016:</p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas.- En el presente mes se ha colocado carpeta asfáltica en un 95% y se sigue colocando la señalización vertical; pero aún se encuentra pendiente de pago las planillas de ejecución de obra (desde la 1 hasta la 16). Con fecha 29/06/2016 se pago el 35% del anticipo adeudado.</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas. - Se ha colocado la carpeta asfáltica desde el Km 0+230 hasta la población de Abdón Calderón Km 10+760, se están ejecutando trabajos de construcción de bordillos y cunetas en la población de San Carlos 0+000 - 0+230. se encuentra pendiente de pago las planillas de ejecución de obra (desde la 1 hasta la 20).</p>	Calderón Cañar, Edgar Miguel	05/10/2016 - 03:34 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2016:</p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas.- En el presente mes se ha colocado carpeta asfáltica en un 95% y se ha colocado algunas señales verticales; pero aún se encuentra pendiente de pago las planillas de ejecución de obra (desde la 1 hasta la 14). Con fecha 29/06/2016 se pago el 35% del anticipo adeudado.</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas. - Se coloca base granular clase 4, carpeta asfáltica y se construyen cabezales de hormigón estructural, aún se encuentra pendiente de pago las planillas de ejecución de obra (desde la 1 hasta la 20).</p>	<p>Calderón Cañar, Edgar Miguel</p>	<p>07/09/2016 - 03:47 PM</p>
<p>JULIO 2016:</p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas.- En el presente mes se ha colocado carpeta asfáltica y señalización vertical, aún se encuentra pendiente de pago las planillas de ejecución de obra (desde la 1 hasta la 14) y los trabajos de la vía se reiniciarán al 100% a partir del 11/07/2016, una vez que se haga efectivo el anticipo.</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas. - Se coloca base granular clase 4, carpeta asfáltica y se construyen cabezales de hormigón estructural, aún se encuentra pendiente de pago las planillas de ejecución de obra (desde la 1 hasta la 17) y los trabajos de la vía se reiniciarán al 100% a partir del 11/07/2016, una vez que se haga efectivo el anticipo.</p>	<p>Calderón Cañar, Edgar Miguel</p>	<p>05/08/2016 - 08:00 AM</p>
<p>JUNIO 2016:</p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas.- Según autoridades superiores del MTOP indicaron que ya se procedió a depositar el 35% del anticipo con el crédito chino que se adeudaba al contratista, aún se encuentra pendiente de pago las planillas de ejecución de obra (desde la 1 hasta la 14) y los trabajos de la vía se reiniciarán al 100% a partir del 11/07/2016, una vez que se haga efectivo el anticipo.</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas. - Según autoridades superiores del MTOP indicaron que ya se procedió a depositar el 35% del anticipo con el crédito chino que se adeudaba al contratista, aún se encuentra pendiente de pago las planillas de ejecución de obra (desde la 1 hasta la 17) y los trabajos de la vía se reiniciarán al 100% a partir del 11/07/2016, una vez que se haga efectivo el anticipo.</p>	<p>Calderón Cañar, Edgar Miguel</p>	<p>06/07/2016 - 08:56 AM</p>
<p>MAYO 2016:</p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas.- Se autorizó una ampliación de plazo hasta el 31/08/2016, aún se encuentra pendiente de pago las planillas de ejecución de obra (desde la 1 hasta la 14) y los trabajos de la vía se ejecutan a un nivel mínimo, por motivo de la falta de pago de planillas.</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas. - Se autorizó una ampliación de plazo hasta el 31/08/2016, aún se encuentra pendiente de pago las planillas de ejecución de obra (desde la 1 hasta la 16) y los trabajos de la vía se ejecutan a un nivel mínimo, por motivo de la falta de pago de planillas.</p>	<p>Calderón Cañar, Edgar Miguel</p>	<p>07/06/2016 - 08:27 AM</p>
<p>ABRIL 2016:</p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas.- Se autorizó una ampliación de plazo hasta el 31/08/2016, aún se encuentra pendiente de pago las planillas de ejecución de obra (desde la 1 hasta la 14) y los trabajos de la vía se ejecutan a un nivel mínimo debido a la presencia del invierno.</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas. - Se autorizó una ampliación de plazo hasta el 31/08/2016, aún se encuentra pendiente de pago las planillas de ejecución de obra</p>	<p>Calderón Cañar, Edgar Miguel</p>	<p>04/05/2016 - 03:06 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
(desde la 1 hasta la 14) y los trabajos de la vía se ejecutan a un nivel mínimo debido a la presencia del invierno.		
<p>MARZO 2016:</p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas.- Los trabajos de la vía se ejecutan a un nivel mínimo debido a la presencia del invierno. Se encuentra pendiente de pago las planillas de ejecución de obra (desde la 1 hasta la 14).</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas. - Los trabajos se ejecutan a un nivel mínimo debido a la presencia del invierno y que aún no le pagan el total del anticipo al contratista y todas las planillas de ejecución de obra se encuentran en trámite (desde la 1 hasta la 14).</p>	Calderón Cañar, Edgar Miguel	04/05/2016 - 03:05 PM
<p>FEBRERO 2016: RESÚMENES DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA</p> <p>C.1 La Rehabilitación del camino km 18.5 (Naranjal-Machala) - Comuna Shuar (límite provincial), se encuentra concluido con acta de recepción definitiva y cerrado en el sitop.</p> <p>C.2 La Colocación de capa de rodadura en vías urbanas - vías de tercer orden de la ciudad General Villamil Playas, se encuentra concluido con acta de recepción definitiva y cerrado en el sitop.</p> <p>C.3 Convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el Ministerio De Transporte y Obras Públicas, el Banco del Estado y el Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guayas.- Proyecto completado.</p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas.- Se encuentra construido el puente en el sector Las Piedras y sirviendo a la comunidad, los trabajos de la vía se ejecutan a un nivel mínimo debido a la presencia del invierno. Se encuentra pendiente de pago las planillas de ejecución de obra (desde la 1 hasta la 14).</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas. - Los trabajos se ejecutan a un nivel mínimo debido a la presencia del invierno y que aún no le pagan el total del anticipo al contratista y todas las planillas de ejecución de obra se encuentran en trámite (desde la 1 hasta la 14).</p>	Calderón Cañar, Edgar Miguel	08/03/2016 - 11:30 AM
<p>NOVIEMBRE 2015: RESÚMENES DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA</p> <p>C.1 Rehabilitación del camino km 18.5 (Naranjal-Machala) - Comuna Shuar (límite provincial) con una longitud de 7.5 km incluye puentes.- Este proyecto se encuentra concluido con acta de recepción definitiva y cerrado en el sitop.</p> <p>C.2 Colocación de capa de rodadura en vías urbanas - vías de tercer orden de la ciudad General Villamil Playas.- Este proyecto se encuentra concluido con acta de recepción definitiva y cerrado en el sitop.</p> <p>C.3 Convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el Ministerio De Transporte y Obras Públicas, el Banco del Estado y el Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guayas.- Proyecto completado.</p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas.- Se encuentra colocado material de base hasta el Km 4+500 y a partir de este kilometraje se esta colocando entre sub base y base, además se encuentran construidos los estribos del puente en el sector Las Piedras, Los trabajos se ejecutan a un nivel mínimo debido a la presencia de agua y a que aún no le pagan el total del anticipo al contratista y todas las planillas de ejecución de obra se encuentran en trámite (desde la 1 hasta la 12)., se trabaja en la mina San Antonio, explotando y acopiando material de subbase y base.</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas. - Se continua colocando material de subbase a partir de la población de La Joya hacia Abdón Calderón, en el tramo San Carlos - La Joya se encuentra a nivel de base. Los trabajos se ejecutan a un nivel mínimo debido a la presencia de agua y a que aún no le pagan el total del anticipo al contratista y todas las planillas</p>	Calderón Cañar, Edgar Miguel	08/12/2015 - 12:05 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>de ejecución de obra se encuentran en trámite (desde la 1 hasta la 12)., se trabaja en la mina San Antonio, explotando y acopiando material de subbase y base.</p>		
<p><b>OCTUBRE 2015: RESÚMENES DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA</b></p> <p>C.1 Rehabilitación del camino km 18.5 (Naranjal-Machala) - Comuna Shuar (límite provincial) con una longitud de 7.5 km incluye puentes. Proyecto completado.</p> <p>C.2 Colocación de capa de rodadura en vías urbanas - vías de tercer orden de la ciudad General Villamil Playas. Proyecto completado.</p> <p>C.3 Convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el Ministerio De Transporte y Obras Públicas, el Banco del Estado y el Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guayas. Proyecto completado.</p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas. Continúan los trabajos de transporte y stockeo de sub-base clase 3, transporte y colocación base 4.</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas. Continúan los trabajos de Desbroce y limpieza, Excavación sin clasificación, colocación y Transporte de Préstamo Importado, Colocación y transporte de sub-base, Acero de refuerzo en barras, Hormigon estructural cemento portland Clase C, Colocación y transporte de base, Escombreras, Agua para control de polvo, se trabaja en la mina San Antonio, explotando y acopiando material.</p>	<p>Palacios Pesantes, Daniel</p>	<p>05/11/2015 - 11:37 AM</p>
<p><b>SEPTIEMBRE 2015: RESÚMENES DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA</b></p> <p>C.1 Rehabilitación del camino km 18.5 (Naranjal-Machala) - Comuna Shuar (límite provincial) con una longitud de 7.5 km incluye puentes. Proyecto completado.</p> <p>C.2 Colocación de capa de rodadura en vías urbanas - vías de tercer orden de la ciudad General Villamil Playas. Proyecto completado.</p> <p>C.3 Convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el Ministerio De Transporte y Obras Públicas, el Banco del Estado y el Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guayas. Proyecto completado.</p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas. Continúan los trabajos de transporte y stockeo de sub-base clase 3, transporte y colocación base 4.</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas. Continúan los trabajos de Desbroce y limpieza, Excavación sin clasificación, colocación y Transporte de Préstamo Importado, Colocación y transporte de sub-base, Acero de refuerzo en barras, Hormigon estructural cemento portland Clase C, Colocación y transporte de base, Escombreras, Agua para control de polvo, se trabaja en la mina San Antonio, explotando y acopiando material.</p>	<p>Palacios Pesantes, Daniel</p>	<p>05/11/2015 - 11:36 AM</p>
<p><b>AGOSTO 2015: RESÚMENES DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA</b></p> <p>C.1 Rehabilitación del camino km 18.5 (Naranjal-Machala) - Comuna Shuar (límite provincial) con una longitud de 7.5 km incluye puentes. Proyecto completado.</p> <p>C.2 Colocación de capa de rodadura en vías urbanas - vías de tercer orden de la ciudad General Villamil Playas. Proyecto completado.</p>	<p>Palacios Pesantes, Daniel</p>	<p>05/11/2015 - 11:36 AM</p>



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>C.3 Convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el Ministerio De Transporte y Obras Públicas, el Banco del Estado y el Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guayas. Proyecto completado.</p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas. Continúan los trabajos de transporte y stockeo de sub-base clase 3, transporte y colocación base 4.</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas. Continúan los trabajos de Desbroce y limpieza, Excavación sin clasificación, colocación y Transporte de Préstamo Importado, Colocación y transporte de sub-base, Acero de refuerzo en barras, Hormigon estructural cemento portland Clase C, Colocación y transporte de base, Escombreras, Agua para control de polvo, se trabaja en la mina San Antonio, explotando y acopiando material.</p>		
<p><b>JULIO 2015: RESÚMENES DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA</b></p> <p>C.1 Rehabilitación del camino km 18.5 (Naranjal-Machala) - Comuna Shuar (límite provincial) con una longitud de 7.5 km incluye puentes. Proyecto completado.</p> <p>C.2 Colocación de capa de rodadura en vías urbanas - vías de tercer orden de la ciudad General Villamil Playas. Proyecto completado.</p> <p>C.3 Convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el Ministerio De Transporte y Obras Públicas, el Banco del Estado y el Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guayas. Proyecto completado.</p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas. Continúan los trabajos de transporte y stockeo de sub-base clase 3, transporte y colocación base 4.</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas. Continúan los trabajos de Desbroce y limpieza, Excavación sin clasificación, colocación y Transporte de Préstamo Importado, Colocación y transporte de sub-base, Acero de refuerzo en barras, Hormigon estructural cemento portland Clase C, Colocación y transporte de base, Escombreras, Agua para control de polvo, se trabaja en la mina San Antonio, explotando y acopiando material.</p>	<p>Mendoza Cedeno, José Eugenio</p>	<p>07/09/2015 - 01:52 PM</p>
<p><b>JULIO 2015: RESÚMENES DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA</b></p> <p>C.1 Rehabilitación del camino km 18.5 (Naranjal-Machala) - Comuna Shuar (límite provincial) con una longitud de 7.5 km incluye puentes. Proyecto completado.</p> <p>C.2 Colocación de capa de rodadura en vías urbanas - vías de tercer orden de la ciudad General Villamil Playas. Proyecto completado.</p> <p>C.3 Convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el Ministerio De Transporte y Obras Públicas, el Banco del Estado y el Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guayas. Proyecto completado.</p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas. Se realizan trabajos de: transporte y stockeo de sub-base clase 3, transporte y colocación base 4 para abscisas: 5+900, 6+180, 5+280 y 5+660.</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas.</p>	<p>Mendoza Cedeno, José Eugenio</p>	<p>13/08/2015 - 01:57 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Avance de obra con los siguientes trabajos: Desbroce, desbosque y limpieza, Excavación sin clasificación, colocación y Transporte de Préstamo Importado, Colocación y transporte de sub-base, Acero de refuerzo en barras, Hormigón estructural cemento portland Clase C, Colocación y transporte de base, Escombreras, Agua para control de polvo, se trabaja en la mina San Antonio, explotando y acopiando material.</p>		
<p><b>JUNIO 2015:</b>                      C.1 Rehabilitación del camino km 18.5 (Naranjal-Machala) - Comuna Shuar (límite provincial) con una longitud de 7.5 km incluye puentes.                      Proyecto completado.</p> <p>C.2 Colocación de capa de rodadura en vías urbanas - vías de tercer orden de la ciudad General Villamil Playas.                      Proyecto completado.</p> <p>C.3 Convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el Ministerio De Transporte y Obras Públicas, el Banco del Estado y el Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guayas.                      Proyecto completado.</p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas.                      Se realizan trabajos de: vaciado de hormigón estructural tipo A de 280 Kg/cm<sup>2</sup> para ducto cajón, acero de refuerzo en barras para muros de escuela, transporte y colocación de sub-base clase 3, mejoramiento de la subrasante y transporte, excavación y relleno para estructuras menores (muro de escuela) y, vaciado de hormigón estructural tipo C de 140 Kg/cm<sup>2</sup> para replantillo de muro de escuela. Se continúa trabajando en colocación de sub-base clase 3, está por terminarse la colocación total de este rubro.</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas.                      Avance de obra con los siguientes trabajos: Desbroce, desbosque y limpieza, colocación y Transporte de Préstamo Importado, Excavación y Relleno para Estructuras, Excavación para cunetas y encauzamientos en terrenos particulares, Escombreras, se trabaja en la mina San Antonio, explotando y acopiando material.</p>	<p>Mendoza Cedeno, José Eugenio</p>	<p>10/07/2015 - 05:10 PM</p>
<p><b>MAYO 2015:</b>                      C.1 Rehabilitación del camino km 18.5 (Naranjal-Machala) - Comuna Shuar (límite provincial) con una longitud de 7.5 km incluye puentes.                      Proyecto completado. Con fecha 10 de marzo de 2015 se suscribió Acta de Recepción Definitiva de la obra.</p> <p>C.2 Colocación de capa de rodadura en vías urbanas - vías de tercer orden de la ciudad General Villamil Playas.                      Proyecto completado.</p> <p>C.3 Convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el Ministerio De Transporte y Obras Públicas, el Banco del Estado y el Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guayas.                      Proyecto completado.</p> <p>C.4 Guayas- (Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas.                      Se realizan trabajos de: vaciado de hormigón estructural tipo A de 280 Kg/cm<sup>2</sup> para ducto cajón, , acero de refuerzo en barras para cabezales y ducto cajón, mejoramiento y transporte de material de mejoramiento para la subrasante, excavación y relleno para estructuras menores y, colocación de Geotextil para subdren. Lluvias continúan retrasando trabajos. Está lista autorización de la ARCH para iniciar trabajos de protección de tubería GLP.</p> <p>C.5 Guayas- (Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas.                      Avance de obra con los siguientes trabajos: Excavación sin Clasificar, Excavación y Desalojo (a máquina), colocación y Transporte de Préstamo Importado, colocación y transporte de sub-base, Excavación y Relleno para Estructuras, colocación y transporte de base, tubería de hormigón armado de 60", vallas móviles, Agua para control de polvo, se trabaja en la mina San Antonio, explotando y acopiando material.</p>	<p>Mendoza Cedeno, José Eugenio</p>	<p>10/07/2015 - 05:10 PM</p>
<p><b>MARZO 2015:</b> Se tramita el Acta de Entrega Recepción Provisional. HITO 13.</p>	<p>Palacios Pesantes, Daniel</p>	<p>06/04/2015 - 01:58 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
FEBRERO 2015: Se tramita el Acta de Entrega Recepción Provisional. HITO 13.	Palacios Pesantes, Daniel	09/03/2015 - 02:41 PM
ENERO 2015: Se tramita el Acta de Entrega Recepción Provisional. HITO 13.	Palacios Pesantes, Daniel	09/03/2015 - 02:37 PM
DICIEMBRE 2014: Se tramita el Acta de Entrega Recepción Provisional. HITO 13.	Palacios Pesantes, Daniel	29/12/2014 - 11:33 AM
NOVIEMBRE 2014: Se tramita el Acta de Entrega Recepción Provisional. HITO 13.	Palacios Pesantes, Daniel	07/12/2014 - 11:50 PM
OCTUBRE 2014: Se tramita el Acta de Entrega Recepción Provisional. HITO 13.	Palacios Pesantes, Daniel	06/11/2014 - 12:21 PM
SEPTIEMBRE 2014: Se legaliza el Acta de Recepción Provisional y se la sube al SITOP y al GPR. HITO 13.	Palacios Pesantes, Daniel	20/10/2014 - 08:50 AM
Agosto 2014: Se tramita el Acta de Entrega Recepción Provisional. HITO 13.	Palacios Pesantes, Daniel	11/09/2014 - 10:41 PM
Julio 2014: Se tramita el Acta de Entrega Recepción Provisional. HITO 13.	Palacios Pesantes, Daniel	10/08/2014 - 09:24 PM
Junio 2014: Se tramita el Acta de Entrega Recepción Provisional. HITO 13.	Palacios Pesantes, Daniel	20/07/2014 - 12:12 AM
MAYO 2014: Se tramita el Acta de Entrega Recepción Provisional. HITO 13 y 14.	Palacios Pesantes, Daniel	07/06/2014 - 02:18 PM
Abril 2014: Se tramita el Acta de Entrega Recepción Provisional. HITO 13	Palacios Pesantes, Daniel	07/06/2014 - 02:18 PM
Marzo 2014: Se tramita el Acta de Entrega Recepción Provisional. HITO 13	Palacios Pesantes, Daniel	22/04/2014 - 12:28 PM
Febrero 2014: Concluyen los trabajos de colocación de la Capa de Rodadura y señalización horizontal y vertical. HITO 11 Y 12.	Palacios Pesantes, Daniel	21/03/2014 - 01:24 AM
Enero 2014: Se aumentó 45 días por la falta de capacidad de producción de material necesario para el proyecto en la planta que proveía la Base Clase 1. HITO 11.	Palacios Pesantes, Daniel	21/03/2014 - 01:18 AM
Diciembre 2013: Se ha continuado con el transporte del material de Base Clase 1 del km 1+800 al 3+500 se ha colocado las losetas y encofrado para la fundición de las losas de los tres puentes del proyecto. Se ha construido los muros de gaviones en un 75% sobre el lado izquierdo del estero Seco, las Damas y el Venado. Se ha terminado la colocación de la tubería de 10 pulgadas. HITO 7, 8, 9, 10, 11, 12.	Palacios Pesantes, Daniel	09/01/2014 - 02:39 PM
Noviembre 2013: Se ha colocado base clase 1 del km 3+500 al 6+500 con excepción de los accesos a los puentes Las Damas y El Venado. Se ha colocado los diafragmas y losetas de Hormigón del tablero del puente sobre el Estero Seco y las vigas tipo California de hormigón pre-comprimido de los Puentes sobre los esteros Las Damas y El Venado. Se ha empezado a construir los gaviones al pie del Puente Estero Seco. Y se ha continuado con la instalación de la tubería de agua potable de 10" del km. 1 al km 3+500. (HITO: 7,8 Y 9).	Palacios Pesantes, Daniel	09/01/2014 - 02:27 PM
Octubre 2013: Se ha colocado base clase 1 y carpeta asfáltica del km 6+500 al 7+800, se ha colocada la tubería abovedada tipo Armico en el canal de agua ubicado en el km 2+620, se ha colocado vigas tipo California de hormigón pre-comprimido en el puente Estero Seco.	Palacios Pesantes, Daniel	06/11/2013 - 11:42 AM
Septiembre 2013: Se está construyendo muros de ala en el estribo del puente sobre el estero El Venado, se continúa colocación de sub-base y base.	Palacios Pesantes, Daniel	18/09/2013 - 11:50 AM
Agosto 2013: Se termino de transportar material de préstamo importado, colocó material de Sub-base y construyo cabezales de hormigón en alcantarillas y hormigón armado en el estribo del puente El Venado.	Jácome Cevallos, Hermes Aroldo	10/09/2013 - 09:57 AM
Julio 2013: En este periodo se continuo trabajando en la construcción de los estribos de los puentes sobre los esteros Las Damas y el Venado, se estockea material de subbase en el campamento así como también se ha colocado señalización preventiva a lo largo de la obra y trabajos de topografía.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	20/08/2013 - 08:23 AM
Junio 2013: Se ha comenzado a construir la estructura de los dos puentes; se ha completado la colocación de material préstamo importado; retiro de poste de luz de la vía	Jácome Cevallos, Hermes Aroldo	02/07/2013 - 09:25 AM
Marzo a Mayo 2013: Transporte y colocación de material de préstamo importado; colocación de alcantarillas de hormigón	Jácome Cevallos, Hermes Aroldo	02/07/2013 - 09:24 AM

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Febrero 2013: Se entrega anticipo 21/feb/2013 y se inician los trabajos	Jácome Cevallos, Hermes Aroldo	02/07/2013 - 09:23 AM

Problemas cerrados: 7, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 0

## LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 5 - Litoral > Guayas > Balao
2	Zona 5 - Litoral > Guayas > Naranjal

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: C.3 Convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el Ministerio De Transporte y Obras Públicas, el Banco del Estado y el Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guayas.	5-Entregables Intermedios	16/03/2012		16/03/2012		Sí	1.0
2	PLANEACIÓN: C.1 Contrato Rehabilitación del camino km 18.5 (Naranjal-Machala) - Comuna Shuar, firmado.	3-Adjudicación	15/01/2013		15/01/2013		Sí	1.0
3	EJECUCIÓN: C.1 Trabajos de la Rehabilitación del camino km 18.5 (Naranjal-Machala) - Comuna Shuar iniciados.	4-Inicio de Trabajo	21/02/2013		21/02/2013		Sí	1.0
4	EJECUCIÓN: C.1 Rehabilitación del camino km 18.5 (Naranjal-Machala) - Comuna Shuar Transporte y Material préstamo importado, terminado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2013		30/06/2013		Sí	18.0
5	EJECUCIÓN: C.2 Colocación de capa de rodadura en vías urbanas - vías de tercer orden de la ciudad General Villamil Playas.	5-Entregables Intermedios	20/07/2013		30/09/2014		Sí	1.0
6	EJECUCIÓN: C.1 Colocación de alcantarillas en la Rehabilitación del camino km 18.5 (Naranjal-Machala) - Comuna Shuar , terminado.	5-Entregables Intermedios	20/08/2013		20/08/2013		Sí	3.0
7	EJECUCIÓN: C.1 Transporte de materiales (Préstamo Importado) en la Rehabilitación del camino km 18.5 (Naranjal-Machala) - Comuna Shuar , terminado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/08/2013		30/08/2013		Sí	12.0
8	EJECUCIÓN: C.1 Colocación de Sub-base Rehabilitación del camino km 18.5 (Naranjal-	5-Entregables Intermedios	27/09/2013		27/09/2013		Sí	3.0


**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Machala) - Comuna Shuar , terminado.							
9	EJECUCIÓN: C.1 Puente Estero Venado en Rehabilitación del camino km 18.5 (Naranjal-Machala) - Comuna Shuar , terminado.	5-Entregables Intermedios	28/10/2013		13/01/2014		Sí	19.0
10	EJECUCIÓN: C.1 Puente Estero Las Damas Rehabilitación del camino km 18.5 (Naranjal-Machala) - Comuna Shuar , terminado.	5-Entregables Intermedios	29/10/2013		13/01/2014		Sí	4.0
11	EJECUCIÓN: C.1 Puente Estero Seco Rehabilitación del camino km 18.5 (Naranjal-Machala) - Comuna Shuar , terminado.	5-Entregables Intermedios	30/10/2013		13/01/2014		Sí	5.0
12	EJECUCIÓN: C.1 Colocación de Base material Rehabilitación del camino km 18.5 (Naranjal-Machala) - Comuna Shuar , terminado.	5-Entregables Intermedios	05/12/2013		20/01/2014		Sí	2.0
13	EJECUCIÓN: C.1 Carpeta asfáltica Rehabilitación del camino km 18.5 (Naranjal-Machala) - Comuna Shuar, terminada.	5-Entregables Intermedios	10/12/2013		03/02/2014		Sí	22.0
14	EJECUCIÓN: C.1 Señalización Rehabilitación del camino km 18.5 (Naranjal-Machala) - Comuna Shuar , terminada.	5-Entregables Intermedios	20/12/2013		24/02/2014		Sí	1.0
15	EJECUCIÓN: C.5 Guayas-(Macrocontrato 8370) Construcción de la vía San Carlos-La Joya-Abdón Calderón, ubicado en el cantón Balao de la provincia del Guayas	5-Entregables Intermedios	30/01/2016		30/01/2017		Sí	1.0
16	CIERRE: Acta entrega provisional, firmada.	9-Entregables Formales	31/03/2016		31/07/2017		Sí	2.0
17	CIERRE: Liquidación económica, realizada	9-Entregables Formales	31/03/2016		03/10/2017		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN: C.4 Guayas-(Macrocontrato 8370) Rehabilitación y ampliación de La Vía San Vicente-Macul, long. 8km. Incluye puentes, ubicado en el cantón Balzar, provincia del Guayas.	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		15/03/2017		Sí	1.0
19	COMPLETADO: Acta entrega definitiva, firmada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	03/10/2017	03/10/2017			No	2.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	AVANCE FÍSICO DE OBRA DE LA VÍA SAN CARLOS - LA JOYA - ABDÓN CALDERÓN		100.00 %	100	100	01/01/2016	Diciembre

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
2	AVANCE FÍSICO DE OBRA DE LA VÍA SAN VICENTE - MACUL		100.00 %	100	100	01/01/2016	Diciembre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	748,163.96
Estimado Al Fin Del Proyecto:	14,715,838.78 **
Costo Total:	21,355,675.97
Total Devengado:	14,715,838.78
% Costo Total Devengado:	68.91 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 68.91 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	2,493,880.88	0.00	0.00	2,493,880.88
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	16,107,265.80	0.00	0.00	16,107,265.80
Ppto. Codificado	17,342,841.82	0.00	0.00	17,342,841.82
Ppto. Comprometido	13,879,469.86	0.00	0.00	13,879,469.86
Planeado - Codificado (2017)		0.00		
Programado a Devengar	9,245,300.59	0.00	0.00	9,245,300.59
Ppto. Devengado	14,715,838.78	0.00	0.00	14,715,838.78
Pagado Real	6,491,234.78	0.00	0.00	6,491,234.78
Estimado a fin de año	* 14,715,838.78	0.00	0.00	14,715,838.78
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-5,470,538.19	0.00	0.00	-5,470,538.19
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 159.17 %	0.00 %	0.00 %	159.17 %
Ppto. Codificado 998	1,869,826.19	0.00	0.00	1,869,826.19
Ppto. Devengado 998	1,524,515.00	0.00	0.00	1,524,515.00

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017



Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	100.00 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Oct	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Nov	0.00		0.00				
Dic							
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
7	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
8	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
9	Reducir el índice de incumplimiento de las normativas de transporte pesado, MEDIANTE la implementación del sistema de control de pesos y dimensiones de los vehículos de carga.
10	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo
13	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta de Entrega Recepción Provisional. Comuna Shuar	A.02.pdf	20/10/2014
2	Acta definitiva Comuna Shuar	Acta_definitiva_Comuna_Shuar.pdf	22/06/2015
3	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL PROVISIONAL SAN CARLOS - LA JOYA	ACTA_DE_ENTREGA_RECEPCIÓN_PROVISIONAL_PARCIAL_SAN_CARLOS_-_LA_JOYA_-_A_CALDERON.pdf	04/10/2017
4	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL PROVISIONAL SAN VICENTE - MACUL	ACTA_RECEPCIÓN_PARCIAL_PROVISIONAL_SAN_VICENTE_-_MACUL.pdf	07/09/2017
5	APU proyectos Sinohydro	APU_Macrocontrato_-_Sinohydro.pdf	05/01/2017
6	Calificación oferta Sinohydro	Calificación_oferta_Sinohydro.pdf	05/01/2017
7	Cláusula Vigésima Primera_Recepción_Definitiva_Sinohydro	Cláusula_Vigésima_Primer_Recepción_Definitiva_Sinohydro.pdf	04/08/2017
8	Contrato Complementario No. 1_San Carlos-La Joya-A Calderón y San Vicente_Macul	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_	08/11/2017
9	Contrato Comuna Shuar	A.01.pdf	11/04/2014
10	Delegación Comisión Técnica Recepción Provisional San Carlos - La Joya	MTOP-DCT-2017-455-ME-1_Comisión_Técnica_Recepción_Provisional_San_Carlos_La_Joya.pdf	05/09/2017
11	Garantía fiel cumplimiento trabajos Sinohydro	Garantía_fiel_cumplimiento_-_Sinohydro.pdf	05/01/2017
12	Informe Ejecutivo SITOP, Abril 2014.	B.15.pdf	21/04/2014



**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
13	Informe Ejecutivo SITOP, abril 2013.	B.03.pdf	11/04/2014
14	Informe Ejecutivo SITOP, agosto 2013.	B.07.pdf	11/04/2014
15	Informe Ejecutivo SITOP, Agosto 2014.	B.19.pdf	01/09/2014
16	Informe Ejecutivo SITOP, diciembre 2013.	B.11.pdf	11/04/2014
17	Informe Ejecutivo SITOP, diciembre 2014.	B.23.pdf	08/01/2015
18	Informe Ejecutivo SITOP, enero 2015.	B.24.pdf	03/02/2015
19	Informe Ejecutivo SITOP, enero2014.	B.12.pdf	11/04/2014
20	Informe Ejecutivo SITOP, febrero 2013.	B.01.pdf	11/04/2014
21	Informe Ejecutivo SITOP, febrero 2014.	B.13.pdf	11/04/2014
22	Informe Ejecutivo SITOP, febrero 2015.	B.25.pdf	04/03/2015
23	Informe Ejecutivo SITOP, Julio 2014.	B.18.pdf	04/08/2014
24	Informe Ejecutivo SITOP, julio2013.	B.06.pdf	11/04/2014
25	Informe Ejecutivo SITOP, junio2013.	B.05.pdf	11/04/2014
26	Informe Ejecutivo SITOP, junio2014.	B.17.pdf	07/07/2014
27	Informe Ejecutivo SITOP, marzo 2013.	B.02.pdf	11/04/2014
28	Informe Ejecutivo SITOP, marzo 2014.	B.14.pdf	11/04/2014
29	Informe Ejecutivo SITOP, mayo 2013.	B.04.pdf	11/04/2014
30	Informe Ejecutivo SITOP, mayo 2014.	B.16.pdf	09/06/2014
31	Informe Ejecutivo SITOP, noviembre 2014.	B.22.pdf	03/12/2014
32	Informe Ejecutivo SITOP, noviembre2013.	B.10.pdf	11/04/2014
33	Informe Ejecutivo SITOP, octubre 2013.	B.09.pdf	11/04/2014
34	Informe Ejecutivo SITOP, octubre 2014.	B.21.pdf	06/11/2014
35	Informe Ejecutivo SITOP, septiembre 2013.	B.08.pdf	11/04/2014
36	Informe Ejecutivo SITOP, septiembre 2014.	B.20.pdf	06/10/2014
37	Macrocontrato Proyectos Sinohydro	Macrocontrato_proyectos_Sinohydro.pdf	05/01/2017
38	Orden de cambio No. 1 - Sinohydro	ORDEN_DE_CAMBIO_NR._01.pdf	05/01/2017
39	Orden de cambio No. 2 - Sinohydro	ORDEN_DE_CAMBIO_NR._02.pdf	05/01/2017
40	Orden de cambio No. 3 - Sinohydro	ORDEN_DE_CAMBIO_NR._3.pdf	05/01/2017
41	Orden de cambio No. 4 - Sinohydro	ORDEN_DE_CAMBIO_No._4_SINOHYDRO_CON_FECHA.pdf	05/01/2017
42	Orden de cambio No. 5 - Sinohydro	ORDEN_DE_CAMBIO_No._5_SINOHYDRO.pdf	05/01/2017
43	Orden de cambio No. 6 - Sinohydro	ORDEN_DE_CAMBIO_No._6_SINOHYDRO.pdf	02/02/2017
44	Planilla No. 1 vía San Carlos - La Joya - Abdón Calderón	pl1construccion_viasancarlos-lasjoya-aldoncalderon_id8452.pdf	05/01/2017
45	Planilla No. 10 vía San Carlos - La Joya - Abdón Calderón	Planilla_No._10.PDF	17/01/2017
46	Planilla No. 11 vía San Carlos - La Joya - Abdón Calderón	Planilla_No._11.PDF	17/01/2017
47	Planilla No. 12 vía San Carlos - La Joya - Abdón Calderón	Planilla_No._12.PDF	17/01/2017
48	Planilla No. 13 vía San Carlos - La Joya - Abdón Calderón	Planilla_No._13.PDF	17/01/2017
49	Planilla No. 14 vía San Carlos - La Joya - Abdón Calderón	Planilla_No._14.PDF	17/01/2017
50	Planilla No. 15 vía San Carlos - La Joya - Abdón Calderón	Planilla_No._15.PDF	17/01/2017
51	Planilla No. 16 vía San Carlos - La Joya - Abdón Calderón	Planilla_No._16.PDF	17/01/2017
52	Planilla No. 17 vía San Carlos - La Joya - Abdón Calderón	Planilla_No._17.PDF	17/01/2017
53	Planilla No. 18 vía San Carlos - La Joya - Abdón Calderón	Planilla_No._18.PDF	17/01/2017

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
54	Planilla No. 19 vía San Carlos - La Joya - Abdón Calderón	Planilla_No._19.PDF	17/01/2017
55	Planilla No. 2 vía San Carlos - La Joya - Abdón Calderón	Planilla_No._2.PDF	17/01/2017
56	Planilla No. 20 vía San Carlos - La Joya - Abdón Calderón	Planilla_No._20.PDF	17/01/2017
57	Planilla No. 3 vía San Carlos - La Joya - Abdón Calderón	Planilla_No._3.PDF	17/01/2017
58	Planilla No. 4 vía San Carlos - La Joya - Abdón Calderón	Planilla_No._4.PDF	17/01/2017
59	Planilla No. 5 vía San Carlos - La Joya - Abdón Calderón	Planilla_No._5.PDF	17/01/2017
60	Planilla No. 6 vía San Carlos - La Joya - Abdón Calderón	Planilla_No._6.PDF	17/01/2017
61	Planilla No. 7 vía San Carlos - La Joya - Abdón Calderón	Planilla_No._7.PDF	17/01/2017
62	Planilla No. 8 vía San Carlos - La Joya - Abdón Calderón	Planilla_No._8.PDF	17/01/2017
63	Planilla No. 8 vía San Carlos - La Joya - Abdón Calderón	Planilla_No._9.PDF	17/01/2017
64	Planilla No. 9 vía San Carlos - La Joya - Abdón Calderón	Planilla_No._9.PDF	17/01/2017
65	Pliegos Macrocontrato proyecto Sinohydro	Pliegos_Macrocontrato_-_Sinohydro.pdf	05/01/2017

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Calderón Cañar, Edgar Miguel	Líder de Proyecto	Supervisor de Obra del Guayas - MTOP	ecalderon@mtop.gob.ec	023974600
Pulecio Montalvo, Roger Alberto	Director Provincial del Guayas	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Guayas, Encargado	rpulecio@mtop.gob.ec	023974600
Valle Zuñiga, Hugo Arturo	Subsecretario Regional 5	Subsecretario Regional 5	hvalle@mtop.gob.ec	023974600

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
70230_1.jpg	02/08/2017
