

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte
Dirección de Estudios del Transporte

PROYECTO: K010 MTOP - Estudios Planes Viales Provinciales

Líder del Proyecto:	Brazales Haro, Diego Ruben (dbrazales@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Medina Galarza, César Augusto	Programas Relacionados:	
Titular:	Espinoza Vivanco, Darwin Gonzalo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.382682	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	918,012.11
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2017 - 31/12/2020
Fecha de última actualización:	31/05/2019	Fecha de Fin Base:	31/12/2020
Modificado por:	Brazales Haro, Diego Ruben	Fecha del siguiente Hito:	28/02/2019

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales


DATOS GENERALES

Descripción
Consultorías realizadas para la estabilización de puntos críticos en la RVE
Beneficios Cualitativos
Tipo de Beneficiario
Restricciones
RECURSOS: Asignación presupuestaria

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 60.44 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2017 Fecha de Fin: 31/12/2020

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

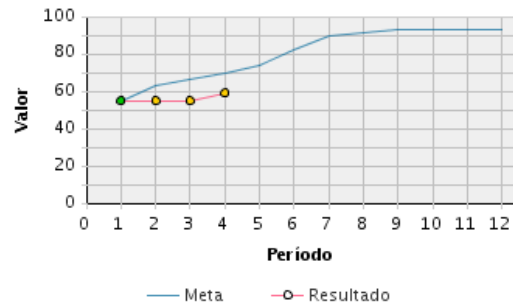

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	55 %	63 %	66 %	70 %	74 %	82 %	90 %	91 %	93 %	93 %	93 %	93 %
	Avance real acumulado											
	55 %	55 %	55 %	59 %								

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mediante Memorando No. MTOP-SIT-2019-229-ME de fecha 23 de abril 2019 se realiza la transferencia del proyecto a la Dirección de Estudios - Se suscribe un contrato complementario por ampliación de plazo de 60 días contados a partir del 19 de febrero 2019 - Entrega el contratista los estudios con oficio No. CLC-MTOP-M-007-2018-031, DEL 18-04-2019 	Llquin González, Mercedes Eugenia	02/05/2019 - 05:06 PM
<p>MARZO 2019</p> <p>EJECUCIÓN: Estudios de la carretera san clemente - sanjacinto - desembocadura del rio Portoviejo - Las Gilses - Crucita - Jaramijó - Manta, Incluye puente La Boca con una longitud de 33 km (MANABÍ), aprobados.</p> <p>Proyecto se encuentra en ejecución con avance general de los estudios del 60.10 % MTOP-SUBZ4-UETR-2019-101-ME.</p> <p>Febrero 2019</p> <p>HITO 15 EJECUCIÓN Estudios de ingeniería para la construcción de los puentes: Quimis, Sancam, Las Américas y Banchal y puente Lodana (MANABÍ), aprobados.</p> <p>Proyecto se encuentra en ejecución una vez que se reiniciaron los trabajos, después de la suspensión por falta de pago del anticipo, tiene un porcentaje de avance general de los estudios del 24.18%</p> <p>HITO 16 EJECUCIÓN Estudios de ingeniería definitivos para la rehabilitación y reconstrucción de las calles de la ciudad de Pedernales (MANABÍ). Aprobados.</p> <p>El Proyecto estuvo suspendido desde el 6 de diciembre de 2018 por no pago del anticipo, se levanto la misma el 7 de febrero de 2019, fecha en que se les entregó el anticipo, actualmente tiene un avance general de los estudios del 26.97%</p> <p>ENERO 2019: El presupuesto asignado al proyecto es insuficiente para cubrir la totalidad del saldo contratado a nivel nacional.</p>	Llquin González, Mercedes Eugenia	29/03/2019 - 03:53 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Falta de financiamiento CAUSARÍA proyectos no ejecutados	23/05/2019	Diego Ruben Brazales Haro	10	10	1	0/0

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Recursos. El retraso en la entrega de los estudios por parte de los contratistas CAUSARÍA el deterioro acelerado de las obras de infraestructura	23/05/2019	Diego Ruben Brazales Haro	40 %	50	20	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Manta
2	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Montecristi
3	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pedernales
4	Zona 6 - Austro > Azuay > Cuenca
5	Zona 6 - Austro > Cañar > Azogues
6	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	1-Solicitud de Información	14/09/2017		14/09/2017		Sí	8.0
2	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado	1-Solicitud de Información	30/11/2017		30/11/2017		Sí	2.0
3	PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida	1-Solicitud de Información	30/11/2017		30/11/2017		Sí	4.5
4	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	4-Inicio de Trabajo	15/05/2018		15/05/2018		Sí	2.5
5	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	4-Inicio de Trabajo	01/06/2018		01/06/2018		Sí	3.0
6	EJECUCIÓN: Contrato de Estudios para la solución de los conflictos de movilidad de la autopista Cuenca-Azogues-Biblián (AZUAY), firmado	9-Entregables Formales	29/06/2018		29/06/2018		Sí	4.0
7	EJECUCIÓN: Contrato Estudios para la construcción de la carretera Cuenca-Estación de Cumbe (AZUAY), firmado	9-Entregables Formales	29/06/2018		29/06/2018		Sí	4.0
8	EJECUCIÓN: Contrato de Estudios de estabilidad del sitio crítico de acceso al puente Copueno y de otros sitios críticos seleccionados en la vía E45 -troncal amazónica. (MORONA SANTIAGO), firmado	9-Entregables Formales	31/10/2018		31/10/2018		Sí	4.0
9	EJECUCIÓN: Contrato para estudios de ingeniería definitivos para la rehabilitación y reconstrucción de las calles de la ciudad de Pedernales (MANABÍ), firmado	9-Entregables Formales	19/11/2018		19/11/2018		Sí	4.0
10	EJECUCIÓN: Contrato de estudios definitivos de la carretera San Clemente - San Jacinto - desembocadura del río Portoviejo - Las Gilses - Crucita - Jaramijó - Manta, Incluye puente La Boca con una longitud de 33 km (MANABÍ), firmado	9-Entregables Formales	21/11/2018		21/11/2018		Sí	3.5
11	EJECUCIÓN: Contrato de Estudios para dar solución al tramo afectado en la vía Bilibán-Zhud (CAÑAR), firmado	9-Entregables Formales	21/11/2018		21/11/2018		Sí	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
12	EJECUCIÓN: Contrato de estudios definitivos de ingeniería para la construcción de los puentes: Quimis, Sancan, las Américas y Banchal y puente Lodana (MANABÍ), suscrito	9-Entregables Formales	29/11/2018		29/11/2018		Sí	4.0
13	EJECUCIÓN: Contrato de estudios definitivos para la construcción de la solución vial en la intersección de la E-15 y actualización de los estudios definitivos para la construcción paso elevado de Jipijapa (MANABÍ), suscrito	9-Entregables Formales	21/12/2018		21/12/2018		Sí	4.0
14	EJECUCIÓN: Estudios definitivos de ingeniería para la ampliación a cuatro carriles de la vía E-482, Montecristi - Jipijapa - La Cadena (MANABÍ), suscrito	9-Entregables Formales	21/12/2018		21/12/2018		Sí	3.5
15	EJECUCIÓN Estudios de ingeniería para la construcción de los puentes: Quimis, Sancan, Las Americas y Banchal y puente Lodana (MANABÍ), aprobados	9-Entregables Formales	28/02/2019	28/02/2019			No	4.0
16	EJECUCIÓN Estudios de ingeniería definitivos para la rehabilitación y reconstrucción de las calles de la ciudad de Pedernales (MANABÍ). aprobados	9-Entregables Formales	28/02/2019	28/02/2019			No	4.0
17	EJECUCIÓN: Estudios de la carretera san clemente - sanjacinto - desembocadura del río Portoviejo - Las Gilses - Crucita - Jaramijó - Manta, Incluye puente La Boca con una longiTud de 33 km (MANABÍ), aprobados	9-Entregables Formales	31/03/2019	31/03/2019			No	3.0
18	EJECUCIÓN: Estudios de ingeniería para la ampliación a cuatro carriles de la vía E-482, Montecristi - Jipijapa - La Cadena (MANABÍ), aprobados	9-Entregables Formales	30/04/2019		30/04/2019		Sí	4.0
19	EJECUCIÓN: Entrega de estudios para la construcción de la solución vial en la intersección de la E-15 y actualización de los estudios definitivos para la construcción paso elevado de Jipijapa (MANABÍ), aprobados	9-Entregables Formales	31/05/2019	31/05/2019			No	4.0
20	EJECUCIÓN: Estudios para la solución de los conflictos de movilidad de la autopista Cuenca-Azogues-Biblián (AZUAY). aprobados	9-Entregables Formales	30/06/2019	30/06/2019			No	4.0
21	EJECUCIÓN: Estudios para la construcción de la carretera Cuenca-Estación de Cumbe (AZUAY), aprobados	9-Entregables Formales	30/06/2019	30/06/2019			No	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
22	EJECUCIÓN: Estudios de estabilidad del sitio crítico de acceso al puente Copueno y de otros sitios críticos seleccionados en la vía E45 - troncal amazónica. (MORONA SANTIAGO), aprobados	9-Entregables Formales	31/07/2019	31/07/2019			No	4.0
23	EJECUCIÓN: Estudios para dar solución al tramo afectado en la vía Bilibán-Zhud (CAÑAR), aprobados	9-Entregables Formales	31/07/2019	31/07/2019			No	4.0
24	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	5-Entregables Intermedios	30/08/2019	30/08/2019			No	1.0
25	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva, suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	02/09/2019	02/09/2019			No	2.0
26	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	9-Entregables Formales	31/07/2020	31/07/2020			No	1.0
27	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	9-Entregables Formales	31/07/2020	31/07/2020			No	1.0
28	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	31/07/2020	31/07/2020			No	1.5
29	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	15/08/2020	15/08/2020			No	2.0
30	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	9-Entregables Formales	27/08/2020	27/08/2020			No	1.0
31	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	30/09/2020	30/09/2020			No	0.5

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de estudios definitivos aprobados		-	-	-	01/01/2019	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	918,012.11 **
Costo Total:	819,158.33
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %


Perfil Económico 2019				
	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	546,105.56	0.00	546,105.56
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	405,829.17	0.00	405,829.17
Ppto. Codificado	0.00	918,012.11	0.00	918,012.11
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2019)		-371,906.55		
Programado a Devengar	0.00	918,012.11	0.00	918,012.11
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	918,012.11	0.00	918,012.11
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	512,182.94		512,182.94				
Abr	0.00		512,182.94				
May	0.00		512,182.94				
Jun	0.00		512,182.94				
Jul	81,165.84		593,348.78				
Ago	0.00		593,348.78				
Sep	121,748.75		715,097.53				
Oct	0.00		715,097.53				
Nov	0.00		715,097.53				
Dic	202,914.58		918,012.11				
Total	918,012.11	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
No hay información disponible	

Objetivos Operativos Matriciales	
MTOB - Ministerio de Transporte y Obras Públicas >Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte >Dirección de Conservación de la Infraestructura del Transporte	
18	Incrementar la aplicación de las políticas, normas y lineamientos en la fase de conservación de los proyectos de infraestructura del transporte MEDIANTE la supervisión de planes, programas y proyectos institucionales para la gestión de conservación en los procesos desconcentrados

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	HITO 15 _ RESPALDO	HITO_15_mtop-subsz4-uetr-2019-58-me.pdf	01/03/2019
2	HITO 16 _RESPALDO	HITO_16_mtop-subsz4-uetr-2019-59-me.pdf	01/03/2019
3	HITO 17 _RESPALDO	MTOB-SUBSZ4-UETR-2019-101-ME__informe_de_avance_HITO_17.pdf	29/03/2019
4	Hito 18.- Entrega de estudios	Oficio_entregando_Estudios_HITO_18.pdf	02/05/2019
5	Hito 19.- Informe de avance de revision de estudios	MTOB-SUBSZ4-UETR-2019-171-ME.pdf	31/05/2019
6	Transferencia de proyecto a la Dirección de Estudios	MTOB-SIT-2019-229-ME__designado_responsable_a_Estudios.pdf	02/05/2019

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Brazales Haro, Diego Ruben	Líder de proyecto		dbrazales@mtop.gob.ec	
Medina Galarza, César Augusto	Subsecretario de la Infraestructura del Transporte	Subsecretario de Infraestructura del Transporte, Subrogante	cmedina@mtop.gob.ec	
Sánchez Yoza, Gabriel Vicente	Director de Conservación de la Infraestructura del Transporte		salio@mtop.gob.ec	023974600
