

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 1
Dirección Provincial Sucumbíos

PROYECTO: K033 MTOP-Construcción del puente Dureno, ubicado en la carretera: Lago Agrio- Cuyabeno -Tarapoa

Líder del Proyecto:	López Mendoza, Cristhian Manuel (cmlopez@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Benavides Morillo, Omar Alexander	Programas Relacionados:	CONSTRUCCION DEL PUENTE DURENO UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO- CUYABENO - TARAPOA, Provincia - Sucumbíos, STPE - Inversión en 40km de frontera norte
Titular:	Solano Blacio, Wimper Vicente	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	2.37
CUP:	175200000.20.6935	TIR:	24.20 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	967,700.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,442,209.61
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	16/09/2011 - 31/03/2020
Fecha de última actualización:	05/06/2019	Fecha de Fin Base:	31/12/2019
Modificado por:	López Mendoza, Cristhian Manuel	Fecha del siguiente Hito:	06/11/2018

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
 Construcción del puente Dureno, ubicado en la carretera: Lago Agrio- Cuyabeno -Tarapoa

PRODUCTO / SERVICIO:
 El producto esperado, es el puente nuevo.

LÍNEA BASE:
 La línea base para la construcción del puente es cero

OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO:
 Construir un puente que brinde mayor fluidez al tráfico vehicular

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Disminuir el tiempo de viaje en la carretera Lago Agrio- Cuyabeno -Tarapoa

Evitar accidentes de tránsito

Constructor: PATE C.A.

Valor Contractual:
 1'0153 20.97 (valor contractual por puentes: Teteje, Parahuaico 1 y Dureno)

Beneficios Cualitativos

Disminución del tiempo de viaje entre las poblaciones: Lago Agrio, Dureno, Pacayacu, Chiritza, Tarapoa, Puerto el Carmen del Putumayo; disminución de accidentes debido al mal estado de las estructuras existentes, incremento del nivel de servicio.

Tipo de Beneficiario

Habitantes de la Provincia de Sucumbios, Orellana e industrias petroleras asentadas en el sector


Restricciones

Tiempo : El plazo estipulado en el contrato
 Costo : El monto contractual para esta obra
 Alcance : Construcción del puente sobre el río Dureno

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 91.19 %
 Fecha de Inicio: 16/09/2011 Fecha de Fin: 31/03/2020

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

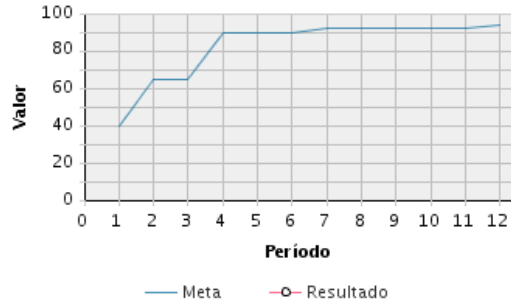

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	40 %	65 %	65 %	90 %	90 %	90 %	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	94 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Mayo 2019:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización, el segundo contrato se encuentra en ejecución con un avance del 65%</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	05/06/2019 - 02:52 PM
<p>Abril 2019:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización.</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	02/05/2019 - 09:07 AM
<p>Marzo 2019:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización,</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	03/04/2019 - 01:46 PM
<p>Febrero 2019:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización,</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	27/02/2019 - 08:00 AM
<p>ENERO 2019:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización,</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	05/02/2019 - 01:41 PM
<p>DICIEMBRE 2018:</p> <p>La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización.</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	04/01/2019 - 08:59 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE 2018 La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización.</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	06/12/2018 - 08:08 AM
<p>Octubre 2018: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización, se solicitó la inclusión en el PAI 2019</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	05/11/2018 - 09:38 AM
<p>Septiembre 2018: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización.</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	03/10/2018 - 02:52 PM
<p>AGOSTO 2018: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización.</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	04/09/2018 - 02:29 PM
<p>Julio 2018: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización.</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	03/08/2018 - 02:45 PM
<p>Junio 2018: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de fiscalización.</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	03/08/2018 - 02:44 PM
<p>MAYO 2018 La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, se ha realizado el pago de la liquidación al contratista</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	01/06/2018 - 03:47 PM
<p>Abril 2018: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, se ha realizado el pago de la liquidación al contratista</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	03/05/2018 - 05:33 PM
<p>Marzo 2018: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, se ha realizado el pago de la liquidación al contratista</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	04/04/2018 - 12:02 PM
<p>Febrero 2018: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, se ha realizado el pago de la liquidación al contratista</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	04/04/2018 - 12:01 PM
<p>Enero 2018: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, se ha realizado el pago de la liquidación al contratista</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	08/02/2018 - 10:51 AM
<p>Diciembre 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, se ha realizado el pago de la liquidación al contratista</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	08/02/2018 - 10:51 AM
<p>Noviembre 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	04/12/2017 - 05:42 PM
<p>Octubre 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	01/11/2017 - 04:19 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Septiembre 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>02/10/2017 - 11:17 AM</p>
<p>Agosto 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>05/09/2017 - 09:53 PM</p>
<p>Julio 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>02/08/2017 - 02:45 PM</p>
<p>Junio 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>04/07/2017 - 04:04 PM</p>
<p>Mayo 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>01/06/2017 - 11:27 AM</p>
<p>Abril 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>03/05/2017 - 01:29 PM</p>
<p>Marzo 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>30/03/2017 - 11:11 AM</p>
<p>Febrero 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>05/03/2017 - 01:41 PM</p>
<p>Enero 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>		
<p>Dicimbre 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	<p>Benavides Morillo, Omar Alexander</p>	<p>05/01/2017 - 11:43 AM</p>
<p>Noviembre 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>07/12/2016 - 09:51 AM</p>
<p>Octubre 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>31/10/2016 - 12:55 PM</p>
<p>Septiembre 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	<p>Arizaga Davila, Leoncio Abelardo</p>	<p>29/09/2016 - 12:55 PM</p>
<p>Agosto 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>		
<p>Julio 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Junio 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>		
<p>Mayo 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	13/05/2016 - 09:09 AM
<p>Abril 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	25/04/2016 - 12:03 PM
<p>Marzo 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	06/04/2016 - 05:09 PM
<p>Febrero 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	08/03/2016 - 04:04 PM
<p>Enero 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	13/02/2016 - 01:25 PM
<p>Diciembre 2015: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	15/12/2015 - 12:32 PM
<p>Noviembre 2015: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>		
<p>Octubre 2015: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta pago correspondiente a la liquidación</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	30/10/2015 - 11:18 AM
<p>Septiembre 2015: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta pago correspondiente a la liquidación</p>	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	07/10/2015 - 08:59 AM
<p>Agosto 2015 La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo, debido a fallas en los estudios</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	01/09/2015 - 10:06 AM
<p>JULIO 2015: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/08/2015 - 10:45 AM
<p>Junio 2015: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/07/2015 - 11:00 AM
<p>Mayo 2015: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/07/2015 - 10:59 AM
<p>MARZO 2015 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/04/2015 - 12:37 PM
<p>FEBRERO 2015 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/03/2015 - 08:46 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2015 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/02/2015 - 11:54 AM
DICIEMBRE 2014 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	23/01/2015 - 11:30 AM
NOVIEMBRE 2014 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	23/01/2015 - 11:29 AM
OCTUBRE 2014 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/11/2014 - 12:47 PM
SEPTIEMBRE 2014 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/11/2014 - 12:47 PM
AGOSTO 2014 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/11/2014 - 12:47 PM
JULIO 2014 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	21/08/2014 - 04:30 AM
JUNIO 2014 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	03/07/2014 - 03:57 PM
MAYO 2014 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	03/07/2014 - 03:57 PM
ABRIL 2014 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	03/07/2014 - 03:57 PM
MARZO 2014 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/04/2014 - 10:18 AM
FEBRERO 2014 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/04/2014 - 10:18 AM
ENERO 2014 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/04/2014 - 10:18 AM
DICIEMBRE 2013 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/04/2014 - 10:17 AM
NOVIEMBRE 2013 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/04/2014 - 10:17 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
OCTUBRE 2013 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/04/2014 - 10:16 AM
SEPTIEMBRE 2013 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/11/2013 - 02:41 PM
AGOSTO 2013 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/10/2013 - 02:37 PM
JULIO 2013 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	09/09/2013 - 09:15 AM
JUNIO 2013 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/07/2013 - 09:34 AM
MAYO 2013 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/07/2013 - 09:34 AM
ABRIL 2013 La Cia. PATE C.A. Contratista de la obra ha aceptado la terminación por mutuo acuerdo, la Dirección Provincial de Sucumbios ha solicitado a la Fiscalización realice la liquidación económica y técnica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	06/06/2013 - 08:40 PM
MARZO 2013 La aprobación de los nuevos estudios continúan en la Subsecretaría Regional 1. (Con fecha 19 de Diciembre el contratista entrega los estudios definitivos para la construcción de los puentes: Teteyé, Parahuaico y Dureno, los mismos que se encuentran en aprobación en la Subsecretaría regional 1. Se ha realizado la consulta al departamento jurídico del MTOP central, para que emita su criterio jurídico respecto al problema presentado).	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	24/04/2013 - 05:26 PM
FEBRERO 2013 Con fecha 19 de Diciembre el contratista entrega los estudios definitivos para la construcción de los puentes: Teteyé, Parahuaico y Dureno, los mismos que se encuentran en aprobación en la Subsecretaría regional 1. Se ha realizado la consulta al departamento jurídico del MTOP central, para que emita su criterio jurídico respecto al problema presentado.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	24/04/2013 - 05:25 PM
ENERO 2013 Con fecha 19 de Diciembre el contratista entrega los estudios definitivos para la construcción de los puentes: Teteyé, Parahuaico y Dureno, los mismos que se encuentran en aprobación en la Subsecretaría regional 1. Se ha realizado la consulta al departamento jurídico del MTOP central, para que emita su criterio jurídico respecto al problema presentado.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	06/03/2013 - 04:48 PM
DICIEMBRE 2012 Con fecha 19 de Diciembre el contratista entrega los estudios definitivos para la construcción de los puentes: Teteyé, Parahuaico y Dureno, los mismos que se encuentran en revisión en la Dirección Provincial de Sucumbios.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	06/03/2013 - 04:48 PM
NOVIEMBRE 2012 La obra continúa paralizada	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	09/01/2013 - 03:07 PM
OCTUBRE 2012 Contratista : Pate C.A. La obra continúa paralizada SEPTIEMBRE 2012 Contratista : Pate C.A. La obra continúa paralizada AGOSTO 2012.- Contratista : Pate C.A. Se realizó el montaje y lanzamiento del puente provisional JULIO 2012.- Contratista : Pate C.A. Los trabajos se encuentran suspendidos, debido a fallas técnicas. JUNIO 2012 No se puede iniciar los trabajos de construcción debido a que existe la necesidad de colocar un puente tipo bailey que servirá de paso provisional hasta la construcción del puente definitivo.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	09/01/2013 - 03:07 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>La Dirección Provincial de Sucumbios se encuentra realizando los tramites pertinentes para la obtencion del puente bailey a traves de Petroecuador. MAYO 2012 No se puede iniciar los trabajos de construcción debido a que existe la necesidad de colocar un puente tipo bailey que servirá de paso provisional hasta la construcción del puente definitivo. La Dirección Provincial de Sucumbios se encuentra realizando los tramites pertinentes para la obtencion del puente bailey a traves de Petroecuador. ABRIL 2012: Se entrega el 13 de Abril el anticipo Todavía el contratista PATECA , no presenta planillas de ejecucion de Obra. por ese motivo no se adjunta el reporte ejecutivo del SITOP. Los trabajos empiezan el 25 de Abril Este puente se en cuenta Ubicado en TRANSVERSAL NORTE E10 Lago Agrio- Puerto el Carmen del Putumayo MARZO 2012: Se adjudica el proceso (no de lo declara desierto como estaba previsto) FEBRERO 2012: Se cae el proceso y se espera iniciar nuevamente en los primeros días de Abril del 2012 ENERO 2012: En espera de adjudicación en el portal de Compras Publicas DICIEMBRE 2011: Revisión de ofertas, convalidación y calificación y firma de resolución de adjudicación NOVIEMBRE 2011: Publicación en el portal de Compras Piublicas OCTUBRE2011: Certificación Presupuestaria</p>		

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
No se pudo construir el puente debido a fallas en los estudios..	09/04/2019	Cristhian Manuel López Mendoza	10	10	1	0/1

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
3- REGIONAL. * General. Falta de pago de la liquidacion economica	05/06/2019	Cristhian Manuel López Mendoza	10 %	10	1	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Cuyabeno

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Dictamen Senplades, obtenido	1-Solicitud de Información	16/09/2011		16/09/2011		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN: Certificación Presupuestaria, obtenida	1-Solicitud de Información	31/10/2011		31/10/2011		Sí	3.0
3	PLANEACIÓN: Documentos precontractuales, realizado	1-Solicitud de Información	31/10/2011		31/10/2011		Sí	3.0


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
4	PLANEACIÓN: Publicación en el Portal Compras Públicas	2-Publicación de Pliegos	14/11/2011		14/11/2011		Sí	4.0
5	EJECUCIÓN: Contrato, suscrito	4-Inicio de Trabajo	03/04/2012		03/04/2012		Sí	5.0
6	EJECUCIÓN: Acta de adjudicación y publicación en el portal de Compras Publicas, realizado	3-Adjudicación	15/05/2012		08/03/2012		Sí	3.0
7	EJECUCIÓN: Documentos precontractuales (2do. Contrato)	5-Entregables Intermedios	15/08/2018		15/08/2018		Sí	3.0
8	EJECUCIÓN: 2do. contrato, suscrito	4-Inicio de Trabajo	16/10/2018		16/10/2018		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Acta de adjudicación y publicación en el portal de Compras (2do. Contrato)	3-Adjudicación	06/11/2018	06/11/2018			No	4.0
10	EJECUCIÓN: Avance de obra 50% (2do. Contrato) según cronograma	5-Entregables Intermedios	28/02/2019	28/02/2019			No	25.0
11	EJECUCIÓN: Avance de obra 100% (2do. Contrato) según cronograma	5-Entregables Intermedios	30/04/2019	30/04/2019			No	25.0
12	CIERRE: Liquidación económica (2do. Contrato) y Acta entrega recepción provisional	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	24/07/2019	24/07/2019			No	2.0
13	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva (2do. Contrato)	9-Entregables Formales	31/12/2019	31/12/2019			No	1.0
14	CIERRE; Liquidación Económica por Mutuo Acuerdo (1er. Contrato)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2019	31/12/2019			No	1.0
15	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	24/01/2020	24/01/2020			No	2.0
16	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	V - Verificación ejecutiva	31/01/2020	31/01/2020			No	1.0
17	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	V - Verificación ejecutiva	14/02/2020	14/02/2020			No	1.0
18	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	V - Verificación ejecutiva	13/03/2020	13/03/2020			No	1.5
19	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	V - Verificación ejecutiva	31/03/2020	31/03/2020			No	0.5

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	OBRA ABANDONADA	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	27/02/2014
2	Esta obra se encuentra abandonada,	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	01/04/2014
3	Esta obra se encuentra abandonada	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	30/04/2014
4	. Se sugiere retomar los trabajos, porque la ciudadanía exige que se cumpla con el ofrecimiento de construcción del puente.	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	30/06/2014
5	Obra abandonada, sin fecha de reinicio de trabajos.	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	31/07/2014
6	OBRA PARALIZADA	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	30/07/2013
7	Historico - JULIO-2012 obra paralizada. PROBLEMA: segun el constructor los estudios de suelos no concuerdan con la realidad del puente. iniciara los trabajos en cuanto le entreguen los estudios	Morocho Velaña, Nancy Beatriz	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	20/07/2012
8	Historico - JUNIO 2012 Se encuentra con ciertos trabajos de resanteo y lastrado de los accesos ya que colocarán un puente provisional hasta construir el definitivo, según indica el resumen ejecuti	Morocho Velaña, Nancy Beatriz	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	15/06/2012
9	Historico - MAYO-2012 Aun no empiezan los trabajos de suelo, solo está realizado la limpieza de la maleza, no hay presencia de trabajadores.	Morocho Velaña, Nancy Beatriz	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	10/05/2012
10	Historico - ABRIL-2012 En recorrido realizado por la Señora Gobernadora y el Supervisor de la SNAP se constato que en los puentes Teteye, Dureno y Parahuayco, aun no se inician los trabajos de con	Morocho Velaña, Nancy Beatriz	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	25/04/2012

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance de obra en la construcción del puente sobre el río Dureno		100.00 %	0.65	0.65	01/01/2017	Abr-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	102,422.13
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,442,209.61 **
Costo Total:	341,407.09
Total Devengado:	102,422.13
% Costo Total Devengado:	30.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 30.00 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	2,170,387.60	1,339,787.48	0.00	3,510,175.08
Ppto. Externo Planeado	341,407.09	0.00	0.00	341,407.09
Ppto. Aprobado Inicial	1,248,606.85	1,339,787.48	0.00	2,588,394.33
Ppto. Codificado	1,466,134.07	1,339,787.48	0.00	2,805,921.55
Ppto. Comprometido	0.00	1,117,264.43	0.00	1,117,264.43
Planeado - Codificado (2019)		0.00		
Programado a Devengar	1,597,837.00	1,339,787.48	0.00	2,937,624.48
Ppto. Devengado	102,422.13	0.00	0.00	102,422.13
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 102,422.13	0.00	0.00	102,422.13
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,495,414.87	1,339,787.48	0.00	2,835,202.35
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 6.41 %	0.00 %	0.00 %	3.49 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	425,329.26	0.00	425,329.26	0.00	0.00 %		0.00 %
Mar	467,862.38		893,191.64				
Abr	446,595.84		1,339,787.48				
May	0.00		1,339,787.48				
Jun	0.00		1,339,787.48				
Jul	0.00		1,339,787.48				
Ago	0.00		1,339,787.48				
Sep	0.00		1,339,787.48				
Oct	0.00		1,339,787.48				
Nov	0.00		1,339,787.48				
Dic	0.00		1,339,787.48				
Total	1,339,787.48	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
17	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	1.01 INFORME EJECUTIVO A OCTUBRE 2016	1.02_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2016_FISCAL_6_PUENTES.pdf	08/09/2016
2	1.1 ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO PUENTES TETEYÉ , PARAHUAICO Y DURENO	Acta_puentes_parte1.pdf	25/05/2016
3	15. INFORME EJECUTIVO A SEPTIEMBRE 2016	INFORME_EJECUTIVO_DURENO_A_SEPTIEMBRE_2016.pdf	20/09/2016
4	16_ INFORME EJECUTIVO SITOP ENERO-FEBRERO 2016	INFORME_SITOP_FEBRERO_2016.pdf	08/03/2016
5	17_ INFORME EJECUTIVO SITOP DESDE AGOSTO A DICIEMBRE 2015	INFORME_EJECUTIVO_DURENO.pdf	15/12/2015
6	18_ OFICIO DE ACEPTACIÓN DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO	A1_OFICIO_DE_ACEPTACIÓN_DE_TERMINACIÓN_POR_MUTUO_ACUERDO.pdf	10/04/2016
7	19_ INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2015 DURENO	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MARZO_2015_DURENO.pdf	10/04/2015
8	20_ INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2015	A3_ INFORME_EJECUTIVO_SITOP_ABRIL_2015.pdf	08/06/2015
9	21_ INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2015	A4_ INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MAYO_2015.pdf	08/06/2015
10	22_ INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2015	JUNIO.pdf	07/09/2015
11	23_ INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2015	JULIO.pdf	07/09/2015
12	24_ Informe Ejecutivo Agosto 2015	INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2015.pdf	01/09/2015
13	25_ Informe Ejecutivo Septiembre 2015	A8_ Informe Ejecutivo Septiembre 2015.pdf	07/10/2015
14	26_ DEVENGADO AL MES DE JULIO	Ejecucion_Enero_-_Julio_2012(1).xls	14/08/2012
15	27_ DEVENGADO ES DE JUNIO	Ejecucion_Junio_2012.pdf	09/07/2012
16	28_ DEVENGADO MES DE MAYO	DEVENGADOS_MES_DE_MAYO.pdf	08/06/2012
17	29_ EJECUCION PRESUPUESTARIA AGOSTO 2013	Reporte_Ejecucion_Agosto_2013[1].pdf	09/09/2013
18	30_ EJECUCION PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE	Ejecucion_Septiembre_del_2012(1).pdf	05/10/2012
19	31_ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2013	Reporte_de_Ejecucion_mes_de_Junio_2013[1].pdf	05/07/2013
20	32_ FOTOGRAFIA AL MES DE MAYO	FOTOGRAFIA_DURENO.pdf	08/06/2012
21	33_ INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2013 DURENO	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MES_DE_JUNIO_2013_teteye_y_parahuaico_y_dureno.pdf	07/20/2013
22	34_ INFORME EJECUTIVO SITOP MES DE JULIO 2013	informe_ejecutivo_sitop_teteye_parahuaico_y_dureno_julio.pdf	12/08/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
23	35_INFORME EJECUTIVO SITOP MES DE SEPT 2013	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_SEPT_teteye__parahuaico_07102013.pdf	07/10/2013
24	36_JUSTIFICATIVO PARA SUSPENDER LOS TRABAJOS	JUSTIFICATIVOS_TRABAJOS_SUSPENDIDOS_TETEYE_PATAHUACO_Y_DURENO.pdf	05/07/2013
25	37_JUSTIFICATIVOS DE LA PARALIZACIÓN DE LA OBRA	JUSTIFICATIVOS_DE_LA_PARALIZACIÓN_DE_LA_OBRA.pdf	01/09/2012
26	38_OFICIO DE PATE C.A. ACEPTACIÓN DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO	aceptacion_de_terminacion_pateca_teteye.pdf	05/07/2013
27	39_OFICIO DONDE SE HACE CONOCER LOS PROBLEMAS TECNICOS	MTOP-CON_SUC-12-40-OF.pdf	14/08/2012
28	40_Proyecto Priorizado SENPLADES	INFORME.doc	03/05/2012
29	A.0040 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2017	Informe_ejecutivo_id_4529.pdf	05/01/2018
30	A.0041 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	informe_ejecutivo_noviembre_id_4529.pdf	04/12/2017
31	A.0042 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2017_PROYECTO_K032.pdf	01/11/2017
32	A.0043 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2017_ID_4529.pdf	02/10/2017
33	A.0045 INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2017	ID_CONTRATO_4529.pdf	05/09/2017
34	A.0046 INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2017	INFORME_SITOP_JULIO_2017_ID_4529.pdf	02/08/2017
35	A.0047 INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2017	INFORME_SITOP_JUNIO_2017_ID_4529.pdf	04/07/2017
36	A.048 INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2017	INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2017_ID_4529.pdf	01/06/2017
37	A.049 INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2017	INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2017_PROYECTO_4529.pdf	06/05/2017
38	A.050 INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2017	INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2017_PROYECTO_4529.pdf	01/03/2017
39	A.1 INFORME EJECUTIVO DURENO A MAYO 2016	INFORME_EJECUTIVO_DURENO_A_MAYO_2016.pdf	13/05/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	Supervisor			
	Administrador			
Benavides Morillo, Omar Alexander	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretario Zonal 1	obenavides@mtop.gob.ec	023974600
López Mendoza, Cristhian Manuel	Líder de proyecto	Analista de Infraestructura	cmlopez@mtop.gob.ec	062991931 ext 13710
Noroña, Víctor	Supervisor Financiero	Analista	vnorona@mtop.gob.ec	Ext. 13706
Vinces Navarrete, Julio Cesar	Director Distrital Sucumbíos	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Sucumbios	jcvinces@mtop.gob.ec	062991930 Ext 13701

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
30719_1.jpg	06/10/2015
