

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 4
Dirección Provincial Manabí

PROYECTO: K064 MTOP- Reconstrucción y mantenimiento por dos años de la vía entrada a Pambilar - La Crespa - Flavio Alfaro (Mitigación para los sitios críticos en la carretera Flavio Alfaro - La Crespa)

Líder del Proyecto:	Alarcon Pico, Hector Hernan (halarcon@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	Programas Relacionados:	Provincia - Manabí, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO. POR DOS ANOS DE LA VIA ENTRADA A PAMBILAR-LA CRESPA-FLAVIO ALFARO TR: 1 KM.39+227-, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Macias Fuentes, Alberto Fabrizio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.766.3902	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,096,553.72
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	19/10/2011 - 28/02/2020
Fecha de última actualización:	21/06/2019	Fecha de Fin Base:	30/04/2014
Modificado por:	Alarcon Pico, Hector Hernan	Fecha del siguiente Hito:	30/07/2019

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN: No se tiene proyecto en formato SENPLADES.

Contrato para la ejecutar la mitigación de los puntos críticos en la vía Flavio Alfaro - La crespa, en los sitios la Crespa, Los Bollos, Cabañas del Abuelo, donde se presentan continuas fallas, como por ejemplo deslizamientos.

Contratista: Consorcio DN Soria.

Fiscalización: Ing. Marcos Dueñas Toro.

Monto de la obra: \$ 3'044,993.71

Fiscalización: \$119,085.72

Beneficios Cualitativos

Evita posibles interrupciones por los continuos deslizamientos en los puntos criticos.

Tipo de Beneficiario

Agricultores.
 Ganaderos.
 Transportistas.
 Población en general.

Restricciones


Tiempo.- El plazo para ejecutar el proyecto es de 180 días contados desde la entrega del anticipo (Del 31/10/2012 a 20/04/2013)

Costo.- El monto de la obra es de 2364492.43 y la fiscalización 119085.72.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 92.05 %
 Fecha de Inicio: 19/10/2011 Fecha de Fin: 28/02/2020

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

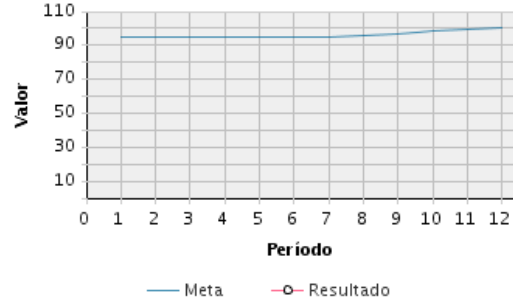

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	95 %	96 %	97 %	99 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2019.- Se realizan los tramites administrativos pertinentes para solicitar el AVAL - certificación presupuestaria, para cancelar el convenio de pago del Contrato de fiscalización para la Reconstrucción y Mantenimiento de la Carretera Entrada a Pambilar-La Crespa-Flavio Alfaro, Sitios Criticos Zapallo y Pavón, a su vez se realizan trámites administrativos para elaborar el Convenio de Pago.	Alarcon Pico, Hector Hernan	05/06/2019 - 04:30 PM
ABRIL 2019.- Se realizan los tramites administrativos pertinentes para solicitar el AVAL - certificación presupuestaria, para cancelar el convenio de pago del Contrato de fiscalización para la Reconstrucción y Mantenimiento de la Carretera Entrada a Pambilar-La Crespa-Flavio Alfaro, Sitios Criticos Zapallo y Pavón.	Alarcon Pico, Hector Hernan	04/05/2019 - 10:55 AM
MARZO 2019.- Se realizan los tramites administrativos pertinentes para solicitar el AVAL - certificación presupuestaria, para cancelar el convenio de pago del Contrato de fiscalización para la Reconstrucción y Mantenimiento de la Carretera Entrada a Pambilar-La Crespa-Flavio Alfaro, Sitios Criticos Zapallo y Pavón.	Alarcon Pico, Hector Hernan	05/04/2019 - 12:13 PM
FEBRERO 2019.- Se realizan los tramites administrativos pertinentes para solicitar el AVAL - certificación presupuestaria, para cancelar el convenio de pago del Contrato de fiscalización para la Reconstrucción y Mantenimiento de la Carretera Entrada a Pambilar-La Crespa-Flavio Alfaro, Sitios Criticos Zapallo y Pavón.	Alarcon Pico, Hector Hernan	01/03/2019 - 08:29 AM
ENERO 2019.- De acuerdo al POA y PAI 2019, se incluye convenio de pago del Contrato de fiscalización para la Reconstrucción y Mantenimiento de la Carretera Entrada a Pambilar-La Crespa-Flavio Alfaro, Sitios Criticos Zapallo y Pavón.	Alarcon Pico, Hector Hernan	01/03/2019 - 08:28 AM
Abril 2017.- Trabajos concluidos con acta de Recepción definitiva.	Vera Vera, José Ricardo	05/06/2017 - 09:32 AM
Marzo 2017.- Trabajos concluidos con acta de Recepción Provisional, se encuentra en proceso de elaboración y suscripción el acta de recepción definitiva por los delegados.	Vera Vera, José Ricardo	05/04/2017 - 08:09 AM
Diciembre 2016.- Trabajos concluidos con acta de Recepción Provisional, se encuentra en proceso de elaboración y suscripción el acta de recepción definitiva por los delegados.	Vera Vera, José Ricardo	04/01/2017 - 08:00 AM
Noviembre 2016.- Trabajos concluidos con acta de Recepción Provisional, se encuentra en proceso de elaboración y suscripción el acta de recepción definitiva por los delegados.	Vera Vera, José Ricardo	07/12/2016 - 08:27 AM
Octubre 2016.- Trabajos concluidos con acta de Recepción Provisional, se encuentra en proceso de elaboración y suscripción el acta de recepción definitiva por los delegados.	Vera Vera, José Ricardo	01/11/2016 - 11:37 AM
Septiembre 2016.- Trabajos concluidos con acta de Recepción Provisional, se encuentra en proceso de elaboración y suscripción el acta de recepción definitiva por los delegados.	Vera Vera, José Ricardo	06/10/2016 - 08:32 AM
Agosto 2016.- Trabajos concluidos con acta de Recepción Provisional, en etapa de prueba entre la Recepción Provisional y Definitiva.	Vera Vera, José Ricardo	06/10/2016 - 08:29 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Julio 2016.- Trabajos concluidos con acta de Recepción Provisional, en etapa de prueba entre la Recepción Provisional y Definitiva.	Vera Vera, José Ricardo	04/08/2016 - 10:05 AM
Junio 2016.- Trabajos concluidos con acta de Recepción Provisional, en etapa de prueba entre la Recepción Provisional y Definitiva.	Vera Vera, José Ricardo	10/07/2016 - 06:21 PM
Mayo 2016.- Trabajos concluidos con acta de Recepción Provisional, en etapa de prueba entre la Recepción Provisional y Definitiva.	Vera Vera, José Ricardo	01/06/2016 - 09:36 AM
Abril 2016.- Trabajos concluidos con acta de Recepción Provisional, en etapa de prueba entre la Recepción Provisional y Definitiva.	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	05/05/2016 - 07:59 AM
Marzo 2016.- Trabajos concluidos con acta de Recepción Provisional, en etapa de prueba entre la Recepción Provisional y Definitiva.	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	01/04/2016 - 09:04 AM
Febrero 2016.- Trabajos concluidos con acta de Recepción Provisional, en etapa de prueba entre la Recepción Provisional y Definitiva.	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	03/03/2016 - 08:55 AM
Enero 2016.- Se esta elaborando el acta de recepción provisional una vez que el contratista cumplio con las reparaciones en la calzada.	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	04/02/2016 - 08:47 AM
Diciembre 2015.- Se esta elaborando el acta de recepción provisional una vez que el contratista cumplio con las reparaciones en la calzada.	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	04/01/2016 - 03:21 PM
Noviembre 2015.- En tramite acta recepción provisional, existen reparaciones pendientes previo a la suscripción del acta provisional los cuales no se han podido intervenir por las lluvias que se presentan en la zona, una vez la obra este a entera satisfacción de la institución sera recibida.	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	02/12/2015 - 09:52 AM
Octubre 2015.- En tramite acta recepción provisional, existen reparaciones pendientes previo a la suscripción del acta provisional los cuales no se han podido intervenir por las lluvias que se presentan en la zona, una vez la obra este a entera satisfacción de la institución sera recibida.	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	02/12/2015 - 09:51 AM
Septiembre 2015.- En tramite acta recepción provisional, existen reparaciones pendientes previo a la suscripción del acta provisional los cuales no se han podido intervenir por las lluvias que se presentan en la zona, una vez la obra este a entera satisfacción de la institución sera recibida.	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	05/10/2015 - 05:14 PM
Agosto 2015.- En tramite acta recepción provisional, existen reparaciones pendientes previo a la suscripción del acta provisional los cuales no se han podido intervenir por las lluvias que se presentan en la zona, una vez la obra este a entera satisfacción de la institución sera recibida.	Vera Vera, José Ricardo	04/09/2015 - 08:14 AM
Julio 2015.- En tramite acta recepción provisional, existen reparaciones pendientes previo a la suscripción del acta provisional los cuales no se han podido intervenir por las lluvias que se presentan en la zona, una vez la obra este a entera satisfacción de la institución sera recibida.	Vera Vera, José Ricardo	05/08/2015 - 08:43 AM
Junio 2015.- En tramite acta recepción provisional, existen reparaciones pendientes previo a la suscripción del acta provisional los cuales no se han podido intervenir por las lluvias que se presentan en la zona, una vez la obra este a entera satisfacción de la institución sera recibida.	Vera Vera, José Ricardo	07/07/2015 - 08:54 AM
Mayo 2015 (Alcance) .- En tramite acta recepción provisional, existen reparaciones pendientes previo a la suscripción del acta provisional los cuales no se han podido intervenir por las lluvias que se presentan en la zona, una vez la obra este a entera satisfacción de la institución sera recibida.	Vera Vera, José Ricardo	03/06/2015 - 08:49 AM
Mayo 2015.- En tramite acta recepción provisional.	Vera Vera, José Ricardo	02/06/2015 - 09:23 AM
Abril 2015.- En tramite acta recepción provisional.	Vera Vera, José Ricardo	07/05/2015 - 08:33 AM
Marzo 2015.- En tramite acta recepción provisional.	Vera Vera, José Ricardo	06/04/2015 - 10:23 AM
Febrero 2015.- En tramite acta recepción provisional.	Vera Vera, José Ricardo	04/03/2015 - 10:14 AM
Enero 2015.- En tramite acta recepción provisional.	Vera Vera, José Ricardo	05/02/2015 - 12:12 PM
Diciembre 2014.- En tramite acta recepción provisional.	Vera Vera, José Ricardo	07/01/2015 - 10:34 AM
Noviembre 2014.- En tramite acta recepción provisional.	Vera Vera, José Ricardo	07/01/2015 - 10:34 AM
Noviembre 2014.- En tramite actas recepción provisional.	Vera Vera, José Ricardo	05/12/2014 - 09:12 AM
Octubre 2014.- En tramite actas recepción provisional.	Vera Vera, José Ricardo	05/11/2014 - 01:59 PM
Septiembre 2014.- En tramite planillas pendientes y actas recepción provisional.	Vera Vera, José Ricardo	05/11/2014 - 01:59 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Agosto 2014.- En tramite planillas pendientes y actas recepción provisional.	Vera Vera, José Ricardo	04/09/2014 - 03:49 PM
Julio 2014.- En tramite planillas pendientes y actas recepción provisional	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	07/08/2014 - 05:39 PM
Junio 2014.- En tramite planillas pendientes y actas recepción provisional.	Vera Vera, José Ricardo	04/07/2014 - 11:46 AM
Mayo 2014.- En tramite planillas pendientes y actas recepción provisional.	Vera Vera, José Ricardo	06/06/2014 - 04:00 PM
Abril 2014.- En tramite planillas pendientes y actas recepción provisional.	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	05/05/2014 - 10:49 AM
Marzo 2014.- En tramite recepción provisional.	Vera Vera, José Ricardo	09/04/2014 - 10:59 AM
Febrero 2014.- En tramite recepción provisional.	Vera Vera, José Ricardo	05/03/2014 - 03:12 PM
Enero 2013.- En tramite recepción provisional.	Vera Vera, José Ricardo	11/02/2014 - 08:33 AM
Diciembre 2013.- En tramite recepción provicional	Vera Vera, José Ricardo	06/01/2014 - 10:02 AM
Noviembre 2013.- Se realiza regeneración vial en el sector los bollos y las cabañas del abuelo, en la Crespa se sigue con la construcción del muro armado, Colocación de material de base y subbase. En tramite contrato complementario, el mismo que incluye ampliación de plazos.	Vera Vera, José Ricardo	06/12/2013 - 02:26 PM
Octubre 2013.- Se realiza regeneración vial en el sector los bollos y las cabañas del abuelo, en la Crespa se sigue con la construcción del muro armado, construcción de muro de tierra en la crespa. En tramite contrato complementario, el mismo que incluye ampliación de plazos.	Vera Vera, José Ricardo	06/11/2013 - 12:55 PM
Septiembre 2013.- Se realiza regeneración vial en el sector los bollos y las cabañas del abuelo, en la Crespa se sigue con la construcción del muro armado, construcción de muro de tierra en la crespa. En tramite contrato complementario, el mismo que incluye ampliación de plazos.	Vera Vera, José Ricardo	29/10/2013 - 08:28 AM
Agosto 2013.- Se realiza regeneración vial en el sector los bollos y las cabañas del abuelo, en la Crespa se comienza muro armado, construcción de muro de tierra en la crespa,colocación de subbase en los Bollos y La cabaña del Abuelo. En tramite contrato complementario, el mismo que incluye ampliación de plazos.	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	03/09/2013 - 03:14 PM
Julio 2013.- Se realiza regeneración vial en el sector los bollos y las cabañas del abuelo, en la Crespa se comienza muro armado.	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	07/08/2013 - 10:44 AM
Junio 2013. Colocación de Hormigón, colocación de sub base y mejoramiento de suelo. colocación de alcantarillas.	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	09/07/2013 - 12:25 PM
Mayo 2013: construcción de muro de hormigón armado; subdrenes, muro de tierra armada	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	30/05/2013 - 01:50 PM
Abril 2013. Se continua con los trabajos de excavacion, rellenos, transporte de material. Pero por motivos de las lluvias no se puede cumplir con lo programado.	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	30/05/2013 - 01:49 PM
Marzo 2013.- se continua con los trabajos, pero no se realizan con normalidad por motivo de las lluvias. Febrero 2013.- se continua con los trabajos, pero no se realizan con normalidad por motivo de las lluvias. Enero 2013.- Excavación, relleno en el sector bollos, transporte de subbase construccion de muros de hormigon armado en el sector cabaña del abuelo.	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	05/04/2013 - 12:23 AM
Diciembre.- Excavación en suelo, relleno para muro de tierra, demolición de estructura de hormigon.	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	17/01/2013 - 11:26 AM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. Económico.	21/06/2019	Hector Hernan Alarcon Pico	40 %	60	24	0/1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Falta de recursos económicos CAUSARÍA problemas en la liquidación del proyecto						

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Flavio Alfaro

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Estudios, realizados.	9-Entregables Formales	19/10/2011		19/10/2011		Sí	1.0
2	PLANEACIÓN: Firma de contrato, firmado.	9-Entregables Formales	19/10/2011		19/10/2011		Sí	1.0
3	PLANEACIÓN: Entrega anticipo, entregado.	9-Entregables Formales	31/10/2012		31/10/2012		Sí	1.0
4	EJECUCIÓN: Avance físico 6%(Regeneración vial, cunetas, subdrenes, alcantarillas, Muro de tierra armada), ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2012		30/12/2012		Sí	6.0
5	EJECUCIÓN: Avance físico 21%(Regeneración vial, cunetas, subdrenes, alcantarillas, Muro de tierra armada), ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	19.0
6	EJECUCIÓN: Avance físico 35%(Regeneración vial, cunetas, subdrenes, alcantarillas, Muro de tierra armada), ejecutado.	5-Entregables Intermedios	20/04/2013		20/04/2013		Sí	13.0
7	EJECUCIÓN: Avance físico 62%(Regeneración vial, cunetas, subdrenes, alcantarillas, Muro de tierra armada), ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/05/2013		30/05/2013		Sí	11.0
8	EJECUCIÓN: Avance físico 80%(Regeneración vial, cunetas, subdrenes, alcantarillas, Muro de tierra armada), ejecutado.	5-Entregables Intermedios	09/07/2013		15/11/2013		Sí	12.0
9	EJECUCIÓN: Avance físico 90%(Regeneración vial, cunetas, subdrenes, alcantarillas, Muro de tierra armada), ejecutado.	5-Entregables Intermedios	20/07/2013		15/12/2013		Sí	13.0
10	EJECUCIÓN: Avance físico 100%(Regeneración vial, cunetas, subdrenes, alcantarillas, Muro de tierra armada), ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/07/2013		30/12/2013		Sí	15.0
11	EJECUCIÓN: Rubros del Contrato Complementario, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2013		01/11/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
12	CIERRE: Acta de entrega recepción provisional, firmado.	9-Entregables Formales	30/08/2013		30/01/2016		Sí	0.5
13	CIERRE: Liquidación económica, pagada.	5-Entregables Intermedios	30/08/2013		30/05/2017		Sí	0.5
14	COMPLETADA: Acta de entrega recepción definitiva, firmada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	04/12/2013		30/05/2017		Sí	0.5
15	EJECUCIÓN.- Convenio de Pago Fiscalización, cancelado.	5-Entregables Intermedios	30/07/2019	30/07/2019			No	0.5
16	CIERRE.- Informes de Fiscalización aprobados	5-Entregables Intermedios	31/08/2019	31/08/2019			No	1.0
17	CIERRE.- Cierre de proyecto según formato SENPLADES aprobado	5-Entregables Intermedios	30/09/2019	30/09/2019			No	1.0
18	CIERRE.- Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	V - Verificación ejecutiva	01/10/2019	01/10/2019			No	1.0
19	CIERRE.- Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno - suscrita	V - Verificación ejecutiva	31/10/2019	31/10/2019			No	1.0
20	CIERRE.- Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	V - Verificación ejecutiva	30/11/2019	30/11/2019			No	0.5
21	CIERRE.- Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	V - Verificación ejecutiva	31/12/2019	31/12/2019			No	0.5

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	SUPERVISION EXITOSA DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	24/12/2015
2	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	22/09/2015
3	Proyecto culminado	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	20/02/2015
4	Supervision de Proyecto	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	26/12/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Avance físico según cronograma de trabajo.	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/01/2012	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	981,522.69
Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,096,553.72 **
Costo Total:	3,614,644.43
Total Devengado:	3,067,734.37
% Costo Total Devengado:	84.87 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 84.87 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	6,437,788.37	38,425.80	0.00	6,476,214.17
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	3,510,351.23	28,819.35	0.00	3,539,170.58
Ppto. Codificado	164,294,172.58	28,819.35	0.00	164,322,991.93
Ppto. Comprometido	3,603,461.67	0.00	0.00	3,603,461.67
Planeado - Codificado (2019)		9,606.45		
Programado a Devengar	4,926,932.84	28,819.35	0.00	4,955,752.19
Ppto. Devengado	3,067,734.37	0.00	0.00	3,067,734.37
Pagado Real	2,654,846.66	0.00	0.00	2,654,846.66
Estimado a fin de año	* 3,067,734.37	0.00	0.00	3,067,734.37
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,859,198.47	28,819.35	0.00	1,888,017.82
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 62.26 %	0.00 %	0.00 %	61.90 %
Ppto. Codificado 998	1,490,688.41	0.00	0.00	1,490,688.41
Ppto. Devengado 998	769,119.81	0.00	0.00	769,119.81

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

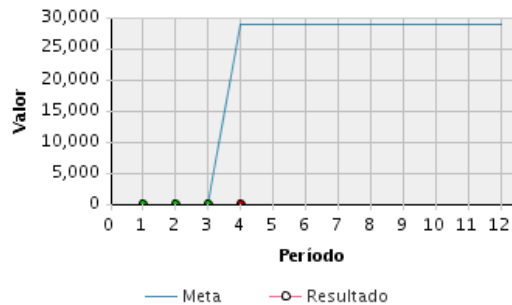

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	28,819.35	0.00	28,819.35	0.00	0.00 %		0.00 %
May	0.00		28,819.35				
Jun	0.00		28,819.35				
Jul	0.00		28,819.35				
Ago	0.00		28,819.35				
Sep	0.00		28,819.35				
Oct	0.00		28,819.35				
Nov	0.00		28,819.35				
Dic	0.00		28,819.35				
Total	28,819.35	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
17	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta de recepción provisional.	Acta_Provisional-Mitigación_Sitios_Criticos..pdf	03/03/2016
2	Acta recepción definitiva.	ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA..pdf	05/06/2017
3	Informe Ejecutivo SITOP marzo 2016	ID_5247_marzo_2016.pdf	01/04/2016
4	Informe Ejecutivo SITOP, junio 2014	C.2.pdf	04/07/2014
5	Informe Ejecutivo SITOP. abril 2013.	A.6.pdf	09/04/2014
6	Informe Ejecutivo SITOP. abril 2014.	B.9.pdf	05/05/2014
7	Informe Ejecutivo SITOP. agosto 2013.	B.1.pdf	09/04/2014
8	Informe Ejecutivo SITOP. diciembre 2012.	A.2.pdf	09/04/2014
9	Informe Ejecutivo SITOP. diciembre 2013.	B.5.pdf	09/04/2014
10	Informe Ejecutivo SITOP. enero 2013.	A.3.pdf	09/04/2014
11	Informe Ejecutivo SITOP. enero 2014.	B.6.pdf	09/04/2014
12	Informe Ejecutivo SITOP. febrero 2013.	A.4.pdf	09/04/2014
13	Informe Ejecutivo SITOP. febrero 2014.	B.7.pdf	09/04/2014
14	Informe Ejecutivo SITOP. julio 2013.	A.9.pdf	09/04/2014
15	Informe Ejecutivo SITOP. julio 2014.	C.3.pdf	07/08/2014
16	Informe Ejecutivo SITOP. junio 2013.	A.8.pdf	09/04/2014
17	Informe Ejecutivo SITOP. marzo 2013.	A.5.pdf	09/04/2014
18	Informe Ejecutivo SITOP. marzo 2014.	B.8.pdf	09/04/2014
19	Informe Ejecutivo SITOP. mayo 2013.	A.7.pdf	09/04/2014
20	Informe Ejecutivo SITOP. mayo 2014.	C.1.pdf	05/06/2014
21	Informe Ejecutivo SITOP. noviembre 2012.	A.1.pdf	09/04/2014
22	Informe Ejecutivo SITOP. noviembre 2013.	B.4.pdf	09/04/2014
23	Informe Ejecutivo SITOP. octubre 2013.	B.3.pdf	09/04/2014
24	Informe Ejecutivo SITOP. septiembre 2013.	B.2.pdf	09/04/2014
25	J.1-Informe ejecutivo SITOP agosto 2014	C.4.pdf	04/09/2014
26	J.2-Informe ejecutivo SITOP septiembre 2014.	C.5.pdf	02/10/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
27	J.3 Informe Ejecutivo SITOP. Octubre 2014.	C.6.pdf	05/11/2014
28	J.4 Informe Ejecutivo SITOP. Noviembre 2014.	C.7.pdf	22/12/2014
29	J.5 Informe Ejecutivo SITOP. Diciembre 2014.	C.8.pdf	07/01/2015
30	J.6 Informe Ejecutivo SITOP. Enero 2015.	C.9.pdf	05/02/2015
31	J.7 Informe Ejecutivo SITOP. Febrero 2015	D.1.pdf	03/03/2015
32	J.8 Informe Ejecutivo SITOP. Marzo 2015	D.2.pdf	06/04/2015
33	J.9 Informe Ejecutivo SITOP. Abril 2015	D.3.pdf	07/05/2015
34	K.1 Informe Ejecutivo SITOP. Mayo 2015	D.4.pdf	07/07/2015
35	K.2 Informe Ejecutivo SITOP. Junio 2015	D.5.pdf	07/07/2015
36	K.3- Contrato Modificatorio	D.6.pdf	28/07/2015
37	K.4- Contrato Complementario	D.7.pdf	28/07/2015
38	K.5- Informe Ejecutivo SITOP, mes julio 2015.	D.8.pdf	05/08/2015
39	K.6- Informe Ejecutivo SITOP, mes agosto 2015.	D.9.pdf	03/09/2015
40	K.7 Informe Ejecutivo SITOP mes septiembre 2015	C.1.pdf	06/10/2015
41	K.8 Informe Ejecutivo SITOP mes octubre 2015	C.2.pdf	04/11/2015
42	K.9- Informe Ejecutivo SITOP mes noviembre 2015	C.3.pdf	07/01/2016
43	L.1- Informe Ejecutivo SITOP mes diciembre 2015	C.4.pdf	07/01/2016
44	L.1- Informe Ejecutivo SITOP mes enero 2016	ID_5247.pdf	05/02/2016
45	L.2- Informe Ejecutivo SITOP mes febrero 2016	ID_5247_febrero_2016..pdf	03/03/2016
46	L3- Informe Ejecutivo SITOP mes mayo 2016	ID_5247_Mayo_2016.pdf	01/06/2016
47	L4- Informe Ejecutivo SITOP mes septiembre 2016	ID_5247_septiembre_2016.pdf	06/10/2016
48	L5- Informe Ejecutivo SITOP mes octubre 2016	ID_5247_Octubre_2016.pdf	01/11/2016
49	L6- Informe Ejecutivo SITOP mes noviembre 2016	ID_5247.pdf	07/12/2016
50	L7- Informe Ejecutivo SITOP mes diciembre 2016.	ID_5247_DICIEMBRE_2016..pdf	04/01/2017
51	L8- Informe Ejecutivo SITOP mes marzo 2017.	ID_5247.pdf	05/04/2017

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Alarcon Pico, Hector Hernan	Supervisor	Experto de Infraestructura Provincial	halarcon@mtop.gob.ec	
Macias Fuentes, Alberto Fabrizzio	Director	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Manabí	amacias@mtop.gob.ec	023974600
