

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte**  
**Dirección de Construcciones del Transporte**

**PROYECTO: K011 MTOP - Fiscalización de Obra Pública Contratada**

Líder del Proyecto:	Salgado Brasero, Jorge Fernando (fsalgado@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Medina Galarza, César Augusto	Programas Relacionados:	
Titular:	Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.21.4623	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	629,677.66
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	02/01/2012 - 31/12/2020
Fecha de última actualización:	05/07/2019	Fecha de Fin Base:	31/12/2020
Modificado por:	Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	Fecha del siguiente Hito:	25/03/2019


**DATOS GENERALES**

<b>Descripción</b>
Fiscalización de Obra Contratada
<b>Beneficios Cualitativos</b>
Fiscalizar el avance de Obra Contratada con los Proyectos de Infraestructura. Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de los contratos
<b>Tipo de Beneficiario</b>
Población beneficiaria de los proyectos de infraestructura
<b>Restricciones</b>
Presupuesto asignado Tiempo de ejecución de proyectos Especificaciones técnicas de obras de infraestructura

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**




Transcurrido: 84.21 %  
 Fecha de Inicio: 02/01/2012      Fecha de Fin: 31/12/2020

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

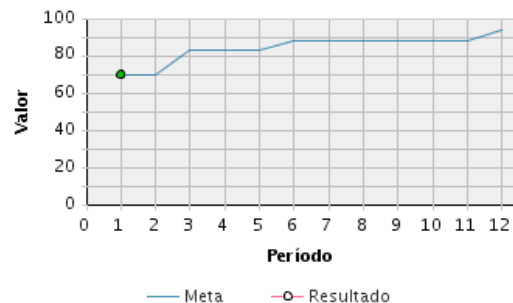

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	70 %	70 %	83 %	83 %	83 %	88 %	88 %	88 %	88 %	88 %	88 %	94 %
Avance real acumulado												
	70 %											
Estado												
												

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Junio 2019:</p> <p>Causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se encuentra a la espera del pronunciamiento jurídico para realizar los pagos correspondientes.</li> <li>- Se solicitó el aval para el Convenio de Pago de la Fiscalización de la Rehabilitación y Reparación del Muelle Internacional #2 en el Puerto de Manta.</li> <li>- Fiscalización INECO: No se recibe respuesta a las observaciones a los Planos Asbuilt presentados por la contratista para realizar la liquidación y recepción definitiva de la obra y así continuar con el trámite respectivo con respecto al Convenio de Pago de la Fiscalización.</li> </ul> <p>Acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar la insistencia en la observaciones de los Planos Asbuilt</li> <li>- Hacer seguimiento respectivo a los Actos Administrativos que se realizan respecto a los pronunciamientos jurídicos para realizar los pagos respectivos a los Muelles marginal e internacional</li> </ul>	Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	05/07/2019 - 03:21 PM
<p>Mayo 2019:</p> <p>Causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se solicitó el aval para el Convenio de Pago de la Fiscalización de la Rehabilitación y Reparación del Muelle Internacional #2 en el Puerto de Manta.</li> <li>- Fiscalización INECO: No se recibe respuesta a las observaciones a los Planos Asbuilt presentados por la contratista para realizar la liquidación y recepción definitiva de la obra y así continuar con el trámite respectivo con respecto al Convenio de Pago de la Fiscalización.</li> </ul> <p>Acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar la insistencia en la observaciones de los Planos Asbuilt</li> <li>- Hacer seguimiento respectivo a los Actos Administrativos que se realizan.</li> </ul>	Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	05/06/2019 - 09:36 AM
<p>Abril 2019:</p> <p>Causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se continúa esperando el pronunciamiento jurídico con respecto a los Muelles Marginal e Internacional en el Puerto de Manta.</li> <li>- Referente a los trabajos extracontractuales ejecutados por la Cía. SOLEICO, Contratista de la Fiscalización de la Rehabilitación y Reparación de los Muelles Marginales en el Puerto de Manta, al respecto debo manifestarle que el trámite se encuentra en la Coordinación General Jurídica desde el 25 de febrero de 2019, en vista de que se ha pedido pronunciamiento Jurídico para la suscripción del Convenio de Pago por un valor de USD. 45.238,96, correspondiente a los valores a favor de la Fiscalización determinados en el Acta de Negociación suscrita y, que consta en el Acta de Recepción Única y en el Acta de Recepción de los trabajos extracontractuales.</li> <li>- Se espera contestación con el criterio jurídico mediante el cual se consulta la viabilidad del pago de la fiscalización de los muelles, MTOP-SUBZ4-2019-0409-ME, del 26 de marzo de 2019</li> <li>- Fiscalización INECO: Se hizo observaciones a los Planos Asbuilt presentados por la contratista para realizar la liquidación y recepción definitiva de la obra y así continuar con el trámite respectivo con respecto al Convenio de Pago de la Fiscalización.</li> <li>- Mediante Oficio Nro. MTOP-SIT-18-68-OF del 13 de marzo de 2018 mediante el cual el Subsecretario de Infraestructura del Transporte da a conocer al Gerente de INECO el informe emitido por el Coordinador de Asesoría Jurídica respecto a los pagos pendientes.</li> <li>- En relación al Oficio Anexo Nro.MTOP-SIT-18-132-OF de 26 de junio de 2018 a través del cual la Subsecretaría de Infraestructura del Transporte solicita al Ing. José Pernas-INECO remitir información necesaria para dar continuidad al trámite de Convenio de Pago, cumpliendo con las disposiciones establecidas en el artículo 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas así como en las directrices impartidas por la Coordinación General de Asesoría Jurídica mediante Memorando Nro.MTOP-CGJ-2017-1283-ME de 23 de noviembre de 2017 y alineándose con los requisitos remitidos en su Memorando Nro. MTOP-CGJ-2018-312-ME de 01 de marzo de 2018, para poder efectuar dicho trámite y de esta forma proceder, luego del análisis correspondiente, con el pago del valor adeudado a su Representada, por lo cual me permito recalcar como Administrador del contrato que deben contar con los siguientes documentos a ser proporcionados por su representada: 1.Acta de Entrega Recepción Definitiva del Contratista de Obra 2.La Planilla Única de los trabajos de Fiscalización 3.Informe Final de</li> </ul>	Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	02/05/2019 - 02:37 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>la Fiscalización 4. Planos "As-Built" La fiscalización realizó el envío de dichos planos a través de Oficio Nro. 1033-INECO-PIFO-PAPALLACTA de 22 de enero de 2018 el cual se dió contestación a través los Oficios Nros. MTOP-DCT-18-11-OF de 09/02/2018, MTOP-DCT-18-21-OF de 13/03/2018, MTOP-DCT-18-24-OF de 20/03/2018, MTOP-DCT-18-26-OF de 29/03/2018, MTOP-DCT-18-27-OF de 29/03/2018, MTOP-DCT-18-28-OF de 29/03/2018 y MTOP-DCT-18-55-OF de 18/05/2018 en los cuales se realizaron varias observaciones y se encuentra a la espera de que estos hayan sido subsanados. 5. Acta de Recepción Definitiva del Contrato de Fiscalización En razón de lo expuesto, se solicita con el carácter de urgente a la CONSULTORA ESPAÑOLA INECO-Fiscalizadora de la obra, realice las respectivas correcciones indicadas en los planos AS-BUILT y envíe toda documentación indicada anteriormente.</p> <p>Acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar la insistencia en la observaciones de los Planos Asbuilt</li> <li>- Hacer seguimiento respectivo a los Actos Administrativos que se realizan.</li> </ul>		
<p>Marzo 2019:</p> <p>Causas: .Referente a los trabajos extracontractuales ejecutados por la Cía. SOLEICO, Contratista de la Fiscalización de la Rehabilitación y Reparación de los Muelles Marginales en el Puerto de Manta, al respecto debo manifestarle que el trámite se encuentra en la Coordinación General Jurídica desde el 25 de febrero de 2019, en vista de que se ha pedido pronunciamiento Jurídico para la suscripción del Convenio de Pago por un valor de USD. 45.238,96, correspondiente a los valores a favor de la Fiscalización determinados en el Acta de Negociación suscrita y, que consta en el Acta de Recepción Única y en el Acta de Recepción de los trabajos extracontractuales.</p> <p>.Se espera contestación con el criterio jurídico mediante el cual se consulta la viabilidad del pago de la fiscalización de los muelles, MTOP-SUBZ4-2019-0409-ME, del 26 de marzo de 2019</p> <p>.Fiscalización INECO; Se hizo observaciones a los Planos Asbuilt presentados por la contratista para realizar la liquidación y recepción definitiva de la obra y así continuar con el trámite respectivo con respecto al Convenio de Pago de la Fiscalización.</p> <p>.Mediante Oficio Nro. MTOP-SIT-18-68-OF del 13 de marzo de 2018 mediante el cual el Subsecretario de Infraestructura del Transporte da a conocer al Gerente de INECO el informe emitido por el Coordinador de Asesoría Jurídica respecto a los pagos pendientes.</p> <p>Acciones: .Realizar la insistencia en la observaciones de los Planos Asbuilt</p> <p>.Hacer seguimiento respectivo a los Actos Administrativos que se realizan.</p>	Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	04/04/2019 - 02:12 PM
<p>Febrero 2019</p> <p>Fiscalización (INECO) Pifo Papallacta.- Mediante Oficio N°. 1045-INEC-PIFO-PAPALLACTA de fecha 22 de febrero de 2018, el Gerente de Proyectos de INECO expresa estar de acuerdo con el Cronograma de Actividades para Mantenimiento de los 7 Proyectos. Sin embargo, se aclara que los 7 proyectos deberán estar expedidos para la Recepción Definitiva, cuando el MTOP lo designe. Fiscalización de proyecto de muelle internacional de Puerto de Manta y Fiscalización de proyecto de muelles marginales de Puerto de Manta, en espera el Aval para solicitar la Certificación Presupuestaria</p>	Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	01/03/2019 - 10:38 AM
<p>Enero 2019</p> <p>Se procede con la creación del proyecto para el pago de las Fiscalizaciones pendientes Pifo Papallacta, Muelles Marginales en el Puerto de Manta, Muelle Internacional N°2 en el Puerto de Manta</p>	Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	31/01/2019 - 11:05 AM
<p>Enero 2017</p> <p>Se procede con la creación del proyecto para el pago de las Fiscalizaciones pendientes Pifo Papallacta, Muelles Marginales en el Puerto de Manta, Muelle Internacional N°2 en el Puerto de Manta</p>	Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	31/01/2019 - 09:25 AM

**PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Disponibilidad de los recursos para realizar los pagos correspondientes	31/01/2019	Fredy Oswaldo Altamirano Arias	10	10	1	0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>2- NACIONAL. * General.</b> No asignación de recursos CAUSARÍA el no pago y liquidación de fiscalización de diferentes obras	05/07/2019	Fredy Oswaldo Altamirano Arias	40 %	60	24	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1




**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 2 - Centro Norte > Zona 2 > Zona 2 - (Toda la Zona)
2	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Manta


**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado	1-Solicitud de Información	01/01/2014		01/01/2014		Sí	10.0
2	EJECUCIÓN: Fiscalización de proyecto de muelle internacional de Puerto de Manta pagada	1-Solicitud de Información	02/12/2014		02/12/2014		Sí	15.0
3	EJECUCIÓN: Fiscalización de proyecto Pífo Papallacta pagada	3-Adjudicación	31/10/2017		31/10/2017		Sí	20.0
4	EJECUCIÓN: Fiscalización de proyecto de muelles marginales de Puerto de Manta pagada	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		30/11/2017		Sí	15.0
5	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	1-Solicitud de Información	01/01/2019		01/01/2019		Sí	5.0
6	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluído	1-Solicitud de Información	01/01/2019		01/01/2019		Sí	5.0
7	EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada	5-Entregables Intermedios	01/03/2019	25/03/2019			No	3.0
8	EJECUCIÓN: Fiscalización de proyecto de muelle internacional de Puerto de Manta pagada	9-Entregables Formales	31/03/2019	31/03/2019			No	5.0
9	EJECUCIÓN: Fiscalización de proyecto de muelles marginales de Puerto de Manta pagada	9-Entregables Formales	31/03/2019	31/03/2019			No	5.0
10	EJECUCIÓN: Fiscalización de proyecto Pífo Papallacta pagada	9-Entregables Formales	30/06/2019	30/06/2019			No	5.0
11	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019			No	6.0
12	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	5-Entregables Intermedios	28/01/2020	28/01/2020			No	1.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
13	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	5-Entregables Intermedios	28/01/2020	28/01/2020			No	1.0
14	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	5-Entregables Intermedios	28/01/2020	28/01/2020			No	2.0
15	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	5-Entregables Intermedios	28/02/2020	28/02/2020			No	1.5
16	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	20/03/2020	20/03/2020			No	0.5

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de planillas pagadas		-	-	-	01/01/2019	-


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	629,677.66 **
Costo Total:	5,200,000.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 0.00 %

**Perfil Económico 2019**

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	844,570.21	0.00	844,570.21
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	629,677.66	0.00	629,677.66
Ppto. Codificado	0.00	629,677.66	0.00	629,677.66
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2019)		214,892.55		
Programado a Devengar	629,677.66	629,677.66	0.00	1,259,355.32
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	629,677.66	629,677.66	0.00	1,259,355.32
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019**

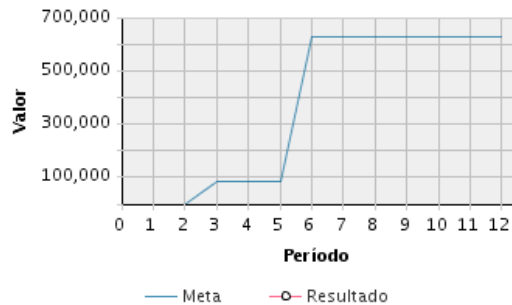

**Presupuesto Mensual 2019**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	86,546.17		86,546.17				
Abr	0.00		86,546.17				
May	0.00		86,546.17				
Jun	543,131.49		629,677.66				
Jul	0.00		629,677.66				
Ago	0.00		629,677.66				
Sep	0.00		629,677.66				
Oct	0.00		629,677.66				
Nov	0.00		629,677.66				
Dic	0.00		629,677.66				
<b>Total</b>	<b>629,677.66</b>						

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
10	Incrementar el seguimiento, control y evaluación de los proyectos de construcción y fiscalización de la infraestructura del transporte MEDIANTE la supervisión de la aplicación de normas técnicas, administrativas y lineamientos para la gestión de construcciones en los procesos desconcentrados.

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	2- NACIONAL. * General. No asignación de recursos CAUSARÍA el no pago y liquidación de fiscalización de diferentes obras	Fiscalización_Obra_Contratada.rar	05/07/2019
2	A.10_Respaldo_Fiscalización_INECO-Pifo_Papallacta	Disponibilidad_de_Recursos.pdf	16/05/2019
3	A.2_Respaldo_EJECUCIÓN_Fiscalización_de_proyecto_de Muelle Internacional de Puerto de Manta pagada	A.2_Respaldo_EJECUCIÓN_Fiscalización_de_proyecto_de Muelle Internacional de Puerto de Manta pagada.docx	06/06/2019
4	A.3_Respaldo_EJECUCIÓN_Fiscalización_de_proyecto de Pifo_Papallacta pagada	A.3_Respaldo_EJECUCIÓN_Fiscalización_de_proyecto de Pifo_Papallacta pagada.docx	06/06/2019
5	A.4_Respaldo_EJECUCIÓN_Fiscalización_de_proyecto de Muelle Marginal de Puerto de Manta pagada	A.4_Respaldo_EJECUCIÓN_Fiscalización_de_proyecto de Muelle Marginal de Puerto de Manta pagada.docx	06/06/2019
6	A.5_Respaldo_PLANEACIÓN_Proyecto_con_recursos económicos desconcentrados	A.5_Respaldo_PLANEACIÓN_Proyecto_con_recursos económicos desconcentrados.pdf	01/05/2019
7	A.6_Respaldo_Planeación_Proyecto_en_PAI_incluido	A.6_Respaldo_PLANEACIÓN_Proyecto_en_PAI_incluido.pdf	31/01/2019
8	A.7_Cronograma_Actividades_Pifo_Papallacta_INECO	A.7_Cronograma_Actividades_Pifo_Papallacta_INECO.rar	01/03/2019
9	A.8_EJECUCIÓN: Fiscalización de proyecto de muelle internacional de Puerto de Manta pagada	Fiscalizacion_Muelle_Internacional_Manta.rar	05/06/2019
10	A.8_Respaldo_Muelle_Marginal_Manta	Fiscalización_Muelle_Marginal_Puerto_Manta_26_Marzo_2019.pdf	04/07/2019

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	Líder de proyecto	Director de Construcciones del Transporte	faltamirano@mtop.gob.ec	
Guaman Vargas, César Manuel	Supervisor zonal	Supervisión de la Región 4	cguaman@mtop.gob.ec	023974600
Salgado Brasero, Jorge Fernando	Coordinador Técnico de infraestructura	Director de Construcciones del Transporte, Encargado	fsalgado@mtop.gob.ec	023974600
