

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 5
Dirección Provincial Santa Elena

PROYECTO: K011 MTOP-Construcción del intercambiador de tráfico en la vía San Vicente-San Pablo para la interconexión del corredor E40 y E15 incluye intercambiador San Vicente-San Pablo y vía San Vicente-Atahualpa.

Líder del Proyecto:	Anchundia García, Gonzalo Evaristo (ganchundia@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Bastidas Izurieta, Álvaro Sebastián	Programas Relacionados:	CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR DE TRAFICO EN LA VIA SAN VICENTE-SAN PABLO PARA LA INTERCONEXION DEL CORREDOR E, Provincia - Santa Elena, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Matamoros Arias, Julio Cesar	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.375953	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,195,653.40
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	16/04/2014 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	16/08/2019	Fecha de Fin Base:	30/06/2016
Modificado por:	Anchundia García, Gonzalo Evaristo	Fecha del siguiente Hito:	30/04/2018

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Construcción del intercambiador de tráfico en la vía San Vicente-San Pablo para la interconexión del corredor E40 y E15 incluye intercambiador San Vicente-San Pablo y vía San Vicente-Atahualpa.

El componente Sectorial del Transporte pretende vincular y desarrollar armónicamente el territorio Ecuatoriano, mejorando las condiciones de accesibilidad hacia las áreas con posibilidad de producción agropecuaria, turística y para facilitar la transportación e intercambio de personas y productos mediante la regularización de la infraestructura vial del país de acuerdo al Plan Maestro Vial Nacional y en concordancia con la iniciativa IIRSA.

IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO:

El área de estudio considerada comprende la intersección 1, tramo San Vicente - San Pablo (km 120 vía Guayaquil-Salinas); y la intersección 2, situada en la Ruta Spondylus (E15) y el desvío a San Vicente, ambos en la provincia de Santa Elena.

LÍNEA BASE:

De acuerdo con los estudios realizados se ha encontrado que el caos vehicular que se genera en la intersección del Km. 117, de la carretera Guayaquil - Santa Elena, con el tramo San Vicente - San Pablo y en la intersección del Km. 709, de la Ruta Spondylus, en el tramo San Vicente - San Pablo, las intersecciones vía E15 y E40, es alto tal que, durante los fines de semana, la Comisión de Tránsito del Ecuador, (CTE) asigna personal para evitar que se produzcan accidentes en estas intersecciones.

Es necesario la construcción del intercambiador de tráfico en la vía San Vicente-San pablo para la interconexión del corredor E40 y E15 incluye intercambiador San Vicente-San Pablo., en razón de mejorar el ángulo de visibilidad para los vehículos que se dirigen a Guayaquil, provenientes de San Vicente y evitar confusiones de los conductores se propone modificar la geometría de la intersección

OBJETIVO GENERAL:


DATOS GENERALES

Descripción
Lograr la construcción de los intercambiadores de tráfico en la vía san Vicente-San Pablo, para mejorar las condiciones de transitabilidad segura y eficaz durante los 365 días del año. (Para la interconexión del corredor e40 y e15 incluye intercambiador San Vicente-San Pablo y vía San Vicente-Atahualpa con el fin de mejorar el ángulo de visibilidad para los vehículos que se dirigen a Guayaquil, provenientes de San Vicente, evitar confusiones de los conductores, mejorar el flujo vehicular, reducción de congestionamientos o cuellos de botella en puntos específicos. Con los antecedentes expuestos, se concluye que las dos intersecciones deben ser modificadas geoméricamente, con el fin de evitar accidentes y precautelar la seguridad de los usuarios de la vía).
Beneficios Cualitativos
Mejorar la interconexión entre las poblaciones de Santa Elena, Ballenita y La Libertad.
Tipo de Beneficiario
El tiempo de viaje entre la provincia de Santa Elena y Guayas se reducirá en un 60 %.
Restricciones
Los costos de operación y transporte se reducirán notablemente lo que incrementará el tráfico y permitirá mejorar las condiciones de productividad, fomentar el desarrollo empresarial, desarrollar focos de producción y potencial exportador fomentando la libre competencia.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	------------	------------------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 94.20 %
 Fecha de Inicio: 16/04/2014 Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Julio 2019: El contratista ha ejecutado lo siguiente: Colocación de la base en todos los ramales(# 1, 2, 3, 4 y 5); piedra escollera en los taludes respectivos , bordillo, parterre central.	Anchundia García, Gonzalo Evaristo	04/08/2019 - 09:44 AM
Junio -2019: El Consorcio Intercambiador San Pablo- 2018, Contratista actual de la obra, se detalla lo ejecutado: Hormigonado del puente (luz de : 100 metros), Colocado la sub- base y base clase I, en todos los ramales ,	Anchundia García, Gonzalo Evaristo	03/07/2019 - 05:06 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se encuentra colocando la piedra escollera como revestimiento de los taludes.		
<p>Mayo -2019: El Consorcio Intercambiador San Pablo- 2018, Contratista actual de la obra,ha hormigonado el puente en su totalidad (luz de : 100 metros), ha colocado la base clase I, en todos los ramales , se encuentra preparando la piedra escollera para ser utilizada en los revestimiento de los taludes</p>	Anchundia García, Gonzalo Evaristo	03/06/2019 - 03:47 PM
<p>Abril -2019: El Consorcio Intercambiador San Pablo- 2018, Contratista de la obra, ha ejecutado la losa y barandales de hormigón armado del puente (luz: 100 metros), realizando actualmente la colocación de la base clase I, en los ramales 2, 3, 4 y 5.</p>	Anchundia García, Gonzalo Evaristo	02/05/2019 - 10:00 AM
<p>Marzo -2019: esta ejecutado el montaje de las 28 vigas prefabricadas del puente, se construye la losa y barandales de hormigón armado, en una luz de 100 metros , así también se trabaja en los ramales 1, 4 y 5 en la colocación de la sub-base</p>	Anchundia García, Gonzalo Evaristo	03/04/2019 - 04:43 PM
<p>Enero 2019: Se espera la entrega del anticipo, para el inicio de la obra (contratista actual): Consorcio Intercambiador San Pablo- 2018. Febrero 2019: Con fecha 6 de febrero del 2019, el contratista recibe el anticipo (50%) se inicia plazo contractual.</p>	Anchundia García, Gonzalo Evaristo	04/03/2019 - 07:11 PM
<p>Diciembre 2018: Mediante Resolución N° 40- 2018, de fecha 3 de diciembre del 2018, se autoriza el inicio del proceso de Contratación Directa por Terminación Unilateral CDTU- MTOPSE- 01- 18 Mediante Resolución N° 41- 2018, de fecha 7 de diciembre del 2018, se adjudica al Consorcio Intercambiador San Pablo- 2018, cuyo representante legal es el Ing. Carlos Morocho Duque, el contrato se inicia una vez que el anticipo sea entregado al contratista adjudicado.</p>	Anchundia García, Gonzalo Evaristo	04/01/2019 - 09:46 AM
<p>Noviembre 2018: Mediante Resolución de Terminación Unilateral N° MTOP-DDSE-0038-2018, el Director Distrital del MTOP de Santa Elena ,Ing. Julio Matamoros Arias, resuelve declarar la terminación anticipada y unilateral, en virtud del Art. 94, Numeral 7 conforme el LOSNCP, con fecha 27 de noviembre del 2018.</p>	Anchundia García, Gonzalo Evaristo	04/12/2018 - 04:38 PM
<p>Octubre 2018: Con fecha 17 de septiembre del 2018, por motivos de haberse ejecutado el taponamiento (por parte del dueño del terreno aledaño) del cauce natural de la obra el cual impide el drenaje de las aguas,se realiza acta de suspensión N° 6 ; el contratista con fecha 2 de octubre del 2018, solicita la terminación del contrato, por que se procede a la revisión técnica-económica del mismo.</p>	Anchundia García, Gonzalo Evaristo	02/11/2018 - 03:51 AM
<p>SEPTIEMBRE 2018: La obra se encuentra en ejecución (se reinició el 15 de agosto del 2018), se está ejecutando con el siguiente detalle: Colocación de material de mejoramiento.</p>	Anchundia García, Gonzalo Evaristo	30/09/2018 - 04:02 PM
<p>Agosto 2018: con fecha 15 de agosto se procedió a elaborar acta de reanudación de obra N°5</p>	Matamoros Arias, Julio Cesar	03/09/2018 - 04:57 PM
<p>Julio 2018: El proyecto del intercambiador de trafico de san pablo, presenta la siguiente situación: Con fecha 02 de abril del 2018, se suscribe Acta de Suspensión N°5 (adjuntada en el archivo), en la misma se anota que se procede a la suspensión, por obras que tiene que realizar la empresa pública AGUAPEN EP, al haber ejecutando, sin autorización en el sector, la instalación de líneas de agua potable, cámaras de válvulas y guías domiciliarias en el área del proyecto, una vez concluida esta labor, se reiniciará la misma, debiendo elaborarse un nuevo cronograma reprogramado de obra.</p>	Matamoros Arias, Julio Cesar	03/08/2018 - 10:40 AM
<p>Junio 2018: La construcción del Intercambiador de Trafico de San Pablo, tiene suspensión temporal, debido a la afectación en su área de implantación de líneas de agua potable, cámara de válvula y guías domiciliarias, trabajos que se encuentran ejecutando la empresa pública AGUAPEN EP. una vez realizado estos trabajos, se reiniciará la obra y se reprogramará el cronograma de obra.</p>	Matamoros Arias, Julio Cesar	02/07/2018 - 04:37 PM
<p>Mayo 2018: El estado actual del proyecto del Intercambiador de tráfico de San Pablo , se encuentra en suspensión temporal; la empresa pública AGUAPEN EP, está ejecutando el traslado de línea , cámara de válvula y guías domiciliarias de agua potable, terminado esta labor se reinicia el proyecto.</p>	Matamoros Arias, Julio Cesar	01/06/2018 - 04:21 PM
<p>Abril 2018: La obra se encuentra en ejecución, se presentó y aprobó planilla N° 9 de avance obra y planilla N° 1 de contrato complementario N° 1 Se ejecutó del contrato original : rubros de terraceria, transporte e impactos ambientales. Se realizó del contrato complementario N°1 : la reubicación de la posteria eléctrica existente .</p>	Matamoros Arias, Julio Cesar	03/05/2018 - 01:56 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Marzo 2018: El 2 de marzo se reunió en la ciudad de Quito, la Comisión Especial Decreto Ejecutivo N°451 , en la misma se concedió la ampliación del plazo solicitado por el contratista de 100 días .</p> <p>Se elabora acta de reinicio de obra, con fecha 5 de marzo del 2018.</p> <p>Se aprueba cronograma reprogramado en el plazo concedido.</p> <p>Se adjudica contrato de fiscalización, compañía CONSULNAC , inicia sus labores el 26 de marzo del 2018 .</p>	Matamoros Arias, Julio Cesar	05/04/2018 - 07:57 AM
<p>feBRERO 2018: el proyecto se encuentra suspendido, mediante acta de suspensión n°4</p> <p>Se ha solicitado a la Comisión Especial Decreto Ejecutivo N°451, reunión para ser considerado una ampliación de plazo de 100 días. estableciéndose como fecha de la convocatoria el 2 de marzo del 2018.</p>	Matamoros Arias, Julio Cesar	09/03/2018 - 12:28 PM
<p>Enero 2018: El proyecto se encuentra en ejecución.</p> <p>Se procedió a finales de diciembre del 2017 a la firma de la orden de cambio (evaluación mas/ menos) y contrato complementario (rubros nuevos : reubicacion de posteria eléctrica y sistema de iluminacion)</p>	Matamoros Arias, Julio Cesar	19/02/2018 - 01:45 PM
<p>Diciembre 2017:Estado actual : en ejecucion</p> <p>Se reinicia la obra y se elabora el acta de reanudación N°3</p> <p>En atención de la existencia de rubros nuevos por la reubicacion de posteria eléctrica existente y sistema de iluminación (no constaba en los estudios) , se elabora y firma el contrato complementario ,por un monto de: \$ 442681,72</p> <p>Se elabora y firma la orden de cambio (evaluación realizada en mas/menos de cantidades de rubros existentes) , por un monto de \$ 350668,31</p>	Matamoros Arias, Julio Cesar	04/01/2018 - 05:48 PM
<p>Noviembre 2017: En atención del decreto N°198 en el mismo señala lo pertinente : PRIMERA: Suprimase los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo N°58, publicado en el primer suplemento del Registro Oficial N° 36 del 14 de julio del 2017, por lo cual se procede .</p> <p>se solicita refondeo de recursos ,a fin de no tener escasez de recursos en futuro pagos de planillas</p> <p>se esta evaluando las cantidades para la contratación de orden de cambio y complementario, como paso previo a reanudar la obra (se tiene actualmente suspensión temporal N°3)</p>	Matamoros Arias, Julio Cesar	05/12/2017 - 09:01 AM
<p>Octubre 2017:</p> <p>Situación actual: tiene suspensión temporal N°3</p> <p>Se atendió los requisitos del Acuerdo Ejecutivo N° 58.</p> <p>Mediante memorando N° MTOP- SUBZ5- 2017- 1483- ME, de fecha 24 de octubre del 2017, suscrito por el Ing. Hugo Valle, Subsecretario Regional 5, a la Arq. Monica Quezada, Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, atendiendo los requisitos requeridos en el Acuerdo Ministerial N°SNPD-033-2017, en el cual se solicita la autorización e informe favorable del Contralor General del Estado.</p>	Dunn Rodríguez, Martin Eduardo	01/11/2017 - 08:59 AM
<p>Septiembre 2017: En atención del memorando N° MTOP-CGP-2017-1117-ME, se envía nuevamente con memorando N° MTOP-DDSE-2017-1137-ME, de fecha 27 de septiembre del 2017, los requisitos solicitando en el decreto ejecutivo N°58</p> <p>Situación actual: tiene suspensión temporal N°3</p>	Dunn Rodríguez, Martin Eduardo	04/10/2017 - 04:47 PM
<p>Agosto 2017: La situación actual :tiene suspensión temporal N°3</p> <p>En atención del memorando memorando N° MTOP-CGP-2017-948-ME, en el que solicitaba cumplir con los requisitos anotados en el Decreto Ejecutivo N° 58.</p> <p>Se envió respuesta con memorando N° MTOP-DDSE-2017-958-ME, detallándose lo siguiente: flujos de pagos proyectados por fuente de financiamiento identificando IVA, recursos fiscales ficha resumen</p> <p>Con memorando N° MTOP-SUBZ5- 2017-1235-ME, se envía de parte de la Subsecretaria Regional 5, a la Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, fin que se continué con el tramite correspondiente. Obtención de la aprobación por parte de SENPLADES para la firma de la orden de cambio y contrato complementario.</p>	Dunn Rodríguez, Martin Eduardo	04/09/2017 - 07:10 PM
<p>Julio 2017: la situación actual del Intercambiador se detalla:</p> <p>Tiene una suspensión , la N° 3.</p> <p>Se recibió memorando N° MTOP-CGP-2017-948-ME, de fecha 31 de julio del 2017, suscrito por la Arq. Monica Quezada , Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, en el mismo informa los requerimientos de SENPLADES.</p> <p>Se prepara los respectivos informes</p>	Dunn Rodríguez, Martin Eduardo	03/08/2017 - 05:50 PM
<p>Junio 2017: la situación actual del proyecto es:</p> <p>Tiene suspensión temporal N°3; se espera la aprobación de parte de SENPLADES, para proceder a la firma de la orden de cambio (diferencia de cantidades) y contrato complementario (rubros nuevos)</p>	Dunn Rodríguez, Martin Eduardo	04/07/2017 - 04:46 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2017: El proyecto tiene acta de suspensión temporal a partir del 30 de marzo del 2017, a la presente ; se espera la firma de los actos administrativos : orden de cambio y contrato complementario	Dunn Rodríguez, Martin Eduardo	03/06/2017 - 06:39 PM
ABRIL 2017: la contratista en virtud de no haberse firmado el acto administrativo : orden de cambio (incremento de cantidades mas/menos; contrato complementario (rubros nuevos),necesario para continuar con el proceso constructivo del proyecto , solicita una suspensión de obra , se evalúa lo requerido por parte de la fiscalización , supervision, jurídico y administrador de contrato y en atención de lo cual se acoge lo peticionado	Dunn Rodríguez, Martin Eduardo	04/05/2017 - 10:36 PM
MARZO 2017: SE EJECUTA AVANCE DE LOS SIGUIENTES RUBROS: HORMIGÓN ESTRUCTURAL DE CEMENTO PORTLAND CLASE A, F'C: 350 KG/ CM2, PARA ESTRIBOS Y MUROS, CON SU RESPECTIVA ELABORACIÓN DE ARMADURA (ACERO EN BARRAS F'Y = 4200KG/CM2 PILOTES PRE-BARRENADOS D: 0,52 METROS, DE HORMIGÓN F'C: 350 KG/ CM2 VACIADO EN SITIO. ASÍ TAMBIÉN EN EL RUBRO DE IMPACTO AMBIENTALES SE UTILIZA AGUA PARA CONTROL DEL POLVO .	Dunn Rodríguez, Martin Eduardo	08/04/2017 - 10:57 AM
FEBRERO 2017: SE EJECUTA AVANCE DE LOS SIGUIENTES RUBROS : HORMIGÓN ESTRUCTURAL DE CEMENTO PORTLAND CLASE A, F'C: 350 KG/ CM2, PARA ESTRIBOS Y MUROS ,CON SU RESPECTIVA ELABORACIÓN DE ARMADURA (ACERO EN BARRAS F'Y : 4200 KG/CM2 PILOTES PRE-BARRENADOS D: 0,52 METROS ,DE HORMIGÓN F'C: 350 KG/ CM2 VACIADO EN SITIO. ASÍ TAMBIÉN EN EL RUBRO DE IMPACTO AMBIENTALES SE UTILIZA AGUA PARA CONTROL DEL POLVO .	Dunn Rodríguez, Martin Eduardo	05/03/2017 - 09:58 PM
ENERO 2017:un vez pagadas las planillas 4 y 5, se procede a señalar al contratista el reinicio de actividades (se adjunta memorando, fiscalización a la fecha) a.- se evalua y aprueba las diferencias de cantidades. b.- se evalua y aprueba las cantidades de rubros nuevos (sistema de iluminacion y reubicacion de la posteria del area de influencia del intercambiador c.-se solicita reunión de la comisión de acuerdo al decreto 451 , para la aprobacion de lo requerido .	Dunn Rodríguez, Martin Eduardo	09/02/2017 - 04:49 PM
DICIEMBRE 2016: El contratista ha recibido la transferencia por parte del Ministerio de Finanzas del monto correspondiente a las planillas N° 4 y 5 aprobadas por el MTOP de Santa Elena. En virtud de lo cual el contratista está realizando el replanteo de los ejes (5 ramales) , limpieza de las armaduras de las pilas (construidas), en los próximos días se levantara la suspensión temporal En este proyecto se ha procedido a pagar, un primer grupo de personas por afectación (expropiación) en el área del proyecto.	Dunn Rodríguez, Martin Eduardo	05/01/2017 - 02:36 AM
NOVIEMBRE 2016: EL MTOP HA PROCEDIDO AL PAGO DE LAS PLANILLAS 4 Y 5, SE ESPERA QUE LA TRANSFERENCIA SEA REALIZADA EN BREVE POR EL MINISTERIO DE FINANZAS AL CONTRATISTA ,EL CONTRATISTA HA PROCEDIDO HA REALIZAR EL REPLANTEO DE LOS EJES ,REVISION DE SEÑALES,LIMPIEZA DE LA ARMADURA .	Dunn Rodríguez, Martin Eduardo	06/12/2016 - 10:20 AM
OCTUBRE 2016: EL ESTADO DEL PROYECTO ES SUSPENDIDO; SE ANOTA CON FECHA 25 DE OCTUBRE HABER RECIBIDO EL DICTAMEN FAVORABLE DEL SENPLADES Y EN EL MISMO SE DA PARA PAGO UN MONTO CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA 4 Y 5 RESPECTIVAMENTE	Dunn Rodríguez, Martin Eduardo	01/11/2016 - 12:36 PM
SEPTIEMBRE 2016: EL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO ES SUSPENDIDO, SE ESPERA LA APROBACION DEL SENPLADES, SE TIENE PLANILLA PENDIENTE DE PAGO LA N° 4 Y 5 RESPECTIVAMENTE	Dunn Rodríguez, Martin Eduardo	05/10/2016 - 10:39 AM
Agosto 2016: El proyecto continua en suspensión temporal.. Este proyecto a la fecha no cuenta con el dictamen de inclusión en el PAI 2016 que permita cancelar las planillas pendiente de pagos la numero 4 y 5, levantar la suspensión y continuar con la obra.	Dunn Rodríguez, Martin Eduardo	04/09/2016 - 09:37 AM
JULIO 2016:A la fecha el proyecto se encuentra suspendido desde el 12 de noviembre del 2015, el mismo no consta en el PAI 2016, este proyecto a la fecha no cuenta con el dictamen de inclusión en el PAI 2016 que permita cancelar las planillas pendientes (N° 4 y 5) , levantar la suspensión y continuar con el avance de la obra. El Ministerio Coordinador de Productividad, Empleo y Competitividad - MCPEC, mediante oficio N° MCPEC- DESP- 32016- 1313-O, emitido el 12 de julio del 2016, dirigido a la Subsecretaria de Inversión en SENPLADES informó que otorga AVAL para la inclusion con valor "cero" del presente compromiso con la finalidad de realizar el pago de valores pendientes descritos y justificados en los informes, los que deberán ser cubiertos en el presente periodo fiscal, sin embargo hasta la fecha el proyecto en referencia no consta en el PAI 2016.	Dunn Rodríguez, Martin Eduardo	05/08/2016 - 03:44 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2016: el proyecto tiene suspension temporal FEBRERO 2016: el proyecto tiene suspension temporal MARZO 2016: el proyecto tiene suspension temporal ABRIL 2016: el proyecto tiene suspension temporal MAYO 2016: el proyecto tiene suspension temporal JUNIO 2016: El proyecto tiene suspension temporal	Dunn Rodríguez, Martin Eduardo	03/08/2016 - 03:44 PM
JULIO 2015: EL CONTRATISTA CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES ,RELLENOS, PILOTES PREBARRENADOS EN SITIO. AGOSTO 2015; EL CONTRATISTA CONTINUA CON EL HORMIGONADO DE LOS PILOTES , SEPTIEMBRE 2015: AL MOMENTO EL CONTRATISTA HA PRESENTADO PLANILLAS (1,2 Y 3) ,PAGADAS POR EL MTOP , PERO NO TRANSFERIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS AL CONTRATISTA, EN EL PERIODO DEL 23 DE AGOSTO AL 11 DE OCTUBRE SE PRESENTA UNA SUSPENSION TEMPORAL DE LABORES. OCTUBRE 2015: SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PUENTE ,RUBROS DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS, ASI COMO LOS ITEMS DE IMPACTOS AMBIENTALES . NOVIEMBRE 2015: SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PUENTE DICIEMBRE 2015: DEBIDO A SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, SE PRESENTA UNA SUSPENSION TEMPORAL	Dunn Rodríguez, Martin Eduardo	26/05/2016 - 11:06 AM
JUNIO 2015:EL CONTRATISTA DE LA OBRA EJECUTA RUBROS RELACIONADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL PUENTE, ADEMAS DE LA TERRACERIA, DRENAJES E IMPACTOS AMVIENTALES.	Anchundia García, Gonzalo Evaristo	09/07/2015 - 08:36 AM
MAYO 2015:LA EJECUCION DEL PROYECTO AVANZA DE ACUERDO A SU PROGRAMACION, SE EJECUTAN OBRAS DE TERRACERIA Y TRANSPORTE, DRENAJES Y ALCANTARILLAS E IMPACTOS AMBIENTALES	Anchundia García, Gonzalo Evaristo	09/07/2015 - 08:26 AM
mayo 2015: se procede a replantear el area del proyecto,se realizar la excavacion de acuerdo a lo programado	Dunn Rodríguez, Martin Eduardo	03/06/2015 - 12:08 PM
abril 2015: el 22 de abril se entrego el anticipo	Dunn Rodríguez, Martin Eduardo	03/06/2015 - 12:07 PM
Marzo 2015: En trámite de pago de anticipo	Pinoargote Rovello, Vianna Andrea	07/04/2015 - 02:31 PM
Febrero 2015: Proceso de licitación	Pinoargote Rovello, Vianna Andrea	02/03/2015 - 02:06 PM
Enero 2015: Proceso de licitación	Pinoargote Rovello, Vianna Andrea	02/03/2015 - 02:06 PM
Diciembre 2014: Se realizó proceso de licitación, recepción y revisión de ofertas. Noviembre 2014: Se encuentra con dictámen de prioridad, se elaboraron los pliegos para iniciar proceso de contratación.	Pinoargote Rovello, Vianna Andrea	15/01/2015 - 02:02 PM
Octubre 2014: Se realizo el requerimiento en el Sistema SIPeIP.	Dunn Rodríguez, Martin Eduardo	07/11/2014 - 06:48 AM
Junio 2014: Se realizo el requerimiento en el Sistema SIPeIP.	Salazar Castañeda, Perbys	05/07/2014 - 10:22 PM
Marzo 2014: El proyecto se encuentra en el Plan Anual Comprometido.	GOMEZ MEDINA, JOHN GODOFREDO	07/04/2014 - 10:00 AM
Febrero 2014: El proyecto se encuentra en el Plan Anual Comprometido.	GOMEZ MEDINA, JOHN GODOFREDO	07/04/2014 - 10:00 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Recursos. probable demora en los recursos económicos , CAUSARIA EL RETRASO EN EL AVANCE DE OBRA	25/03/2019	Gonzalo Evaristo Anchundia García	10 %	10	1	1/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACION: Dictamen De Prioridad De Senplades emitido	1-Solicitud de Información	16/05/2014		16/05/2014		Sí	4.5
2	PLANEACION: Publicación de pliegos en el portal realizado	2-Publicación de Pliegos	03/12/2014		03/12/2014		Sí	4.5
3	PLANEACION: Adjudicacion realizada	3-Adjudicación	29/12/2014		29/12/2014		Sí	1.0
4	EJECUCION: Movimiento de Tierra 50% realizado	5-Entregables Intermedios	22/06/2015		22/06/2015		Sí	9.9
5	EJECUCION: Movimiento de Tierra 100% realizado	5-Entregables Intermedios	22/08/2015		22/08/2015		Sí	9.9
6	EJECUCIÓN: transporte	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		30/05/2017		Sí	7.26
7	EJECUCION: Drenajes y alcantarillas realizado	5-Entregables Intermedios	22/02/2017		22/02/2018		Sí	3.83
8	EJECUCION: Puente infraestructura 50% realizado	5-Entregables Intermedios	22/02/2018		22/02/2018		Sí	18.64
9	EJECUCION: Reubicacion de posteria eléctrica existente	5-Entregables Intermedios	30/03/2018		30/03/2018		Sí	5.29
10	EJECUCION: Puente infraestructura 100% realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2018	30/04/2018			No	8.12
11	EJECUCION: Puente super-estructura 100% realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2018	31/05/2018			No	4.86
12	EJECUCION: Puente super-estructura 50% realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2018	31/05/2018			No	4.86
13	CIERRE: Acta de recepcion provisional firmada	9-Entregables Formales	30/06/2018	30/06/2018			No	1.0
14	EJECUCION: IMPACTO AMBIENTAL ejecutado	5-Entregables Intermedios	30/06/2018	30/06/2018			No	1.66
15	EJECUCION: señalizacion	5-Entregables Intermedios	30/06/2018	30/06/2018			No	3.4
16	EJECUCION: Sistema de iluminacion	5-Entregables Intermedios	30/06/2018	30/06/2018			No	1.28
17	CIERRE: Acta de recepcion definitiva firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2018	31/12/2018			No	10.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión del Proyecto K011 MTOP Construcción del Intercambiador	Sabando Elizalde, David Israel	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	30/11/2017
2	Supervisión del Proyecto K914 SECOB - MINEDUC - Construcción de la Unidad Educativa Estandarizada del Milenio Tipología Mayor EUGENIO ESPEJO	Sabando Elizalde, David Israel	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	31/10/2017
3	Proyecto Proyecto K011 MTOP-Construcción del intercambiador de tráfico en la vía San Vicente-San Pablo para la interconexión del corredor E40 y E15	Sabando Elizalde, David Israel	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	29/09/2017
4	Supervisión del PROYECTO: K011 MTOP-Construcción del intercambiador de tráfico en la vía San Vicente-San Pablo para la interconexión del corredor E40	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	30/08/2017
5	Proyecto K011 MTOP - Proyecto Construcción del intercambiador de tráfico en la vía San Vicente-San Pablo para la interconexión del corredor E40 y E15	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	31/05/2017
6	Supervisión Proyecto K011 MTOP - Construcción del intercambiador de tráfico en la vía San Vicente-San Pablo	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	27/03/2017
7	Obra detenida Junio 2016	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	30/06/2016
8	Avances a Abril 2016 - Obra detenida	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	29/04/2016
9	Avances a Dic 2016, obra detenida aún	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	01/02/2016
10	Econ. Erick López Zeballos	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	17/12/2015
11	La planilla N.- 5 presentar, se ha realizado el movimiento de tierras, expropiaciones, pagando a los terrenos, reubicación de postes(CNEL). Presupuest	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	30/11/2015
12	tENDIDO ELÉCTRICO, DESEMBOLSO AL CONTRATISTA	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	28/10/2015
13	Pilotes en construcción, avance de obra pago de planillas atrasadas	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	28/08/2015
14	GESTIONAR LA FIRMA EL JUEVES 26 DE MARZO DE 2015 DEL ANTICIPO AL CONTRATISTA PARA EMPEZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR	Palacios Alejandro, César Gustavo	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	25/03/2015
15	PRIORIDAD SENPLADES PROCESO CONTRATACION PARA CONSTRUIR INTERCAMBIADOR Y PUENTE MAS SEÑALETICA	Palacios Alejandro, César Gustavo	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	28/02/2015
16	desembolso del anticipo para la ejecucion del proyecto	Palacios Alejandro, César Gustavo	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	30/04/2015
17	ejecucion del presupuesto y cronograma, movimiento de tierra , pilotes	Gómez Villao, Pedro Rubén	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	29/06/2015
18	Cronograma cumplirlo para no exista atrasos por el anticipo atrasado	Gómez Villao, Pedro Rubén	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	27/05/2015

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de informes generados de obra realizada	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/01/2017	-

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,195,653.40 **
Costo Total:	3,155,313.41
Total Devengado:	4,031,670.27
% Costo Total Devengado:	127.77 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 127.77 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	8,239,268.46	0.00	0.00	8,239,268.46
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	9,366,690.88	0.00	0.00	9,366,690.88
Ppto. Codificado	8,835,610.74	896,055.61	0.00	9,731,666.35
Ppto. Comprometido	4,966,614.35	836,016.87	0.00	5,802,631.22
Planeado - Codificado (2019)		-896,055.61		
Programado a Devengar	6,166,084.97	0.00	0.00	6,166,084.97
Ppto. Devengado	3,195,653.40	836,016.87	0.00	4,031,670.27
Pagado Real	2,950,810.84	836,016.87	0.00	3,786,827.71
Estimado a fin de año	* 3,195,653.40	0.00	0.00	3,195,653.40
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	2,970,431.57	0.00	0.00	2,970,431.57
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 51.83 %	-	0.00 %	65.38 %
Ppto. Codificado 998	659,862.04	396,055.61	0.00	1,055,917.65
Ppto. Devengado 998	307,637.51	396,055.61	0.00	703,693.12

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

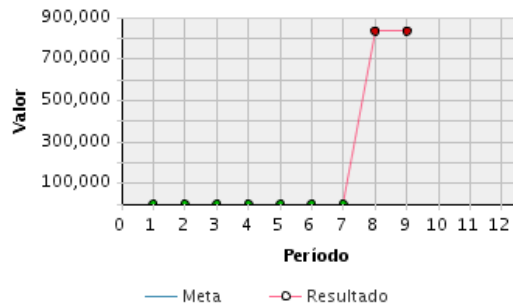

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	100.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Ago	0.00	836,016.87	0.00	836,016.87	115.00 %		115.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	836,016.87	115.00 %		115.00 %
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00	836,016.87					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
12	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
13	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
14	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
15	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		solicitud_de_reunion_de_comision_451.pdf	09/02/2017
2		MEMO_DE_REINICIO_DE_OBRA_ENERO_2017.pdf	09/02/2017
3	A1._DICTAMEN DE PRIORIDAD	A1._DICTAMEN_DE_PRIORIDAD.pdf	20/12/2014
4	ACTA DE REANUDACION N°5 INTERCAMBIADOR DE TRAFICO DE SAN PABLO	ACTA_DE_REANUDACION_N°5_INTERCAMBIADOR_DE_TRAFICO_DE_SAN_PABLO.pdf	03/09/2018
5	ACTA DE SUSPENSION N°5 INTERCAMBIADOR DE TRAFICO DE SAN PABLO	acta_de_suspension_n°5_intercambiador.pdf	01/06/2018
6	ACTA DE SUSPENSIÓN INTERCAMBIADOR SAN PABLO	ACTA_DE_SUSPENSION_N°6__INTERCAMBIADOR.pdf	02/11/2018
7	acta de suspensión n°3	ACTA_DE_SUSPENSIÓN_3.docx	04/05/2017
8	ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL MAYO 2017	ACTA_DE_SUSPENSION_N°3_INTERCAMBIADOR.pdf	03/06/2017
9	Acta de suspensión temporal N° 3	Acta_de_suspension_14-11-2017.pdf	14/11/2017
10	APROBACION PLANILLA 7 INTERCAMBIADOR SAN PABLO	APROBACION_PLANILLA_7_INTERCAMBIADOR_SAN_PABLO.pdf	03/04/2017
11	APROBACION PLANILLA DE AVANCE N°9 CO Y N°1 CC	APROBACION_PLANILLA_N°9_DE_CO_Y_N°1_CC_INTERCAMBIADOR.pdf	04/05/2018
12	CONTRATO COMPLEMENTARIO INTERCAMBIADOR DE TRAFICO SAN PABLO	CONTRATO_COMPLEMENTARIO__INTERCAMBIADOR.docx	05/01/2018
13	CONTRATO DE FISCALIZACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE TRAFICO DE SAN PABLO	CONTRATO_DE_FISCALIZACION_CONSULNAC_INTERCAMBIADOR_DE_TRAFICO_DE_SAN_PABLO.pdf	05/01/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
14	EJECUCION PRESUPUESTARIA MARZO 2015	EJECUCION_PRESUPUESTARIA-MARZO.pdf	06/04/2015
15	informe ejecutivo mes de septiembre año 2015	informe_ejecutivo_mes_de_septiembre_intercambiador_san_pablo_2015.pdf	06/09/2015
16	INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE TRAFICO DE SAN PABLO OCTUBRE DEL 2017	informe_fiscalizacion_octubre_año_2017.pdf	01/11/2017
17	INFORME DE FISCALIZACIÓN INTERCAMBIADOR DE TRAFICO DE SAN PABLO JUNIO 2019	ESCANEADO_INTERCAMBIADOR_DE_TRAFI	03/03/2019
18	INFORME DE INTERCAMBIADOR DE TRAFICO DE SAN PABLO MES JULIO 2019	INFORME_DE_INTERCAMBIADOR_DE_TRAFI	04/08/2019
19	INFORME DE INTERCAMBIADOR DE TRAFICO DE SAN PABLO JULIO 2016	INTERCAMBIADOR_DE_TRAFI	14/08/2016
20	INFORME DE INTERCAMBIADOR MES DE MAYO DEL 2019	ESCANEADO_DE_INFORME_SEGUIMIENTO_DE_OBRA_30_05_2019_DEL_2019.pdf	30/05/2019
21	INFORME DE LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR DE TRAFICO DE SAN PABLO JULIO-2018	INFORME_CONSTRUCCION_DEL_INTERCAMBIADOR_DE_TRAFI	03/08/2018
22	INFORME DE SUPERVISION ,SEPTIEMBRE 2018 INTERCAMBIADOR DE TRAFICO DE SAN PABLO	SEPTIEMBRE_2018_INTERCAMBIADOR_DE_TRAFI	02/09/2018
23	INFORME DEL MES DE MARZO DEL INTERCAMBIADOR DE TRAFICO DE SAN PABLO	ESCANEADO_DE_INFORME_31_DE_MARZO_DEL_2019_INTERCAMBIADOR.pdf	13/03/2019
24	INFORME EJECUTIVO CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR DE TRAFICO, MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016	INFORME_EJECUTIVO_DE_INTERCAMBIADOR_DE_TRAFI	07/12/2016
25	INFORME EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR DE TRAFICO DE SAN PABLO ,OCTUBRE 2016	INFORME_EJECUTIVO_CONSTRUCCION_DEL_INTERCAMBIADOR_DE_TRAFI	01/10/2016
26	INFORME EJECUTIVO INTERCAMBIADOR DE TRAFICO DE SAN PABLO AGOSTO DEL 2016	INFORME_EJECUTIVO_INTERCAMBIADOR_DE_TRAFI	08/08/2016
27	INFORME EJECUTIVO INTERCAMBIADOR DE TRAFICO DE SAN PABLO SEPTIEMBRE 2016	INFORME_EJECUTIVO_INTERCAMBIADOR_DE_TRAFI	05/09/2016
28	INFORME INTERCAMBIADOR DE TRAFICO SAN PABLO MES ABRIL 2019	INFORME_29_de_abril_2019_intercambiador.pdf	02/05/2019
29	INFORME JUNIO AÑO 2015	JUNIO_2015_INFORME_EJECUTIVO_INTERCAMBIADOR_DE_TRAFI	06/07/2015
30	INFORME JUNIO DEL 2018 DE INTERCAMBIADOR DE TRAFICO DE SAN PABLO	INFORME_PERIODO_ENERO-JUNIO_2018_INTERCAMBIADOR_DE_TRAFI	04/07/2018
31	INFORME MAYO AÑO 2015	MAYO_2015_INFORME_EJECUTIVO_INTERCAMBIADOR_DE_TRAFI	05/07/2015
32	INTERCAMBIADOR INFORME AGOSTO AÑO 2017	INTERCAMBIADOR_INFORME_AGOSTO_AÑO_2017.pdf	05/09/2017
33	MEMO DE DIRECTOR DISTRITAL DEL MTOP DE SANTA ELENA A SENPLADES	MEMO_DE_SANTA_ELENA_A_SENPLADES_ING_DUNN.pdf	04/07/2017
34	MEMO DE FISCALIZACION INTERCAMBIADOR AÑO 2016	MEMO_DE_FISCALIZACION_INTERCAMBIADOR.pdf	05/01/2017
35	memorando recibido N° MTOP-CGP-2017-948-ME, suscrito por la Arq. Monica Quezada, Coordinadora General de Planificación ,MTOP	MEMO_DE_ARQ_MONICA_QUEZADA_JARA__MTOP.pdf	03/08/2017
36	ORDEN DE CAMBIO INTERCAMBIADOR DE TRAFICO DE SAN PABLO	ORDEN_DE_CAMBIO_001_INTERCAMBIADOR.pdf	05/01/2018
37	ORDEN DE CAMBIO POR MONTOS DEL INTERCAMBIADOR	ORDEN_DE_CAMBIO_N°1_POR_MONTOS_INTERCAMBIADOR.pdf	19/02/2018
38	RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL INTERCAMBIADOR DE TRAFICO DE SAN PABLO	RESOLUCION_DE_TERMINACION_UNILATERAL_CONTRATO_1572018_ING_LEONARDO_V	04/11/2018
39	RESOLUCIÓN N° 41, ADJUDICACIÓN DEL PROCESO CDTU- MTOPSE- 01- 18 AL CONSORCIO INTERCAMBIADOR SAN PABLO-2018	resolucion_de_adjudicacion_PROCESO_CDTU-MTOPSE-01-18_CONSORCIO_INTERCAMBIADOR_SAN_PABLO_2018.pdf	04/01/2019
40	SEPTIEMBRE 2017, INFORME DE FISCALIZACION DEL INTERCAMBIADOR	INFORME_FISCALIZACION_INTERCAMBIADOR_MES_DE_SEPTIEMBRE_DEL_2017.pdf	05/07/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
41	SOLICITUD DE INCLUSION EN PAI 2019	MTOP-DDSE-2019-425-ME_solicitud_de_inclusion_PAI_2019.pdf	25/03/2019
42	SOLICITUD DE REFONDEO DE RECURSOS , PARA EL INTERCAMBIADOR DE TRAFICO DE SAN PABLO	SOLICITUD_DE_REFONDEO_PARA_PROYECTO_INTERCAMBIADOR_SAN_PABLO.pdf	05/02/2019

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Anchundia García, Gonzalo Evaristo	Líder de Proyecto	Analista de Infraestructura 2	ganchundia@mtop.gob.ec	(04) 3 728-916
Bastidas Izurieta, Álvaro Sebastián	Subsecretario Regional 5	Subsecretario Zonal 5	asbastidas@mtop.gob.ec	042068542
Matamoros Arias, Julio Cesar	Director Provincial de Santa Elena.	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Santa Elena	jmatamoros@mtop.gob.ec	(04) 3 728-916
Orrala Zambrano, Irma Verónica	Enlace Financiero (Cédulas Presupuestarias)	Asistente Financiera Presupuesto	iorrala@mtop.gob.ec	Ext. 52015

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
74531_1.jpg	15/08/2016
