

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 1**  
**Dirección Provincial Esmeraldas**

**PROYECTO: K081** MTOP - Nuevo terminal de pasajeros, torre de control bloque técnico hangar SCI, planta de combustible, obras exteriores

Líder del Proyecto:	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto (galdas@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Cruz Chicaiza, Carlos René Alejandro	Programas Relacionados:	NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS TORRE DE CONTROL BLOQUE TECNICO HANGAR SCI PLANTA DE COMBUSTIBLES OBRAS EXTERIORE, Provincia - Esmeraldas, Proyectos Prioritarios PAI, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Valencia Lara, Gustavo Stalin	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	1.18
CUP:	175200000.219.7202	TIR:	22.46 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	10,262,736.09
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	23,559,668.70
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/12/2011 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	10/09/2019	Fecha de Fin Base:	01/12/2013
Modificado por:	Valencia Lara, Gustavo Stalin	Fecha del siguiente Hito:	31/07/2019


**DATOS GENERALES**

<b>Descripción</b>
Nuevo Terminal de Pasajeros, Torre de Control, Bloque Técnico, Hangar SCI, Planta de Combustibles, Obras Exteriores, Ampliación de la Pista, Taxi Way y Plataforma del Aeropuerto "Gral. Rivadeneira" de Tachina - Esmeraldas
Objetivo: Realizar una Rehabilitación operativa - funcional, para lo cual se deberá proveer de infraestructura, equipamiento y recurso humano, que permita tener un funcionamiento eficiente
Linea Base: El actual terminal de pasajeros tiene una superficie de 1.680,00 m2. y dispone únicamente de instalaciones básicas para atender un vuelo de una aeronave de máximo 100 pax.; no cuenta tampoco con el equipamiento requerido que exigen las normas de seguridad aeroportuaria. La torre de control actual no tiene suficiente visibilidad a los 2 umbrales de pista, carece de bloque técnico y el hangar del servicio contra incendios dispone de una superficie de 361m2 y penetra la franja de seguridad. Requiere además incrementar la longitud de la pista, ampliar el taxi way y la dimensión de la plataforma de aeronaves.
Producto: Torre de Control, Bloque Técnico, Hangar S.C.I, Planta de Combustibles, Exteriores, Parqueaderos, Ampliación de pista y taxi Way, plataforma de hormigón rígido y vías de acceso.
Contratista: Consorcio Aereoportuario Tachina Fiscalizador : Asociación Conyfis- Movial
ORDEN DE CAMBIO 2: 3.077.242,00
<b>Beneficios Cualitativos</b>
Toda la Provincia de Esmeraldas
<b>Tipo de Beneficiario</b>
Cantón Esmeraldas, Tachina, Camarones, Rio verde
<b>Restricciones</b>
Tiempo: Contratista debe cumplir con los plazos requeridos

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución **Cierre** Completado Congelado Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 96.92 %  
 Fecha de Inicio: 01/12/2011 Fecha de Fin: 31/12/2019

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

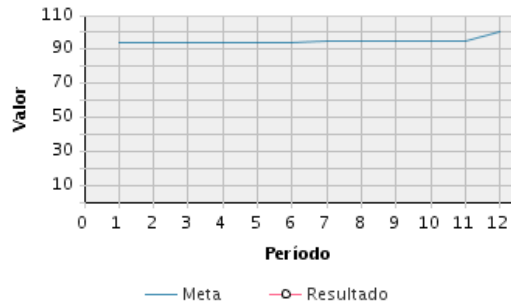

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>AGOSTO 2019:</b></p> <p>Mediante memorando Nro. MTOP-FINAN_ESM-2019-71-M el 20 de marzo del 2019 se entrega las planillas de liquidación y reajuste definitivo del proyecto al Especialista Técnico de Infraestructura Provincial con la finalidad de que realice el informe justificativo en base al criterio jurídico para legalizar el acto administrativo para proceder con el pago.</p> <p>Se asignó el valor de \$ 131.239.87 el 14 de marzo del 2019 de acuerdo al POA 2019 aprobado inicialmente, el mismo fue informado mediante memorando Nro. MTOP-FINAN_ESM-2019-64-ME, se prevee realizar el pago en el año 2020, en espera de la documentación.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/09/2019 - 04:05 PM
<p><b>JULIO 2019:</b></p> <p>Mediante memorando Nro. MTOP-FINAN_ESM-2019-71-M el 20 de marzo del 2019 se entrega las planillas de liquidación y reajuste definitivo del proyecto al Especialista Técnico de Infraestructura Provincial con la finalidad de que realice el informe justificativo en base al criterio jurídico para legalizar el acto administrativo para proceder con el pago.</p> <p>Se asignó el valor de \$ 131.239.87 el 14 de marzo del 2019 de acuerdo al POA 2019 aprobado inicialmente, el mismo fue informado mediante memorando Nro. MTOP-FINAN_ESM-2019-64-ME, se prevee realizar el pago en el año 2020, en espera de la documentación.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	02/08/2019 - 05:06 PM
<p><b>JUNIO 2019:</b></p> <p>Mediante memorando Nro. MTOP-FINAN_ESM-2019-71-M el 20 de marzo del 2019 se entrega las planillas de liquidación y reajuste definitivo del proyecto al Especialista Técnico de Infraestructura Provincial con la finalidad de que realice el informe justificativo en base al criterio jurídico para legalizar el acto administrativo para proceder con el pago.</p> <p>Se asignó el valor de \$ 131.239.87 el 14 de marzo del 2019 de acuerdo al POA 2019 aprobado inicialmente, el mismo fue informado mediante memorando Nro. MTOP-FINAN_ESM-2019-64-ME.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	04/07/2019 - 02:36 PM
<p><b>MAYO 2019:</b></p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/06/2019 - 09:23 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Mediante memorando Nro. MTOP-FINAN_ESM-2019-71-M el 20 de marzo del 2019 se entrega las planillas de liquidación y reajuste definitivo del proyecto al Especialista Técnico de Infraestructura Provincial con la finalidad de que realice el informe justificativo en base al criterio jurídico para legalizar el acto administrativo para proceder con el pago.</p> <p>Se asignó el valor de \$ 131.239.87 el 14 de marzo del 2019 de acuerdo al POA 2019 aprobado inicialmente, el mismo fue informado mediante memorando Nro. MTOP-FINAN_ESM-2019-64-ME.</p>		
<p>ABRIL 2019:</p> <p>Mediante memorando Nro. MTOP-FINAN_ESM-2019-71-M el 20 de marzo del 2019 se entrega las planillas de liquidación y reajuste definitivo del proyecto al Especialista Técnico de Infraestructura Provincial con la finalidad de que realice el informe justificativo en base al criterio jurídico para legalizar el acto administrativo para proceder con el pago.</p> <p>Se asignó el valor de \$ 131.239.87 el 14 de marzo del 2019 de acuerdo al POA 2019 aprobado inicialmente, el mismo fue informado mediante memorando Nro. MTOP-FINAN_ESM-2019-64-ME.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	02/05/2019 - 10:15 AM
<p>MARZO 2019:</p> <p>Se asignó el valor de \$ 131.239.87 el 14 de marzo del 2019 de acuerdo al POA 2019 aprobado inicialmente, el mismo fue informado mediante memorando Nro. MTOP-FINAN_ESM-2019-64-ME.</p> <p>Mediante memorando Nro. MTOP-FINAN_ESM-2019-71-M el 20 de marzo del 2019 se entrega las planillas de liquidación y reajuste definitivo del proyecto al Especialista Técnico de Infraestructura Provincial con la finalidad de que realice el informe justificativo en base al criterio jurídico para legalizar el acto administrativo para proceder con el pago.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	03/04/2019 - 03:43 PM
<p>FEBRERO 2019:</p> <p>En proceso elaboración de la documentación para el pagao de planilla de liquidación y costo más porcentaje, cabe indicar que el monto asignado no cubre la deuda total que es por un valor de \$ 188.677,98 dólares, esperamos Ministerio de Finanzas asigne más recursos.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	01/03/2019 - 05:10 PM
<p>ENERO 2019:</p> <p>En proceso elaboración de convenio de pagao de planilla de liquidación y costo más porcentaje, cabe indicar que el monto asignado no cubre la deuda total que es por un valor de \$ 188.677,98 dólares.</p>	Ortiz Campos, Lenin Herminio	05/02/2019 - 04:11 PM
<p>Enero 2014:</p> <p>- Está en proceso la realización del acta de recepción provisional</p>	Ortiz Campos, Lenin Herminio	28/09/2018 - 09:18 AM
<p>Diciembre 2013:</p> <p>- Está en proceso la realización del acta de recepción provisional.</p>	Ortiz Campos, Lenin Herminio	28/09/2018 - 09:18 AM
<p>Noviembre 2013:</p> <p>-La dirección provincial de Esmeraldas por medio de la directora esta solicitado a la matriz en Quito la comisión para realizar el acta de recepción provisional.</p> <p>-los primeros días del mes de Diciembre se realizarán las pruebas de tanques y recepción de combustibles.</p> <p>-el hito número 13 que se debió cumplir el 1/12/2013 está retrasado por que se está tramitando el acta de recepción provisional que se entregara a finales del mes de Diciembre; y la definitiva se suscribirá a mediados del mes de Junio de 2014</p>	Ortiz Campos, Lenin Herminio	28/09/2018 - 09:18 AM
<p>Octubre 2013:</p> <p>Una vez terminada la obra se está realizando pruebas para la recepción provisional y liquidación económica.</p>	Ortiz Campos, Lenin Herminio	28/09/2018 - 09:18 AM
<p>Septiembre 2013:</p> <p>Se está corrigiendo fallas existentes y haciendo pruebas hidráulicas, eléctricas y electrónicas para la resección provisional.</p>	Ortiz Campos, Lenin Herminio	28/09/2018 - 09:18 AM
<p>Agosto 2013:</p> <p>-Se continua con el alumbrado público</p> <p>- Se continua con correccion de fallas observadas</p> <p>- Se continua con las adecuaciones internas.</p> <p>- Se continua con las instalación de aires acondicionados</p>	Ortiz Campos, Lenin Herminio	28/09/2018 - 09:18 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2017:</p> <p>Proyecto se encuentra terminado, debido a las observaciones realizadas por la comisión para suscribir el Acta de Recepción Definitiva, el contratista debe atender las correcciones solicitadas. Hasta la presente fecha el contratista atiendo parcialmente lo solicitado sin haber entregado al MTOP, la fiscalización y supervisión del MTOP realizaron una inspección al sistema contra incendios del Aeropuerto, el cual está sin operación por cuanto la contratista se ha llevado los equipos para dar el respectivo mantenimiento se ha solicitado la inmediata reposición de los equipos y que deje el sistema operativo.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/01/2018 - 04:48 PM
<p>NOVIEMBRE 2017:</p> <p>Proyecto se encuentra terminado, debido a las observaciones realizadas por la comisión para suscribir el Acta de Recepción Definitiva, el contratista debe atender las correcciones solicitadas. Hasta la presente fecha el contratista atiendo parcialmente lo solicitado sin haber entregado al MTOP, la fiscalización y supervisión del MTOP realizaron una inspección al sistema contra incendios del Aeropuerto, el cual está sin operación por cuanto la contratista se ha llevado los equipos para dar el respectivo mantenimiento se ha solicitado la inmediata reposición de los equipos y que deje el sistema operativo, prevista a fines de diciembre.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/12/2017 - 03:29 PM
<p>OCTUBRE 2017:</p> <p>Proyecto se encuentra terminado, debido a las observaciones realizadas por la comisión para suscribir el Acta de Recepción Definitiva, el contratista debe atender las correcciones solicitadas. Hasta la presente fecha el contratista atiendo parcialmente lo solicitado sin haber entregado al MTOP siendo necesario realizar el Acta de terminación unilateral, la misma que esta en proceso administrativo, prevista a fines de noviembre.</p>	Vivero Cedeño, Cesar Heraclito	01/11/2017 - 03:22 PM
<p>SEPTIEMBRE 2017:</p> <p>Proyecto se encuentra terminado, debido a las observaciones realizadas por la comisión para suscribir el Acta de Recepción Definitiva, el contratista debe atender las correcciones solicitadas. Hasta la presente fecha el contratista atiendo parcialmente lo solicitado sin haber entregado al MTOP siendo necesario realizar el Acta de terminación unilateral, la misma que esta en proceso administrativo, prevista a fines de octubre.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/10/2017 - 05:11 PM
<p>AOGOSTO 2017:</p> <p>Proyecto se encuentra terminado, debido a las observaciones realizadas por la comisión para suscribir el Acta de Recepción Definitiva, el contratista debe atender las correcciones solicitadas. Hasta la presente fecha el contratista atiendo parcialmente lo solicitado sin haber entregado al MTOP siendo necesario realizar el Acta de terminación unilateral, la misma que esta en proceso administrativo.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/09/2017 - 03:59 PM
<p>JULIO 2017:</p> <p>Proyecto se encuentra terminado, debido a las observaciones realizadas por la comisión para suscribir el Acta de Recepción Definitiva, el contratista debe atender las correcciones solicitadas. Hasta la presente fecha el contratista atiendo parcialmente lo solicitado sin haber entregado al MTOP siendo necesario realizar el Acta de terminación unilateral.</p>	Serrano Cedeño, Alex Ricardo	03/08/2017 - 05:37 PM
<p>JUNIO 2017:</p> <p>Proyecto se encuentra terminado, debido a las observaciones realizadas por la comisión para suscribir el Acta de Recepción Definitiva, el contratista debe atender las correcciones solicitadas. Hasta la presente fecha el contratista atiendo parcialmente lo solicitado sin haber entregado al MTOP siendo necesario realizar el Acta de terminación unilateral.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	04/07/2017 - 05:10 PM
<p>MAYO 2017:</p> <p>Proyecto se encuentra terminado, debido a las observaciones realizadas por la comisión para suscribir el Acta de Recepción Definitiva, el contratista debe atender las correcciones solicitadas. Hasta la presente fecha el contratista atiendo parcialmente lo solicitado sin haber entregado al MTOP las repreciones realizadas; se convocará a la empresa para que realicen las correcciones de las observaciones realizadas y firmar Acta Recepción Definitiva para fines de junio 2017; en caso de que la contratista no acate las disposiciones del MTOP se iniciara la terminación unilateral.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	06/06/2017 - 04:03 PM
<p>ABRIL 2017:</p> <p>Proyecto se encuentra terminado, debido a las observaciones realizadas por la comisión para suscribir el Acta de Recepción Definitiva, el contratista debe atender las correcciones solicitadas.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/05/2017 - 07:30 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Hasta la presente fecha el contratista atiende parcialmente lo solicitado sin haber entregado al MTOP las reparaciones realizadas; se convocará a la empresa para que realicen las correcciones de las observaciones realizadas y firmar Acta Recepción Definitiva para fines de mayo 2017; en caso de que la contratista no acate las disposiciones del MTOP se iniciara la terminación unilateral.		
<b>MARZO 2017:</b>  Proyecto se encuentra terminado, debido a las observaciones realizadas por la comisión para suscribir el Acta de Recepción Definitiva, el contratista debe atender las correcciones solicitadas. Hasta la presente fecha el contratista atiende parcialmente lo solicitado, se convocará a la empresa para que realicen las correcciones de las observaciones realizadas y firmar Acta Recepción Definitiva para fines de mayo 2017.	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/04/2017 - 04:44 PM
<b>FEBRERO 2017:</b>  Proyecto se encuentra terminado, debido a las observaciones realizadas por la comisión para suscribir el Acta de Recepción Definitiva, el contratista debe atender las correcciones solicitadas. Hasta la presente fecha el contratista atiende lo solicitado, faltando colocar la bomba del sistema contra incendio, se ha notificado legalmente la decisión del MTOP de dar por terminado el contrato anticipada y unilateralmente, por incumplimiento del contratista, se continúa con el trámite de terminación unilateral, suscribió acta de terminación única a la fiscalización de la obra el 23/08/2016. Se prevé firma de acta de terminación para fines de marzo de 2017	Rodas Mejía, Vicente Fernando	03/03/2017 - 05:18 PM
<b>ENERO 2017:</b>  Proyecto se encuentra terminado, debido a las observaciones realizadas por la comisión para suscribir el Acta de Recepción Definitiva, el contratista debe atender las correcciones solicitadas. Hasta la presente fecha el contratista atiende lo solicitado, faltando colocar la bomba del sistema contra incendio, se ha notificado legalmente la decisión del MTOP de dar por terminado el contrato anticipada y unilateralmente, por incumplimiento del contratista, se continúa con el trámite de terminación unilateral, suscribió acta de terminación única a la fiscalización de la obra el 23/08/2016. Se prevé firma de acta de terminación para fines de marzo de 2017	Rodas Mejía, Vicente Fernando	03/02/2017 - 05:26 PM
<b>DICIEMBRE 2016:</b>  Proyecto se encuentra terminado, debido a las observaciones realizadas por la comisión para suscribir el Acta de Recepción Definitiva, el contratista debe atender las correcciones solicitadas. Hasta la presente fecha el contratista atiende lo solicitado, faltando colocar la bomba del sistema contra incendio, se ha notificado legalmente la decisión del MTOP de dar por terminado el contrato anticipada y unilateralmente, por incumplimiento del contratista, se continúa con el trámite de terminación unilateral, suscribió acta de terminación única a la fiscalización de la obra el 23/08/2016.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/01/2017 - 09:41 AM
<b>NOVIEMBRE 2016:</b>  Proyecto se encuentra terminado, debido a las observaciones realizadas por la comisión para suscribir el Acta de Recepción Definitiva, el contratista debe atender las correcciones solicitadas. Hasta la presente fecha el contratista atiende lo solicitado, faltando colocar la bomba del sistema contra incendio, se ha notificado legalmente la decisión del MTOP de dar por terminado el contrato anticipada y unilateralmente, por incumplimiento del contratista, se continúa con el trámite de terminación unilateral, suscribió acta de terminación única a la fiscalización de la obra el 23/08/2016.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/12/2016 - 04:11 PM
<b>OCTUBRE 2016:</b>  Proyecto se encuentra terminado, debido a las observaciones realizadas por la comisión para suscribir el Acta de Recepción Definitiva, el contratista debe atender las correcciones solicitadas. Hasta la presente fecha el contratista atiende lo solicitado, faltando colocar la bomba del sistema contra incendio, se ha notificado legalmente la decisión del MTOP de dar por terminado el contrato anticipada y unilateralmente, por incumplimiento del contratista, se continúa con el trámite de terminación unilateral.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	01/11/2016 - 05:51 PM
<b>SEPTIEMBRE 2016:</b>  Proyecto se encuentra terminado, debido a las observaciones realizadas por la comisión para suscribir el Acta de Recepción Definitiva, el contratista debe atender las correcciones solicitadas. Hasta la presente fecha el contratista atiende lo solicitado, faltando colocar la bomba del sistema contra incendio, se ha notificado legalmente la decisión del MTOP de dar por terminado el contrato anticipada y unilateralmente, por incumplimiento del contratista.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/10/2016 - 05:19 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2016:</p> <p>Proyecto se encuentra terminado, debido a las observaciones realizadas por la comisión para suscribir el Acta de Recepción Definitiva, el contratista debe atender las correcciones solicitadas. Hasta la presente fecha el contratista no atiende lo solicitado, debido a que la Contratista Consorcio Aeroportuario Tachina no ha atendido los pedidos de la Contratante, se ha notificado legalmente la decisión del MTOP de dar por terminado el contrato anticipada y unilateralmente, mediante Memorando Nro. MTOP-DPE-2015-1454-ME, el Coordinador de Infraestructura vial de Esmeraldas solicita al Sr. Director Provincial que se inicie el proceso de terminación unilateral.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>05/09/2016 - 04:53 PM</p>
<p>JULIO 2016:</p> <p>Proyecto se encuentra terminado, debido a las observaciones realizadas por la comisión para suscribir el Acta de Recepción Definitiva, el contratista debe atender las correcciones solicitadas. Hasta la presente fecha el contratista no atiende lo solicitado, debido a que la Contratista Consorcio Aeroportuario Tachina no ha atendido los pedidos de la Contratante, se ha notificado legalmente la decisión del MTOP de dar por terminado el contrato anticipada y unilateralmente, mediante Memorando Nro. MTOP-DPE-2015-1454-ME, el Coordinador de Infraestructura vial de Esmeraldas solicita al Sr. Director Provincial que se inicie el proceso de terminación unilateral.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>08/08/2016 - 12:02 PM</p>
<p>JUNIO 2016:</p> <p>Proyecto se encuentra terminado, debido a las observaciones realizadas por la comisión para suscribir el Acta de Recepción Definitiva, el contratista debe atender las correcciones solicitadas. Hasta la presente fecha el contratista no atiende lo solicitado, debido a que la Contratista Consorcio Aeroportuario Tachina no ha atendido los pedidos de la Contratante, se ha notificado legalmente la decisión del MTOP de dar por terminado el contrato anticipada y unilateralmente, mediante Memorando Nro. MTOP-DPE-2015-1454-ME, el Coordinador de Infraestructura vial de Esmeraldas solicita al Sr. Director Provincial que se inicie el proceso de terminación unilateral.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>04/07/2016 - 03:45 PM</p>
<p>MAYO 2016:</p> <p>Proyecto se encuentra terminado, debido a las observaciones realizadas por la comisión para suscribir el Acta de Recepción Definitiva, el contratista debe atender las correcciones solicitadas. Hasta la presente fecha el contratista no atiende lo solicitado, debido a que la Contratista Consorcio Aeroportuario Tachina no ha atendido los pedidos de la Contratante, se ha notificado legalmente la decisión del MTOP de dar por terminado el contrato anticipada y unilateralmente, mediante Memorando Nro. MTOP-DPE-2015-1454-ME, el Coordinador de Infraestructura vial de Esmeraldas solicita al Sr. Director Provincial que se inicie el proceso de terminación unilateral.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>08/06/2016 - 04:25 PM</p>
<p>MARZO 2016:</p> <p>Proyecto se encuentra terminado, debido a las observaciones realizadas por la comisión para suscribir el Acta de Recepción Definitiva, el contratista debe atender las correcciones solicitadas. Hasta la presente fecha el contratista no atiende lo solicitado, debido a que la Contratista Consorcio Aeroportuario Tachina no ha atendido los pedidos de la Contratante, se ha notificado legalmente la decisión del MTOP de dar por terminado el contrato anticipada y unilateralmente, mediante Memorando Nro. MTOP-DPE-2015-1454-ME, el Coordinador de Infraestructura vial de Esmeraldas solicita al Sr. Director Provincial que se inicie el proceso de terminación unilateral.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>06/04/2016 - 04:56 PM</p>
<p>FEBRERO 2016:</p> <p>Proyecto se encuentra terminado, debido a las observaciones realizadas por la comisión para suscribir el Acta de Recepción Definitiva, el contratista debe atender las correcciones solicitadas. Hasta la presente fecha el contratista no atiende lo solicitado, debido a que la Contratista Consorcio Aeroportuario Tachina no ha atendido los pedidos de la Contratante, se ha notificado legalmente la decisión del MTOP de dar por terminado el contrato anticipada y unilateralmente, mediante Memorando Nro. MTOP-DPE-2015-1454-ME, el Coordinador de Infraestructura vial de Esmeraldas solicita al Sr. Director Provincial que se inicie el proceso de terminación unilateral.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>06/04/2016 - 04:54 PM</p>
<p>ENERO 2016:</p> <p>Proyecto se encuentra terminado, debido a las observaciones realizadas por la comisión para suscribir el Acta de Recepción Provisional, el contratista debe atender las correcciones solicitadas y una vez suscrita el Acta provisional se procederá, transcurridos 6 meses, con la firma del Acta de Recepción Definitiva. Hasta la presente fecha el contratista no atiende lo solicitado, debido a que la Contratista Consorcio Aeroportuario Tachina no ha atendido los pedidos de la Contratante, se ha notificado legalmente la decisión del MTOP de dar por terminado el contrato anticipada y unilateralmente, mediante Memorando Nro. MTOP-DPE-2015-1454-ME, el Coordinador de Infraestructura vial de Esmeraldas solicita al Sr. Director Provincial que se inicie el proceso de terminación unilateral.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>05/02/2016 - 03:26 PM</p>



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>DICIEMBRE 2015:</b></p> <p>Proyecto se encuentra terminado, debido a las observaciones realizadas por la comisión para suscribir el Acta de Recepción Provisional, el contratista debe atender las correcciones solicitadas y una vez suscrita el Acta provisional se procederá, transcurridos 6 meses, con la firma del Acta de Recepción Definitiva. Hasta la presente fecha el contratista no atiende lo solicitado, debido a que la Contratista Consorcio Aeroportuario Tachina no ha atendido los pedidos de la Contratante, se ha notificado legalmente la decisión del MTOP de dar por terminado el contrato anticipada y unilateralmente, mediante Memorando Nro. MTOP-DPE-2015-1454-ME, el Coordinador de Infraestructura vial de Esmeraldas solicita al Sr. Director Provincial que se inicie el proceso de terminación unilateral.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>05/01/2016 - 02:45 PM</p>
<p><b>NOVIEMBRE 2015</b></p> <p>Proyecto se encuentra terminado, debido a las observaciones realizadas por la comisión para suscribir el Acta de Recepción Provisional, el contratista debe atender las correcciones solicitadas y una vez suscrita el Acta provisional se procederá, transcurridos 6 meses, con la firma del Acta de Recepción Definitiva. Hasta la presente fecha el contratista no atiende lo solicitado, debido a que la Contratista Consorcio Aeroportuario Tachina no ha atendido los pedidos de la Contratante, se ha notificado legalmente la decisión del MTOP de dar por terminado el contrato anticipada y unilateralmente, mediante Memorando Nro. MTOP-DPE-2015-1454-ME, el Coordinador de Infraestructura vial de Esmeraldas solicita al Sr. Director Provincial que se inicie el proceso de terminación unilateral.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>08/12/2015 - 02:59 PM</p>
<p><b>OCTUBRE 2015:</b></p> <p>Proyecto terminado, se realizó la Recepción Provisional, la misma que cuenta con observaciones realizadas por la comisión designada para el efecto. Contratista debe atender las observaciones realizadas y después de 6 meses se procederá al realizar la Recepción Definitiva, por observaciones se prolonga la firma hasta mediados de septiembre 2015, para pagar rubros nuevos se debe realizar un costo +%, por lo que se están realizando los actos administrativos correspondientes.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>06/11/2015 - 03:48 PM</p>
<p><b>SEPTIEMBRE 2015:</b></p> <p>Proyecto terminado, se realizó la Recepción Provisional, la misma que cuenta con observaciones realizadas por la comisión designada para el efecto. Contratista debe atender las observaciones realizadas y después de 6 meses se procederá al realizar la Recepción Definitiva, por observaciones se prolonga la firma hasta mediados de septiembre 2015, para pagar rubros nuevos se debe realizar un costo +%, por lo que se están realizando los actos administrativos correspondientes.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>05/10/2015 - 10:02 AM</p>
<p><b>AGOSTO 2015:</b></p> <p>Proyecto terminado, se realizó la Recepción Provisional, la misma que cuenta con observaciones realizadas por la comisión designada para el efecto. Contratista debe atender las observaciones realizadas y después de 6 meses se procederá al realizar la Recepción Definitiva, por observaciones se prolonga la firma hasta mediados de septiembre 2015, para pagar rubros nuevos se debe realizar un costo +%, por lo que se están realizando los actos administrativos correspondientes.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>04/09/2015 - 12:10 PM</p>
<p><b>JULIO 2015:</b></p> <p>Proyecto terminado, se realizó la Recepción Provisional, la misma que cuenta con observaciones realizadas por la comisión designada para el efecto. Contratista debe atender las observaciones realizadas y después de 6 meses se procederá al realizar la Recepción Definitiva, por observaciones se prolonga la firma hasta mediados de junio 2015, para pagar rubros nuevos se debe realizar un costo +%, por lo que se están realizando los actos administrativos correspondientes.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>31/07/2015 - 11:10 AM</p>
<p><b>JUNIO 2015:</b></p> <p>Proyecto terminado, se realizó la Recepción Provisional, la misma que cuenta con observaciones realizadas por la comisión designada para el efecto. Contratista debe atender las observaciones realizadas y después de 6 meses se procederá al realizar la Recepción Definitiva, por observaciones se prolonga la firma hasta mediados de junio 2015, para pagar rubros nuevos se debe realizar un costo +%, por lo que se están realizando los actos administrativos correspondientes.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>08/07/2015 - 03:04 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>MAYO 2015:</b></p> <p>Proyecto terminado, se realizó la Recepción Provisional, la misma que cuenta con observaciones realizadas por la comisión designada para el efecto. Contratista debe atender las observaciones realizadas y después de 6 meses se procederá al realizar la Recepción Definitiva, por observaciones se prolonga la firma hasta mediados de junio 2015, para pagar rubros nuevos se debe realizar un costo +%, por lo que se están realizando los actos administrativos correspondientes.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	02/06/2015 - 08:37 AM
<p><b>ABRIL 2015:</b></p> <p>Proyecto terminado, se realizó la Recepción Provisional, la misma que cuenta con observaciones realizadas por la comisión designada para el efecto. Contratista debe atender las observaciones realizadas y después de 6 meses se procederá al realizar la Recepción Definitiva, por observaciones se prolonga la firma hasta mediados de mayo 2015.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	11/05/2015 - 10:04 AM
<p><b>MARZO 2015:</b></p> <p>Proyecto terminado, se realizó la Recepción Provisional, la misma que cuenta con observaciones realizadas por la comisión designada para el efecto. Contratista debe atender las observaciones realizadas y después de 6 meses se procederá al realizar la Recepción Definitiva, por observaciones se prolonga la firma hasta fines de abril de 2015.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	07/04/2015 - 02:11 PM
<p><b>FEBRERO 2015:</b></p> <p>Proyecto terminado, se realizó la Recepción Provisional, la misma que cuenta con observaciones realizadas por la comisión designada para el efecto. Contratista debe atender las observaciones realizadas y después de 6 meses se procederá al realizar la Recepción Definitiva, por observaciones se prolonga la firma hasta abril de 2015.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	09/03/2015 - 02:22 PM
<p><b>ENERO 2015:</b></p> <p>Proyecto terminado, se realizó la Recepción Provisional, la misma que cuenta con observaciones realizadas por la comisión designada para el efecto. Contratista debe atender las observaciones realizadas y después de 6 meses se procederá al realizar la Recepción Definitiva, hasta fines de febrero de 2015.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	09/02/2015 - 08:37 AM
<p><b>DICIEMBRE 2014:</b></p> <p>Proyecto terminado, se realizó la Recepción Provisional, la misma que cuenta con observaciones realizadas por la comisión designada para el efecto. Contratista debe atender las observaciones realizadas y después de 6 meses se procederá al realizar la Recepción Definitiva, hasta febrero de 2015.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	06/01/2015 - 10:08 AM
<p><b>NOVIEMBRE 2014:</b></p> <p>Proyecto terminado, se realizó la Recepción Provisional, la misma que cuenta con observaciones realizadas por la comisión designada para el efecto. Contratista debe atender las observaciones realizadas y después de 6 meses se procederá al realizar la Recepción Definitiva.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/12/2014 - 03:40 PM
<p><b>OCTUBRE 2014:</b></p> <p>Proyecto terminado, se realizó la Recepción Provisional, la misma que cuenta con observaciones realizadas por la comisión designada para el efecto. Contratista debe atender las observaciones realizadas.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	10/11/2014 - 09:24 AM
<p><b>SEPTIEMBRE 2014:</b></p> <p>La obra se termino en la fecha establecida en el contrato el 24 de agosto del 2013.</p> <p>Por pedido de la comisión se solicito se conforme una subcomisión especial de apoyo perteneciente a la Dirección General de Aviación Civil del MTOP para que emita un informe técnico de las obras a entregar.</p> <p>La comisión y subcomisión realizaron el recorrido del 28 de julio al 01 de agosto del presente año.</p> <p>El 28 de Agosto del 2014 se subscribe el Acta de recepción provisional, con observaciones, las misma que en la actualidad estan siendo atendidas por el contratista. La subcomisión esta realizando la inspección para confirmar si las observaciones han sido atendidas en su totalidad.</p> <p>Con Memorando N° MTOP-DPE-2014-1519-ME, de fecha 17 de septiembre del 2014, la Directora Provincial de Emeraldas le hace conocer al Señor Ing. Patricio Banegas Ayala,</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	07/10/2014 - 08:50 AM



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Asesor Despacho Ministerial, y demás funcionarios del MTOP relacionados al proceso, toda la documentación correspondiente al Costo +%, que esta en legalización.		
<p>AGOSTO 2014:</p> <p>La obra se termino en la fecha establecida en el contrato el 24 de agosto del 2013.</p> <p>Por pedido de la comisión se solicito se conforme una subcomisión especial de apoyo perteneciente a la Dirección General de Aviación Civil del MTOP para que emita un informe técnico de las obras a entregar.</p> <p>La comisión y subcomisión realizaron el recorrido del 28 de julio al 01 de agosto del presente año.</p> <p>El 28 de Agosto del 2014 subscribe el Acta de Recepción Provisional, con observaciones.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	09/09/2014 - 08:55 AM
<p>JULIO 2014</p> <p>El 29 de julio del presente año, la comisión nominada para apoyar a la comisión nombrada para la recepción provisional se hizo presente, teniendo previsto terminar el recorrido el 01 de agosto del presente año, teniendo que presentar esta subcomisiones los informes respectivos, para proceder a elaborar el Acta de Recepción provisional.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	30/07/2014 - 02:37 PM
<p>JUNIO 2014:</p> <p>El Ing. Bayardo Ramírez delega a los Ings. Edwin Vásquez y Vicente Rodas para la recepción provisional del nuevo aeropuerto de Esmeraldas, pero esta comisión solicita que se los apoye con técnicos de las diferentes ramas técnicas.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/07/2014 - 12:05 PM
<p>MAYO 2014:</p> <p>Estando comprobado las tuberías y los tanques de combustibles se solicito a la máxima autoridad que nombre la comisión para realizar la acta de recepción provisional.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	06/06/2014 - 02:33 PM
<p>ABRIL 2014:</p> <p>Las pruebas de Flushing se realizaron a los 23 días del mes de abril del 2014 a las 10:00 horas las cuales fueron aceptadas por ECUFUEL. La contratista solicito recepción provisional por haber cumplido lo solicitado por ECUFUEL y la ARCH de Esmeraldas.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	08/05/2014 - 01:46 PM
<p>MARZO 2014:</p> <p>La ARCH y ECUAFUEL realizaron observaciones a las líneas de conducción a los tanques de combustibles, para lo cual se iba hacer la prueba respectiva para ver el funcionamiento de las tuberías, pero por no tener el combustible adecuado no se pudo realizar esta prueba el 27 de marzo del 2014 esperando realizarlo en la tercera semana de abril.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	07/04/2014 - 02:31 PM
<p>Se encuentra en revisión por parte de la Fiscalización la Liquidación Económica para poder hacer la Recepción Provisional; considerando unas observaciones que ha hecho Hidrocarburos - Esmeraldas a los tanques de combustibles (ARCH)</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	07/03/2014 - 03:42 PM
<p>Julio 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Se continua con el alumbrado público</li> <li>- Se continua con el adoquinado en parqueadero</li> <li>- Se continua con la colocacion de cerámica en la terminal de pasajeros</li> <li>- Se continua con las instalación de aires acondicionados</li> </ul>	Dávila Cadena, Christian Roberto	16/08/2013 - 11:50 AM
<p>Junio 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alumbrado público</li> <li>- Adoquinado en parqueadero</li> <li>- Cerámica en la terminal de pasajeros</li> <li>- Instalación de aires acondicionados</li> <li>- Colocación de ventanas y vidrios</li> <li>- Terminación de servicios higiénicos</li> </ul>	Martínez Martínez, Jorge Aníbal	06/07/2013 - 11:27 AM
<p>Mayo 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alumbrado público</li> <li>- Adoquinado en parqueadero</li> <li>- Cerámica en la terminal de pasajeros</li> <li>- Instalación de aires acondicionados</li> <li>- Colocación de ventanas y vidrios</li> <li>- Terminación de servicios higiénicos</li> </ul>	Martínez Martínez, Jorge Aníbal	06/07/2013 - 11:26 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>ABRIL 2013:</b> Se esta trabajando en la const. del bloque terminal; const. bloque exteriores; bloque torre de control; bloque contra incendios; bloque de combustible, taller mecanico, subestacion electrica y caseta de bombas contra incendios, Bloque de transformadores, planta de tratamiento de AA.SS, Se firmo la orden de cambio numero N° 2 de incremento de cantidades, faltando firmar el contrato complementario por rubros nuevos.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	01/05/2013 - 11:47 AM
<p><b>MARZO 2013:</b> Se esta trabajando en la const. del bloque terminal; const. bloque exteriores; bloque torre de control; bloque contra incendios; bloque de combustible, taller mecanico, subestacion electrica y caseta de bombas contra incendios, Bloque de transformadores, planta de tratamiento de AA.SS, Se firmo la orden de cambio numero N° 2 de incremento de cantidades, faltando firmar el contrato complementario por rubros nuevos.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	26/03/2013 - 01:52 PM
<p><b>FEBRERO 2013:</b> Se esta trabajando en la const. del bloque terminal; const. bloque exteriores; bloque torre de control; bloque contra incendios; bloque de combustible, taller mecanico, subestacion electrica y caseta de bombas contra incendios, Bloque de transformadores, planta de tratamiento de AA.SS.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	26/03/2013 - 01:47 PM
<p><b>Enero 2013:</b> Se esta trabajando en la const. del bloque terminal; const. bloque exteriores; bloque torre de control; bloque contra incendios; bloque de combustible, taller mecanico, subestacion electrica y caseta de contra bombas de contra incendios.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	18/02/2013 - 04:56 PM
<p><b>DICIEMBRE 2012</b> Se ha trabajado en los diferentes frentes de trabajo como detallo a continuación, EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS, en OBRAS CIVILES se ejecutó estructura de hormigón, estructura metálica, pisos, aluminio y vidrio, señalización y obras exteriores; INSTALACIONES ELÉCTRICAS, se construyo red eléctrica de distribución de carga y tierra eléctrica, en INSTALACIONES ESPECIALES se tiene red: estructurada, de anuncio público, control de acceso y circuito cerrado de televisión, telefónica IP, wireless, detección de incendios e informática de vuelos., en el SISTEMA HIDRÁULICO SANITARIO, se ha construido los siguientes sistemas de aguas: servidas, lluvias terminal pax, potable y la cisterna, en la TORRE DE CONTROL Y BLOQUE TÉCNICO, en OBRAS CIVILES tenemos en ejecución obras preliminares, movimientos de tierras, estructura, estructura metálica y pisos, en el HANGARDE SERVICIO CONTRA INCENDIO se está realizando en OBRAS CIVILES: obras preliminares, movimiento de tierras, estructura, estructura metálica, mampostería, recubrimientos y red eléctrica - carga, en INTALACIONES ESPECIALES tenemos red estructurada y cisterna SCI, en INSTALACIONES ELÉCTRICAS tenemos la red eléctrica, en el SISTEMA HIDRÁULICO tenemos la red de aguas servidas general, entibado y tratamiento de aguas servidas, en el EDIFICIO DE LA PLANTA DE COMBUSTIBLE, TALLER MECÁNICO DE LA PLANTA DE COMBUSTIBLES, SUB-ESTACIÓN ELECTRICA DE LA PLANTA DE COMBUSTIBLES, CASETA DE BOMBAS DE LA PLANTA DE COMBUSTIBLES Y OBRAS EXTERIORES Y CIMENTACIÓN TANQUES DE COMBUSTIBLES se está realizando las siguientes actividades; obras preliminares, movimiento de tierras, estructura, pisos, mampostería y enlucido, en la PLANTA DE COMBUSTIBLES- PIPING Y TANQUES JET A1-AVGAS- SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, se construye tanque de combustible JET-A1 y AV GAS, como el de agua, en la AMPLIACIÓN DE PISTA Y CALLE DE RODAJE Y ACCESO se ejecuta la ampliación pista y calle de rodaje, drenaje, manejo de impacto ambiental y transporte de materiales petreos, y por ultimo tenemos PLATAFORMA HORMIGÓN RÍGIDO PARA AERONAVES en lo que se ha realizado plataforma de hormigón estructural y transporte de material pétreo</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	18/02/2013 - 04:53 PM
	Rodas Mejía, Vicente Fernando	08/01/2013 - 09:49 AM
	Rodas Mejía, Vicente Fernando	08/01/2013 - 08:25 AM
<p><b>NOVIEMBRE 2012:</b> En la Plataforma Proyectada se está fundiendo hormigón con el acero. En el Terminal de Pasajeros se está colocando tubería de aguas servidas con sus respectivas salidas, ademas se continua con los plintos y muñecos con el acero estructural, y el hormigón en plintos con su acero de refuerzo; Edificio de Sistema Contra Incendios,Se está colocando paredes de bloque y fundiendo el piso con fibras y malla soldada de refuerzo,por ultimo se se mejoró el suelo con piedra bola y se puso el hierro de las vigas. Acceso a Plataforma y Taxi Way se esta rellinando con material sub - base clase II. En la torre de control se ha colocado el acero estructural. Obras Exteriores se colocó tubería de 200 mm. de diametro para desagüe.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	07/01/2013 - 02:46 PM
<p><b>Octubre 2012</b> En la Plataforma Proyectada se está fundiendo hormigón con el acero. En el Terminal de Pasajeros se está colocando tubería de aguas servidas con sus respectivas salidas, ademas se continua con los plintos y muñecos con el acero estructural, y el hormigón en plintos con su</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	01/11/2012 - 10:28 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>acero de refuerzo; Edificio de Sistema Contra Incendios, Se está colocando paredes de bloque y fundiendo el piso con fibras y malla soldada de refuerzo, por último se se mejoró el suelo con piedra bola y se puso el hierro de las vigas. Acceso a Plataforma y Taxi Way se está relleno con material sub - base clase II. En la torre de control se ha colocado el acero estructural. Obras Exteriores se colocó tubería de 200 mm. de diámetro para desagüe, se realizó el replantillo en tanque de agua como laguna de oxidación, y se ha puesto el hierro para el tanque de agua. Ampliación Colindante con Taxi Way, Ecuafuel y combustibles se ha realizado relleno con sub - base clase III. Edificio Administrativo de Combustible se ha construido plintos, muñecos de hormigón con su respectivo hierro.</p>		
<p>Septiembre 2012: Se realizó relleno con subbase clase 2 estabilizada con cemento portland; colocación de vigas en el terminal de pasajeros; armado de losa y hormigonado de losa en el edificio de sistema contra incendios; relleno con material de mejoramiento acceso a la plataforma; relleno clase 3 para taxi way; hierro de cimentación en torre de control; excavación, relleno con material de mejoramiento, geomalla y geotextil en planta de combustible y vía nueva frente al terminal de pasajeros: avance físico de la obra es 30% , económico 30%</p> <p>AGOSTO: Edificio terminal de pasajeros.- relleno con material de préstamo - sub-base clase 2, excavación cimientos, hormigón simple en cadenas y columnas, acero estructural: Hangar de servicio contra incendio.- hormigón simple en plintos y columnas y acero de refuerzo: Edificio de la planta de combustible.- excavación cimientos y replanteo y nivelación: Ampliación de pista y calle de rodaje.- excavación en suelo, geotextil no tejido, geomalla biaxial, mejoramiento subrasante con suelo seleccionado. Plataforma de hormigón rígida para aeronaves.- mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado, transporte de material de mejoramiento.</p> <p>JULIO 2012: Se ha realizado movimiento de tierra, colocación de tuberías para drenajes, colocación de material préstamo importado, colocación de material de mejoramiento, acero de refuerzos en columnas, hormigonado en plintos y dados, colocación de geomalla biaxial y geotextil no tejido, colocación de material de subbase clase 2; el avance económico es de 11.50 % y el avance físico es el 10.49 %, se ha presentado una reprogramación del cronograma, por haber problemas en los materiales por estar los ríos crecidos.</p> <p>JUNIO 2012: Se ha realizado excavación sin clasificar y desalojo, excavación y colocación de tubería para drenaje, préstamo importado y material de mejoramiento, también se ha reubicado los postes fuera del Aeropuerto para tener mayor área de trabajo, el avance económico es de 4.38 % y el avance físico es el 6.00 %, se ha presentado una reprogramación del cronograma, por haber problemas en los materiales por estar los ríos crecidos.</p> <p>MAYO 2012: El avance ejecutado es de 2.45%. Se realizó en el terminal de pasajeros: limpieza y desbroce, replanteo y nivelación y parte exterior desbroce para estacionamiento y vías. Ampliación de pista y calle de rodaje se ha realizado desbroce y limpieza, con la limpieza de alcantarilla (canales de drenaje). Plataforma de hormigón se ha realizado mejoramiento sub rasante con suelo seleccionado y el transporte del mismo</p> <p>ABRIL 2012: avance físico es de 1.72% Se realizó la limpieza y desbroce incluido espacios laterales del edificio; replanteo y nivelación del perímetro de la construcción; relleno con material de préstamo subbase clase 2; excavación de cimientos; relleno compactado con material de excavación y desalojo de material de excavación.</p> <p>MARZO 2012: Se firma el contrato. Se entrega el anticipo</p> <p>FEBRERO 2012: Se espera la NO objeción de la CAF. Se solicita partida presupuestaria.</p> <p>ENERO 2012: Se adjudica el contrato a la Cía. ABC &amp; Consermín</p> <p>DICIEMBRE de 2011: Se subió al portal la licitación para adjudicación</p> <p>NOVIEMBRE 2011: Aprobación de Financiamiento CAF</p> <p>JULIO 2011: La Ficha Senplades se encuentra en trámite de Priorización en Senplades - Ibarra. Los estudios se encuentran en revisión para aprobación en el MTOP. El proyecto se encuentra en revisión para verificar la Factibilidad Económica y Social del proyecto</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>01/11/2012 - 10:10 AM</p>

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

## LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	1-Solicitud de Información	01/12/2011		01/12/2011		Sí	8.0
2	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado	1-Solicitud de Información	01/12/2011		01/12/2011		Sí	2.0
3	EJECUCIÓN: Programación presupuestaria aprobada	2-Publicación de Pliegos	01/12/2011		01/12/2011		Sí	3.0
4	PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida	1-Solicitud de Información	01/12/2011		01/12/2011		Sí	5.0
5	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	1-Solicitud de Información	01/12/2011		01/12/2011		Sí	3.0
6	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	1-Solicitud de Información	01/12/2011		01/12/2011		Sí	2.0
7	EJECUCIÓN: Adjudicación presentado	3-Adjudicación	02/02/2012		02/02/2012		Sí	5.0
8	EJECUCION: Inicio de Obra ejecutada	4-Inicio de Trabajo	03/03/2012		03/03/2012		Sí	5.0
9	EJECUCION: Obras Preliminares realizadas	5-Entregables Intermedios	15/03/2012		15/03/2012		Sí	5.0
10	EJECUCION: Movimiento de Tierras - Excavaciones ejecutados	5-Entregables Intermedios	30/05/2012		30/05/2012		Sí	10.0
11	EJECUCION: Obras de Infraestructura Civil 50% realizados	5-Entregables Intermedios	01/11/2012		01/11/2012		Sí	10.0
12	EJECUCION: Obras de Infraestructura Arquitectónica - Eléctrico - Electrónica realizadas	9-Entregables Formales	26/06/2013		26/06/2013		Sí	10.0
13	EJECUCION: Obras de Infraestructura Civil 100% ejecutadas	9-Entregables Formales	30/06/2013		30/06/2013		Sí	10.0
14	EJECUCION: Acabados Generales realizados	5-Entregables Intermedios	29/08/2013		29/08/2013		Sí	10.0
15	EJECUCION: Señalización - Señalética completada	5-Entregables Intermedios	31/08/2013		31/08/2013		Sí	2.0
16	CIERRE: Acta de Entrega Recepción Provisional	5-Entregables Intermedios	15/06/2014		05/06/2014		Sí	1.0
17	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	15/06/2014		09/05/2018		Sí	2.0
18	CIERRE: Liquidación económica realizada	5-Entregables Intermedios	15/06/2014		09/05/2018		Sí	1.0
19	CIERRE: Liquidación económica de reajuste de precios realizada	1-Solicitud de Información	31/07/2019	31/07/2019			No	1.0
20	CIERRE: Certificación de la Cordinación General	V - Verificación ejecutiva	31/12/2019	31/12/2019			No	1.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito							
21	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno	V - Verificación ejecutiva	31/12/2019	31/12/2019			No	1.0
22	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	V - Verificación ejecutiva	31/12/2019	31/12/2019			No	1.5
23	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	V - Verificación ejecutiva	31/12/2019	31/12/2019			No	1.0
24	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	V - Verificación ejecutiva	31/12/2019	31/12/2019			No	0.5
25	COMPLETADO: Informe de Cierre de Proyectos (SENPLADES) aprobada.	V - Verificación ejecutiva	31/12/2019	31/12/2019			No	0.0

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	OBRA EN EJECUCIÓN	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	25/08/2014
2	OBRA EN EJECUCIÓN	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	23/12/2013
3	GOBERNACIÓN DE ESMERALDAS	Lemos Ramirez, Pablo Rafael	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	28/08/2013
4	GOBERNACIÓN DE ESMERALDAS	Lemos Ramirez, Pablo Rafael	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	30/09/2013
5	GOBERNACIÓN DE ESMERALDAS	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	28/10/2013
6	GOBERNACION DE ESMERALDAS	Lemos Ramirez, Pablo Rafael	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	02/07/2013
7	GOBERNACIÓN DE ESMERALDAS	Lemos Ramirez, Pablo Rafael	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	21/02/2013
8	GOBERNACIÓN DE ESMERALDAS	Lemos Ramirez, Pablo Rafael	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	22/03/2013
9	GOBERNACIÓN DE ESMERALDAS	Lemos Ramirez, Pablo Rafael	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	08/03/2013
10	Historico - - De acuerdo a inspección realizada el 26/04/2012 se nos informo que la obra dio inicio el 08/03/2012 debido que en esta fecha se realizo la entregade los anticipos. - Se nos dio a con	Lara Rivadeneira, Lenin Jose	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	26/04/2012

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Periodo	Meta	Resultado del Periodo	Fecha de Inicio	Último Periodo Actualizado
1	Porcentaje de cumplimiento de la elaboración y pago de convenio		0.00 %	0.5	0	01/01/2019	Ene-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	3,694,573.88
Estimado Al Fin Del Proyecto:	23,559,668.70 **
Costo Total:	12,315,488.27
Total Devengado:	23,428,428.83
% Costo Total Devengado:	190.24 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 190.24 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	16,834,349.31	177,486.49	0.00	17,011,835.80
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	1,146,274.60	131,239.87	0.00	1,277,514.47
Ppto. Codificado	27,917,568.38	131,239.87	0.00	28,048,808.25
Ppto. Comprometido	1,914,510.27	0.00	0.00	1,914,510.27
Planeado - Codificado (2019)		46,246.62		
Programado a Devengar	24,960,214.01	131,239.87	0.00	25,091,453.88
Ppto. Devengado	23,428,428.83	0.00	0.00	23,428,428.83
Pagado Real	1,914,510.27	0.00	0.00	1,914,510.27
Estimado a fin de año	* 23,428,428.83	0.00	0.00	23,428,428.83
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,531,785.18	131,239.87	0.00	1,663,025.05
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 93.86 %	0.00 %	0.00 %	93.37 %
Ppto. Codificado 998	124,006.11	0.00	0.00	124,006.11
Ppto. Devengado 998	124,006.11	0.00	0.00	124,006.11

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

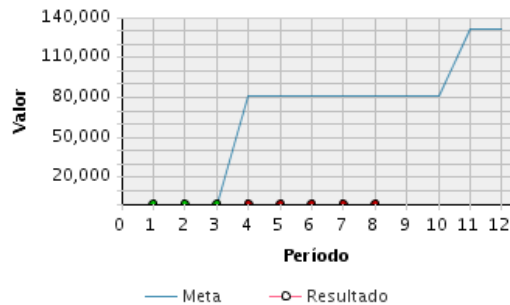

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.00 %



Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	81,548.57	0.00	81,548.57	0.00	0.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	81,548.57	0.00	0.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	81,548.57	0.00	0.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	81,548.57	0.00	0.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	81,548.57	0.00	0.00 %		0.00 %
Sep	0.00		81,548.57				
Oct	0.00		81,548.57				
Nov	49,691.30		131,239.87				
Dic	0.00		131,239.87				
<b>Total</b>	<b>131,239.87</b>	<b>0.00</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
15	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		OFICIO_GPR_K019_Y_K081.pdf	20/06/2012
2		AEROPUERTO.pdf	10/09/2012
3	A1.ORDEN DE CAMBIO 1	A1_-_ORDEN_DE_CAMBIO_1.pdf	14/03/2014
4	A2.ORDEN DE CAMBIO 2	A2_-_ORDEN_DE_CAMBIO_2.pdf	14/03/2014
5	A3.CONTRATO COMPLEMENTARIO 1	A3_-_COMPLEMENTARIO_1-2013.pdf	14/03/2014
6	A4. INFORME DE SITOP MARZO 2014	A4_-_4404_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2014.PDF	07/04/2014
7	A5.INFORME DE SITOP ABRIL 2014	A5.4404_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_ABRIL_2014.PDF	08/05/2014
8	A6.ACTA PRUEBAS FLUSHING	A6.ACTA_DE_PRUEBAS_FLUSHING_.pdf	08/05/2014
9	A7.INFORME DE SITOP MAYO 2014	A7._INFORME_SITOP_MAYO_2014_-_K081.PDF	06/06/2014
10	A8.ACTA RECEPCION PROVISIONAL	A8.-ACTA_RECEPCION_PROVISIONAL-2014.pdf	30/09/2014
11	A9. 4404-INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	A9._4404-INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2014.pdf	10/11/2014
12	B1.4404 INFORME EJECUTIVO SITOP NOV 2014	B1.4404_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_NOV_2014.pdf	05/12/2014
13	B2. 4404 INFORME EJECUTIVO SITOP DIC 2014	B2._4404_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_DIC_2014.pdf	06/01/2015
14	B3. 4404- INFROME EJECUTIVO DE SITOP ENE 2015	B3._4404- _INFROME_EJECUTIVO_DE_SITOP_ENE_2015.pdf	09/02/2015
15	B4. 4004 INFORME EJECUTIVO SITOP FEB 2015	B4._4004_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_FEB_2015.pdf	09/03/2015
16	B5.4404 INFORME EJECUTIVO SITOP MAR 2015	B5.4404_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MAR_2015.pdf	07/04/2015
17	B6.4404 INFORME EJECUTIVO SITOP ABR 2015	B6.4404_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_ABR_2015.pdf	11/05/2015
18	B7. 4404 INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2015	B7._4404_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MAYO_2015.pdf	02/06/2015
19	B8. 4404 INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2015	B8._4404_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_JUNIO_2015.pdf	08/07/2015
20	B9. 4404 INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2015	B9._4404_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_JULIO_2015.pdf	31/07/2015
21	C1. 4404 INFORME EJECUTIVO SITOP AGO 2015	C1._4404_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_AGO_2015.pdf	05/10/2015
22	C2. 4404 INFORME EJECUTIVO SITOP SEP 2015	C2._4404_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_SEP_2015.pdf	05/10/2015
23	C3. 4404 INFORME EJECUTIVO SITOP OCT 2015	C3._4404_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_OCT_2015.pdf	06/11/2015

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
24	C4. 4404 INFORME EJECUTIVO SITOP NOV 2015	C4_4404_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_NOV_2015.pdf	08/12/2015
25	C5. 4404 INFORME EJECUTIVO SITOP DIC 2015	C5_4404_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_DIC_2015.pdf	05/01/2016
26	C6. 4404-ACTA DEFINITIVA-2018	C6_4404-ACTA_DEFINITIVA-2018.pdf	25/01/2019
27	C7. ALINEADO AL HITO 19 - MEMORANDO MTOP-FINAN_ESM-2019-64-ME	C7_ALINEADO_AL_HITO_19_-_MEMORANDO_MTOP-FINAN_ESM-2019-64-ME.pdf	03/04/2019
28	C8. Asociado a Hito 19 -Informe de Acciones Riesgos proyectos en ejecucion - Abril 2019	C8_Asociado_a_Hito_19_-_Informe_de_Acciones_Riesgos_proyectos_en_ejecucion_-_Abril_2019.pdf	03/04/2019
29	C9 - Reporte pago esigef agosto 2019	C9_-_Reporte_pago_esigef_agosto_2019.pdf	05/09/2019
30	Fotografía del aeropuerto 1	aeropuerto_1.pdf	06/08/2012
31	Fotografía del aeropuerto 2	aeropuerto_2.pdf	06/08/2012
32	Fotografía del aeropuerto 3	aeropuerto_3.pdf	06/08/2012
33	Fotografía del aeropuerto 4	informe_fotografico_aeropuerto_Tachina.docx	05/10/2012
34	fotografias	IMG_0175.JPG	01/05/2013
35	fotografias mes de abril	IMG_0136.JPG	01/05/2013
36	fotografias del aeropuerto de Tachina	fotos_del_aeropuerto_de_Tachina.pdf	09/07/2012
37	fotografias del aeropuerto de Tachina	fotos_aeropuerto_Tachina_1.pdf	09/07/2012
38	FOTOS	AEROPUERTO_GENERAL_RIVADENEIRA.docx	07/11/2012
39	fotos aeropuerto abril 2013	fotos_aeropuerto_abril_2013.docx	06/05/2013
40	FOTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	FOTOS_DE_AEROPUERTO_RIVADENEIRA_MES_DE_DICIEMBRE_2012.docx	18/02/2013
41	fotos del mes de enero 2013	aeropuerto_Tachina_123.docx	18/02/2013
42	fotos del mes de noviembre	NOVIEMBRE_FOTOS_AEROPUERTO_TACHINA_PROVINCIA_07/12/2013	07/12/2013
43	fotos mes de junio 2013	fotos_mes_de_junio_2013_aeropuerto.docx	06/07/2013
44	INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2014	A7_4404_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_AGOSTO_2014.pdf	09/09/2014
45	informe ejecutivo sitop mes de junio 2013	informe_ejecutivo_sitop_mes_de_junio_2013_aeropuerto.pdf	08/07/2013
46	informe fotografico agosto 2013	FOTOGRAFÍAS_AEROPUERTO_MES_DE_AGOSTO_2013.docx	06/09/2013
47	informe fotografico julio 2013	INFORME_FOTOGRAFICO_PASO_LATERAL_TACHINA_MES_DE_JULIO_2013	05/08/2013
48	informe sitop diciembre 2013	reporte_sitop_diciembre_2013._aeropuerto_Tachina.pdf	08/01/2014
49	informe sitop noviembre 2013	sitop_noviembre_2013_aeropuerto_tachina.pdf	09/12/2013
50	informe sitop octubre 2013	reporte_sitop_octubre_2013_aeropuerto.pdf	06/11/2013
51	informe tecnico sitop agosto 2013	informe_sitop_agosto_2013_aeropuerto_GestionReporteFN.pdf	09/09/2013
52	informe tecnico sitop septiembre 2013	informe_sitop_aeropuerto_Tacina_septiembre_2013.pdf	07/10/2013
53	Priorización Senplades del Proyecto	PRIORIZACION_ESMERALDAS_....pdf	10/04/2012
54	Proyecto Priorizado SENPLADES	TACHINA-ESMERALAS.rar	02/05/2012
55	Reporte Ejecutivo Abril SITOP	Reporte_Ejecutivo_de_Abril.pdf	07/05/2013
56	vista general del aeropuerto	IMG_0051.JPG	06/06/2013

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	Líder de Proyecto	Analista de Infraestructura Provincial 1	galdas@mtop.gob.ec	023974600 / 0958988062 / 11615
Rezabala Zamora, Maritza Del Carmen	Supervisora Financiera	Supervisora Financiera de Esmeraldas	mrezabala@mtop.gob.ec	0988270005 / 11606
Valencia Lara, Gustavo Stalin	Administrador del Proyecto	Director Distrital de Esmeraldas	gvalencia@mtop.gob.ec	0983585159

## FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
4890_1.jpg	05/10/2015
