

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 2
Dirección Provincial Napo

PROYECTO: K029 MTOP - Mejoramiento del Acceso a Papallacta

Líder del Proyecto:	Sanchez Camino, Narcisa de Jesus (njsanchez@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ramirez Barahona, Rodrigo Santiago	Programas Relacionados:	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A PAPALLACTA, Provincia - Napo, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Zambrano Vacacela, José Gabriel	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	1.69
CUP:	175200000.0000.373159	TIR:	19.50 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	1,996,677.69
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,882,532.98
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	19/04/2013 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	04/01/2020	Fecha de Fin Base:	31/10/2014
Modificado por:	Sanchez Camino, Narcisa de Jesus	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2019

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se rehabilitará 5 km de vía a termas, mediante la ejecución de los siguientes componentes:

- Mejorar la Calzada de 5km de vía.
- Estabilizar la vía mediante la construcción de 2 muros.
- Dotar de señalización que garantizara la seguridad a los usuarios de la vía
- Garantiza el cumplimiento de las normas establecidas mediante las actividades de fiscalización.
- Implementar el plan de manejo ambiental.

CONTRATISTA: Consorcio Papallacta

MONTO:\$ 3'251.577,09

FISCALIZACIÓN: Consultor Ing. Mario Alfonso Guevara Alvarado

EQUIPO:

- 1 Superintendente
- 1 Residente de obra
- 2 Choferes
- 20 Jornaleros
- 1 Residente de fiscalización
- 1 Ambiental
- 1 Estructural

PRODUCTO / SERVICIO: Los 5 km de vía asfaltado o rehabilitados con señalización turística, preventiva.

LINEA BASE: Actualmente existe una vía lastrada de 5 km de longitud y ancho de vía de 8 metros, no existe cunetas ni señalización.

OBJETIVOS: - Mejorar la movilidad y conectividad de los habitantes de la parroquia de Papallacta y los turistas nacionales e internacionales

Beneficios Cualitativos

Disminución en los tiempos de viaje.
 Disminución en el costo operativo de transporte.
 Intercambio de bienes y servicios de las Provincias: Napo - Pichincha.
 La calidad de la infraestructura vial mejorará el servicio a la circulación vehicular.

Tipo de Beneficiario

Los distintos sectores como son: agrícola, comercial y turístico

Restricciones

Plazo 06meses para culminación del contrato.

Restricciones

Recursos:

La mano de obra calificada requerida para la Ejecución del Proyecto considerando la experiencia que cada uno de los miembros del personal técnico mínimo deberá acreditar como mínimo, ya sea en años, número o monto de proyectos en los que haya participado.

Los Equipos y Materiales utilizados son de excelente calidad y rendimiento con el fin de desarrollar de manera afectiva y en el plazo estimado sumando al desarrollo del País con obras emblemáticas.


Alcance:

Las especificaciones técnicas que regirán cada uno de los Proyectos contratados por medio del MTOP Napo serán las "Especificaciones generales para la ejecución de puentes y caminos MOP-001-F 2002", del MTOP del Ecuador.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 19/04/2013 **Fecha de Fin:** 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

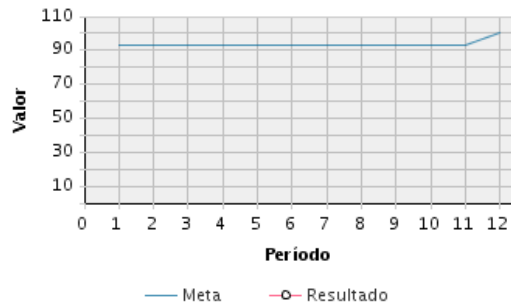

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2019: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha de 16 de Mayo de 2014, en espera del Acta de Entrega Recepción Definitiva. En revisión por parte del Fiscalizador la planilla de liquidación final ingresada por parte del contratista que asciende a un monto de USD. 89.699,55 no incluye IVA.	Sanchez Camino, Narcisca de Jesus	04/01/2020 - 12:36 PM
NOVIEMBRE 2019: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha de 16 de Mayo de 2014, en espera del Acta de Entrega Recepción Definitiva. En revisión por parte del Fiscalizador la planilla de liquidación final ingresada por parte del contratista que asciende a un monto de USD. 89.699,55 no incluye IVA.	Sanchez Camino, Narcisca de Jesus	04/12/2019 - 03:57 PM
OCTUBRE 2019: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha de 16 de Mayo de 2014, en espera del Acta de Entrega Recepción Definitiva. En revisión por parte del Fiscalizador la planilla de liquidación final ingresada por parte del contratista que asciende a un monto de USD. 89.699,55 no incluye IVA.	Sanchez Camino, Narcisca de Jesus	05/11/2019 - 04:09 PM
SEPTIEMBRE 2019: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha de 16 de Mayo de 2014, en espera del Acta de Entrega Recepción Definitiva. En revisión por parte del Fiscalizador la planilla de liquidación final ingresada por parte del contratista que asciende a un monto de USD. 89.699,55 no incluye IVA.	Sanchez Camino, Narcisca de Jesus	04/10/2019 - 09:25 AM
ENERO 2019: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha de 16 de Mayo de 2014, en espera del Acta de	Villacis Miranda, Rolando Alberto	01/10/2019 - 12:03 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Entrega Recepción Definitiva. En revisión por parte del Fiscalizador la planilla de liquidación final ingresada por parte del contratista asciende a un monto de USD. 89.699,55 no incluye IVA.		
DICIEMBRE 2018: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha de 16 de Mayo de 2014, en espera del Acta de Entrega Recepción Definitiva. En revisión por parte del Fiscalizador la planilla de liquidación final ingresada por parte del contratista asciende a un monto de USD. 89.699,55 no incluye IVA.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	01/10/2019 - 12:03 PM
AGOSTO 2019: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha de 16 de Mayo de 2014, en espera del Acta de Entrega Recepción Definitiva. En revisión por parte del Fiscalizador la planilla de liquidación final ingresada por parte del contratista que asciende a un monto de USD. 89.699,55 no incluye IVA.	Calero Cordonez, Olga Margarita	04/09/2019 - 06:20 PM
JULIO 2019: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha de 16 de Mayo de 2014, en espera del Acta de Entrega Recepción Definitiva. En revisión por parte del Fiscalizador la planilla de liquidación final ingresada por parte del contratista que asciende a un monto de USD. 89.699,55 no incluye IVA.	Navas Berrones, Veronica Elizabeth	05/08/2019 - 03:15 PM
JUNIO 2019: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha de 16 de Mayo de 2014, en espera del Acta de Entrega Recepción Definitiva. En revisión por parte del Fiscalizador la planilla de liquidación final ingresada por parte del contratista que asciende a un monto de USD. 89.699,55 no incluye IVA.	Navas Berrones, Veronica Elizabeth	04/07/2019 - 05:19 PM
MAYO 2019: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha de 16 de Mayo de 2014, en espera del Acta de Entrega Recepción Definitiva. En revisión por parte del Fiscalizador la planilla de liquidación final ingresada por parte del contratista que asciende a un monto de USD. 89.699,55 no incluye IVA.	Navas Berrones, Veronica Elizabeth	03/06/2019 - 12:17 PM
ABRIL 2019: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha de 16 de Mayo de 2014, en espera del Acta de Entrega Recepción Definitiva. En revisión por parte del Fiscalizador la planilla de liquidación final ingresada por parte del contratista que asciende a un monto de USD. 89.699,55 no incluye IVA.	Navas Berrones, Veronica Elizabeth	02/05/2019 - 08:31 AM
MARZO 2019: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha de 16 de Mayo de 2014, en espera del Acta de Entrega Recepción Definitiva. En revisión por parte del Fiscalizador la planilla de liquidación final ingresada por parte del contratista que asciende a un monto de USD. 89.699,55 no incluye IVA.	Navas Berrones, Veronica Elizabeth	03/04/2019 - 02:09 PM
FEBRERO 2019: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha de 16 de Mayo de 2014, en espera del Acta de Entrega Recepción Definitiva. En revisión por parte del Fiscalizador la planilla de liquidación final ingresada por parte del contratista asciende a un monto de USD. 89.699,55 no incluye IVA.	Navas Berrones, Veronica Elizabeth	01/03/2019 - 03:59 PM
NOVIEMBRE 2018: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha de 16 de Mayo de 2014, en espera del Acta de Entrega Recepción Definitiva. En revisión por parte del Fiscalizador la planilla de liquidación final ingresada por parte del contratista asciende a un monto de USD. 89.699,55 no incluye IVA.	Mora Orozco, Fabián Alberto	03/12/2018 - 09:28 AM
OCTUBRE 2018: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha de 16 de Mayo de 2014, en espera del Acta de Entrega Recepción Definitiva. En revisión por parte del Fiscalizador la planilla de liquidación final ingresada por parte del contratista.	Mora Orozco, Fabián Alberto	05/11/2018 - 08:46 AM
SEPTIEMBRE 2018: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha de 16 de Mayo de 2014, en espera del Acta de Entrega Recepción Definitiva. En revisión de la planilla de liquidación final ingresada por parte del contratista.	Mora Orozco, Fabián Alberto	02/10/2018 - 10:24 AM
AGOSTO 2018: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha de 16 de Mayo de 2014, en espera del Acta de Entrega Recepción Definitiva. En revisión de la planilla de liquidación final ingresada por parte del contratista.	Mora Orozco, Fabián Alberto	04/09/2018 - 05:45 PM
JULIO 2018: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha de 16 de Mayo de 2014, en espera del Acta de Entrega Recepción Definitiva. En revisión de la planilla de liquidación final ingresada por parte del contratista.	Mora Orozco, Fabián Alberto	03/08/2018 - 04:56 PM
JUNIO 2018: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevee contar con el acta de recepción definitiva. En revisión de la planilla de liquidación final ingresada por parte del contratista.	Mora Orozco, Fabián Alberto	04/07/2018 - 06:35 PM
MAYO 2018: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevee contar con el acta de recepción definitiva. En revisión de la planilla de liquidación final ingresada por parte del contratista.	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	05/06/2018 - 09:51 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2018: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevee contar con el acta de recepción definitiva. En revisión de la planilla de liquidación final ingresada por parte del contratista.</p>	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	04/05/2018 - 08:51 AM
<p>MARZO 2018: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevee contar con el acta de recepción definitiva. En revisión de la planilla de liquidación final ingresada por parte del contratista.</p>	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	05/04/2018 - 10:55 AM
<p>FEBRERO 2018: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevee contar con el acta de recepción definitiva. En revisión de la planilla de liquidación final ingresada por parte del contratista.</p>	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	06/03/2018 - 05:56 PM
<p>ENERO 2018: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevee contar con el acta de recepción definitiva. En revisión de la planilla de liquidación final ingresada por parte del contratista.</p>	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	06/03/2018 - 05:40 PM
<p>DICIEMBRE 2017: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevee contar con el acta de recepción definitiva, el contratista ha realizado las correcciones e ingresa una planilla con OFC-053-MG-2017 con fecha 13 de julio de 2017. La planilla se entregó sin firmas del fiscalizador externo, supervisor y Director provincial .</p>	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	04/01/2018 - 02:53 PM
<p>NOVIEMBRE 2017: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevee contar con el acta de recepción definitiva, hasta que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior y actual supervisor, con Memorando MTOP-DIRN-2015-2185-ME, se conforma la comisión para la recepción definitiva. La fiscalización externa indica que se devuelve la planilla de liquidación final entregada para su respectiva corrección, en contestación al Memorando N° MTOP-DDN-2017-132-OF de fecha 16 de junio de 2017.</p>	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	04/12/2017 - 03:55 PM
<p>OCTUBRE 2017: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevee contar con el acta de recepción definitiva, hasta que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior y actual supervisor, con Memorando MTOP-DIRN-2015-2185-ME, se conforma la comisión para la recepción definitiva, a los 6 días del mes de Enero del 2016, la comisión emite el informe estableciendo que el acta de recepción definitiva "NO ES PROCEDENTE", el consultor debe realizar las correcciones establecidas en el nuevo informe.</p> <p>Se ejecutan los trabajos de reparacion por parte del Consorcio Papallacta de las observaciones realizadas por la Supervisión, para proceder al cierre del proyecto. Se esta a la espera de la presentaciond el Informe de la FiscalizacionExterna y la presentación de las planillas pendientes de pago.</p>	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	04/12/2017 - 03:55 PM
<p>SEPTIEMBRE 2017: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevee contar con el acta de recepción definitiva, hasta que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior y actual supervisor, con Memorando MTOP-DIRN-2015-2185-ME, se conforma la comisión para la recepción definitiva, a los 6 días del mes de Enero del 2016, la comisión emite el informe estableciendo que el acta de recepción definitiva "NO ES PROCEDENTE", el consultor debe realizar las correcciones establecidas en el nuevo informe.</p> <p>Se ejecutan los trabajos de reparacion por parte del Consorcio Papallacta de las observaciones realizadas por la Supervisión, para proceder al cierre del proyecto. Se esta a la espera de la presentaciond el Informe de la FiscalizacionExterna y la presentación de las planillas pendientes de pago.</p>	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	04/10/2017 - 07:10 PM
<p>AGOSTO 2017: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevee contar con el acta de recepción definitiva, hasta que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior y actual supervisor, con Memorando MTOP-DIRN-2015-2185-ME, se conforma la comisión para la recepción definitiva, a los 6 días del mes de Enero del 2016, la comisión emite el informe estableciendo que el acta de recepción definitiva "NO ES PROCEDENTE", el consultor debe realizar las correcciones establecidas en el nuevo informe.</p> <p>Se ejecutan los trabajos de reparacion por parte del Consorcio Papallacta de las observaciones realizadas por la Supervisión, para proceder al cierre del proyecto. Se esta a la espera de la presentaciond el Informe de la FiscalizacionExterna y la presentación de las planillas pendientes de pago.</p>	Díaz Arequipa, Evelyn Karina	05/09/2017 - 11:50 AM
<p>JULIO 2017: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevee contar con el acta de recepción definitiva, hasta que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior y actual supervisor, con Memorando MTOP-DIRN-2015-2185-ME, se conforma la comisión para la</p>	Solano Pineda, Oscar Santiago	03/08/2017 - 05:50 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>recepción definitiva, a los 6 días del mes de Enero del 2016, la comisión emite el informe estableciendo que el acta de recepción definitiva "NO ES PROCEDENTE", el consultor debe realizar las correcciones establecidas en el nuevo informe.</p> <p>Se ejecutan los trabajos de reparación por parte del Consorcio Papallacta de las observaciones realizadas por la Supervisión, para proceder al cierre del proyecto.</p> <p>Se esta a la espera de la presentación del Informe de la Fiscalización Externa y la presentación de las planillas pendientes de pago.</p>		
<p>JUNIO 2017: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevee contar con el acta de recepción definitiva, hasta que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior y actual supervisor, con Memorando MTOP-DIRN-2015-2185-ME, se conforma la comisión para la recepción definitiva, a los 6 días del mes de Enero del 2016, la comisión emite el informe estableciendo que el acta de recepción definitiva "NO ES PROCEDENTE", el consultor debe realizar las correcciones establecidas en el nuevo informe.</p> <p>Se ejecutan los trabajos de reparación por parte del Consorcio Papallacta de las observaciones realizadas por la Supervisión, para proceder al cierre del proyecto.</p>	Solano Pineda, Oscar Santiago	05/07/2017 - 10:36 AM
<p>MAYO 2017: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevee contar con el acta de recepción definitiva, hasta que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior y actual supervisor, con Memorando MTOP-DIRN-2015-2185-ME, se conforma la comisión para la recepción definitiva, a los 6 días del mes de Enero del 2016, la comisión emite el informe estableciendo que el acta de recepción definitiva "NO ES PROCEDENTE", el consultor debe realizar las correcciones establecidas en el nuevo informe.</p> <p>Se ejecutan los trabajos de reparación por parte del Consorcio Papallacta de las observaciones realizadas por la Supervisión, para proceder al cierre del proyecto.</p>	Solano Pineda, Oscar Santiago	05/06/2017 - 05:07 PM
<p>ABRIL 2017: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevee contar con el acta de recepción definitiva, hasta que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior y actual supervisor, con Memorando MTOP-DIRN-2015-2185-ME, se conforma la comisión para la recepción definitiva, a los 6 días del mes de Enero del 2016, la comisión emite el informe estableciendo que el acta de recepción definitiva "NO ES PROCEDENTE", el consultor debe realizar las correcciones establecidas en el nuevo informe.</p> <p>Se ejecutan los trabajos de reparación por parte del Consorcio Papallacta de las observaciones realizadas por la Supervisión, para proceder al cierre del proyecto.</p>	Solano Pineda, Oscar Santiago	05/05/2017 - 11:07 PM
<p>MARZO 2017: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevee contar con el acta de recepción definitiva, hasta que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior y actual supervisor, con Memorando MTOP-DIRN-2015-2185-ME, se conforma la comisión para la recepción definitiva, a los 6 días del mes de Enero del 2016, la comisión emite el informe estableciendo que el acta de recepción definitiva "NO ES PROCEDENTE", el consultor debe realizar las correcciones establecidas en el nuevo informe.</p>	Solano Pineda, Oscar Santiago	05/04/2017 - 02:33 PM
<p>FEBRERO 2017: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevee contar con el acta de recepción definitiva, hasta que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior y actual supervisor, con Memorando MTOP-DIRN-2015-2185-ME, se conforma la comisión para la recepción definitiva, a los 6 días del mes de Enero del 2016, la comisión emite el informe estableciendo que el acta de recepción definitiva "NO ES PROCEDENTE", el consultor debe realizar las correcciones establecidas en el nuevo informe.</p>	Zarate Iñiguez, Luis Santiago	01/03/2017 - 05:29 PM
<p>ENERO 2017: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevee contar con el acta de recepción definitiva, hasta que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior y actual supervisor, con Memorando MTOP-DIRN-2015-2185-ME, se conforma la comisión para la recepción definitiva, a los 6 días del mes de Enero del 2016, la comisión emite el informe estableciendo que el acta de recepción definitiva "NO ES PROCEDENTE", el consultor debe realizar las correcciones establecidas en el nuevo informe.</p>	León Fernández, Jhoer Gustavo	03/02/2017 - 06:17 PM
<p>DICIEMBRE 2016: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevee contar con el acta de recepción definitiva, hasta que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior y actual supervisor, con Memorando MTOP-DIRN-2015-2185-ME, se conforma la comisión para la recepción definitiva, a los 6 días del mes de Enero del 2016, la comisión emite el informe</p>	León Fernández, Jhoer Gustavo	05/01/2017 - 10:46 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
estableciendo que el acta de recepción definitiva "NO ES PROCEDENTE", el consultor debe realizar las correcciones establecidas en el nuevo informe.		
NOVIEMBRE 2016: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevee contar con el acta de recepción definitiva, hasta que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior y actual supervisor, con Memorando MTOP-DIRN-2015-2185-ME, se conforma la comisión para la recepción definitiva, a los 6 días del mes de Enero del 2016, la comisión emite el informe estableciendo que el acta de recepción definitiva "NO ES PROCEDENTE", el consultor debe realizar las correcciones establecidas en el nuevo informe.	León Fernández, Jhoer Gustavo	02/12/2016 - 04:58 PM
OCTUBRE 2016: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevee contar con el acta de recepción definitiva, hasta que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior y actual supervisor, con Memorando MTOP-DIRN-2015-2185-ME, se conforma la comisión para la recepción definitiva, a los 6 días del mes de Enero del 2016, la comisión emite el informe estableciendo que el acta de recepción definitiva "NO ES PROCEDENTE", el consultor debe realizar las correcciones establecidas en el nuevo informe.	León Fernández, Jhoer Gustavo	01/11/2016 - 11:24 AM
SEPTIEMBRE 2016: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevee contar con el acta de recepción definitiva, hasta que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior y actual supervisor, con Memorando MTOP-DIRN-2015-2185-ME, se conforma la comisión para la recepción definitiva, a los 6 días del mes de Enero del 2016, la comisión emite el informe estableciendo que el acta de recepción definitiva "NO ES PROCEDENTE", el consultor debe realizar las correcciones establecidas en el nuevo informe.	León Fernández, Jhoer Gustavo	03/10/2016 - 03:44 PM
AGOSTO 2016: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevee contar con el acta de recepción definitiva, hasta que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior y actual supervisor, con Memorando MTOP-DIRN-2015-2185-ME, se conforma la comisión para la recepción definitiva, a los 6 días del mes de Enero del 2016, la comisión emite el informe estableciendo que el acta de recepción definitiva "NO ES PROCEDENTE", el consultor debe realizar las correcciones establecidas en el nuevo informe.	León Fernández, Jhoer Gustavo	05/09/2016 - 04:22 PM
JULIO 2016: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevee contar con el acta de recepción definitiva, hasta que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior y actual supervisor, con Memorando MTOP-DIRN-2015-2185-ME, se conforma la comisión para la recepción definitiva, a los 6 días del mes de Enero del 2016, la comisión emite el informe estableciendo que el acta de recepción definitiva "NO ES PROCEDENTE", el consultor debe realizar las correcciones establecidas en el nuevo informe.	León Fernández, Jhoer Gustavo	04/08/2016 - 04:44 PM
JUNIO 2016: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevé contar con el acta de recepción definitiva hasta fines de AGOSTO del 2016, una vez que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior y actual supervisor, con Memorando MTOP-DIRN-2015-2185-ME, se conforma la comisión para la recepción definitiva, a los 6 días del mes de Enero del 2016, la comisión emite el informe estableciendo que el acta de recepción definitiva "NO ES PROCEDENTE", el consultor debe realizar las correcciones establecidas en el nuevo informe	León Fernández, Jhoer Gustavo	05/07/2016 - 12:28 AM
mayo 2016: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevé contar con el acta de recepción definitiva hasta fines de Junio del 2016, una vez que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior y actual supervisor, con Memorando MTOP-DIRN-2015-2185-ME, se conforma la comisión para la recepción definitiva, a los 6 días del mes de Enero del 2016, la comisión emite el informe estableciendo que el acta de recepción definitiva "NO ES PROCEDENTE", el consultor debe realizar las correcciones establecidas en el nuevo informe	León Fernández, Jhoer Gustavo	04/06/2016 - 07:03 PM
ABRIL 2016: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevé contar con el acta de recepción definitiva hasta fines de Junio del 2016, una vez que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior y actual supervisor, con Memorando MTOP-DIRN-2015-2185-ME, se conforma la comisión para la recepción definitiva, a los 6 días del mes de Enero del 2016, la comisión emite el informe estableciendo que el acta de recepción definitiva "NO ES PROCEDENTE", el consultor debe realizar las correcciones establecidas en el nuevo informe	León Fernández, Jhoer Gustavo	05/05/2016 - 08:31 AM
MARZO 2016: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevé contar con el acta de recepción definitiva hasta fines de Junio del 2016, una vez que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior y actual supervisor, con Memorando MTOP-DIRN-2015-2185-ME, se conforma la comisión para la recepción definitiva, a los 6 días del mes de Enero del	León Fernández, Jhoer Gustavo	01/04/2016 - 04:57 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2016, la comisión emite el informe estableciendo que el acta de recepción definitiva "NO ES PROCEDENTE", el consultor debe realizar las correcciones establecidas en el nuevo informe		
FEBRERO 2016: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevé contar con el acta de recepción definitiva hasta fines de Junio del 2016, una vez que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior y actual supervisor, con Memorando MTOP-DIRN-2015-2185-ME, se conforma la comisión para la recepción definitiva, a los 6 días del mes de Enero del 2016, la comisión emite el informe estableciendo que el acta de recepción definitiva "NO ES PROCEDENTE", el consultor debe realizar las correcciones establecidas en el nuevo informe.	León Fernández, Jhoer Gustavo	07/03/2016 - 11:19 AM
Enero 2016: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevé contar con el acta de recepción definitiva hasta fines de Junio del 2016, una vez que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior y actual supervisor, con Memorando MTOP-DIRN-2015-2185-ME, se conforma la comisión para la recepción definitiva, a los 6 días del mes de Enero del 2016, la comisión emite el informe estableciendo que el acta de recepción definitiva "NO ES PROCEDENTE", el consultor debe realizar las correcciones establecidas en el nuevo informe	León Fernández, Jhoer Gustavo	04/02/2016 - 09:01 AM
Diciembre 2015: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevé contar con el acta de recepción definitiva hasta fines de Febrero del 2016, una vez que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior supervisor, actualmente en tramites legales.	León Fernández, Jhoer Gustavo	06/01/2016 - 11:03 AM
Se prevee firmar el acta de recepción definitiva a finales de Febrero 2016, se conformara la comisión para la recepción por parte de esta Dirección	León Fernández, Jhoer Gustavo	09/12/2015 - 12:17 PM
Noviembre 2015: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevé contar con el acta de recepción definitiva hasta fines de Febrero del 2015, una vez que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior supervisor, actualmente en tramites legales	León Fernández, Jhoer Gustavo	09/12/2015 - 11:57 AM
Octubre 2015: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevé contar con el acta de recepción definitiva hasta fines de Diciembre del 2015, una vez que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior supervisor, actualmente en tramites legales	León Fernández, Jhoer Gustavo	09/11/2015 - 09:15 PM
Septiembre 2015: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevé contar con el acta de recepción definitiva hasta fines de Noviembre del 2015, una vez que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior supervisor.	León Fernández, Jhoer Gustavo	08/10/2015 - 09:02 AM
Agosto 2015: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevé contar con el acta de recepción definitiva hasta fines de Octubre del 2015., una vez que el contratista realice las correcciones solicitadas por el anterior supervisor	León Fernández, Jhoer Gustavo	06/09/2015 - 07:50 PM
Julio 2015: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevé contar con el acta de recepción definitiva hasta fines de Septiembre del 2015.	Zarate Iñiguez, Luis Santiago	07/08/2015 - 12:54 PM
Junio 2015: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevé contar con el acta de recepción definitiva hasta fines de Agosto del 2015.	Rendón Martínez, Fernando Ramiro	08/07/2015 - 03:19 PM
Mayo 2015: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevé contar con el acta de recepción definitiva hasta fines de Julio del 2015.	Rendón Martínez, Fernando Ramiro	03/06/2015 - 05:27 PM
Abril 2015: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevé contar con el acta de recepción definitiva hasta fines de Mayo del 2015.	Rendón Martínez, Fernando Ramiro	04/05/2015 - 04:43 PM
Marzo 2015: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevé contar con el acta de recepción definitiva hasta fines de Mayo del 2015.	Rendón Martínez, Fernando Ramiro	04/05/2015 - 04:43 PM
Febrero 2015: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevé contar con el acta de recepción definitiva hasta fines de Marzo del 2015.	Navas Coque, Richard Wladimir	10/03/2015 - 02:38 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Enero 2015: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevé contar con el acta de recepcion definitiva hasta fines de Febrero del 2015.	Navas Coque, Richard Wladimir	24/02/2015 - 02:38 PM
Diciembre 2014: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, se cuenta con el acta de recepción provisional de fecha 16 de Mayo del 2014, se prevé contar con el acta de recepcion definitiva hasta fines de Enero del 2015.	Navas Coque, Richard Wladimir	25/01/2015 - 08:52 PM
Noviembre 2014: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad,el contratista solicita la recepción provisional mediante oficio no. 2014-060, se prevé contar con el acta de recepción provisional hasta fines de Diciembre del 2014.	Navas Coque, Richard Wladimir	10/12/2014 - 07:17 PM
Octubre 2014: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad,el contratista solicita la recepción provisional mediante oficio no. 2014-060, se prevé contar con el acta de recepción provisional hasta fines de Noviembre del 2014.	Navas Coque, Richard Wladimir	11/11/2014 - 12:48 PM
Septiembre 2014: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad,el contratista solicita la recepción provisional mediante oficio no. 2014-060, se prevee contar con el acta de recepción provisional hasta fines de Octubre del 2014.	Navas Coque, Richard Wladimir	13/10/2014 - 12:41 PM
Agosto 2014: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad,el contratista solicita la recepción provisional mediante oficio no. 2014-060, se prevee contar con el acta de recepción provisional hasta fines de Septiembre del 2014.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	11/09/2014 - 09:58 AM
JULIO 2014: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, el contratista solicita la recepción provisional mediante oficio no. 2014-060, se realiza nuevamente la inspección por parte de la comisión designada contando con los arreglos del proyecto, se procederá a dar trámite hasta fines de Agosto de 2014.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	11/08/2014 - 04:45 PM
JUNIO 2014: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, el contratista solicita la recepción provisional mediante oficio no. 2014-060, el cual se procederá a dar trámite hasta fines de Julio de 2014.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	10/07/2014 - 02:54 PM
MAYO 2014: El proyecto se encuentra concluido en su totalidad, el contratista solicita la recepción provisional mediante oficio no. 2014-060, el cual se procederá a dar trámite hasta junio de 2014.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	11/06/2014 - 12:34 PM
MARZO 2014: Asfaltado e imprimacion - Acceso a Papallacta (via antigua), tramo 1+145 a 2+360, construccion de cunetas y bordillos en Acceso a Papallacta (via antigua), construccion de cunetas en acceso a las Termas de Papallacta.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	10/04/2014 - 07:58 PM
FEBRERO 2014: Colocación y tendido de base desde la abscisa 0+000 hasta 1+700; desde la laguna hacia la Y de las Termas de Papallacta; desencofrado de la losa del puente; señalización horizontal, pintura y tachas desde la Y de Papallacta hacia las Termas de Papallacta.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	10/03/2014 - 08:05 PM
ENERO 2014: Al momento se están ejecutando los siguientes trabajos:Encofrado y Fundicion de la losa del puente, imprimacion y colocacion de la carpeta asfaltica desde la Y de papallacta abscisa 0+000 hasta la choza del Sr. Wilson abscisa 1+700,Colocación de base y compactación de la misma desde las abscisa 0+00 a la 1+700, explotación en mina y stock de material de base y subbase, explotación en roca desde la 0+700 hacia la 1+000, 0+000 1+150, construccion de tres muros de gaviones de 1x2m.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	11/02/2014 - 08:29 AM
DICIEMBRE 2013: Al momento se están ejecutando los siguientes trabajos:Imprimación y colocación de carpeta asfaltica en las abscisas desde la 0+000 a 1+480 via hacia Y de las termas de papallacta,colocación de la subbase desde la abscisa 0+000 a 1+700 desde la entrada a la luguna via hacia las termas de papallacta, explotación en mina y stock de material de base y subbase, explotación en roca desde la 0+700 hacia la 1+000, 0+000 1+150 , preparación del hierro para la losa del puente.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	07/01/2014 - 05:11 PM
NOVIEMBRE 2013: Al momento se están ejecutando los siguientes trabajos: Corte de talud, colocacion de subbase en la abscisa 0+000 a 1+480 via hacia las termas, cambio de suelo y tendido de subbase, de la abscisa 0+000 1+150 desde la entrada de papallacta a la Y de las termas, preparacion del hierro para la losa del puente, explotacion en mina, stock de base y subbase con la trituracion del material, explotacion en roca desde la 0+700 hasta la abscisa 1+000.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	02/12/2013 - 06:07 PM
OCTUBRE 2013: REPLANTEO Y NIVELACION, TENDIDO DE SUBBASE, EXCAVACION Y RELLENO DE CAJERAS DESDE 0+000 HASTA 2+100, EXCAVACION Y RELLENO DE MATERIAL CON MEJORAMIENTO, CONFIGURACION DEL ACERO PARA PUENTES, EXPLOTACION EN MINAS Y EN ROCAS.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	07/11/2013 - 02:59 PM
SEPTIEMBRE 2013: SE INICIA CON EL REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LA VÍA, CORTE DE TALUD Y EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MEJORAMIENTO, TRABAJOS EN CIMIENTO DE PUENTE EN AMBOS ESTRIBOS.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	07/11/2013 - 02:56 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA	03/06/2019	Veronica Elizabeth Navas Berrones	40	40	16	0/1
Planilla incompleta, no cuenta con firmas de responsabilidad	03/06/2019	Veronica Elizabeth Navas Berrones	10	10	1	0/1

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 2

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Certificación Presupuestaria entregada	1-Solicitud de Información	19/04/2013		19/04/2013		Sí	2.0
2	PLANEACIÓN: Acta de adjudicación entregada	1-Solicitud de Información	20/06/2013		20/06/2013		Sí	2.0
3	PLANEACIÓN: Contrato Original firmado	1-Solicitud de Información	05/08/2013		05/08/2013		Sí	2.0
4	PLANEACIÓN: anticipo entregado	1-Solicitud de Información	28/08/2013		28/08/2013		Sí	3.0
5	EJECUCIÓN: Movimiento de Tierras realizado	1-Solicitud de Información	01/10/2013		07/10/2013		Sí	14.0
6	EJECUCIÓN: Muros de Gaviones Ancho =6.60m construido	5-Entregables Intermedios	20/12/2013		09/02/2014		Sí	17.0
7	EJECUCIÓN: Puente de Hormigon de 11 metros de Luz construido	5-Entregables Intermedios	15/01/2014		20/01/2014		Sí	25.0
8	EJECUCIÓN: Sistemas de drenaje realizado	5-Entregables Intermedios	15/02/2014		15/02/2014		Sí	12.0
9	EJECUCIÓN: Mejoramiento de la Calzada realizado	5-Entregables Intermedios	20/02/2014		20/02/2014		Sí	7.0
10	EJECUCIÓN: Señalización Horizontal y Vertical y turístico realizado	1-Solicitud de Información	03/03/2014		30/04/2014		Sí	8.0
11	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	16/05/2014		16/05/2014		Sí	1.0
12	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2019	31/12/2019			No	1.0
13	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	9-Entregables Formales	31/12/2019	31/12/2019			No	1.0
14	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica	9-Entregables Formales	31/12/2019	31/12/2019			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita							
15	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	31/12/2019	31/12/2019		▼	No	1.5
16	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	31/12/2019	31/12/2019		▼	No	1.0
17	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	1-Solicitud de Información	31/12/2019	31/12/2019		▼	No	1.0
18	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	31/12/2019	31/12/2019		▼	No	0.5

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	RECORRIDO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	30/09/2015
2	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	28/08/2015
3	RECORRIDO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	30/03/2015
4	RECORRIDO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	26/02/2015
5	SUPERVISION	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	31/01/2015
6	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	09/12/2014
7	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	21/10/2014
8	SUPERVISIÓN FISICA	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	19/09/2014
9	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	27/08/2014
10	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	27/06/2014
11	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	29/04/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	975,473.13
Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,882,532.98 **
Costo Total:	3,998,120.44
Total Devengado:	3,882,532.98
% Costo Total Devengado:	97.11 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 97.11 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	3,882,532.98	0.00	0.00	3,882,532.98
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	3,882,532.98	72,639.26	0.00	3,955,172.24
Ppto. Codificado	3,882,532.98	0.00	0.00	3,882,532.98
Ppto. Comprometido	3,882,532.98	0.00	0.00	3,882,532.98
Planeado - Codificado (2019)		0.00		
Programado a Devengar	3,882,532.98	0.00	0.00	3,882,532.98
Ppto. Devengado	3,882,532.98	0.00	0.00	3,882,532.98
Pagado Real	3,882,532.98	0.00	0.00	3,882,532.98
Estimado a fin de año	* 3,882,532.98	0.00	0.00	3,882,532.98
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %
Ppto. Codificado 998	637,421.79	0.00	0.00	637,421.79
Ppto. Devengado 998	637,421.77	0.00	0.00	637,421.77

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	100.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Oct	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Nov	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Dic	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Total	0.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
13	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
14	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
16	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ACTA DE RECEPCIÓN PROVICIONAL	E4.pdf	09/12/2015
2	C1.CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2019 NAPO	C1.CEDULA_PRESUPUESTARIA_ENERO_2019_NAPO.pdf	04/10/2019
3	C10.CEDULA PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2019 NAPO	C10.CEDULA_PRESUPUESTARIA_OCTUBRE_2019_NAPO.pdf	05/11/2019
4	C2.CEDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2019 NAPO	C2.CEDULA_PRESUPUESTARIA_FEBRERO_2019_NAPO.pdf	04/10/2019
5	C3.CEDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2019 NAPO	C3.CEDULA_PRESUPUESTARIA_MARZO_2019_NAPO.pdf	04/10/2019
6	C4.CEDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2019 NAPO	C4.CEDULA_PRESUPUESTARIA_ABRIL_2019_NAPO.pdf	04/10/2019
7	C5.CEDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2019 NAPO	C5.CEDULA_PRESUPUESTARIA_MAYO_2019_NAPO.pdf	04/10/2019
8	C6.CEDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2019 NAPO	C6.CEDULA_PRESUPUESTARIA_JUNIO_2019_NAPO.pdf	04/10/2019
9	C7.CEDULA PRESUPUESTARIA JULIO 2019 NAPO	C7.CEDULA_PRESUPUESTARIA_JULIO_2019_NAPO.pdf	04/10/2019
10	C8.CEDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2019 NAPO	C8.CEDULA_PRESUPUESTARIA_AGOSTO_2019_NAPO.pdf	04/10/2019
11	C9.CEDULA PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2019 NAPO	C9.CEDULA_PRESUPUESTARIA_SEPTIEMBRE_2019_NAPO.pdf	04/10/2019
12	CONTRATO ORIGINAL	A1.pdf	16/03/2014
13	COSTO TOTAL K029	COSTO_TOTAL_K029.pdf	27/11/2019
14	Cédulas presupuestarias Acceso a Papallacta y a Termas	G7.pdf	23/12/2016
15	D1.CEDULA PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 2019 NAPO	D1.CEDULA_PRESUPUESTARIA_NOVIEMBRE_2019_NAPO.pdf	04/10/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
16	D2. DEVENGADO AÑO 2013 ACCESO A PAPALLACTA DETALLE MENSUAL	devengado_acceso_a_papallacta_2013.pdf	17/12/2019
17	D3. DEVENGADO AÑO 2014 ACCESO A PAPALLACTA DETALLE MENSUAL	devengado_accesos_a_papallacta_2014.pdf	17/12/2019
18	D4. DEVENGADO AÑO 2017 ACCESO A PAPALLACTA DETALLE MENSUAL	devengado_acceso_a_papallacta_2017.pdf	17/12/2019
19	Dictamen de Prioridad Acceso a Papallacta y a Termas	G6.pdf	23/12/2016
20	FOTOGRAFIA TRABAJOS REALIZADOS DURANTE MES DE NOVIEMBRE 2013	A7.pdf	16/03/2014
21	INFORME DE FISCALIZACION Y SUPERVISION SOBRE LOS TRABAJOS A EJECUTARSE POR PARTE DE CONSORCIO PAPALLACTA	H1.pdf	05/06/2017
22	Informe ejec. Sitop Abril 2014	B8.pdf	16/05/2014
23	Informe ejec. Sitop ENERO 2014	B1.pdf	16/03/2014
24	Informe ejec. Sitop Febrero 2014	B4.pdf	16/03/2014
25	Informe ejec. Sitop Marzo 2014	B6.pdf	10/04/2014
26	Informe ejec. Sitop Octubre 2013	A3.pdf	16/03/2014
27	Informe ejecutivo Diciembre 2013	A9.pdf	16/03/2014
28	Informe ejecutivo Septiembre 2013	A2.pdf	16/03/2014
29	Informe ejecutivo Sitop Noviembre 2013	A5.pdf	16/03/2014
30	Informe ejecutivo Sitop_ Agosto 2016	F3.pdf	05/09/2016
31	Informe ejecutivo Sitop_ Diciembre 2016	G8.pdf	05/01/2017
32	Informe ejecutivo Sitop_ Julio 2016	F2.pdf	04/08/2016
33	Informe ejecutivo Sitop_ Junio 2016	F1.pdf	05/07/2016
34	Informe ejecutivo Sitop_ Noviembre 2016	F6.pdf	02/12/2016
35	Informe ejecutivo Sitop_ Octubre 2016	F5.pdf	01/11/2016
36	Informe ejecutivo Sitop_ Septiembre 2016	F4.pdf	03/10/2016
37	Informe ejecutivo Sitop_Abril 2015	D6.pdf	04/05/2015
38	Informe ejecutivo Sitop_Abril 2016	E8.pdf	05/05/2016
39	Informe Ejecutivo Sitop_Agosto 2014	C3.pdf	11/09/2014
40	Informe ejecutivo Sitop_Agosto 2015	D9.pdf	07/09/2015
41	Informe ejecutivo Sitop_Diciembre 2014	D2.pdf	29/01/2015
42	Informe ejecutivo Sitop_Diciembre 2015	E4.pdf	06/01/2016
43	Informe ejecutivo Sitop_Enero 2015	D3.pdf	24/02/2015
44	Informe ejecutivo Sitop_Enero 2016	E5.pdf	04/02/2016
45	Informe ejecutivo Sitop_Enero 2017	G9.pdf	03/02/2017
46	Informe ejecutivo Sitop_Febrero 2015	D4.pdf	10/03/2015
47	Informe ejecutivo Sitop_Febrero 2016	E6.pdf	07/04/2016
48	Informe ejecutivo Sitop_Julio 2015	D8.pdf	07/08/2015
49	Informe ejecutivo Sitop_Junio 2015	D7.pdf	08/07/2015
50	Informe ejecutivo Sitop_Marzo 2015	D5.pdf	08/04/2015
51	Informe ejecutivo Sitop_Marzo2016	E7.pdf	07/04/2016
52	Informe ejecutivo Sitop_Mayo 2016	E9.pdf	04/06/2016
53	Informe ejecutivo Sitop_Noviembre 2015	E3.pdf	09/12/2015
54	Informe ejecutivo sitop_Octubre 2014	C7.pdf	11/11/2014
55	Informe ejecutivo Sitop_Octubre 2015	E2.pdf	09/11/2015
56	Informe Ejecutivo Sitop_Septiembre 2014	C5.pdf	13/10/2014
57	Informe ejecutivo Sitop_Septiembre 2015	E1.pdf	08/10/2015
58	Informe Ejecutivo_Sitop_Noviembre 2014	C9.pdf	10/12/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
59	INFORME INSPECCION PREVIA RECEPCION DEFINITIVA VIA PAPALLACTA - LAS TERMAS	F7.pdf	02/12/2016
60	JuLio 2014_ Informe ejecutivo Sitop	C2.pdf	01/09/2014
61	Julio 2014_ Pagos según Esigef	C1.pdf	11/08/2014
62	Junio 2014_ Pagos según Esigef	B9.pdf	10/07/2014
63	Pagos Esigef_Febrero 2014_Mejoramiento Accesos a Papallacta	B3.pdf	16/03/2014
64	Pagos segun Esigef Abril 2014	B7.pdf	16/05/2014
65	PAGOS SEGUN ESIGEF ENERO 2014	B2.pdf	16/03/2014
66	Pagos segun Esigef Marzo 2014	B5.pdf	10/04/2014
67	PAGOS SEGUN ESIGEF NOVIEMBRE 2013	A6.pdf	16/03/2014
68	PAGOS SEGUN ESIGEF OCTUBRE 2013	A4.pdf	16/03/2014
69	Pagos según esigef Diciembre 2013	A8.pdf	16/03/2014
70	Pagos según Esigef_Agosto 2014	C4.pdf	11/09/2014
71	Pagos según Esigef_Noviembre 2014	D1.pdf	10/12/2014
72	Pagos según esigef_Octubre 2014	C8.pdf	11/11/2014
73	Pagos según Esigef_Septiembre 2014	C6.pdf	13/10/2014
74	Planilla 1 E INFORMES	F8.pdf	02/12/2016
75	Planilla 2 E INFORMES	F9.pdf	02/12/2016
76	Planilla 3 E INFORMES	G1.pdf	02/12/2016
77	Planilla 4 E INFORMES	G2.pdf	02/12/2016
78	Planilla 5 E INFORMES	G3.pdf	02/12/2016
79	Planilla 6 E INFORMES	G4.pdf	02/12/2016
80	Planilla de Liquidacion	G5.pdf	02/12/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Granda Sarango, Rosa Consuelo	Financiera (Encargada)	Analista Administrativo Financiero Distrital (Encargada)	rgranda@mtop.gob.ec	0998627926
Navas Berrones, Veronica Elizabeth	Supervisor	Analista de Infraestructura Distrital 2	vnavas@mtop.gob.ec	
Zambrano Vacacela, José Gabriel	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Napo	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Napo	jzambrano@mtop.gob.ec	0999886130

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
71625_1.jpg	10/12/2014
