

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 4**  
**Dirección Provincial Manabí**

**PROYECTO: K084 MTOP - Proyecto de reconstrucción de obras por el terremoto 2016 - Manabí**

Líder del Proyecto:	Tarabo Mieles, Tyron Xavier (ttarabo@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	Programas Relacionados:	Provincia - Manabí, PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE OBRAS POR EL TERREMOTO 2016
Titular:	Zambrano Pincay, Geomar Dumar	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.381287	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	172,976,025.44
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	02/05/2016 - 31/12/2020
Fecha de última actualización:	02/12/2019	Fecha de Fin Base:	30/12/2016
Modificado por:	Zambrano Pincay, Geomar Dumar	Fecha del siguiente Hito:	21/12/2018

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Reconstrucción de obras de Infraestructura afectadas por el terremoto 16A-2016:  
 - Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí.  
 - Demoliciones en varios cantones de la provincia de Manabí.  
 -Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí.  
 -Construcción puente Jama.  
 -Fiscalización Construcción puente Jama.  
 -Reparación de la vía de Acceso a Bahía de Caraquez - canton sucre, provincia de manabi, en las abscisas 0+000 a 6+566 y 0+000 a 6+682  
 -Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí.  
 -Construcción de plataformas en varios cantones de la provincia de Manabí.  
 Construcción del Puente Pimpiguasi sobre el Río Chico De 30 M de Longitud Ubicado en La Red Vial Estatal E384, Provincia De Manabí.  
 Construcción del Puente Canuto sobre el Río Grande, de 40 m de Longitud ubicada en la Red Vial Estatal E384, de la Provincia de Manabí.  
 Adaptabilidad para la Rehabilitación y Reconstrucción de la Infraestructura afectada por el Sismo del 16 de Abril Del 2016, en el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de La Ciudad de Manta, que Incluye la Construcción del Nuevo Terminal de Pasajeros, Torre de Control, Cerramiento Perimetral, Mantenimiento de Pista, Readequación del APP y mobiliario para la edificación.

**Beneficios Cualitativos**

Mejorar el desplazamiento y comunicación entre los Cantones de la Provincia de Manabí , contribuir con la recostrucción de edificaciones publicas y dotar de infraestructura aeroportuaria de caracter internacional a la provincia de Manabí.

**Tipo de Beneficiario**

Población de Manabí en general


**Restricciones**

Tiempo.- Duración de estado de exepción (15/12/2016).

Fase Actual:  Anteproyecto  Definición  Planeación  Ejecución  Cierre  Completado  Congelado  Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 78.83 %  
 Fecha de Inicio: 02/05/2016 Fecha de Fin: 31/12/2020

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

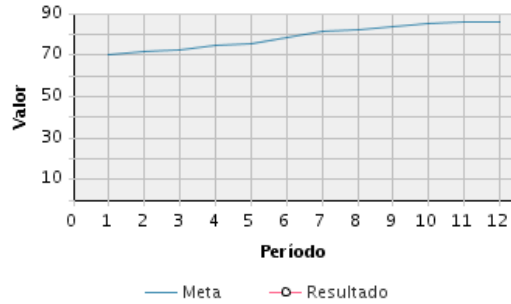

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	70 %	72 %	72 %	74 %	76 %	78 %	82 %	82 %	84 %	85 %	86 %	86 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Agosto 2019.</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Trabajos en normal ejecución.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo.- Trabajos en ejecución</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Proyecto en etapa de mantenimiento, se encuentra en trámite de pago planillas de mantenimiento de la 1 a la 5, y se tramita el pago del convenio de fiscalización, en espera de asignación de recursos para pago</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caráquez.-Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBSZ4-UETER-2019-204-ME, de fecha 5 de julio de 2019,el administrador de contrato levanta la suspensión de Trabajos, por lo que los trabajos actualmente se encuentran en normal ejecución. Con fecha 12 de Agosto se suscribe contrato complementario para la Calle García Moreno, trabajos en normal ejecución.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.- Trabajos concluidos, con acta de recepción definitiva, aún existen planillas pendientes de cancelación, en espera de asignación de recursos.</p> <p>-Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta.- Trabajos en ejecución, planillas se encuentran trámite de pago</p> <p>-Puente Pimpiguasí y Puente Canuto: Trabajos en ejecución, planillas se encuentran trámite de pago</p>	Tarabo Mieles, Tyron Xavier	03/09/2019 - 04:29 PM
<p>Junio 2019.</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Trabajos en normal ejecución.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo.- Trabajos en ejecución</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Proyecto en etapa de mantenimiento, se encuentra en trámite de pago planillas de mantenimiento de la 1 a la 5, y se tramita el pago del convenio de fiscalización, en espera de asignación de recursos para pago</p>	Tarabo Mieles, Tyron Xavier	04/07/2019 - 11:03 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caráquez.-Trabajos suspendidos, según Memorando MTOP-SUBSZ4-UETR-2019-73A-ME, en espera de asignación de recursos para el pago de las planillas pendientes de cancelación.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.- Trabajos concluidos, con acta de recepción definitiva, aún existen planillas pendientes de cancelación, en espera de asignación de recursos.</p> <p>-Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta.- Trabajos en ejecución, planillas se encuentran trámite de pago</p> <p>-Puente Pimpiguasí y Puente Canuto: Trabajos en ejecución, planillas se encuentran trámite de pago</p>		
<p>Mayo 2019.</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Trabajos en normal ejecución.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo.- Con fecha 20 de Mayo de 2019, se firma contrato complementario para la reparación del Talud afectado por el sismo del 3 de diciembre de 2017, sin embargo aun el proyecto no se encuentra en ejecución en razón de que el inicio de los trabajos es a partir de la entrega del anticipo, el cual se encuentra en trámite.</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Proyecto en etapa de mantenimiento, se encuentra en trámite de pago planillas de mantenimiento de la 1 a la 5, y se tramita el pago del convenio de fiscalización, en espera de asignación de recursos para pago</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caráquez.-Trabajos suspendidos, según Memorando MTOP-SUBSZ4-UETR-2019-73A-ME, en espera de asignación de recursos para el pago de las planillas pendientes de cancelación.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.- Trabajos concluidos, con acta de recepción definitiva, aún existen planillas pendientes de cancelación, en espera de asignación de recursos.</p> <p>-Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta.- Trabajos en ejecución, planillas se encuentran trámite de pago</p> <p>-Puente Pimpiguasí y Puente Canuto: Trabajos en ejecución, planillas se encuentran trámite de pago</p>	<p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p>	<p>05/06/2019 - 10:47 AM</p>
<p>MARZO 2019.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Los trabajos se encuentran suspendidos, ya que se encuentra en trámite de inclusión al PAI 2019 para la solicitud de asignación de recursos para el contrato complementario 2 motivo por el cual se suspendieron los trabajos.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo.- Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2019-307-ME de fecha 14 de marzo de 2019, suscrito por la Dra. Alexandra Muñoz Coordinadora General de Planificación informa a esta Subsecretaría que el Proyecto de Obras de Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de Abril de 2016 ya se encuentra incluido en el PAI 2019, actualmente se tramita la asignación de recursos para continuar con el trámite de la reparación del talud afectado.</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Proyecto en etapa de mantenimiento hasta el 12 de noviembre de 2019, con Memorando Nro. MTOP-CGP-2019-307-ME de fecha 14 de marzo de 2019, suscrito por la Dra. Alexandra Muñoz Coordinadora General de Planificación informa a esta Subsecretaría que el Proyecto de Obras de Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de Abril de 2016 ya se encuentra incluido en el PAI 2019, actualmente se tramita la asignación de recursos .</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caráquez.- Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2019-307-ME de fecha 14 de marzo de 2019, suscrito por la Dra. Alexandra Muñoz</p>	<p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p>	<p>05/04/2019 - 04:07 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Coordinadora General de Planificación informa a esta Subsecretaría que el Proyecto de Obras de Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de Abril de 2016 ya se encuentra incluido en el PAI 2019, actualmente se tramita la asignación de recursos. Trabajos en ejecución</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.- Trabajos concluidos, con acta de recepción definitiva, aún existen planillas pendientes de cancelación, se encuentra en trámite la inclusión al PAI 2019 para la asignación de recurso.</p> <p>-Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta.- Con fecha 23 de Noviembre de 2018, se suscribe el contrato modificatorio al contrato original del 30 de noviembre de 2017 del contrato multimodal de los Proyectos Aeropuerto de Manta, Puente Pimpiguasí y Puente Canuto, el mismo en la cláusula cuarta establece que el inicio y terminación de las obras rige a partir de la fecha de suscripción del contrato midificatorio; es decir desde el 23 de Noviembre de 2018 con un plazo de 608 días calendarios.</p> <p>-Puente Pimpiguasí.- Con fecha 23 de Noviembre de 2018, se suscribe el contrato modificatorio al contrato original del 30 de noviembre de 2017 del contrato multimodal de los Proyectos Aeropuerto de Manta, Puente Pimpiguasí y Puente Canuto, el mismo en la cláusula cuarta establece que el inicio y terminación de las obras rige a partir de la fecha de suscripción del contrato midificatorio; es decir desde el 23 de Noviembre de 2018 con un plazo de 608 días calendarios.</p> <p>-Puente Canuto.- Con fecha 23 de Noviembre de 2018, se suscribe el contrato modificatorio al contrato original del 30 de noviembre de 2017 del contrato multimodal de los Proyectos Aeropuerto de Manta, Puente Pimpiguasí y Puente Canuto, el mismo en la cláusula cuarta establece que el inicio y terminación de las obras rige a partir de la fecha de suscripción del contrato midificatorio; es decir desde el 23 de Noviembre de 2018 con un plazo de 608 días calendarios.</p>		
<p>ENERO 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Los trabajos se encuentran suspendidos, ya que se encuentra en trámite de inclusión al PAI 2019 para la solicitud de asignación de recursos para el contrato complementario 2 motivo por el cual se suspendieron los trabajos.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - Los trabajos de mitigación del Proyecto Manta - San Meto se ejecutaran bajo la modalidad de contrato complementario, al presente reporte se encuentra en espera de asignación de recursos, los mismos que fueron solicitados en la inclusión al PAI 2019; el cual al presente reporte se encuentra en trámite.</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Trabajos finalizados (proyecto en período de prueba) y en etapa de mantenimiento, contrato complementario de fiscalización en trámite para asignación de recursos los cuales fueron solicitados en la inclusión al PAI 2019, el cual al presente reporte se encuentra en trámite.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caráquez. Al presente reporte los trabajos se encuentran en normal ejecución.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.- Trabajos concluidos, con acta de recepción definitiva, aún existen planillas pendientes de cancelación, se encuentra en trámite la inclusión al PAI 2019 para la asignación de recursos</p>	<p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p>	<p>01/03/2019 - 04:09 PM</p>
<p>ENERO 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Los trabajos se encuentran suspendidos, con Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1540-ME y Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1540-ME, ambos de fecha 29 de Noviembre de 2018, suscrito por el Subsecretario Zonal 4 Ing. Iván Ganchozo solicita aval de obra y fiscalización respectivamente para el financiamiento del contrato complementario 2 motivo por el cual se suspendieron los trabajos.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - Los trabajos de mitigación del Proyecto Manta - San Meto se ejecutaran bajo la modalidad de contrato complementario, al presente reporte se</p>	<p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p>	<p>05/02/2019 - 09:40 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>encuentra en espera de asignación de recursos, los mismos que fueron solicitados en la inclusión al PAI 2019; el cual al presente reporte se encuentra en trámite</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Trabajos finalizados (proyecto en período de prueba) y en etapa de mantenimiento, contrato complementario de fiscalización en trámite para asignación de recursos los cuales fueron solicitados en la inclusión al PAI 2019, el cual al presente reporte se encuentra en trámite.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caráquez. Al presente reporte los trabajos se encuentran en normal ejecución.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.- Trabajos concluidos, con acta de recepción definitiva, aún existen planillas pendientes de cancelación, se encuentra en trámite la inclusión al PAI 2019 para la asignación de recursos.</p>		
<p>DICIEMBRE 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Los trabajos se encuentran suspendidos, con Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1540-ME y Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1540-ME, ambos de fecha 29 de Noviembre de 2018, suscrito por el Subsecretario Zonal 4 Ing. Iván Ganchozo solicita aval de obra y fiscalización respectivamente para el financiamiento del contrato complementario 2 motivo por el cual se suspendieron los trabajos.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - Los trabajos de mitigación del Proyecto Manta - San Meto se ejecutaran bajo la modalidad de contrato complementario, al presente reporte se encuentra en espera de asignación de recursos, por la reducción de presupuesto que el MEF efectuó en el mes de julio, los cuales fueron solicitados mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME, de fecha 29 de octubre 2018</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Trabajos finalizados (proyecto en período de prueba), contrato complementario de fiscalización en trámite para asignación de recursos los cuales fueron solicitados mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME, de fecha 29 de octubre 2018.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caráquez. Con fecha 21 de diciembre de 2018, el Ing. Stewar Durán en calidad de administrador de contrato, informa al contratista que en virtud de que el MEF ha efectuado la cancelación de las planillas pendientes de pago de la 10 a la 14, se reinicien los trabajos, por lo que al presente los trabajos se encuentran en normal ejecución.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.- Trabajos concluidos, cuenta con acta de recepción provisional, se encuentra en período de prueba (a la fecha aún el acta de recepción definitiva se encuentra en trámite en vista e que el MEF efectuó un recorte de presupuesto y no se cuenta con el recurso necesario para le pago del IVA con ley de solidaridad, razón por la cual aún se encuentran pendiente de pago las planillas de liquidación, recurso que se solicitó mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME de fecha 29 de octubre de 2018), ya que con Memorando MTOP-DF-2018-870, de fecha 19 de septiembre el Director financiero confirma el desembolso del crédito chino por parte del MEF</p>	<p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p>	<p>04/01/2019 - 02:10 PM</p>
<p>OCTUBRE 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Los trabajos se encuentran suspendidos, con Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1540-ME y Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1540-ME, ambos de fecha 29 de Noviembre de 2018, suscrito por el Subsecretario Zonal 4 Ing. Iván Ganchozo solicita aval de obra y fiscalización respectivamente para el financiamiento del contrato complementario 2 motivo por el cual se suspendieron los trabajos.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - Los trabajos de mitigación del Proyecto Manta - San Meto se ejecutaran bajo la modalidad de contrato complementario, al presente reporte se encuentra en espera de asignación de recursos, por la reducción de presupuesto que el MEF efectuó en el mes de julio, los cuales fueron solicitados mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME, de fecha 29 de octubre 2018</p>	<p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p>	<p>05/12/2018 - 10:34 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Trabajos finalizados (proyecto en período de prueba), contrato complementario de fiscalización en trámite para asignación de recursos los cuales fueron solicitados mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME, de fecha 29 de octubre 2018.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caráquez. Con fecha 24 de julio de 2018, mediante Oficio MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF se suspenden los trabajos debido al no pago de planillas, con Memorando Nro.MTOP-SUBSZ4-UETR-2018-196-ME de fecha 6 de agosto de 2018 suscrito por el Ing. Stewar Durán en calidad de administrador de contrato, dirigido al Ing. Diofre Alcívar Subsecretario Zonal 4, informa que mediante Memorando Nro.MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF dirigido al Contratista de la obra se aprueba la suspensión de plazo de la ejecución de los trabajos hasta que el proyecto se reactive económicamente, ya que hasta la fecha no se ha cancelado las planillas en trámite del 10 a la 17, el MEF efectuó un recorte de presupuesto y no se cuenta con el recurso necesario para le pago del IVA con ley de solidaridad, razón por la cual aún se encuentran pendiente de pago las planillas de liquidación, recurso que se solicitó mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME de fecha 29 de octubre de 2018), ya que con Memorando MTOP-DF-2018-870, de fecha 19 de septiembre el Director financiero confirma el desembolso del crédito chino por parte del MEF</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.- Trabajos concluidos, cuenta con acta de recepción provisional, se encuentra en período de prueba (a la fecha aún el acta de recepción definitiva se encuentra en trámite en vista e que el MEF efectuó un recorte de presupuesto y no se cuenta con el recurso necesario para le pago del IVA con ley de solidaridad, razón por la cual aún se encuentran pendiente de pago las planillas de liquidación, recurso que se solicitó mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME de fecha 29 de octubre de 2018), ya que con Memorando MTOP-DF-2018-870, de fecha 19 de septiembre el Director financiero confirma el desembolso del crédito chino por parte del MEF</p>		
<p>OCTUBRE 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Con fecha 9 de septiembre del 2018 se suspenden los trabajos, la suspensión se levantará toda vez que se suscriban los actos administrativos en trámite. Adicionalmente se tramita suscripción de complementario de consultoria para la fiscalización por un valor total de 234.254,70. MAS IVA. Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME, se solicita recursos para los contratos complementarios.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la via Manta - Los trabajos de mitgación del Proyecto Manta - San Meto se ejecutaran bajo la modalidad de contrato complementario, al pressnte reporte se enuentra en espera de asignación de recursos, por la reducción de presupuesto que el MEF efectuó en el mes de julio, los cuales fueron solicitados mediante Memotando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME, de fecha 29 de octubre 2018</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Trabajos finalizados (proyecto en período de prueba), contrato complementario de fiscalización en trámite para asignación de recursos los cuales fueron solicitados mediante Memotando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME, de fecha 29 de octubre 2018.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. Con fecha 24 de julio de 2018, mediante Oficio MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF se suspenden los trabajos debido al no pago de planillas, con Memorando Nro.MTOP-SUBSZ4-UETR-2018-196-ME de fecha 6 de agosto de 2018 suscrito por el Ing. Stewar Durán en calidad de adminstrador de contrato, dirigido al Ing. Diofre Alcívar Subsecretario Zonal 4, informa que mediantr Memorando Nro.MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF dirigido al Contratista de la obra se aprueba la suspensión de plazo de la ejecución de los trabajos hasta que el proyecto se reactive económicamente, ya que hasta la fecha no se ha cancelado las planillas en trámite de l 10 a la 17, el MEF efectuó un recorte de presupuesto y no se cuenta con el ecurso necesario para le pago del IVA con ley de solidaridad, razón por la cual aún se encuentran pendiente de pago las planillas de liquidación, recurso que se olicitó mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME de fecha 29 de octubre de 2018), ya que con Memorando MTOP-DF-2018-870, de fecha 19 de septiembre el Director financiero confirma el desembolso del crédito chino por parte del MEF</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.-rabajos concluidos, cuenta con acta de</p>	<p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p>	<p>05/11/2018 - 09:47 AM</p>



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>recepción provisional, se encuentra en período de prueba (a la fecha aún el acta de recepción definitiva se encuentra en trámite en vista e que el MEF efectuó un recorte de presupuesto y no se cuenta con el recurso necesario para el pago del IVA con ley de solidaridad, razón por la cual aún se encuentran pendiente de pago las planillas de liquidación, recurso que se olicitó mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME de fecha 29 de octubre de 2018), ya que con Memorando MTOP-DF-2018-870, de fecha 19 de septiembre el Director financiero confirma el desembolso del crédito chino por parte del MEF</p>		
<p>Septiembre 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Con fecha 9 de septiembre del 2018 se suspenden los trabajos, la suspensión se levantará toda vez que se suscriban los actos administrativos en trámite. Adicionalmente se tramita suscripción de complementario de consultoría para la fiscalización por un valor total de 234.254,70. MAS IVA.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.- Proyecto concluido en octubre de 2017 y se encontraba en trámite de recepción provisional de la obra; sin embargo con fecha 5 de diciembre 2017 se presentaron fallas en los taludes del proyecto por el sismo del 3 de diciembre de 2017, ante lo cual la contratista efectuó a su costo las remediaciones inmediatas, que permitieron dar transitabilidad a la vía. Con Memorando MTOP-SUBSZ4-UETR-2018-182-ME de fecha 10 de julio 2018, la supervisión de estudios zonal 4 , valida la alternativa de remediación definitiva al proyecto, misma que fue presentada por la fiscalización contratada Esta intervención tiene un costo de 1'714213,50 MAS IVA, trabajos que incluidos los servicios de fiscalización alcanzan un total de 1'804.552,55 mas iva, resultando un monto total requerido incluido iva de 2'021.098,86 USD. Al presente se encuentra en espera de asignación de recursos para continuar con el trámite respectivo de la ejecución de los trabajos de remediación inmediata.</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Con fecha 21 de mayo del 2018 se levanta suspensión del proyecto y se reinician trabajos mismos que debían ser culminados el 10 de junio del 2018. Sin embargo con la suscripción de la orden de cambio # 3 al proyecto a través del cual se legaliza un incremento contractual a la ejecución de obras por un valor de 1'899.006,93 USD mas iva , se autoriza la implementación de 90 días adicionales que extienden la fecha de terminación de los trabajos para el 08-09-2018, los trabajos a la presente fecha se encuentran concluidos, por lo que el proyecto entra en período de prueba (6 meses); previo a la suscripción del acta de recepción definitiva.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. Con orden de cambio No. 4 de fecha 07 de febrero de 2018, se legaliza el incremento del plazo contractual en 90 días, contados a partir del 09 de Junio 2018, por lo que la fecha para la terminación de los trabajos se la estableció para el 08 de Septiembre de 2018; sin embargo con fecha 24 de julio de 2018, mediante Oficio MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF se suspenden los trabajos debido al no pago de planillas, en vista de que a la fecha aún no se ha efectuado el desembolso del Crédito Chino con el cual el proyecto se encuentra financiado por parte de MEF.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.-Trabajos finalizados y recibido provisionalmente, se encuentran pendientes de cancelar las planillas 9-10-11 de obra y fiscalización a la fecha aún no se ha efectuado el desembolso del Crédito Chino con el cual el proyecto se encuentra financiado por parte de MEF</p>	<p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p>	<p>04/10/2018 - 08:10 AM</p>
<p>Agosto 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Con fecha 8 de junio del 2018 se levanta suspensión del proyecto y se reinician los trabajos , toda vez que se suscribe contrato complementario por 3'003.265,33 USD MAS IVA, otorgando además un plazo de ejecución de 90 días contados a partir del reinicio de los trabajos; esto es hasta el 6-09-2018. Adicionalmente se tramita suscripción de complementario de consultoría para la fiscalización por un valor total de 234.254,70. MAS IVA.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.- Proyecto concluido en octubre de 2017 y se encontraba en trámite de recepción provisional de la obra; sin embargo con fecha 5 de diciembre 2017 se presentaron fallas en los taludes del proyecto por el sismo del 3 de diciembre de 2017, ante lo cual la contratista efectuó a su costo las remediaciones inmediatas, que permitieron dar transitabilidad a la vía. Con Memorando MTOP-SUBSZ4-UETR-2018-182-ME de fecha 10 de julio 2018, la supervisión de estudios zonal 4 , valida la alternativa de remediación definitiva al proyecto, misma que fue presentada por la fiscalización contratada Esta intervención tiene un costo de 1'714213,50 MAS IVA, trabajos que incluidos los servicios de fiscalización</p>	<p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p>	<p>05/09/2018 - 11:28 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>alcanzan un total de 1'804.552,55 mas iva, resultando un monto total requerido incluido iva de 2'021.098,86 USD. Al presente se encuentra en espera de asignación de recursos para continuar con el trámite respectivo de la ejecución de los trabajos de remediación inmediata.</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Con fecha 21 de mayo del 2018 se levanta suspensión del proyecto y se reinician trabajos mismos que debían ser culminados el 10 de junio del 2018. Sin embargo con la suscripción de la orden de cambio # 3 al proyecto a través del cual se legaliza un incremento contractual a la ejecución de obras por un valor de 1'899.006,93 USD mas iva , se autoriza la implementación de 90 días adicionales que extienden la fecha de terminación de los trabajos para el 08-09-2018 y a la fecha se tramita el incremento de 118.118,23 USD mas iva para los trabajos de fiscalización complementarios, los mismos que se encuentran en espera de asignación de recursos.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. Con orden de cambio No. 4 de fecha 07 de febrero de 2018, se legaliza el incremento del plazo contractual en 90 días, contados a partir del 09 de Junio 2018, por lo que la fecha para la terminación de los trabajos se la estableció para el 08 de Septiembre de 2018; sin embargo con fecha 24 de julio de 2018, mediante Oficio MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF se suspenden los trabajos debido al no pago de planillas, en vista de que a la fecha aún no se ha efectuado el desembolso del Crédito Chino con el cual el proyecto se encuentra financiado por parte de MEF.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.-Trabajos finalizados y recibido provisionalmente, se encuentran pendientes de cancelar las planillas 9-10-11 de obra y fiscalización a la fecha aún no se ha efectuado el desembolso del Crédito Chino con el cual el proyecto se encuentra financiado por parte de MEF.</p>		
<p>JULIO 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Con fecha 8 de junio del 2018 se levanta suspensión del proyecto y se reinician los trabajos , toda vez que se suscribe contrato complementario por 3'003.265,33 USD MAS IVA, otorgando además un plazo de ejecución de 90 días contados a partir del reinicio de los trabajos; esto es hasta el 6-09-2018. Adicionalmente se tramita suscripción de complementario de consultoría para la fiscalización por un valor total de 234.254,70. MAS IVA.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.- Proyecto concluido en octubre de 2017 y se encontraba en trámite de recepción provisional de la obra; sin embargo con fecha 5 de diciembre 2017 se presentaron fallas en los taludes del proyecto por el sismo del 3 de diciembre de 2017, ante lo cual la contratista efectuó a su costo las remediaciones inmediatas, que permitieron dar transitabilidad a la vía. Con Memorando MTOP-SUBSZ4-UETR-2018-182-ME de fecha 10 de julio 2018, la supervisión de estudios zonal 4 , valida la alternativa de remediación definitiva al proyecto, misma que fue presentada por la fiscalización contratada Esta intervención tiene un costo de 1'714213,50 MAS IVA, trabajos que incluidos los servicios de fiscalización alcanzan un total de 1'804.552,55 mas iva, resultando un monto total requerido incluido iva de 2'021.098,86 USD.</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Con fecha 21 de mayo del 2018 se levanta suspensión del proyecto y se reinician trabajos mismos que debían ser culminados el 10 de junio del 2018. Sin embargo con la suscripción de la orden de cambio # 3 al proyecto a través del cual se legaliza un incremento contractual a la ejecución de obras por un valor de 1'899.006,93 USD mas iva , se autoriza la implementación de 90 días adicionales que extienden la fecha de terminación de los trabajos para el 08-09-2018 y a la fecha se tramita el incremento de 118.118,23 USD mas iva para los trabajos de fiscalización complementarios.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. Con orden de cambio No. 4 de fecha 07 de febrero de 2018, se legaliza el incremento del plazo contractual en 90 días, contados a partir del 09 de Junio 2018, por lo que la fecha para la terminación de los trabajos se la estableció para el 08 de Septiembre de 2018; sin embargo con fecha 24 de julio de 2018, mediante Oficio MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF se suspenden los trabajos debido al no pago de planillas, en vista de que a la fecha aún no se ha efectuado el desembolso del Crédito Chino con el cual el proyecto se encuentra financiado por parte de MEF.</p>	<p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p>	<p>06/08/2018 - 06:35 PM</p>



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.-Trabajos finalizados y recibido provisionalmente, se encuentran pendientes de cancelar las planillas 9-10-11 de obra y fiscalización</p>		
<p>Junio 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).                      -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.                      -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.                      -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.                      -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p>	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>05/07/2018 - 05:12 PM</p>
<p>Mayo 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).                      -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.                      -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.                      -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.                      -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p>	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>05/07/2018 - 05:12 PM</p>
<p>Abril 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).                      -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.                      -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.                      -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.                      -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p>	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>05/07/2018 - 05:11 PM</p>
<p>Marzo 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).                      -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.                      -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.                      -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.                      -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p>	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>05/07/2018 - 05:10 PM</p>
<p>Febrero 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).                      -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.                      -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.                      -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.                      -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p>	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>05/07/2018 - 05:10 PM</p>
<p>Enero 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).                      -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.                      -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.                      -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.                      -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p>	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>05/07/2018 - 05:09 PM</p>
<p>Diciembre 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).                      -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</p>	<p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p>	<p>05/07/2018 - 05:09 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p>		
<p>Noviembre 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p>	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	05/07/2018 - 05:09 PM
<p>Octubre 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p>	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	14/11/2017 - 03:02 PM
<p>Septiembre 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zon</p> <p>En el mes de mayo se continua con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p>	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	14/11/2017 - 03:02 PM
<p>Agosto 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de mayo se continua con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p>	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	14/11/2017 - 03:01 PM
<p>Julio 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de mayo se continua con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p>	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	14/11/2017 - 03:01 PM
<p>Junio 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p>	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	14/11/2017 - 03:01 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>En el mes de mayo se continua con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</li> <li>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</li> <li>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</li> </ul>		
<p>Mayo 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de mayo se continua con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</li> <li>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</li> <li>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</li> </ul>	Vera Vera, José Ricardo	08/06/2017 - 10:15 AM
<p>Abril 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de abril se continua con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</li> <li>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</li> <li>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</li> </ul>	Vera Vera, José Ricardo	08/06/2017 - 10:14 AM
<p>Marzo 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de marzo se continua con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</li> <li>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</li> <li>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</li> </ul>	Vera Vera, José Ricardo	11/04/2017 - 02:30 PM
<p>Febrero 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de febrero se continua con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</li> <li>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.</li> <li>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.</li> <li>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</li> </ul>	Vera Vera, José Ricardo	11/04/2017 - 02:29 PM
<p>Enero 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.</p> <p>En el mes de enero se continua con los trabajos de reparación emergente de varios tramos de la RVE.:</p>	Vera Vera, José Ricardo	11/04/2017 - 02:26 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).                      -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.                      -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.                      -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.                      -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</p>		
<p>Diciembre 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.                      En el mes de noviembre se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE.:                      -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).                      -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.                      -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.                      -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.                      -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</p>	<p>Vera Vera, José Ricardo</p>	<p>11/04/2017 - 02:25 PM</p>
<p>Noviembre 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.                      En el mes de noviembre se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE.:                      -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).                      -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.                      -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.                      -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.                      -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</p>	<p>Vera Vera, José Ricardo</p>	<p>08/12/2016 - 08:57 AM</p>
<p>Octubre 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.                      En el mes de octubre se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE.:                      -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).                      -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.                      -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.                      -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.                      -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</p>	<p>Vera Vera, José Ricardo</p>	<p>08/12/2016 - 08:56 AM</p>
<p>Septiembre 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.                      En el mes de septiembre se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE.:                      -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).                      -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.                      -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.                      -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez.                      -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</p>	<p>Vera Vera, José Ricardo</p>	<p>08/12/2016 - 08:55 AM</p>
<p>Agosto 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona.                      En el mes de julio se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, contrata la reparación emergente de varios tramos de la RVE.:</p>	<p>Vera Vera, José Ricardo</p>	<p>08/12/2016 - 08:52 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.		
Julio 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona. En el mes de julio se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.	Vera Vera, José Ricardo	08/12/2016 - 08:48 AM
Junio 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona. En el mes de junio se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.	Vera Vera, José Ricardo	08/12/2016 - 08:42 AM
Mayo 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona. En el mes de mayo se inicia la construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción.	Vera Vera, José Ricardo	08/12/2016 - 08:42 AM

**PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5 Recursos Economico	23/01/2019	Tyron Xavier Tarabo Mieles	10	10	1	1/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**


Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>2- NACIONAL. Ambiental.</b> El malo temporal por lluvias CAUSARÍA que se retrasen las obras de reconstrucción.	23/01/2019	Tyron Xavier Tarabo Mieles	10 %	10	1	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí

**HITOS**

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1 DEFINICION: Declaratoria estado de excepción por sismo 16 de abril 2016, mediante decretos ejecutivos 1001 y	5-Entregables Intermedios	02/05/2016		17/04/2017		Sí	10.0



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	1002 de fechas 17 y 18 de abril 2016							
2	PLANEACION: Postulacion y Priorización de parte de Secretaría Técnica de la Reconstrucción y Reactivación Productiva de los proyectos a ejecutar.	5-Entregables Intermedios	02/05/2016		22/05/2017		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN: Demolición y Remoción de escombros de edificaciones afectadas por el sismo 16 A en la provincia de Manabí	5-Entregables Intermedios	03/05/2016		07/01/2018		Sí	5.0
4	EJECUCIÓN: Construcción de Plataformas en varios cantones de la provincia de Manabí	5-Entregables Intermedios	25/11/2016		07/07/2018		Sí	3.0
5	EJECUCIÓN: Construcción de Hangar Provisional para mantener en operación el Aeropuerto Eloy Alfaro de la Provincia de Manabí.	5-Entregables Intermedios	03/03/2017		01/07/2017		Sí	2.0
6	EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí.	5-Entregables Intermedios	05/03/2017	21/12/2018			No	10.0
7	EJECUCIÓN: Contrato 2- Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí.	5-Entregables Intermedios	06/03/2017	21/12/2018			No	3.0
8	EJECUCIÓN: Contrato 3- Construcción puente Jama.	5-Entregables Intermedios	09/04/2017		29/01/2018		Sí	4.0
9	EJECUCIÓN: Contrato 4- Fiscalización Construcción puente Jama.	5-Entregables Intermedios	09/04/2017		21/12/2018		Sí	1.0
10	EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía	5-Entregables Intermedios	09/05/2017	21/12/2018			No	10.0
11	EJECUCIÓN: Contrato 6- Fiscalización Reparación de la Vía Acceso a Bahía	5-Entregables Intermedios	09/05/2017		21/12/2018		Sí	2.0
12	EJECUCIÓN: Contrato 7- Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí.	5-Entregables Intermedios	15/09/2017	21/12/2018			No	10.0
13	EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	5-Entregables Intermedios	01/01/2019	31/01/2019			No	0.25
14	EJECUCIÓN: Implementación de actividades preliminares previo iniciar movimientos de tierra para la construcción del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/01/2019	31/01/2019			No	0.25
15	EJECUCIÓN: Movimientos de tierra para la construcción de	5-Entregables Intermedios	01/02/2019	28/02/2019			No	0.5



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	la cimentacion de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10							
16	EJECUCIÓN: Suministro y Fabricacion de pilotes apoyo izquierdo para la construccion de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	5-Entregables Intermedios	01/02/2019	28/02/2019		▼	No	0.5
17	EJECUCIÓN: Estructura de Hormigon Armado para la construcción de la cimentacion del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/03/2019	31/03/2019		▼	No	0.5
18	EJECUCIÓN: Suministro y Fabricacion de pilotes apoyo derecho para la construccion de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	5-Entregables Intermedios	01/03/2019	31/03/2019		▼	No	0.5
19	EJECUCIÓN: Estructura de Hormigon Armado para la construcción de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/04/2019	30/04/2019		▼	No	1.5
20	EJECUCIÓN: Hincado de pilotes apoyo derecho para la construccion de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	5-Entregables Intermedios	01/04/2019	30/04/2019		▼	No	0.5
21	EJECUCIÓN: Hincado de pilotes apoyo izquierdo para la construccion de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	5-Entregables Intermedios	01/05/2019	31/05/2019		▼	No	0.5
22	EJECUCIÓN: Instalaciones Sanitarias para la construcción de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/05/2019	31/05/2019		▼	No	0.5
23	EJECUCIÓN: Construcción de Infraestructura de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	5-Entregables Intermedios	01/06/2019	30/06/2019		▼	No	2.5
24	EJECUCIÓN: Instalaciones Electricas para la construcción de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/06/2019	30/06/2019		▼	No	0.5
25	EJECUCIÓN: Construcción de Superestructura de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	5-Entregables Intermedios	01/07/2019	31/07/2019		▼	No	2.5
26	EJECUCIÓN: Instalaciones Electronicas para la construcción de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/07/2019	31/07/2019		▼	No	0.5
27	EJECUCIÓN: Derrocamiento y Retiro de estructuras existentes de antiguos puentes Contrato 9 Pimpiguasi y Contrato 8 Canuto	5-Entregables Intermedios	01/08/2019	31/08/2019		▼	No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
28	EJECUCIÓN: Movimientos de tierra para la construcción de la ampliación de pista de aterrizaje de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/08/2019	31/08/2019		▼	No	0.5
29	EJECUCIÓN: Construcción de Accesos, Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	5-Entregables Intermedios	01/09/2019	30/09/2019		▼	No	1.0
30	EJECUCIÓN: Revestimientos de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/09/2019	30/09/2019		▼	No	0.5
31	EJECUCIÓN: Acabados y colocación de cielo raso para la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/10/2019	31/10/2019		▼	No	0.5
32	EJECUCIÓN: Construcción de Encauzamientos y Protecciones Hidráulicas de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	5-Entregables Intermedios	01/10/2019	31/10/2019		▼	No	1.0
33	EJECUCIÓN: Construcción de Sistema Eléctrico de Iluminación de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	5-Entregables Intermedios	01/11/2019	30/11/2019		▼	No	0.25
34	EJECUCIÓN: Colocación de Puertas de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/11/2019	30/11/2019		▼	No	0.25
35	EJECUCIÓN: Ejecución de Señalética Vertical y Horizontal de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	5-Entregables Intermedios	01/12/2019	31/12/2019		▼	No	0.25
36	EJECUCIÓN: Colocación de Ventanas para la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/12/2019	31/12/2019		▼	No	0.25
37	EJECUCIÓN: Suministro e instalación de Mobiliario de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/01/2020	31/01/2020		▼	No	0.25
38	EJECUCIÓN: Suministro e instalación de piezas sanitarias para la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/01/2020	31/01/2020		▼	No	0.25
39	EJECUCIÓN: Suministro e instalación de sistema de aclimatación de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/02/2020	29/02/2020		▼	No	0.5
40	EJECUCIÓN: Suministro e instalación de sistema de seguridad aeroportuaria de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/02/2020	29/02/2020		▼	No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
41	EJECUCIÓN: Suministro e instalación de sistema contra incendio de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/03/2020	31/03/2020		▼	No	0.25
42	EJECUCIÓN: Provisión y colocación de material granular de relleno a para la construcción de la ampliación de pista de aterrizaje de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/04/2020	30/04/2020		▼	No	0.25
43	EJECUCIÓN: Suministro e instalación de señalética de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/04/2020	30/04/2020		▼	No	0.25
44	EJECUCIÓN: Provisión y colocación de capas estructurales de conformación de pavimento de la pista de aterrizaje de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/05/2020	31/05/2020		▼	No	0.5
45	EJECUCIÓN: Provisión y colocación de capas de rodadura de la ampliación pista de aterrizaje de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	08/05/2020	31/05/2020		▼	No	0.5
46	EJECUCIÓN: Provisión y colocación de capas de rodadura de la pista de aterrizaje de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/06/2020	30/06/2020		▼	No	0.5
47	EJECUCIÓN: Provisión y colocación de señalética horizontal de la pista de aterrizaje de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	5-Entregables Intermedios	01/06/2020	30/06/2020		▼	No	0.25
48	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	5-Entregables Intermedios	01/07/2020	31/07/2020		▼	No	1.0
49	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	01/07/2020	31/07/2020		▼	No	1.0
50	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	5-Entregables Intermedios	01/07/2020	31/07/2020		▼	No	1.0
51	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	01/10/2020	31/10/2020		▼	No	1.0
52	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	5-Entregables Intermedios	01/10/2020	31/10/2020		▼	No	2.0
53	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	5-Entregables Intermedios	01/11/2020	30/11/2020		▼	No	1.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
54	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	5-Entregables Intermedios	01/11/2020	30/11/2020		▼	No	1.0
55	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	5-Entregables Intermedios	01/12/2020	31/12/2020		▼	No	1.5
56	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	5-Entregables Intermedios	01/12/2020	31/12/2020		▼	No	0.5

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Numero de informes técnicos de control de obra.	—	-	-	-	01/01/2017	-


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	172,976,025.44 **
Costo Total:	244,516,825.20
Total Devengado:	139,630,669.27
% Costo Total Devengado:	57.10 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 57.10 %

**Perfil Económico 2019**

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	116,018,821.65	0.00	0.00	<b>116,018,821.65</b>
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Codificado	257,874,665.75	30,141,673.28	0.00	<b>288,016,339.03</b>
Ppto. Comprometido	200,736,736.14	0.00	0.00	<b>200,736,736.14</b>
Planeado - Codificado (2019)		-30,141,673.28		
Programado a Devengar	159,018,276.09	33,345,356.17	0.00	<b>192,363,632.26</b>
Ppto. Devengado	139,630,669.27	0.00	0.00	<b>139,630,669.27</b>
Pagado Real	108,704,578.32	0.00	0.00	<b>108,704,578.32</b>
Estimado a fin de año	* 139,630,669.27	0.00	0.00	<b>139,630,669.27</b>
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	19,387,606.82	33,345,356.17	0.00	<b>52,732,962.99</b>
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 87.81 %	0.00 %	0.00 %	<b>72.59 %</b>
Ppto. Codificado 998	12,557,087.19	0.00	0.00	<b>12,557,087.19</b>
Ppto. Devengado 998	11,955,338.58	0.00	0.00	<b>11,955,338.58</b>

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019**

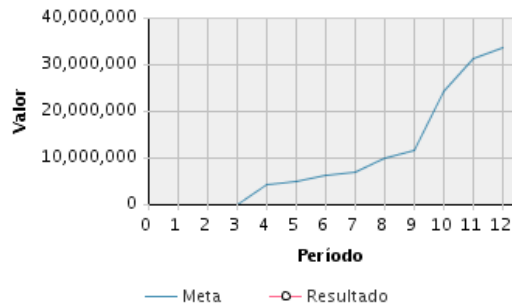

**Presupuesto Mensual 2019**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	4,310,457.16		4,310,457.16				
May	616,522.83		4,926,979.99				
Jun	1,385,176.52		6,312,156.51				
Jul	679,063.85		6,991,220.36				
Ago	2,999,694.58		9,990,914.94				
Sep	1,488,196.06		11,479,111.00				
Oct	12,834,922.69		24,314,033.69				
Nov	6,707,313.81		31,021,347.50				
Dic	2,324,008.67		33,345,356.17				
<b>Total</b>	<b>33,345,356.17</b>						

## OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
17	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
18	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
19	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
20	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	10 EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía	5_ACCESO_BAHÍA_OBRA.pdf	03/09/2019
2	10 EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía	5_CONTRATO_COMPLEMENTARIO#3_BAHIA_1.pdf	03/09/2019
3	10 EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía	5_CONTRATO_COMPLEMENTARIO#3_BAHIA_2.pdf	03/09/2019
4	10 EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía	5_CONTRATO_COMPLEMENTARIO#3_BAHIA_3.pdf	03/09/2019
5	10 EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía	5_CONTRATO_COMPLEMENTARIO#3_BAHIA_4.pdf	03/09/2019
6	10 EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía	5_CONTRATO_COMPLEMENTARIO#3_BAHIA_5.pdf	03/09/2019
7	10 EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía	5_CONTRATO_COMPLEMENTARIO#3_BAHIA_6.pdf	03/09/2019
8	11 EJECUCIÓN: Contrato 6- Fiscalización Reparación de la Vía Acceso a Bahía	5_ACCESO_BAHÍA_FISCA.pdf	03/09/2019
9	12 EJECUCIÓN: Contrato 7- Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí.	6_MONTECRISTI_-JIPIJAPA_-LA_CADENA_OBRA.pdf	03/09/2019
10	12 EJECUCIÓN: Contrato 7- Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí.	6_MONTECRISTI_-JIPIJAPA_-LA_CADENA_FISCA.pdf	03/09/2019
11	13 EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	12_PUENTE_CANUTO_OBRA.pdf	03/09/2019



**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
12	13 EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	13_PUENTE_PIMPIGUASÍ_OBRA.pdf	03/09/2019
13	14 EJECUCIÓN: Implementación de actividades preliminares previo iniciar movimientos de tierra para la construcción del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	7_AEROPUERTO_DE_MANTA_OBRA.pdf	03/09/2019
14	5 EJECUCIÓN: Construcción de Hangar Provisional para mantener en operación el Aeropuerto Eloy Alfaro de la Provincia de Manabí.	1_HANGAR_FISCA.pdf	04/07/2019
15	5 EJECUCIÓN: Construcción de Hangar Provisional para mantener en operación el Aeropuerto Eloy Alfaro de la Provincia de Manabí.	1_HANGAR_OBRA.pdf	03/09/2019
16	5 EJECUCIÓN: Construcción de Hangar Provisional para mantener en operación el Aeropuerto Eloy Alfaro de la Provincia de Manabí.	1_HANGAR_FISCA.pdf	03/09/2019
17	6 EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí.	2_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_OBRA.pdf	03/09/2019
18	6 EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí.	2_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_FISCA.pdf	03/09/2019
19	7 EJECUCIÓN: Contrato 2- Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí.	3_MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA.pdf	04/07/2019
20	7 EJECUCIÓN: Contrato 2- Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí.	3_MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA.pdf	03/09/2019
21	7 EJECUCIÓN: Contrato 2- Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí.	3_MANTA_-_SAN_MATEO_FISCA.pdf	03/09/2019
22	8 EJECUCIÓN: Contrato 3- Construcción puente Jama.	11_PUENTE_JAMA_OBRA.pdf	03/09/2019
23	9 EJECUCIÓN: Contrato 4- Fiscalización Construcción puente Jama.	11_PUENTE_JAMA_FISCA.pdf	03/09/2019
24	AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE FASE DE EJECUCIÓN A CONGELADO	MTOP-CGP-2019-104-ME_AUTORIZACIÓN_PARA_CAMBIO_DE_FASE.pdf	30/01/2019
25	HITO 10 EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía	5_ACCESO_BAHÍA_OBRA.pdf	01/03/2019
26	HITO 10 EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía	5_ACCESO_BAHÍA_OBRA.pdf	05/06/2019
27	HITO 10 EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía	5_ACCESO_BAHÍA_-_SUSPENSIÓN.pdf	05/06/2019
28	HITO 10 EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía	5_ACCESO_BAHÍA_OBRA.pdf	04/07/2019
29	HITO 10 EJECUCIÓN: CONTRATO 6 FISCALIZACIÓN REPARACIÓN ACCESO A BAHÍA	7_ACCESO_BAHIA_FISCA_03-09-2018-041754.pdf	05/09/2018
30	HITO 10 EJECUCIÓN: CONTRATO 6 FISCALIZACIÓN REPARACIÓN ACCESO A BAHÍA	7ACCESO_BAHIA_FISCA_02-10-2018-042643.pdf	04/10/2018
31	HITO 10 EJECUCIÓN: CONTRATO 6 FISCALIZACIÓN REPARACIÓN ACCESO A BAHÍA	7_ACCESO_BAHÍA_FISCA.pdf	05/11/2018
32	HITO 10 EJECUCIÓN: CONTRATO 6 FISCALIZACIÓN REPARACIÓN ACCESO A BAHÍA	ACCESO_BAHÍA_FISCA.pdf	05/12/2018
33	HITO 10 EJECUCIÓN: CONTRATO 6 FISCALIZACIÓN REPARACIÓN ACCESO A BAHÍA	7_ACCESO_BAHIA_FISCA_02-08-2018-045904.pdf	06/08/2018

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
34	HITO 10 EJECUCIÓN: CONTRATO 6 FISCALIZACIÓN REPARACIÓN ACCESO A BAHÍA	7_ACCESO_BAHÍA_FISCA.pdf	04/01/2019
35	HITO 10 EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía	7_ACCESO_BAHÍA_OBRA.pdf	05/02/2019
36	HITO 11 EJECUCIÓN: Contrato 6- Fiscalización Reparación de la Vía Acceso a Bahía	7_ACCESO_BAHÍA_FISCA.pdf	05/02/2019
37	HITO 11 EJECUCIÓN: Contrato 6- Fiscalización Reparación de la Vía Acceso a Bahía	5_ACCESO_BAHÍA_FISCA.pdf	01/03/2019
38	HITO 11 EJECUCIÓN: Contrato 6- Fiscalización Reparación de la Vía Acceso a Bahía	5_ACCESO_BAHÍA_FISCA.pdf	05/06/2019
39	HITO 11 EJECUCIÓN: Contrato 6- Fiscalización Reparación de la Vía Acceso a Bahía	5_ACCESO_BAHÍA_FISCA.pdf	04/07/2019
40	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	8_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_TERREMOTO_OBRA_03-09-2018-054138.pdf	05/09/2018
41	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	8MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_TERREMOTO_OBRA_02-10-2018-042807.pdf	04/10/2018
42	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	8_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_OBRA.pdf	05/11/2018
43	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	MEMORANDOS_SUSPENSIÓN_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA.pdf	05/11/2018
44	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	Memorando_Nro._MTOB-SUBZ4-2018-1384-ME_Solicitud_de_Recursos_Obras_de_Arrastre_y_C.C._Nuevos_de_Terremoto.pdf	05/11/2018
45	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_OBRA.pdf	05/12/2018
46	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	MEMORANDO_NRO._MTOB-SUBZ4-2018-1540-ME.pdf	05/12/2018
47	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	MEMORANDO_NRO._MTOB-SUBZ4-2018-1541-ME.pdf	05/12/2018
48	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_SUSPENSIÓN_1.pdf	05/12/2018
49	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_SUSPENSIÓN_2.pdf	05/12/2018
50	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_SUSPENSIÓN_3.pdf	05/12/2018
51	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_SUSPENSIÓN_4.pdf	05/12/2018

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
52	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	8_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_OBRA.pdf	04/01/2019
53	HITO 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	8_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_TERREMOTO_OBRA_02-08-2018-091831.pdf	06/08/2018
54	HITO 12 EJECUCIÓN: Contrato 7- Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí	8_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_OBRA.pdf	05/02/2019
55	HITO 12 EJECUCIÓN: Contrato 7- Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí	6_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_OBRA.pdf	01/03/2019
56	HITO 12 EJECUCIÓN: Contrato 7- Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí	6_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_FISCA.pdf	01/03/2019
57	HITO 12 EJECUCIÓN: Contrato 7- Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí.	6_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_OBRA.pdf	05/06/2019
58	HITO 12 EJECUCIÓN: Contrato 7- Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí.	6_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_FISCA.pdf	05/06/2019
59	HITO 12 EJECUCIÓN: Contrato 7- Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí.	6_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_OBRA.pdf	04/07/2019
60	HITO 12 EJECUCIÓN: Contrato 7- Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí.	6_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_FISCA.pdf	04/07/2019
61	HITO 13 CIERRE: ACTA DE RECEPCIÓN PROVINCIAL PUENTE JAMA PARTE 1	ACTA_PROVISIONAL_PTE._JAMA_1.pdf	06/08/2018
62	HITO 13 CIERRE: ACTA DE RECEPCIÓN PROVINCIAL PUENTE JAMA PARTE 2	ACTA_PROVISIONAL_PTE._JAMA_2.pdf	06/08/2018
63	HITO 13 EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	13_PUENTE_CANUTO_OBRA.pdf	06/06/2019
64	HITO 13 EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	14_PUENTE_PIMPIGUISÍ.pdf	06/06/2019
65	HITO 13 EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	12_PUENTE_CANUTO_OBRA.pdf	04/07/2019
66	HITO 13 EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	13_PUENTE_PIMPIGUISÍ_OBRA.pdf	04/07/2019
67	HITO 13 EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	11_PUENTE_CANUTO_SOBRE_EL_RÍO_GRANDE.pdf	11/02/2019
68	HITO 13 EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	10_PUENTE_PIMPIGUISI_SOBRE_EL_RÍO_CHICO.pdf	11/02/2019
69	HITO 13 EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	9_PUENTE_CANUTO_OBRA.pdf	01/03/2019
70	HITO 13 EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi	8_PUENTE_PIMPIGUISÍ_OBRA.pdf	01/03/2019
71	HITO 14 EJECUCIÓN: Implementación de actividades preliminares previo iniciar movimientos de tierra para	9_AEROPUERTO_ELOY_ALFARO_DE_MANTA.pdf	11/02/2019

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	la construcción del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10		
72	HITO 14 EJECUCIÓN: Implementación de actividades preliminares previo iniciar movimientos de tierra para la construcción del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	7_AEROPUERTO_DE_MANTA_OBRA.pdf	01/03/2019
73	HITO 14 EJECUCIÓN: Implementación de actividades preliminares previo iniciar movimientos de tierra para la construcción del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	7_AEROPUERTO_DE_MANTA_OBRA.pdf	06/06/2019
74	HITO 14 EJECUCIÓN: Implementación de actividades preliminares previo iniciar movimientos de tierra para la construcción del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10	7_AEROPUERTO_DE_MANTA_OBRA.pdf	04/07/2019
75	HITO 1: Plataformas Cantón Jaramijó: Contrato y sabanas de planillas 1 y 2.	Contrato_y_sabanas_planillas..rar	29/11/2016
76	HITO 2: Plataformas Cantón Chone: Contrato y sabanas de planillas 1 a 7.	Contratos_y_sabanas_de_plataforma_Chone_(1).pdf	01/12/2016
77	HITO 4: Plataformas Cantón Rocafuerte: Contrato y sabanas de planillas 1 a 4, Danzarín, Valdes.	Contratos_y_sabanas_de_plataforma_Rocafuerte.pdf	28/11/2016
78	HITO 4: Plataformas Cantón Rocafuerte: Contrato y sabanas de planillas Higuera.	Sabana_y_planilla_Higuera..rar	01/12/2016
79	HITO 5 EJECUCIÓN: Construcción de Hangar Provisional para mantener en operación el Aeropuerto Eloy Alfaro de la Provincia de Manabí	2_HANGAR_OBRA.pdf	05/02/2019
80	HITO 5 EJECUCIÓN: Construcción de Hangar Provisional para mantener en operación el Aeropuerto Eloy Alfaro de la Provincia de Manabí	1_HANGAR_PROVISIONAL_OBRA.pdf	01/03/2019
81	HITO 5 EJECUCIÓN: Construcción de Hangar Provisional para mantener en operación el Aeropuerto Eloy Alfaro de la Provincia de Manabí	1_HANGAR_PROVISIONAL_FISCA.pdf	01/03/2019
82	HITO 5 EJECUCIÓN: Construcción de Hangar Provisional para mantener en operación el Aeropuerto Eloy Alfaro de la Provincia de Manabí.	1_HANGAR_OBRA.pdf	05/06/2019
83	HITO 5 EJECUCIÓN: Construcción de Hangar Provisional para mantener en operación el Aeropuerto Eloy Alfaro de la Provincia de Manabí.	1_HANGAR_FISCA.pdf	05/06/2019
84	HITO 5 EJECUCIÓN: Construcción de Hangar Provisional para mantener en operación el Aeropuerto Eloy Alfaro de la Provincia de Manabí.	1_HANGAR_OBRA.pdf	04/07/2019
85	HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS CONCLUIDOS	SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_OBRA.pdf	05/12/2018
86	HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS CONCLUIDOS	3_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_OBRA.pdf	04/01/2019
87	HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS CONCLUIDOS	3SAN_PLACIDO_-_PICHINCHA_OBA_TERREMOTO__02-10-2018-041753.pdf	04/10/2018
88	HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS CONCLUIDOS	3SAN_PLACIDO_-_PICHINCHA_FISCA_TERREMOTO__02-10-2018-041838.pdf	04/10/2018
89	HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS CONCLUIDOS	3_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_OBRA.pdf	05/11/2018

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
90	HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS CONCLUIDOS	Memorando_Nro._MTOB-SUBZ4-2018-1384-ME_Solicitud_de_Recursos_Obras_de_Arrastre_y_C.C._Nuevos_de_Terremoto.pdf	05/11/2018
91	HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS EN EJECUCIÓN	3_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_TERREMOTO_OBRA_03-08-2018-063332.pdf	06/08/2018
92	HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS EN EJECUCIÓN	3_SAN_PLACIDO_TERRMOTO_OBRA_03-09-2018-040955.pdf	05/09/2018
93	HITO 5 EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí.	Contrato_1__planilla_1..rar	29/11/2016
94	HITO 51 CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA_PUENTE_SOBRE_EL_RÍO_03/2018.pdf	01/03/2019
95	HITO 6 EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí	3_SAN_PLÁCIDO_-_PÍCHINCHA_OBRA.pdf	05/02/2019
96	HITO 6 EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí	2_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_OBRA.pdf	01/03/2019
97	HITO 6 EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí	2_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_FISCA.pdf	01/03/2019
98	HITO 6 EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí.	2_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_OBRA.pdf	05/06/2019
99	HITO 6 EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí.	2_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_FISCA.pdf	05/06/2019
100	HITO 6 EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí.	2_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_OBRA.pdf	04/07/2019
101	HITO 6 EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí.	2_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_FISCA.pdf	04/07/2019
102	HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	4_MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA_03-09-2018-041134.pdf	05/09/2018
103	HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	4MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA__02-10-2018-041934.pdf	04/10/2018

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
104	HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	4MANTA_-_SAN_MATEO_FISCA_02-10-2018-042021.pdf	04/10/2018
105	HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	4_MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA.pdf	05/11/2018
106	HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	Memorando_Nro._MTOPE-SUBZ4-2018-1384-ME_Solicitud_de_Recursos_Obras_de_Arrastre_y_C.C._Nuevos_de_Terramoto.pdf	05/11/2018
107	HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA.pdf	05/12/2018
108	HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	4_MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA_02-08-2018-045539.pdf	06/08/2018
109	HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	4_MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA.pdf	04/01/2019
110	HITO 7 EJECUCIÓN: Contrato 2- Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí	4_MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA.pdf	05/02/2019
111	HITO 7 EJECUCIÓN: Contrato 2- Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí	3_MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA.pdf	01/03/2019
112	HITO 7 EJECUCIÓN: Contrato 2- Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí	3_MANTA_-_SAN_MATEO_FISCA.pdf	01/03/2019
113	HITO 7 EJECUCIÓN: Contrato 2- Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí.	3_MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA.pdf	05/06/2019
114	HITO 7 EJECUCIÓN: Contrato 2- Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí.	3_MANTA_-_SAN_MATEO_FISCA.pdf	05/06/2019
115	HITO 7 EJECUCIÓN: Contrato 2- Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí.	3_MANTA_-_SAN_MATEO_FISCA.pdf	04/07/2019
116	HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	PUENTE_JAMA_OBRA.pdf	05/12/2018
117	HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	1_PUENTE_JAMA_OBRA.pdf	04/01/2019
118	HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	1_PUENTE_JAMA_OBRA_03-09-2018-040301.pdf	05/09/2018
119	HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	1_PUENTE_JAMA_OBRA.pdf	05/11/2018
120	HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	Memorando_Nro._MTOPE-DF-2018-870-ME_Confirmación_Desembolso_Crédito_Chino_Jama_y_Bahia.pdf	05/11/2018
121	HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	Memorando_Nro._MTOPE-SUBZ4-2018-1384-ME_Solicitud_de_Recursos_Obras_de_Arrastre_y_C.C._Nuevos_de_Terramoto.pdf	05/11/2018
122	HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA RESPALDO DE TRABAJOS EJECUTADOS	1_PUENTE_JAMA_OBRA_02-08-2018-045225.pdf	06/08/2018
123	HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA RESPALDO DE TRABAJOS EJECUTADOS	1PUENE_JAMA_OBRA_02-10-2018-041211.pdf	04/10/2018
124	HITO 8 EJECUCIÓN: Contrato 3- Construcción puente Jama.	1_PUENTE_JAMA_OBRA.pdf	05/02/2019
125	HITO 8 EJECUCIÓN: Contrato 3- Construcción puente Jama.	11_PUENTE_JAMA_OBRA.pdf	05/06/2019



**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
126	HITO 8 EJECUCIÓN: Contrato 3- Construcción puente Jama.	11_PUENTE_JAMA_OBRA.pdf	04/07/2019
127	HITO 8 EJECUCIÓN: CONTRATO 4 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	1_PUENTE_JAMA_FISCA_03-09-2018-040352.pdf	05/09/2018
128	HITO 8 EJECUCIÓN: CONTRATO 4 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	1PUENE_JAMA_FISCA_02-10-2018-041257.pdf	04/10/2018
129	HITO 8 EJECUCIÓN: CONTRATO 4 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	1_PUENTE_JAMA_FISCA.pdf	05/11/2018
130	HITO 8 EJECUCIÓN: CONTRATO 4 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	PUENTE_JAMA_FISCA.pdf	05/12/2018
131	HITO 8 EJECUCIÓN: CONTRATO 4 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	1_PUENTE_JAMA_FISCA.pdf	04/01/2019
132	HITO 8 EJECUCIÓN: CONTRATO 4 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA	1_PUENTE_JAMA_FISCA_02-08-2018-045305.pdf	06/08/2018
133	HITO 9 EJECUCIÓN: Contrato 4- Fiscalización Construcción puente Jama.	1_PUENTE_JAMA_FISCA.pdf	05/02/2019
134	HITO 9 EJECUCIÓN: Contrato 4- Fiscalización Construcción puente Jama.	11_PUENTE_JAMA_FISCA.pdf	05/06/2019
135	HITO 9 EJECUCIÓN: Contrato 4- Fiscalización Construcción puente Jama.	11_PUENTE_JAMA_FISCA.pdf	04/07/2019
136	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA OFICIO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS	7_PRONUNCIAMIENTO_SUSPENCION_ACCESO_BAHIA_06-08-2018-060017.pdf	06/08/2018
137	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA OFICIO LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS	7_LEVANTAMIENTO_SUSPENSION_ACCESO_BAHIA.pdf	04/01/2019
138	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	7_ACCESO_BAHIA_OBRA_02-08-2018-045819.pdf	06/08/2018
139	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	7_ACCESO_BAHIA_OBRA_03-09-2018-041710.pdf	05/09/2018
140	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	7ACCESO_BAHIA_OBRA_02-10-2018-042602.pdf	04/10/2018
141	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	7_ACCESO_BAHÍA_OBRA.pdf	05/11/2018
142	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	Memorando_Nro._MTOB-SUBZ4-2018-1384-ME_Solicitud_de_Recursos_Obras_de_Arrastre_y_C.C._Nuevos_de_Terremoto.pdf	05/11/2018
143	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	Memorando_Nro._MTOB-DF-2018-870-ME_Confirmación_Desembolso_Crédito_Chino_Jama_y_Bahía.pdf	05/11/2018
144	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	ACCESO_BAHÍA_OBRA.pdf	05/12/2018
145	HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS	7_ACCESO_BAHÍA_OBRA.pdf	04/01/2019
146	SOLICITUD DE CAMBIO DE FASE DE EJECUCION A CONGELADO	MTOB-SUBZ4-2019-0145-ME.pdf	30/01/2019
147	SOLICITUD DE CAMBIO DE FASE DE EJECUCION A CONGELADO	MTOB-SUBSZ4-UIDT-2019-0013-ME.pdf	30/01/2019

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	Patrocinador ejecutivo.	Subsecretario Zonal 4	iganchozo@mtop.gob.ec	023974600
Macias Fuentes, Alberto Fabrizio	Titular	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Manabí	amacias@mtop.gob.ec	023974600
Tarabo Mieles, Tyron Xavier	Lider del proyecto.	Coordinador de Infraestructura	ttarabo@mtop.gob.ec	023974600

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
112636_1.jpg	23/01/2019
