

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 4
Dirección Provincial Manabí

PROYECTO: K084 MTOP - Proyecto de reconstrucción de obras por el terremoto 2016 - Manabí

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Líder del Proyecto: | Tarabo Mieles, Tyron Xavier (ttarabo@mtop.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando | Programas Relacionados: | Provincia - Manabí, PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE OBRAS POR EL TERREMOTO 2016 |
| Titular: | Vinces Navarrete, Julio Cesar | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 175200000.0000.381287 | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 4 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Media | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 180,895,062.05 |
| Localidad de Gestión: | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 02/05/2016 - 31/12/2020 |
| Fecha de última actualización: | 14/04/2020 | Fecha de Fin Base: | 30/12/2016 |
| Modificado por: | Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando | Fecha del siguiente Hito: | 21/12/2018 |

DATOS GENERALES

Descripción

Reconstrucción de obras de Infraestructura afectadas por el terremoto 16A-2016:
 - Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí.
 - Demoliciones en varios cantones de la provincia de Manabí.
 -Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí.
 -Construcción puente Jama.
 -Fiscalización Construcción puente Jama.
 -Reparación de la vía de Acceso a Bahía de Caraquez - canton sucre, provincia de manabi, en las abscisas 0+000 a 6+566 y 0+000 a 6+682
 -Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí.
 -Construcción de plataformas en varios cantones de la provincia de Manabí.
 Construcción del Puente Pimpiguasi sobre el Río Chico De 30 M de Longitud Ubicado en La Red Vial Estatal E384, Provincia De Manabí.
 Construcción del Puente Canuto sobre el Río Grande, de 40 m de Longitud ubicada en la Red Vial Estatal E384, de la Provincia de Manabí.
 Adaptabilidad para la Rehabilitación y Reconstrucción de la Infraestructura afectada por el Sismo del 16 de Abril Del 2016, en el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de La Ciudad de Manta, que Incluye la Construcción del Nuevo Terminal de Pasajeros, Torre de Control, Cerramiento Perimetral, Mantenimiento de Pista, Readecuación del APP y mobiliario para la edificación.

Beneficios Cualitativos

Mejorar el desplazamiento y comunicación entre los Cantones de la Provincia de Manabí , contribuir con la reconstrucción de edificaciones publicas y dotar de infraestructura aeroportuaria de caracter internacional a la provincia de Manabí.

Tipo de Beneficiario

Población de Manabí en general


Restricciones

Tiempo.- Duración de estado de excepción (15/12/2016).

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 85.63 %
 Fecha de Inicio: 02/05/2016 Fecha de Fin: 31/12/2020

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

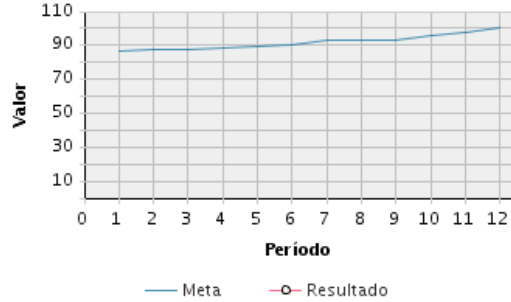

| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2020 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 87 % | 88 % | 88 % | 88 % | 89 % | 90 % | 93 % | 93 % | 93 % | 96 % | 98 % | 100 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 al 31 de Marzo 2020. -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena - TRABAJOS SUSPENDIDOS desde el 12 de diciembre 2019, debido a tramites de coordinación con la CNEL Manabí; adicionalmente a esto y luego de decretado el estado excepción por emergencia sanitaria y conforme al acuerdo Ministerial 012 del 20 de marzo 2020, el proyecto continua suspendido por temas sanitarios -Proyecto vía Manta - San Mateo.- TRABAJOS CONCLUIDOS Y RECIBIDOS DE FORMA PROVISIONAL el 29 de Noviembre del 2019, fecha a partir de la cual el proyecto se encuentra en periodo de mantenimiento -Proyecto Portoviejo - San Placido - Pichincha.-Etapa de mantenimiento de proyecto CONCLUIDA el mes de Noviembre 2019, a pesar de esto el proyecto no se ha recibido de forma definitiva debido a que la contratista debe efectuar correcciones a la ejecución de rubros de bacheo previo a su recepción definitiva; pago de planillas de mantenimiento se encuentran tramitadas sin embargo no han sido canceladas por falta de presentación de facturas de parte de la contratista, quien presenta problemas de deudas pendientes con el IEESS, que no le permiten actualizar facturero. -Proyecto Acceso a Bahía.- Trabajos SUSPENDIDOS a partir del 19 de marzo 2020 conforme a decreto presidencial de estado excepción por emergencia sanitaria. -Proyecto Construcción del Puente Jama.- TRABAJOS CONCLUIDOS, con acta de recepción definitiva, aún existen planillas pendientes de cancelación, en espera de asignación de recursos. -Aeropuerto de Manta.- TRABAJOS SUSPENDIDOS a partir del 20 de marzo 2020, esto luego de decretado el estado excepción por emergencia sanitaria y conforme al acuerdo Ministerial 012 del 20 de marzo 2020. -Puente Pimpiguasí y Puente Canuto: TRABAJOS CONCLUIDOS, inaugurados el 11 de marzo 2020. Existe pendiente de efectuar trámite administrativo en puente canuto para legalizar nuevo diseño de viga que fue autorizado para su ejecución y poder concluir la obra física. | Tarabo Mieles, Tyron Xavier | 01/04/2020 - 08:10 AM |
| 1 Enero al 23 de Marzo 2020. -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena - TRABAJOS SUSPENDIDOS desde el 12 de diciembre 2019, debido a tramites de coordinación con la CNEL Manabí; adicionalmente a esto y luego de decretado el estado excepción por emergencia sanitaria y conforme al acuerdo Ministerial 012 del 20 de marzo 2020, el proyecto continua suspendido por temas sanitarios -Proyecto vía Manta - San Mateo.- TRABAJOS CONCLUIDOS Y RECIBIDOS DE FORMA PROVISIONAL el 29 de Noviembre del 2019, fecha a partir de la cual el proyecto se encuentra en periodo de mantenimiento. -Proyecto Portoviejo - San Placido - Pichincha.-Etapa de mantenimiento de proyecto CONCLUIDA el mes de Noviembre 2019, a pesar de esto el proyecto no se ha recibido de forma definitiva debido a que la contratista debe efectuar correcciones a la ejecución de rubros de bacheo previo a su recepción definitiva; pago de planillas de mantenimiento se encuentran tramitadas sin embargo no han sido canceladas por falta de presentación de facturas de parte de | Tarabo Mieles, Tyron Xavier | 01/04/2020 - 08:09 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|----------------------------------|
| <p>la contratista, quien presenta problemas de deudas pendientes con el IEESS, que no le permiten actualizar facturero.</p> <p>-Proyecto Acceso a Bahía.- Trabajos SUSPENDIDOS a partir del 17 de marzo 2020 conforme a decreto presidencial de estado excepción por emergencia sanitaria.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente Jama.- TRABAJOS CONCLUIDOS, con acta de recepción definitiva, aún existen planillas pendientes de cancelación, en espera de asignación de recursos.</p> <p>-Aeropuerto de Manta.- TRABAJOS SUSPENDIDOS a partir del 20 de marzo 2020, esto luego de decretado el estado excepción por emergencia sanitaria y conforme al acuerdo Ministerial 012 del 20 de marzo 2020.</p> <p>-Puente Pimpiguasí y Puente Canuto: TRABAJOS CONCLUIDOS, inaugurados el 11 de marzo 2020. Existe pendiente de efectuar trámite administrativo en puente canuto para legalizar nuevo diseño de viga que fue autorizado para su ejecución y poder concluir la obra física; sin embargo esta no será planillada hasta que se formalice el trámite.</p> <p>Septiembre - Diciembre 2019.</p> <p>-Proyecto Montecristi - Jipijapa.- Trabajos en ejecución, su plazo de ejecución se extendió hasta el 24 de diciembre 2019, sin embargo los mismos fueron suspendidos el 12 de diciembre 2019, debido a trámites de coordinación con la CNEL Manabí que permitan efectuar movimiento de portes de iluminación</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo.- Trabajos concluidos y recibidos provisionalmente el 29 de Noviembre del 2019.</p> <p>-Proyecto Portoviejo - San Placido.-Proyecto concluido el mes de Noviembre 2019, a pesar de esto no se ha recibido de forma definitiva debido a que la contratista efectúa correcciones a la ejecución de rubros de bacheo entre los km 45 y 52 previo a su recepción definitiva; pago de planillas de la 1 a la 13 se encuentran tramitadas sin embargo no han sido canceladas debido a falta de presentación de facturas de parte de la contratista.</p> <p>-Proyecto Acceso a Bahía.- Con fecha 5 de julio de 2019, el administrador de contrato levanta la suspensión de Trabajos. Con fecha 12 de Agosto se suscribe contrato complementario para la Calle García Moreno, trabajos de su ejecución fueron suspendidos el mes octubre 2019, debido a falta de pago de anticipo, mismo que se efectivizó el mes de diciembre 2019, luego de lo cual se retomaron los trabajos.</p> <p>-Proyecto Puente Jama.- Trabajos concluidos, con acta de recepción definitiva, aún existen planillas pendientes de cancelación, en espera de asignación de recursos.</p> <p>-Aeropuerto de Manta.- Trabajos en ejecución. Con fecha 22 de noviembre de 2019 se suscribe con la Consultora Asociación AEROMANTA el Contrato de Fiscalización del Proyecto por un monto de USD 781.263,83 más IVA.</p> <p>-Puente Pimpiguasí y Puente Canuto: Trabajos en ejecución, fecha de terminación prevista para el 26 de febrero 2020.</p> | | |
| <p>Agosto 2019.</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Trabajos en normal ejecución.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo.- Trabajos en ejecución</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Proyecto en etapa de mantenimiento, se encuentra en trámite de pago planillas de mantenimiento de la 1 a la 5, y se tramita el pago del convenio de fiscalización, en espera de asignación de recursos para pago</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caráquez.-Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBSZ4-UETER-2019-204-ME, de fecha 5 de julio de 2019,el administrador de contrato levanta la suspensión de Trabajos, por lo que los trabajos actualmente se encuentran en normal ejecución. Con fecha 12 de Agosto se suscribe contrato complementario para la Calle García Moreno, trabajos en normal ejecución.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.- Trabajos concluidos, con acta de recepción definitiva, aún existen planillas pendientes de cancelación, en espera de asignación de recursos.</p> <p>-Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta.- Trabajos en ejecución, planillas se encuentran trámite de pago</p> <p>-Puente Pimpiguasí y Puente Canuto: Trabajos en ejecución, planillas se encuentran trámite de pago</p> | <p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p> | <p>03/09/2019 - 04:29 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--|----------------------------------|
| <p>Junio 2019.</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Trabajos en normal ejecución.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo.- Trabajos en ejecución</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Proyecto en etapa de mantenimiento, se encuentra en trámite de pago planillas de mantenimiento de la 1 a la 5, y se tramita el pago del convenio de fiscalización, en espera de asignación de recursos para pago</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caráquez.-Trabajos suspendidos, según Memorando MTOP-SUBSZ4-UETR-2019-73A-ME, en espera de asignación de recursos para el pago de las planillas pendientes de cancelación.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.- Trabajos concluidos, con acta de recepción definitiva, aún existen planillas pendientes de cancelación, en espera de asignación de recursos.</p> <p>-Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta.- Trabajos en ejecución, planillas se encuentran trámite de pago</p> <p>-Puente Pimpiguasí y Puente Canuto: Trabajos en ejecución, planillas se encuentran trámite de pago</p> | <p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p> | <p>04/07/2019 - 11:03 AM</p> |
| <p>Mayo 2019.</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Trabajos en normal ejecución.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo.- Con fecha 20 de Mayo de 2019, se firma contrato complementario para la reparación del Talud afectado por el sismo del 3 de diciembre de 2017, sin embargo aun el proyecto no se encuentra en ejecución en razón de que el inicio de los trabajos es a partir de la entrega del anticipo, el cual se encuentra en trámite.</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Proyecto en etapa de mantenimiento, se encuentra en trámite de pago planillas de mantenimiento de la 1 a la 5, y se tramita el pago del convenio de fiscalización, en espera de asignación de recursos para pago</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caráquez.-Trabajos suspendidos, según Memorando MTOP-SUBSZ4-UETR-2019-73A-ME, en espera de asignación de recursos para el pago de las planillas pendientes de cancelación.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.- Trabajos concluidos, con acta de recepción definitiva, aún existen planillas pendientes de cancelación, en espera de asignación de recursos.</p> <p>-Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta.- Trabajos en ejecución, planillas se encuentran trámite de pago</p> <p>-Puente Pimpiguasí y Puente Canuto: Trabajos en ejecución, planillas se encuentran trámite de pago</p> | <p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p> | <p>05/06/2019 - 10:47 AM</p> |
| <p>MARZO 2019.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Los trabajos se encuentran suspendidos, ya que se encuentra en trámite de inclusión al PAI 2019 para la solicitud de asignación de recursos para el contrato complementario 2 motivo por el cual se suspendieron los trabajos.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo.- Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2019-307-ME de fecha 14 de marzo de 2019, suscrito por la Dra. Alexandra Muñoz Coordinadora General de Planificación informa a esta Subsecretaría que el Proyecto de Obras de Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de Abril de 2016 ya se encuentra incluido en el PAI 2019, actualmente se tramita la asignación de recursos para continuar con el trámite de la reparación del talud afectado.</p> | <p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p> | <p>05/04/2019 - 04:07 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--|----------------------------------|
| <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Proyecto en etapa de mantenimiento hasta el 12 de noviembre de 2019, con Memorando Nro. MTOP-CGP-2019-307-ME de fecha 14 de marzo de 2019, suscrito por la Dra. Alexandra Muñoz Coordinadora General de Planificación informa a esta Subsecretaría que el Proyecto de Obras de Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de Abril de 2016 ya se encuentra incluido en el PAI 2019, actualmente se tramita la asignación de recursos .</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caráquez.- Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2019-307-ME de fecha 14 de marzo de 2019, suscrito por la Dra. Alexandra Muñoz Coordinadora General de Planificación informa a esta Subsecretaría que el Proyecto de Obras de Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de Abril de 2016 ya se encuentra incluido en el PAI 2019, actualmente se tramita la asignación de recursos. Trabajos en ejecución</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.- Trabajos concluidos, con acta de recepción definitiva, aún existen planillas pendientes de cancelación, se encuentra en trámite la inclusión al PAI 2019 para la asignación de recurso.</p> <p>-Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta.- Con fecha 23 de Noviembre de 2018, se suscribe el contrato modificatorio al contrato original del 30 de noviembre de 2017 del contrato multimodal de los Proyectos Aeropuerto de Manta, Puente Pimpiguasí y Puente Canuto, el mismo en la cláusula cuarta establece que el inicio y terminación de las obras rige a partir de la fecha de suscripción del contrato midificatorio; es decir desde el 23 de Noviembre de 2018 con un plazo de 608 días calendarios.</p> <p>-Puente Pimpiguasí.- Con fecha 23 de Noviembre de 2018, se suscribe el contrato modificatorio al contrato original del 30 de noviembre de 2017 del contrato multimodal de los Proyectos Aeropuerto de Manta, Puente Pimpiguasí y Puente Canuto, el mismo en la cláusula cuarta establece que el inicio y terminación de las obras rige a partir de la fecha de suscripción del contrato midificatorio; es decir desde el 23 de Noviembre de 2018 con un plazo de 608 días calendarios.</p> <p>-Puente Canuto.- Con fecha 23 de Noviembre de 2018, se suscribe el contrato modificatorio al contrato original del 30 de noviembre de 2017 del contrato multimodal de los Proyectos Aeropuerto de Manta, Puente Pimpiguasí y Puente Canuto, el mismo en la cláusula cuarta establece que el inicio y terminación de las obras rige a partir de la fecha de suscripción del contrato midificatorio; es decir desde el 23 de Noviembre de 2018 con un plazo de 608 días calendarios.</p> | | |
| <p>ENERO 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Los trabajos se encuentran suspendidos, ya que se encuentra en trámite de inclusión al PAI 2019 para la solicitud de asignación de recursos para el contrato complementario 2 motivo por el cual se suspendieron los trabajos.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - Los trabajos de mitigación del Proyecto Manta - San Meto se ejecutaran bajo la modalidad de contrato complementario, al presente reporte se encuentra en espera de asignación de recursos, los mismos que fueron solicitados en la inclusión al PAI 2019; el cual al presente reporte se encuentra en trámite.</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Trabajos finalizados (proyecto en período de prueba) y en etapa de mantenimiento, contrato complementario de fiscalizacion en trámite para asignación de recursos los cuales fueron solicitados en la inclusión al PAI 2019, el cual al presente reporte se encuentra en trámite.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caráquez. Al presente reporte los trabajos se encuentran en normal ejecución.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.- Trabajos concluidos, con acta de recepción definitiva, aún existen planillas pendientes de cancelación, se encuentra en trámite la inclusión al PAI 2019 para la asignación de recursos</p> | <p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p> | <p>01/03/2019 - 04:09 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|----------------------------------|
| <p>ENERO 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Los trabajos se encuentran suspendidos, con Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1540-ME y Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1540-ME, ambos de fecha 29 de Noviembre de 2018, suscrito por el Subsecretario Zonal 4 Ing. Iván Ganchozo solicita aval de obra y fiscalización respectivamente para el financiamiento del contrato complementario 2 motivo por el cual se suspendieron los trabajos.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - Los trabajos de mitigación del Proyecto Manta - San Meto se ejecutaran bajo la modalidad de contrato complementario, al presente reporte se encuentra en espera de asignación de recursos, los mismos que fueron solicitados en la inclusión al PAI 2019; el cual al presente reporte se encuentra en trámite</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Trabajos finalizados (proyecto en período de prueba) y en etapa de mantenimiento, contrato complementario de fiscalización en trámite para asignación de recursos los cuales fueron solicitados en la inclusión al PAI 2019, el cual al presente reporte se encuentra en trámite.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caráquez. Al presente reporte los trabajos se encuentran en normal ejecución.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.- Trabajos concluidos, con acta de recepción definitiva, aún existen planillas pendientes de cancelación, se encuentra en trámite la inclusión al PAI 2019 para la asignación de recursos.</p> | <p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p> | <p>05/02/2019 - 09:40 AM</p> |
| <p>DECEMBER 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Los trabajos se encuentran suspendidos, con Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1540-ME y Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1540-ME, ambos de fecha 29 de Noviembre de 2018, suscrito por el Subsecretario Zonal 4 Ing. Iván Ganchozo solicita aval de obra y fiscalización respectivamente para el financiamiento del contrato complementario 2 motivo por el cual se suspendieron los trabajos.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - Los trabajos de mitigación del Proyecto Manta - San Meto se ejecutaran bajo la modalidad de contrato complementario, al presente reporte se encuentra en espera de asignación de recursos, por la reducción de presupuesto que el MEF efectuó en el mes de julio, los cuales fueron solicitados mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME, de fecha 29 de octubre 2018</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Trabajos finalizados (proyecto en período de prueba), contrato complementario de fiscalización en trámite para asignación de recursos los cuales fueron solicitados mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME, de fecha 29 de octubre 2018.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caráquez. Con fecha 21 de diciembre de 2018, el Ing. Stewar Durán en calidad de administrador de contrato, informa al contratista que en virtud de que el MEF ha efectuado la cancelación de las planillas pendientes de pago de la 10 a la 14, se reinicien los trabajos, por lo que al presente los trabajos se encuentran en normal ejecución.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.- Trabajos concluidos, cuenta con acta de recepción provisional, se encuentra en período de prueba (a la fecha aún el acta de recepción definitiva se encuentra en trámite en vista e que el MEF efectuó un recorte de presupuesto y no se cuenta con el recurso necesario para le pago del IVA con ley de solidaridad, razón por la cual aún se encuentran pendiente de pago las planillas de liquidación, recurso que se solicitó mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME de fecha 29 de octubre de 2018), ya que con Memorando MTOP-DF-2018-870, de fecha 19 de septiembre el Director financiero confirma el desembolso del crédito chino por parte del MEF</p> | <p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p> | <p>04/01/2019 - 02:10 PM</p> |
| <p>OCTUBRE 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> | <p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p> | <p>05/12/2018 - 10:34 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--|----------------------------------|
| <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Los trabajos se encuentran suspendidos, con Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1540-ME y Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1540-ME, ambos de fecha 29 de Noviembre de 2018, suscrito por el Subsecretario Zonal 4 Ing. Iván Ganchozo solicita aval de obra y fiscalización respectivamente para el financiamiento del contrato complementario 2 motivo por el cual se suspendieron los trabajos.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - Los trabajos de mitigación del Proyecto Manta - San Meto se ejecutaran bajo la modalidad de contrato complementario, al presente reporte se encuentra en espera de asignación de recursos, por la reducción de presupuesto que el MEF efectuó en el mes de julio, los cuales fueron solicitados mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME, de fecha 29 de octubre 2018</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Trabajos finalizados (proyecto en período de prueba), contrato complementario de fiscalización en trámite para asignación de recursos los cuales fueron solicitados mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME, de fecha 29 de octubre 2018.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caráquez. Con fecha 24 de julio de 2018, mediante Oficio MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF se suspenden los trabajos debido al no pago de planillas, con Memorando Nro.MTOP-SUBSZ4-UETR-2018-196-ME de fecha 6 de agosto de 2018 suscrito por el Ing. Stewar Durán en calidad de administrador de contrato, dirigido al Ing. Diofre Alcívar Subsecretario Zonal 4, informa que mediante Memorando Nro.MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF dirigido al Contratista de la obra se aprueba la suspensión de plazo de la ejecución de los trabajos hasta que el proyecto se reactive económicamente, ya que hasta la fecha no se ha cancelado las planillas en trámite del 10 a la 17, el MEF efectuó un recorte de presupuesto y no se cuenta con el recurso necesario para le pago del IVA con ley de solidaridad, razón por la cual aún se encuentran pendiente de pago las planillas de liquidación, recurso que se solicitó mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME de fecha 29 de octubre de 2018), ya que con Memorando MTOP-DF-2018-870, de fecha 19 de septiembre el Director financiero confirma el desembolso del crédito chino por parte del MEF</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.- Trabajos concluidos, cuenta con acta de recepción provisional, se encuentra en período de prueba (a la fecha aún el acta de recepción definitiva se encuentra en trámite en vista e que el MEF efectuó un recorte de presupuesto y no se cuenta con el recurso necesario para le pago del IVA con ley de solidaridad, razón por la cual aún se encuentran pendiente de pago las planillas de liquidación, recurso que se solicitó mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME de fecha 29 de octubre de 2018), ya que con Memorando MTOP-DF-2018-870, de fecha 19 de septiembre el Director financiero confirma el desembolso del crédito chino por parte del MEF</p> | | |
| <p>OCTUBRE 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Con fecha 9 de septiembre del 2018 se suspenden los trabajos, la suspensión se levantará toda vez que se suscriban los actos administrativos en trámite. Adicionalmente se tramita suscripcion de complementario de consultoria para la fiscalizacion por un valor total de 234.254,70. MAS IVA. Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME, se solicita recursos para los contratos complementarios.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la via Manta - Los trabajos de mitgación del Proyecto Manta - San Meto se ejecutaran bajo la modalidad de contrato complementario, al presnte reporte se encuentra en espera de asignación de recursos, por la reducción de presueto que el MEF efectuó en el mes de julio, los cuales fueron solicitados mediante Memotando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME, de fecha 29 de octubre 2018</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Trabajos finalizados (proyecto en período de prueba), contrato complementario de fiscalizacion en trámite para asignación de recursos los cuales fueron solicitados mediante Memotando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME, de fecha 29 de octubre 2018.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. Con fecha 24 de julio de 2018, mediante Oficio MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF se suspenden los trabajos debido al no pago de planillas, con Memorando Nro.MTOP-SUBSZ4-UETR-2018-196-ME de fecha 6 de agosto de 2018 suscrito por el Ing. Stewar Durán en calidad de adminstrador de contrato, dirigido</p> | <p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p> | <p>05/11/2018 - 09:47 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--|----------------------------------|
| <p>al Ing. Diofre Alcívar Subsecretario Zonal 4, informa que mediantr Memorando Nro.MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF dirigido al Contratista de la obra se aprueba la suspensión de plazo de la ejecución de los trabajos hasta que el proyecto se reactive económicamente, ya que hasta la fecha no se ha cancelado las planillas en trámite de l 10 a la 17, el MEF efectuó un recorte de presupuesto y no se cuenta con el ecurso necesario para le pago del IVA con ley de solidaridad, razón por la cual aún se encuentran pendiente de pago las planillas de liquidación, recurso que se olicitó mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME de fecha 29 de octubre de 2018), ya que con Memorando MTOP-DF-2018-870, de fecha 19 de septiembre el Director financiero confirma el desembolso del crédito chino por parte del MEF</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.-rabajos concluidos, cuenta con acta de recepción provisional, se encuentra en período de prueba (a la fecha aún el acta de recepción definitiva se encuentra en trámite en vista e que el MEF efectuó un recorte de presupuesto y no se cuenta con el recurso necesario para le pago del IVA con ley de solidaridad, razón por la cual aún se encuentran pendiente de pago las planillas de liquidación, recurso que se olicitó mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-2018-1384-ME de fecha 29 de octubre de 2018), ya que con Memorando MTOP-DF-2018-870, de fecha 19 de septiembre el Director financiero confirma el desembolso del crédito chino por parte del MEF</p> | | |
| <p>Septiembre 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Con fecha 9 de septiembre del 2018 se suspenden los trabajos, la suspensión se levantará toda vez que se suscriban los actos administrativos en trámite. Adicionalmente se tramita suscripcion de complementario de consultoria para la fiscalizacion por un valor total de 234.254,70. MAS IVA.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la via Manta - San Mateo de 9 km de longitud.- Proyecto concluido en octubre de 2017 y se econtraba en tramite de recepcion provisional de la obra; sin embargo con fecha 5 de diciembre 2017 se presentaron fallas en los taludes del proyecto por el sismo del 3 de diciembre de 2017, ante lo cual la contratista efectuó a su costo las remediaciones inmediatas, que permitieron dar transitabilidad a la vía. Con Memorando MTOP-SUBSZ4-UETR-2018-182-ME de fecha 10 de julio 2018, la supervisión de estudios zonal 4 , valida la alternativa de remediación definitiva al proyecto, misma que fue presentada por la fiscalización contratada Esta intervencion tiene un costo de 1'714213,50 MAS IVA, trabajos que incluidos los servicios de fiscalización alcanzan un total de 1'804.552,55 mas iva, resultando un monto total requerido incluido iva de 2'021.098,86 USD. Al presente se encuentra en espera de asignación de recursos para continuar con el trámite respectivo de la ejecución de los trabajos de remedicación inmediata.</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Con fecha 21 de mayo del 2018 se levanta suspensión del proyecto y se reinician trabajos mismos que debían ser culminados el 10 de junio del 2018. Sin embargo con la suscripcion de la orden de cambio # 3 al proyecto a traves del cual se legaliza un incremento contractual a la ejecución de obras por un valor de 1'899.006,93 USD mas iva , se autoriza la implementacion de 90 dias adicionales que extienden la fecha de terminación de los trabajos para el 08-09-2018, los trabajos a la presente fecha se encuentran concluidos, por lo que el proyecto entra en período de prueba (6meses); previo a la suscripción del acta de recepción definitiva.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. Con orden de cambio No. 4 de fecha 07 de febrero de 2018, se legaliza el incremento del plazo contractual en 90 días, contados a partir del 09 de Junio 2018, por lo que la fecha para la terminación de los trabajos se la estableció para el 08 de Septiembre de 2018; sin embargo con fecha 24 de julio de 2018, mediante Oficio MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF se suspenden los trabajos debido al no pago de planillas, en vista de que a la fecha aún no se ha efectuado el desembolso del Crédito Chino con el cual el proyecto se encuentra financiado por parte de MEF.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.-Trabajos finalizados y recibido provisionalmente, se encuentran pendientes de cancelar las planillas 9-10-11 de obra y fiscalizacion a la fecha aún no se ha efectuado el desembolso del Crédito Chino con el cual el proyecto se encuentra financiado por parte de MEF</p> | <p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p> | <p>04/10/2018 - 08:10 AM</p> |
| <p>Agosto 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Con fecha 8 de junio del 2018 se levanta suspensión del proyecto y se reinician los trabajos , toda vez que se suscribe contrato complementario por 3'003.265,33 USD MAS IVA, otorgando</p> | <p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p> | <p>05/09/2018 - 11:28 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--|----------------------------------|
| <p>ademas un plazo de ejecucion de 90 dias contados a partir del reinicio de los trabajos; esto es hasta el 6-09-2018. Adicionalmente se tramita suscripcion de complementario de consultoria para la fiscalizacion por un valor total de 234.254,70. MAS IVA.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la via Manta - San Mateo de 9 km de longitud.- Proyecto concluido en octubre de 2017 y se econtraba en tramite de recepcion provisional de la obra; sin embargo con fecha 5 de diciembre 2017 se presentaron fallas en los taludes del proyecto por el sismo del 3 de diciembre de 2017, ante lo cual la contratista efectuó a su costo las remediaciones inmediatas, que permitieron dar transitabilidad a la vía. Con Memorando MTOP-SUBSZ4-UETR-2018-182-ME de fecha 10 de julio 2018, la supervisión de estudios zonal 4 , valida la alternativa de remediación definitiva al proyecto, misma que fue presentada por la fiscalización contratada Esta intervencion tiene un costo de 1'714213,50 MAS IVA, trabajos que incluidos los servicios de fiscalización alcanzan un total de 1'804.552,55 mas iva, resultando un monto total requerido incluido iva de 2'021.098,86 USD. Al presente se encuentra en espera de asignación de recursos para continuar con el trámite respectivo de la ejecución de los trabajos de remedicación inmediata.</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Con fecha 21 de mayo del 2018 se levanta suspensión del proyecto y se reinician trabajos mismos que debían ser culminados el 10 de junio del 2018. Sin embargo con la suscripcion de la orden de cambio # 3 al proyecto a traves del cual se legaliza un incremento contractual a la ejecucion de obras por un valor de 1'899.006,93 USD mas iva , se autoriza la implementacion de 90 dias adicionales que extienden la fecha de terminación de los trabajos para el 08-09-2018 y a la fecha se tramita el incremento de 118.118,23 USD mas iva para los trabajos de fiscalización complementarios, los mismos que se encuentran en espera de asignación de recursos.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. Con orden de cambio No. 4 de fecha 07 de febrero de 2018, se legaliza el incremento del plazo contractual en 90 días, contados a partir del 09 de Junio 2018, por lo que la fecha para la terminación de los trabajos se la estableció para el 08 de Septiembre de 2018; sin embargo con fecha 24 de julio de 2018, mediante Oficio MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF se suspenden los trabajos debido al no pago de planillas, en vista de que a la fecha aún no se ha efectuado el desembolso del Crédito Chino con el cual el proyecto se encuentra financiado por parte de MEF.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.-Trabajos finalizados y recibido provisionalmente, se encuentran pendientes de cancelar las planillas 9-10-11 de obra y fiscalizacion a la fecha aún no se ha efectuado el desembolso del Crédito Chino con el cual el proyecto se encuentra financiado por parte de MEF.</p> | | |
| <p>JULIO 2018.- Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM)..- Con fecha 8 de junio del 2018 se levanta suspensión del proyecto y se reinician los trabajos , toda vez que se suscribe contrato complementario por 3'003.265,33 USD MAS IVA, otorgando ademas un plazo de ejecucion de 90 dias contados a partir del reinicio de los trabajos; esto es hasta el 6-09-2018. Adicionalmente se tramita suscripcion de complementario de consultoria para la fiscalizacion por un valor total de 234.254,70. MAS IVA.</p> <p>-Proyecto Rehabilitación de la via Manta - San Mateo de 9 km de longitud.- Proyecto concluido en octubre de 2017 y se econtraba en tramite de recepcion provisional de la obra; sin embargo con fecha 5 de diciembre 2017 se presentaron fallas en los taludes del proyecto por el sismo del 3 de diciembre de 2017, ante lo cual la contratista efectuó a su costo las remediaciones inmediatas, que permitieron dar transitabilidad a la vía. Con Memorando MTOP-SUBSZ4-UETR-2018-182-ME de fecha 10 de julio 2018, la supervisión de estudios zonal 4 , valida la alternativa de remediación definitiva al proyecto, misma que fue presentada por la fiscalización contratada Esta intervencion tiene un costo de 1'714213,50 MAS IVA, trabajos que incluidos los servicios de fiscalización alcanzan un total de 1'804.552,55 mas iva, resultando un monto total requerido incluido iva de 2'021.098,86 USD.</p> <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud.-Con fecha 21 de mayo del 2018 se levanta suspensión del proyecto y se reinician trabajos mismos que debían ser culminados el 10 de junio del 2018. Sin embargo con la suscripcion de la orden de cambio # 3 al proyecto a traves del cual se legaliza un incremento contractual a la ejecucion de obras por un valor de 1'899.006,93 USD mas iva , se autoriza la implementacion de 90 dias adicionales que extienden la</p> | <p>Tarabo Mieles, Tyron Xavier</p> | <p>06/08/2018 - 06:35 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--|----------------------------------|
| <p>fecha de terminación de los trabajos para el 08-09-2018 y a la fecha se tramita el incremento de 118.118,23 USD mas iva para los trabajos de fiscalización complementarios.</p> <p>-Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. Con orden de cambio No. 4 de fecha 07 de febrero de 2018, se legaliza el incremento del plazo contractual en 90 días, contados a partir del 09 de Junio 2018, por lo que la fecha para la terminación de los trabajos se la estableció para el 08 de Septiembre de 2018; sin embargo con fecha 24 de julio de 2018, mediante Oficio MTOP-SUBSZ4-UETR-18-12-OF se suspenden los trabajos debido al no pago de planillas, en vista de que a la fecha aún no se ha efectuado el desembolso del Crédito Chino con el cual el proyecto se encuentra financiado por parte de MEF.</p> <p>-Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.-Trabajos finalizados y recibido provisionalmente, se encuentran pendientes de cancelar las planillas 9-10-11 de obra y fiscalización</p> | | |
| <p>Junio 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p> | <p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p> | <p>05/07/2018 - 05:12 PM</p> |
| <p>Mayo 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p> | <p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p> | <p>05/07/2018 - 05:12 PM</p> |
| <p>Abril 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p> | <p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p> | <p>05/07/2018 - 05:11 PM</p> |
| <p>Marzo 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p> | <p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p> | <p>05/07/2018 - 05:10 PM</p> |
| <p>Febrero 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p> | <p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p> | <p>05/07/2018 - 05:10 PM</p> |
| <p>Enero 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM).</p> | <p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p> | <p>05/07/2018 - 05:09 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--|-------------------------------|
| <p>-Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p> | | |
| <p>Diciembre 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p> | <p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p> | <p>05/07/2018 - 05:09 PM</p> |
| <p>Noviembre 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p> | <p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p> | <p>05/07/2018 - 05:09 PM</p> |
| <p>Octubre 2017: Los proyectos de reconstrucción están en su fase final de ejecución:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p> | <p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p> | <p>14/11/2017 - 03:02 PM</p> |
| <p>Septiembre 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona En el mes de mayo se continúa con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p> | <p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p> | <p>14/11/2017 - 03:02 PM</p> |
| <p>Agosto 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona. En el mes de mayo se continúa con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p> | <p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p> | <p>14/11/2017 - 03:01 PM</p> |
| <p>Julio 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona. En el mes de mayo se continúa con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE:</p> | <p>Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando</p> | <p>14/11/2017 - 03:01 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p> | | |
| <p>Junio 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona. En el mes de mayo se continua con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales</p> | Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando | 14/11/2017 - 03:01 PM |
| <p>Mayo 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona. En el mes de mayo se continua con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</p> | Vera Vera, José Ricardo | 08/06/2017 - 10:15 AM |
| <p>Abril 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona. En el mes de abril se continua con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</p> | Vera Vera, José Ricardo | 08/06/2017 - 10:14 AM |
| <p>Marzo 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona. En el mes de marzo se continua con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE.:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Río Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</p> | Vera Vera, José Ricardo | 11/04/2017 - 02:30 PM |
| <p>Febrero 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona. En el mes de febrero se continua con los trabajos de construcción de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE.:</p> <p>-Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</p> | Vera Vera, José Ricardo | 11/04/2017 - 02:29 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------|-------------------------------|
| <p>-Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</p> | | |
| <p>Enero 2017: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona. En el mes de enero se continua con los trabajos de reparación emergente de varios tramos de la RVE.: -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</p> | Vera Vera, José Ricardo | 11/04/2017 - 02:26 PM |
| <p>Diciembre 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona. En el mes de noviembre se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE.: -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</p> | Vera Vera, José Ricardo | 11/04/2017 - 02:25 PM |
| <p>Noviembre 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona. En el mes de noviembre se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE.: -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</p> | Vera Vera, José Ricardo | 08/12/2016 - 08:57 AM |
| <p>Octubre 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona. En el mes de octubre se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE.: -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales.</p> | Vera Vera, José Ricardo | 08/12/2016 - 08:56 AM |
| <p>Septiembre 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona. En el mes de septiembre se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, y en la reparación emergente de varios tramos de la RVE.: -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud.</p> | Vera Vera, José Ricardo | 08/12/2016 - 08:55 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------|-------------------------------|
| -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales. | | |
| Agosto 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona. En el mes de julio se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, contrata la reparación emergente de varios tramos de la RVE.: -Proyecto Vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 KM). -Proyecto Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud. -Proyecto Terminación de Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud. -Proyecto Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caraquez. -Proyecto Construcción del Puente sobre el Rio Jama ubicado en la ciudad de Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente Pedernales. | Vera Vera, José Ricardo | 08/12/2016 - 08:52 AM |
| Julio 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona. En el mes de julio se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. | Vera Vera, José Ricardo | 08/12/2016 - 08:48 AM |
| Junio 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona. En el mes de junio se continua con los trabajos de construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. | Vera Vera, José Ricardo | 08/12/2016 - 08:42 AM |
| Mayo 2016: A partir del desastre natural del terremoto de 16 abril 2016, se empleó un sistema nacional descentralizado de emergencias, que sirve para alertar futuras réplicas e implementar la reconstrucción de la zona. En el mes de mayo se inicia la construcción de plataformas en varios cantones de la Provincia como parte del proceso de reconstrucción. | Vera Vera, José Ricardo | 08/12/2016 - 08:42 AM |

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Problema | Fecha de última actualización | Responsable | Urgencia | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|
| 5 Recursos Economico | 06/04/2020 | Tyron Xavier Tarabo Miele | 10 | 10 | 1 | 1/1 |

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|---------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 1- INTERNACIONAL.Ambiental. Emergencia sanitaria COVID 19 ocasionaría que los trabajos no se concluyan dentro de los plazos contractuales de obra | 05/04/2020 | Tyron Xavier Tarabo Miele | 50 % | 50 | 25 | 2/2 |

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|--|
| 1 | Zona 4 - Pacifico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | DEFINICION: Declaratoria estado de excepción por sismo 16 de abril 2016, mediante decretos ejecutivos 1001 y 1002 de fechas 17 y 18 de abril 2016 | 5-Entregables Intermedios | 02/05/2016 | | 17/04/2017 | | Sí | 10.0 |
| 2 | PLANEACION: Postulacion y Priorización de parte de Secretaría Técnica de la Reconstrucción y Reactivación Productiva de los proyectos a ejecutar. | 5-Entregables Intermedios | 02/05/2016 | | 22/05/2017 | | Sí | 10.0 |
| 3 | EJECUCIÓN: Demolición y Remoción de escombros de edificaciones afectadas por el sismo 16 A en la provincia de Manabí | 5-Entregables Intermedios | 03/05/2016 | | 07/01/2018 | | Sí | 5.0 |
| 4 | EJECUCIÓN: Construcción de Plataformas en varios cantones de la provincia de Manabí | 5-Entregables Intermedios | 25/11/2016 | | 07/07/2018 | | Sí | 3.0 |
| 5 | EJECUCIÓN: Construcción de Hangar Provisional para mantener en operación el Aeropuerto Eloy Alfaro de la Provincia de Manabí. | 5-Entregables Intermedios | 03/03/2017 | | 01/07/2017 | | Sí | 2.0 |
| 6 | EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí. | 5-Entregables Intermedios | 05/03/2017 | 21/12/2018 | | | No | 10.0 |
| 7 | EJECUCIÓN: Contrato 2- Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí. | 5-Entregables Intermedios | 06/03/2017 | | 21/12/2018 | | Sí | 3.0 |
| 8 | EJECUCIÓN: Contrato 3- Construcción puente Jama. | 5-Entregables Intermedios | 09/04/2017 | | 29/01/2018 | | Sí | 4.0 |
| 9 | EJECUCIÓN: Contrato 4- Fiscalización Construcción puente Jama. | 5-Entregables Intermedios | 09/04/2017 | | 21/12/2018 | | Sí | 1.0 |
| 10 | EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía | 5-Entregables Intermedios | 09/05/2017 | 21/12/2018 | | | No | 10.0 |
| 11 | EJECUCIÓN: Contrato 6- Fiscalización Reparación de la Vía Acceso a Bahía | 5-Entregables Intermedios | 09/05/2017 | | 21/12/2018 | | Sí | 2.0 |
| 12 | EJECUCIÓN: Contrato 7- Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí. | 5-Entregables Intermedios | 15/09/2017 | 21/12/2018 | | | No | 10.0 |
| 13 | EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes | 5-Entregables Intermedios | 01/01/2019 | | 31/01/2019 | | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi | | | | | | | |
| 14 | EJECUCIÓN: Implementación de actividades preliminares previo iniciar movimientos de tierra para la construcción del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 5-Entregables Intermedios | 01/01/2019 | | 31/01/2019 | | Sí | 0.25 |
| 15 | EJECUCIÓN: Movimientos de tierra para la construcción de la cimentación de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 5-Entregables Intermedios | 01/02/2019 | | 28/02/2019 | | Sí | 0.5 |
| 16 | EJECUCIÓN: Suministro y Fabricación de pilotes apoyo izquierdo para la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi | 5-Entregables Intermedios | 01/02/2019 | | 28/02/2019 | | Sí | 0.5 |
| 17 | EJECUCIÓN: Estructura de Hormigon Armado para la construcción de la cimentación del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 5-Entregables Intermedios | 01/03/2019 | | 31/03/2019 | | Sí | 0.5 |
| 18 | EJECUCIÓN: Suministro y Fabricación de pilotes apoyo derecho para la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi | 5-Entregables Intermedios | 01/03/2019 | | 31/03/2019 | | Sí | 0.5 |
| 19 | EJECUCIÓN: Estructura de Hormigon Armado para la construcción de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 5-Entregables Intermedios | 01/04/2019 | | 30/04/2019 | | Sí | 1.5 |
| 20 | EJECUCIÓN: Hincado de pilotes apoyo derecho para la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi | 5-Entregables Intermedios | 01/04/2019 | | 30/04/2019 | | Sí | 0.5 |
| 21 | EJECUCIÓN: Hincado de pilotes apoyo izquierdo para la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi | 5-Entregables Intermedios | 01/05/2019 | | 31/05/2019 | | Sí | 0.5 |
| 22 | EJECUCIÓN: Instalaciones Sanitarias para la construcción de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 5-Entregables Intermedios | 01/05/2019 | | 31/05/2019 | | Sí | 0.5 |
| 23 | EJECUCIÓN: Construcción de Infraestructura de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi | 5-Entregables Intermedios | 01/06/2019 | | 30/06/2019 | | Sí | 2.5 |
| 24 | EJECUCIÓN: Instalaciones Electricas para la construcción de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 5-Entregables Intermedios | 01/06/2019 | 30/06/2019 | | | No | 0.5 |
| 25 | EJECUCIÓN: Construcción de Superestructura de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi | 5-Entregables Intermedios | 01/07/2019 | | 31/07/2019 | | Sí | 2.5 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 26 | EJECUCIÓN: Instalaciones Electronicas para la construcción de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 5-Entregables Intermedios | 01/07/2019 | 31/07/2019 | | | No | 0.5 |
| 27 | EJECUCIÓN: Derrocamiento y Retiro de estructuras existentes de antiguos puentes Contrato 9 Pimpiguasi y Contrato 8 Canuto | 5-Entregables Intermedios | 01/08/2019 | | 31/08/2019 | | Sí | 0.25 |
| 28 | EJECUCIÓN: Movimientos de tierra para la construcción de la ampliacion de pista de aterrizaje de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 5-Entregables Intermedios | 01/08/2019 | | 31/08/2019 | | Sí | 0.5 |
| 29 | EJECUCIÓN: Construccion de Accesos, Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi | 5-Entregables Intermedios | 01/09/2019 | | 30/09/2019 | | Sí | 1.0 |
| 30 | EJECUCIÓN: Revestimientos de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 5-Entregables Intermedios | 01/09/2019 | 30/09/2019 | | | No | 0.5 |
| 31 | EJECUCIÓN: Acabados y colocacion de cielo para la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 5-Entregables Intermedios | 01/10/2019 | 31/10/2019 | | | No | 0.5 |
| 32 | EJECUCIÓN: Construccion de Encauzamientos y Protecciones Hidraulicas de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi | 5-Entregables Intermedios | 01/10/2019 | | 31/10/2019 | | Sí | 1.0 |
| 33 | EJECUCIÓN: Construccion de Sistema Electrico de Iluminación de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi | 5-Entregables Intermedios | 01/11/2019 | | 30/11/2019 | | Sí | 0.25 |
| 34 | EJECUCIÓN: Colocación de Puertas de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 5-Entregables Intermedios | 01/11/2019 | 30/11/2019 | | | No | 0.25 |
| 35 | EJECUCIÓN: Ejecución de Señaleica Vertical y Horizontal de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi | 5-Entregables Intermedios | 01/12/2019 | | 31/12/2019 | | Sí | 0.25 |
| 36 | EJECUCIÓN: Colocación de Ventanas para la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 5-Entregables Intermedios | 01/12/2019 | 31/12/2019 | | | No | 0.25 |
| 37 | EJECUCIÓN: Suministro e instalacion de Mobiliario de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 5-Entregables Intermedios | 01/01/2020 | 31/01/2020 | | | No | 0.25 |
| 38 | EJECUCIÓN: Suministro e instalacion de piezas sanitarias para la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 5-Entregables Intermedios | 01/01/2020 | 31/01/2020 | | | No | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 39 | EJECUCIÓN: Suministro e instalación de sistema de aclimatación de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 5-Entregables Intermedios | 01/02/2020 | 29/02/2020 | | ▼ | No | 0.5 |
| 40 | EJECUCIÓN: Suministro e instalación de sistema de seguridad aeroportuaria de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 5-Entregables Intermedios | 01/02/2020 | 29/02/2020 | | ▼ | No | 0.25 |
| 41 | EJECUCIÓN: Suministro e instalación de sistema contra incendio de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 5-Entregables Intermedios | 01/03/2020 | 31/03/2020 | | ▼ | No | 0.25 |
| 42 | EJECUCIÓN: Provisión y colocación de material granular de relleno a para la construcción de la ampliación de pista de aterrizaje de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 5-Entregables Intermedios | 01/04/2020 | 30/04/2020 | | ▼ | No | 0.25 |
| 43 | EJECUCIÓN: Suministro e instalación de señalética de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 5-Entregables Intermedios | 01/04/2020 | 30/04/2020 | | ▼ | No | 0.25 |
| 44 | EJECUCIÓN: Provisión y colocación de capas estructurales de conformación de pavimento de la pista de aterrizaje de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 5-Entregables Intermedios | 01/05/2020 | 31/05/2020 | | ▼ | No | 0.5 |
| 45 | EJECUCIÓN: Provisión y colocación de capas de rodadura de la ampliación pista de aterrizaje de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 5-Entregables Intermedios | 08/05/2020 | 31/05/2020 | | ▼ | No | 0.5 |
| 46 | EJECUCIÓN: Provisión y colocación de capas de rodadura de la pista de aterrizaje de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 5-Entregables Intermedios | 01/06/2020 | 30/06/2020 | | ▼ | No | 0.5 |
| 47 | EJECUCIÓN: Provisión y colocación de señalética horizontal de la pista de aterrizaje de la torre de control del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 5-Entregables Intermedios | 01/06/2020 | 30/06/2020 | | ▼ | No | 0.25 |
| 48 | CIERRE: Liquidación Económica aprobada | 5-Entregables Intermedios | 01/07/2020 | 31/07/2020 | | ▼ | No | 1.0 |
| 49 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita | 5-Entregables Intermedios | 01/07/2020 | 31/07/2020 | | ▼ | No | 1.0 |
| 50 | CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados | 5-Entregables Intermedios | 01/07/2020 | 31/07/2020 | | ▼ | No | 1.0 |
| 51 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 01/10/2020 | 31/10/2020 | | ▼ | No | 1.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 52 | CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado | 5-Entregables Intermedios | 01/10/2020 | 31/10/2020 | | ▼ | No | 2.0 |
| 53 | CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito | 5-Entregables Intermedios | 01/11/2020 | 30/11/2020 | | ▼ | No | 1.0 |
| 54 | CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita | 5-Entregables Intermedios | 01/11/2020 | 30/11/2020 | | ▼ | No | 1.0 |
| 55 | CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF | 5-Entregables Intermedios | 01/12/2020 | 31/12/2020 | | ▼ | No | 1.5 |
| 56 | CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado | 5-Entregables Intermedios | 01/12/2020 | 31/12/2020 | | ▼ | No | 0.5 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| No hay información disponible | | | | | | |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 180,895,062.05 ** |
| Costo Total: | 244,516,825.20 |
| Total Devengado: | 162,438,703.64 |
| % Costo Total Devengado: | 66.43 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 66.43 %

Perfil Económico 2020

| | Años Previos | Año Actual (2020) | Años Futuros | Total |
|---|------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Ppto. Planeado | 116,018,821.65 | 59,159,869.52 | 0.00 | 175,178,691.17 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 13,357,840.53 | 35,000,000.00 | 0.00 | 48,357,840.53 |
| Ppto. Codificado | 295,846,512.59 | 16,832,407.67 | 0.00 | 312,678,920.26 |
| Ppto. Comprometido | 229,488,377.33 | 0.00 | 0.00 | 229,488,377.33 |
| Planeado - Codificado (2020) | | 42,327,461.85 | | |
| Programado a Devengar | 196,990,122.93 | 18,456,358.41 | 0.00 | 215,446,481.34 |
| Ppto. Devengado | 162,438,703.64 | 0.00 | 0.00 | 162,438,703.64 |
| Pagado Real | 130,335,531.53 | 0.00 | 0.00 | 130,335,531.53 |
| Estimado a fin de año | * 162,438,703.64 | 0.00 | 0.00 | 162,438,703.64 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 34,551,419.29 | 18,456,358.41 | 0.00 | 53,007,777.70 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 82.46 % | 0.00 % | 0.00 % | 75.40 % |
| Ppto. Codificado 998 | 12,557,087.19 | 0.00 | 0.00 | 12,557,087.19 |
| Ppto. Devengado 998 | 11,955,338.58 | 0.00 | 0.00 | 11,955,338.58 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020

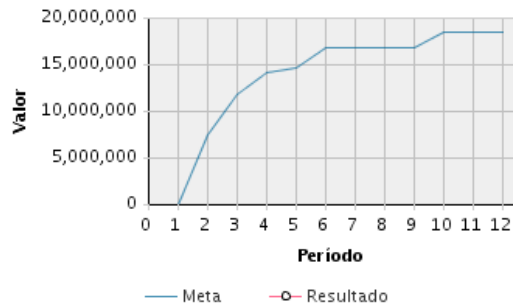

Presupuesto Mensual 2020

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 0.00 | | 0.00 | | | | |

| Presupuesto Mensual 2020 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 7,495,437.63 | | 7,495,437.63 | | | | |
| Mar | 4,194,673.71 | | 11,690,111.34 | | | | |
| Abr | 2,340,979.48 | | 14,031,090.82 | | | | |
| May | 533,021.37 | | 14,564,112.19 | | | | |
| Jun | 2,132,532.41 | | 16,696,644.60 | | | | |
| Jul | 0.00 | | 16,696,644.60 | | | | |
| Ago | 0.00 | | 16,696,644.60 | | | | |
| Sep | 0.00 | | 16,696,644.60 | | | | |
| Oct | 1,759,713.81 | | 18,456,358.41 | | | | |
| Nov | 0.00 | | 18,456,358.41 | | | | |
| Dic | 0.00 | | 18,456,358.41 | | | | |
| Total | 18,456,358.41 | | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|---|
| 17 | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada. |
| 18 | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos. |
| 19 | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo. |
| 20 | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---|-----------------------|
| 1 | | MTOP-SUBZ4-2020-0049-ME.pdf | 26/03/2020 |
| 2 | 1 DEFINICION Acuerdo ministerial acogiendo emergencia nacional 2016 | 3ACUERDO-MINISTERIAL-017.pdf | 31/03/2020 |
| 3 | 1 DEFINICION DECLARATORIA DE EMERGENCIA DECRETO 1002 | 2DECRETO-EJECUTIVO-NO.-1002-DEL-18-DE-ABRIL-DE-2016.pdf | 31/03/2020 |
| 4 | 1 DEFINICION: DECLARATORIA DE EMERGENCIA DECRETO 1001 | 1DECRETO-EJECUTIVO-NO.-1001-DEL-17-DE-ABRIL-DE-2016.pdf | 31/03/2020 |
| 5 | 10EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA OFICIO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS | 7_PRONUNCIAMIENTO_SUSPENSION_ACCESO_BAHIA | 06/08/2018-060017.pdf |
| 6 | 10EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA OFICIO LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS | 7_LEVANTAMIENTO_SUSPENSION_ACCESO_BAHIA.pdf | 04/01/2019 |
| 7 | 10EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | 7_ACCESO_BAHIA_OBRA_02-08-2018-045819.pdf | 06/08/2018 |
| 8 | 10EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | 7_ACCESO_BAHIA_OBRA_03-09-2018-041710.pdf | 05/09/2018 |
| 9 | 10EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | 7ACCESO_BAHIA_OBRA_02-10-2018-042602.pdf | 04/10/2018 |
| 10 | 10EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | 7_ACCESO_BAHIA_OBRA.pdf | 05/11/2018 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|--|---------------|
| 11 | 10EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | Memorando_Nro._MTOPI-SUBZ4-2018-1384-ME_Solicitud_de_Recursos_Obras_de_Arrastre_y_C.C._Nuevos_de_Terramoto.pdf | 05/11/2018 |
| 12 | 10EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | ACCESO_BAHÍA_OBRA.pdf | 05/12/2018 |
| 13 | 10EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | 7_ACCESO_BAHÍA_OBRA.pdf | 04/01/2019 |
| 14 | 10EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía | 7_ACCESO_BAHÍA_OBRA.pdf | 05/02/2019 |
| 15 | 10EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía | 5_ACCESO_BAHÍA_OBRA.pdf | 01/03/2019 |
| 16 | 10EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía | 5_ACCESO_BAHÍA_OBRA.pdf | 05/06/2019 |
| 17 | 10EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía | 5_ACCESO_BAHÍA_-_SUSPENSIÓN.pdf | 05/06/2019 |
| 18 | 10EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía | 5_ACCESO_BAHÍA_OBRA.pdf | 04/07/2019 |
| 19 | 10EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía | 5_ACCESO_BAHÍA_OBRA.pdf | 03/09/2019 |
| 20 | 10EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía | 5_CONTRATO_COMPLEMENTARIO#3_BAHIA_1.pdf | 03/09/2019 |
| 21 | 10EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía | 5_CONTRATO_COMPLEMENTARIO#3_BAHIA_2.pdf | 03/09/2019 |
| 22 | 10EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía | 5_CONTRATO_COMPLEMENTARIO#3_BAHIA_3.pdf | 03/09/2019 |
| 23 | 10EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía | 5_CONTRATO_COMPLEMENTARIO#3_BAHIA_4.pdf | 03/09/2019 |
| 24 | 10EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía | 5_CONTRATO_COMPLEMENTARIO#3_BAHIA_5.pdf | 03/09/2019 |
| 25 | 10EJECUCIÓN: Contrato 5- Reparación de la Vía Acceso a Bahía | 5_CONTRATO_COMPLEMENTARIO#3_BAHIA_6.pdf | 03/09/2019 |
| 26 | 10EJECUCIÓN: CONTRATO 6 FISCALIZACIÓN REPARACIÓN ACCESO A BAHÍA | 7_ACCESO_BAHIA_FISCA_03-09-2018-041754.pdf | 05/09/2018 |
| 27 | 10EJECUCIÓN: CONTRATO 6 FISCALIZACIÓN REPARACIÓN ACCESO A BAHÍA | 7ACCESO_BAHIA_FISCA_02-10-2018-042643.pdf | 04/10/2018 |
| 28 | 10EJECUCIÓN: CONTRATO 6 FISCALIZACIÓN REPARACIÓN ACCESO A BAHÍA | 7_ACCESO_BAHÍA_FISCA.pdf | 05/11/2018 |
| 29 | 10EJECUCIÓN: CONTRATO 6 FISCALIZACIÓN REPARACIÓN ACCESO A BAHÍA | ACCESO_BAHÍA_FISCA.pdf | 05/12/2018 |
| 30 | 10EJECUCIÓN: CONTRATO 6 FISCALIZACIÓN REPARACIÓN ACCESO A BAHÍA | 7_ACCESO_BAHIA_FISCA_02-08-2018-045904.pdf | 06/08/2018 |
| 31 | 10EJECUCIÓN: CONTRATO 6 FISCALIZACIÓN REPARACIÓN ACCESO A BAHÍA | 7_ACCESO_BAHÍA_FISCA.pdf | 04/01/2019 |
| 32 | 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | Memorando_Nro._MTOPI-SUBZ4-2018-1384-ME_Solicitud_de_Recursos_Obras_de_Arrastre_y_C.C._Nuevos_de_Terramoto.pdf | 05/11/2018 |
| 33 | 11 EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | MONTECRISTI_-_JIPIJAPA_-_LA_CADENA_OBRA.pdf | 05/12/2018 |
| 34 | 11EJECUCIÓN: Contrato 6- Fiscalización Reparación de la Vía Acceso a Bahía | 7_ACCESO_BAHÍA_FISCA.pdf | 05/02/2019 |
| 35 | 11EJECUCIÓN: Contrato 6- Fiscalización Reparación de la Vía Acceso a Bahía | 5_ACCESO_BAHÍA_FISCA.pdf | 01/03/2019 |
| 36 | 11EJECUCIÓN: Contrato 6- Fiscalización Reparación de la Vía Acceso a Bahía | 5_ACCESO_BAHÍA_FISCA.pdf | 05/06/2019 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 37 | 11EJECUCIÓN: Contrato 6- Fiscalización Reparación de la Vía Acceso a Bahía | 5_ACCESO_BAHÍA_FISCA.pdf | 04/07/2019 |
| 38 | 11EJECUCIÓN: Contrato 6- Fiscalización Reparación de la Vía Acceso a Bahía | 5_ACCESO_BAHÍA_FISCA.pdf | 03/09/2019 |
| 39 | 11EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | 8_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_TERREMOTO_OBRA_03-09-2018-054138.pdf | 05/09/2018 |
| 40 | 11EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | 8MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_TERREMOTO_OBRA_02-10-2018-042807.pdf | 04/10/2018 |
| 41 | 11EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | 8_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_OBRA.pdf | 05/11/2018 |
| 42 | 11EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | MEMORANDOS_SUSPENSIÓN_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA.pdf | 05/11/2018 |
| 43 | 11EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | MEMORANDO_NRO._MTOPE-SUBZ4-2018-1540-ME.pdf | 05/12/2018 |
| 44 | 11EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | MEMORANDO_NRO._MTOPE-SUBZ4-2018-1541-ME.pdf | 05/12/2018 |
| 45 | 11EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_SUSPENSIÓN_1.pdf | 05/12/2018 |
| 46 | 11EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_SUSPENSIÓN_2.pdf | 05/12/2018 |
| 47 | 11EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_SUSPENSIÓN_3.pdf | 05/12/2018 |
| 48 | 11EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_SUSPENSIÓN_4.pdf | 05/12/2018 |
| 49 | 11EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | 8_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_OBRA.pdf | 04/01/2019 |
| 50 | 11EJECUCIÓN: CONTRATO 7 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | 8_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_TERREMOTO_OBRA_02-08-2018-091831.pdf | 06/08/2018 |
| 51 | 12EJECUCIÓN: Contrato 7- Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí. | 6_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_OBRA.pdf | 03/09/2019 |
| 52 | 12EJECUCIÓN: Contrato 7- Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí. | 6_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_FISCA.pdf | 03/09/2019 |
| 53 | 13EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi | 12_PUENTE_CANUTO_OBRA.pdf | 03/09/2019 |
| 54 | 13EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi | 13_PUENTE_PIMPIGUASÍ_OBRA.pdf | 03/09/2019 |
| 55 | 14EJECUCIÓN: Implementación de actividades preliminares previo iniciar movimientos de tierra para la construcción del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 7_AEROPUERTO_DE_MANTA_OBRA.pdf | 03/09/2019 |
| 56 | 2 PLANEACION ANEXO de Acta 1 CRRPE con detalle de proyectos priorizados MTOPE | 6Anexo-Comité-22-de-mayo.pdf | 31/03/2020 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 57 | 2PLANEACION Acta 1 CRRPE de fecha 22 de mayo 2017 | 5Comité-Acta1CRRPE-22-de-mayo-2017.pdf | 31/03/2020 |
| 58 | 4EJECUCION: Plataformas Cantón Chone: Contrato y sabanas de planillas 1 a 7. | Contratos_y_sabanas_de_plataforma_Chone_(1).pdf | 01/12/2016 |
| 59 | 4EJECUCION: Plataformas Cantón Jaramijó: Contrato y sabanas de planillas 1 y 2. | Contrato_y_sabanas_planillas..rar | 29/11/2016 |
| 60 | 4EJECUCION: Plataformas Cantón Rocafuerte: Contrato y sabanas de planillas 1 a 4, Danzarin, Valdes. | Contratos_y_sabanas_de_plataforma_Rocafuerte.pdf | 28/11/2016 |
| 61 | 4EJECUCION: Plataformas Cantón Rocafuerte: Contrato y sabanas de planillas Higuerón. | Sabana_y_planilla_Higuerón..rar | 01/12/2016 |
| 62 | 51 CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita | ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA_PUENTE_SOBRE_EL_RÍO | 01/03/2019 |
| 63 | 5EJECUCIÓN: Construcción de Hangar Provisional para mantener en operación el Aeropuerto Eloy Alfaro de la Provincia de Manabí. | 1_HANGAR_FISCA.pdf | 04/07/2019 |
| 64 | 5EJECUCIÓN: Construcción de Hangar Provisional para mantener en operación el Aeropuerto Eloy Alfaro de la Provincia de Manabí. | 1_HANGAR_OBRA.pdf | 03/09/2019 |
| 65 | 5EJECUCIÓN: Construcción de Hangar Provisional para mantener en operación el Aeropuerto Eloy Alfaro de la Provincia de Manabí. | 1_HANGAR_FISCA.pdf | 03/09/2019 |
| 66 | 6EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí. | 2_SAN_PLÁCIDO_- _PICHINCHA_OBRA.pdf | 03/09/2019 |
| 67 | 6EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí. | 2_SAN_PLÁCIDO_- _PICHINCHA_FISCA.pdf | 03/09/2019 |
| 68 | 7EJECUCIÓN: Contrato 2- Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí. | 3_MANTA_- _SAN_MATEO_OBRA.pdf | 04/07/2019 |
| 69 | 7EJECUCIÓN: Contrato 2- Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí. | 3_MANTA_- _SAN_MATEO_OBRA.pdf | 03/09/2019 |
| 70 | 7EJECUCIÓN: Contrato 2- Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí. | 3_MANTA_- _SAN_MATEO_FISCA.pdf | 03/09/2019 |
| 71 | 8EJECUCIÓN: Contrato 3- Construcción puente Jama. | 11_PUENTE_JAMA_OBRA.pdf | 03/09/2019 |
| 72 | 9EJECUCIÓN: Contrato 4- Fiscalización Construcción puente Jama. | 11_PUENTE_JAMA_FISCA.pdf | 04/07/2019 |
| 73 | 9EJECUCIÓN: Contrato 4- Fiscalización Construcción puente Jama. | 11_PUENTE_JAMA_FISCA.pdf | 03/09/2019 |
| 74 | AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE FASE DE EJECUCIÓN A CONGELADO | MTOP-CGP-2019-104-ME_AUTORIZACIÓN_PARA_CAMBIO_DE_FASE.pdf | 30/01/2019 |
| 75 | Dictamen de prioridad 2018 componentes Aeropuerto Canuto y Pimpiguasi | Dictamen_Prioridad_Aeropuerto_Canuto_Pimpiguasio_Golondrinas.pdf | 01/03/2020 |
| 76 | HITO 12 EJECUCIÓN: Contrato 7- Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí | 8_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_- _LA_CADENA_OBRA.pdf | 05/02/2019 |
| 77 | HITO 12 EJECUCIÓN: Contrato 7- Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí | 6_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_OBRA.pdf | 01/03/2019 |
| 78 | HITO 12 EJECUCIÓN: Contrato 7- Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí | 6_MONTECRISTI_- _JIPIJAPA_FISCA.pdf | 01/03/2019 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 79 | HITO 12 EJECUCIÓN: Contrato 7- Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí. | 6_MONTECRISTI_-_JIPIJAPA_OBRA.pdf | 05/06/2019 |
| 80 | HITO 12 EJECUCIÓN: Contrato 7- Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí. | 6_MONTECRISTI_-_JIPIJAPA_FISCA.pdf | 05/06/2019 |
| 81 | HITO 12 EJECUCIÓN: Contrato 7- Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí. | 6_MONTECRISTI_-_JIPIJAPA_-_LA_CADENA_OBRA.pdf | 04/07/2019 |
| 82 | HITO 12 EJECUCIÓN: Contrato 7- Rehabilitación de la carretera: Montecristi - Jipijapa-La Cadena, provincia de Manabí. | 6_MONTECRISTI_-_JIPIJAPA_-_LA_CADENA_FISCA.pdf | 04/07/2019 |
| 83 | HITO 13 CIERRE: ACTA DE RECEPCIÓN PROVICIONAL PUENTE JAMA PARTE 1 | ACTA_PROVISIONAL_PTE._JAMA_1.pdf | 06/08/2018 |
| 84 | HITO 13 CIERRE: ACTA DE RECEPCIÓN PROVICIONAL PUENTE JAMA PARTE 2 | ACTA_PROVISIONAL_PTE._JAMA_2.pdf | 06/08/2018 |
| 85 | HITO 13 EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi | 13_PUENTE_CANUTO_OBRA.pdf | 06/06/2019 |
| 86 | HITO 13 EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi | 14_PUENTE_PIMPIGUASI.pdf | 06/06/2019 |
| 87 | HITO 13 EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi | 12_PUENTE_CANUTO_OBRA.pdf | 04/07/2019 |
| 88 | HITO 13 EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi | 13_PUENTE_PIMPIGUASI_OBRA.pdf | 04/07/2019 |
| 89 | HITO 13 EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi | 11_PUENTE_CANUTO_SOBRE_EL_RÍO_GRANDE.pdf | 11/02/2019 |
| 90 | HITO 13 EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi | 10_PUENTE_PIMPIGUASI_SOBRE_EL_RÍO_CHICO.pdf | 11/02/2019 |
| 91 | HITO 13 EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi | 9_PUENTE_CANUTO_OBRA.pdf | 01/03/2019 |
| 92 | HITO 13 EJECUCIÓN: Construcción de Accesos Provisionales en la construcción de Puentes Contrato 8 Canuto y Contrato 9 Pimpiguasi | 8_PUENTE_PIMPIGUASI_OBRA.pdf | 01/03/2019 |
| 93 | HITO 14 EJECUCIÓN: Implementación de actividades preliminares previo iniciar movimientos de tierra para la construcción del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 9_AEROPUERTO_ELOY_ALFARO_DE_MANTA.pdf | 11/02/2019 |
| 94 | HITO 14 EJECUCIÓN: Implementación de actividades preliminares previo iniciar movimientos de tierra para la construcción del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 7_AEROPUERTO_DE_MANTA_OBRA.pdf | 01/03/2019 |
| 95 | HITO 14 EJECUCIÓN: Implementación de actividades preliminares previo iniciar movimientos de tierra para la construcción del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 7_AEROPUERTO_DE_MANTA_OBRA.pdf | 06/06/2019 |
| 96 | HITO 14 EJECUCIÓN: Implementación de actividades preliminares previo iniciar movimientos de tierra para la construcción del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Contrato 10 | 7_AEROPUERTO_DE_MANTA_OBRA.pdf | 04/07/2019 |
| 97 | HITO 5 EJECUCIÓN: Construcción de Hangar Provisional para mantener en operación el Aeropuerto Eloy Alfaro de la Provincia de Manabí | 2_HANGAR_OBRA.pdf | 05/02/2019 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|---|---------------|
| 98 | HITO 5 EJECUCIÓN: Construcción de Hangar Provisional para mantener en operación el Aeropuerto Eloy Alfaro de la Provincia de Manabí | 1_HANGAR_PROVISIONAL_OBRA.pdf | 01/03/2019 |
| 99 | HITO 5 EJECUCIÓN: Construcción de Hangar Provisional para mantener en operación el Aeropuerto Eloy Alfaro de la Provincia de Manabí | 1_HANGAR_PROVISIONAL_FISCA.pdf | 01/03/2019 |
| 100 | HITO 5 EJECUCIÓN: Construcción de Hangar Provisional para mantener en operación el Aeropuerto Eloy Alfaro de la Provincia de Manabí. | 1_HANGAR_OBRA.pdf | 05/06/2019 |
| 101 | HITO 5 EJECUCIÓN: Construcción de Hangar Provisional para mantener en operación el Aeropuerto Eloy Alfaro de la Provincia de Manabí. | 1_HANGAR_FISCA.pdf | 05/06/2019 |
| 102 | HITO 5 EJECUCIÓN: Construcción de Hangar Provisional para mantener en operación el Aeropuerto Eloy Alfaro de la Provincia de Manabí. | 1_HANGAR_OBRA.pdf | 04/07/2019 |
| 103 | HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS CONCLUIDOS | SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_OBRA.pdf | 05/12/2018 |
| 104 | HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS CONCLUIDOS | 3_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_OBRA.pdf | 04/01/2019 |
| 105 | HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS CONCLUIDOS | 3SAN_PLACIDO_-_PICHINCHA_OBA_TERREMOTO__02-10-2018-041753.pdf | 04/10/2018 |
| 106 | HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS CONCLUIDOS | 3SAN_PLACIDO_-_PICHINCHA_FISCA_TERREMOTO__02-10-2018-041838.pdf | 04/10/2018 |
| 107 | HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS CONCLUIDOS | 3_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_OBRA.pdf | 05/11/2018 |
| 108 | HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS CONCLUIDOS | Memorando_Nro._MTOB-SUBZ4-2018-1384-ME_Solicitud_de_Recursos_Obras_de_Arrastre_y_C.C._Nuevos_de_Terremoto.pdf | 05/11/2018 |
| 109 | HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS EN EJECUCIÓN | 3_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_TERREMOTO_OBRA_03-08-2018-063332.pdf | 06/08/2018 |
| 110 | HITO 5 EJECUCIÓN: CONTRATO 1 - REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO; SAN PLÁCIDO PICHINCHA RESPALDO DE TRABAJOS EN EJECUCIÓN | 3_SAN_PLACIDO_TERRMOTO_OBRA_03-09-2018-040955.pdf | 05/09/2018 |
| 111 | HITO 5 EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí. | Contrato_1__planilla_1..rar | 29/11/2016 |
| 112 | HITO 6 EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí | 3_SAN_PLÁCIDO_-_PÍCHINCHA_OBRA.pdf | 05/02/2019 |
| 113 | HITO 6 EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; | 2_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_OBRA.pdf | 01/03/2019 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--|--|---------------|
| | subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí | | |
| 114 | HITO 6 EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí | 2_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_FISCA.pdf | 01/03/2019 |
| 115 | HITO 6 EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí. | 2_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_OBRA.pdf | 05/06/2019 |
| 116 | HITO 6 EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí. | 2_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_FISCA.pdf | 05/06/2019 |
| 117 | HITO 6 EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí. | 2_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_OBRA.pdf | 04/07/2019 |
| 118 | HITO 6 EJECUCIÓN: Contrato 1- Rehabilitación de la carretera Portoviejo; San Plácido - Pichincha; tramo: El Rodeo-San Plácido-Pichincha de 89 km de longitud; subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,3 km, provincia de Manabí. | 2_SAN_PLÁCIDO_-_PICHINCHA_FISCA.pdf | 04/07/2019 |
| 119 | HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | 4_MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA_03-09-2018-041134.pdf | 05/09/2018 |
| 120 | HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | 4MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA__02-10-2018-041934.pdf | 04/10/2018 |
| 121 | HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | 4MANTA_-_SAN_MATEO_FISCA_02-10-2018-042021.pdf | 04/10/2018 |
| 122 | HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | 4_MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA.pdf | 05/11/2018 |
| 123 | HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | Memorando_Nro._MTOPE-SUBZ4-2018-1384-ME_Solicitud_de_Recursos_Obras_de_Arrastre_y_C.C._Nuevos_de_Terramoto.pdf | 05/11/2018 |
| 124 | HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA.pdf | 05/12/2018 |
| 125 | HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | 4_MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA_02-08-2018-045539.pdf | 06/08/2018 |
| 126 | HITO 6 EJECUCIÓN: CONTRATO 2 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA SAN MATEO RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | 4_MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA.pdf | 04/01/2019 |
| 127 | HITO 7 EJECUCIÓN: Contrato 2- Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí | 4_MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA.pdf | 05/02/2019 |
| 128 | HITO 7 EJECUCIÓN: Contrato 2- Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí | 3_MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA.pdf | 01/03/2019 |
| 129 | HITO 7 EJECUCIÓN: Contrato 2- Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí | 3_MANTA_-_SAN_MATEO_FISCA.pdf | 01/03/2019 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|---|---------------|
| 130 | HITO 7 EJECUCIÓN: Contrato 2- Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí. | 3_MANTA_-_SAN_MATEO_OBRA.pdf | 05/06/2019 |
| 131 | HITO 7 EJECUCIÓN: Contrato 2- Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí. | 3_MANTA_-_SAN_MATEO_FISCA.pdf | 05/06/2019 |
| 132 | HITO 7 EJECUCIÓN: Contrato 2- Rehabilitación de la carretera: Manta - San Mateo (sitio crítico), provincia de Manabí. | 3_MANTA_-_SAN_MATEO_FISCA.pdf | 04/07/2019 |
| 133 | HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA | PUENTE_JAMA_OBRA.pdf | 05/12/2018 |
| 134 | HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA | 1_PUENTE_JAMA_OBRA.pdf | 04/01/2019 |
| 135 | HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA | 1_PUENTE_JAMA_OBRA_03-09-2018-040301.pdf | 05/09/2018 |
| 136 | HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA | 1_PUENTE_JAMA_OBRA.pdf | 05/11/2018 |
| 137 | HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA | Memorando_Nro._MTOF-DF-2018-870-ME_Confirmación_Desembolso_Crédito_Chino_Jama_y_Bahía.pdf | 05/11/2018 |
| 138 | HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA | Memorando_Nro._MTOF-SUBZ4-2018-1384-ME_Solicitud_de_Recursos_Obras_de_Arrastre_y_C.C._Nuevos_de_Terremoto.pdf | 05/11/2018 |
| 139 | HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA RESPALDO DE TRABAJOS EJECUTADOS | 1_PUENTE_JAMA_OBRA_02-08-2018-045225.pdf | 06/08/2018 |
| 140 | HITO 7 EJECUCIÓN: CONTRATO 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA RESPALDO DE TRABAJOS EJECUTADOS | 1PUENE_JAMA_OBRA_02-10-2018-041211.pdf | 04/10/2018 |
| 141 | HITO 8 EJECUCIÓN: Contrato 3- Construcción puente Jama. | 1_PUENTE_JAMA_OBRA.pdf | 05/02/2019 |
| 142 | HITO 8 EJECUCIÓN: Contrato 3- Construcción puente Jama. | 11_PUENTE_JAMA_OBRA.pdf | 05/06/2019 |
| 143 | HITO 8 EJECUCIÓN: Contrato 3- Construcción puente Jama. | 11_PUENTE_JAMA_OBRA.pdf | 04/07/2019 |
| 144 | HITO 8 EJECUCIÓN: CONTRATO 4 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA | 1_PUENTE_JAMA_FISCA_03-09-2018-040352.pdf | 05/09/2018 |
| 145 | HITO 8 EJECUCIÓN: CONTRATO 4 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA | 1PUENE_JAMA_FISCA_02-10-2018-041257.pdf | 04/10/2018 |
| 146 | HITO 8 EJECUCIÓN: CONTRATO 4 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA | 1_PUENTE_JAMA_FISCA.pdf | 05/11/2018 |
| 147 | HITO 8 EJECUCIÓN: CONTRATO 4 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA | PUENTE_JAMA_FISCA.pdf | 05/12/2018 |
| 148 | HITO 8 EJECUCIÓN: CONTRATO 4 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA | 1_PUENTE_JAMA_FISCA.pdf | 04/01/2019 |
| 149 | HITO 8 EJECUCIÓN: CONTRATO 4 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PUENTE JAMA | 1_PUENTE_JAMA_FISCA_02-08-2018-045305.pdf | 06/08/2018 |
| 150 | HITO 9 EJECUCIÓN: Contrato 4- Fiscalización Construcción puente Jama. | 1_PUENTE_JAMA_FISCA.pdf | 05/02/2019 |
| 151 | HITO 9 EJECUCIÓN: Contrato 4- Fiscalización Construcción puente Jama. | 11_PUENTE_JAMA_FISCA.pdf | 05/06/2019 |
| 152 | HITO 9 EJECUCIÓN: CONTRATO 5 REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA RESPALDO EJECUCIÓN DE TRABAJOS | Memorando_Nro._MTOF-DF-2018-870-ME_Confirmación_Desembolso_Crédito_Chino_Jama_y_Bahía.pdf | 05/11/2018 |
| 153 | Modificatorio 23 noviembre 2018 | modificatorio_23_de_noviembre_2018.pdf | 06/04/2020 |
| 154 | RIESGO 1 ACCION 1 SUSPENSIÓN TRABAJOS ACCESO A BAHIA | MTOF-SUBZ4-20-93-OF.pdf | 05/04/2020 |
| 155 | RIESGO 1 ACCION 1 SUSPENSIÓN TRABAJOS AEROPUERTO | MTOF-SUBZ4-20-94-OF.pdf | 05/04/2020 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|---|---------------|
| 156 | RIESGO 1 ACCION 1 SUSPENSIÓN TRABAJOS MONTECRISTI JIPIJAPA | MTOP-SUBZ4-20-96-OF.pdf | 05/04/2020 |
| 157 | RIESGO 1 ACCION 1 Acuerdo Ministerial 012/2020 en base a el cual se suspende la ejecucion de trabajos | Acuerdo_m._012-2020_suspension_terminos_y_plazos_acogidos_signed.pdf[1].pdf | 27/06/2020 |
| 158 | Solicitud de cambio de Fase de Congelado a Ejecución (14-ene-2020) | Memorando_Nro._MTOP-SUBZ4-2020-0049-ME.pdf | 14/01/2020 |
| 159 | SOLICITUD DE CAMBIO DE FASE DE EJECUCION A CONGELADO | MTOP-SUBZ4-2019-0145-ME.pdf | 30/01/2019 |
| 160 | SOLICITUD DE CAMBIO DE FASE DE EJECUCION A CONGELADO | MTOP-SUBSZ4-UIDT-2019-0013-ME.pdf | 30/01/2019 |
| 161 | SOLICITUD 2020 PARA RETORNO DE PROYECTO a estadode EJECUCION | MTOP-SUBZ4-2020-0049-ME.pdf | 26/03/2020 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|---------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando | Patrocinador ejecutivo. | Subsecretario Zonal 4 | iganchozo@mtop.gob.ec | 023974600 |
| Tarabo Mielles, Tyron Xavier | Lider del proyecto. | Coordinador Técnico de Infraestructura | ttarabo@mtop.gob.ec | 023974600 |
| Vinces Navarrete, Julio Cesar | Titular | Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Manabí | jvincesn@mtop.gob.ec | 052930494 Ext 41901 |

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

| Archivo | Fecha de Alta |
|--------------|---------------|
| 112636_1.jpg | 23/01/2019 |
