

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Delegaciones y Concesiones del Transporte
Dirección de Estudios de Pre-Factibilidad y Factibilidad de Delegaciones y Concesiones
PROYECTO: K003 MTOP - Gestión y Operación de Corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación

Líder del Proyecto:	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis (aayala@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Alvear Calderon, Fernando Marcelo	Programas Relacionados:	
Titular:	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.382584	TIR:	12.49 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	60,659,421.38
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	136,944,217.25
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2018 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	03/09/2020	Fecha de Fin Base:	31/12/2021
Modificado por:	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	Fecha del siguiente Hito:	01/10/2020

DATOS GENERALES

Descripción
<p>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto Gestión y Operación de corredores de la red vial estatal está formado por el componente: CONTRATOS DE CONCESIÓN Y CONVENIOS DE DELEGACIÓN VIGENTES; constituido por las siguientes actividades:</p> <p>Componente 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ambato- Riobamba (Concesión) Paso Lateral de Ibarra Supervisión Rumichaca - Riobamba Supervisión Panavial Estudios y Diseño de Proyectos Río Siete - Huaquillas (Concesión) Aforo de tráfico Convenio Pichincha (Alóag- Santo Domingo) (Delegación) Convenio Guayas (Naranjal - Km 26) Valor Pagado sin IVA Río Siete - Huaquillas IVA Pendiente <p>Componente 2</p> <ol style="list-style-type: none"> Naranjal- Tenguel <p>PRODUCTO / SERVICIO: El TPDA que circula por los corredores delegados y concesionados constituye la población objetivo del proyecto, el detalle se presenta en la siguiente tabla en la que se ha aplicado una tasa de crecimiento del 3% anual, para los años 2020 y 2021.</p> <p>LÍNEA BASE: La infraestructura vial de transporte, la constituye la Red Vial Estatal (RVE) que tiene una longitud de 10.132,74 km, divididos en 5.773,74 km de vías arteriales; y, 4.359 km de vías colectoras, de éstos 730,35 km se encuentran administrados bajo la modalidad de delegación con participación de la empresa privada; y, 913,50 km a través de los gobiernos seccionales; total 1.643,85 km de vía administrados bajo régimen de delegación. 8488,89 se encuentran bajo administración directa del MTOP.</p> <p>OBJETIVO GENERAL:</p> <p>Impulsar el desarrollo de los corredores concesionados y delegados a través de la ejecución de obras nuevas de infraestructura como soluciones viales y ampliaciones para mejorar la capacidad vial y atender la demanda de tráfico existente y proyectado.</p> <p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS:</p> <p>Mejorar los niveles de servicio de la Red Vial Estatal a través de los Contratos de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes que permitan trasladar en menores tiempos y en mejores condiciones la producción de Costa y Sierra, incorporar cadenas productivas para lograr el cambio de la matriz productiva.</p> <p>Mejorar los niveles de servicio a través de ampliación vial a 4 carriles del tramo Naranjal - Tenguel.</p>

Beneficios Cualitativos

Aportar al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria, por intermedio de las asociaciones público- privadas.

Tipo de Beneficiario

Beneficiarios directos: (2019) 242.804; (2020) 250.088; (2021) 257.580.
Corresponde a los vehículos que circulan en las vías componentes de este proyecto.

Beneficiarios indirectos: (2019) 1.459.325,24; (2020) 1.503.105,00; (2021) 1.548.198,15
Corresponde a los vehículos que circulan por las vías componentes de este proyecto.


Restricciones

TIEMPO: 1 año
COSTO: \$ 14.573.535,00
CALIDAD: garantizan y aseguran al MTOP un flujo de inversión para un estratégico financiamiento de proyectos, además de conseguir una reducción en los plazos de construcción.
RECURSOS: fiscales , humanos
RIESGOS: Supone una significativa transferencia de riesgos al sector privado, minimizándolos para la parte pública.
ALCANCE: Aforo automático, análisis de capacidad, proyección del TPDA asignado al proyecto, análisis de posibilidad de cambios cualitativos en la demanda, pagos por disponibilidad, compensaciones.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 66.87 %
Fecha de Inicio: 01/01/2018 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

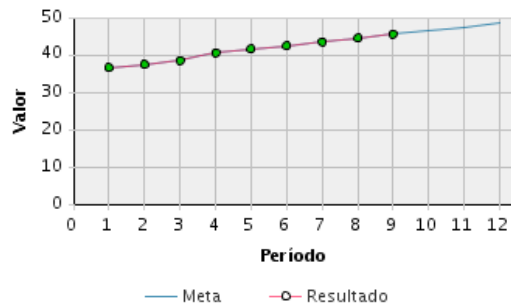

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	36 %	38 %	38 %	40 %	42 %	42 %	44 %	44 %	46 %	46 %	48 %	48 %
	Avance real acumulado											
	36 %	38 %	38 %	40 %	42 %	42 %	44 %	44 %	46 %			
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2020: ASOCIADO: "HITO 24" 1. EJECUCIÓN: Nombramiento comisión técnica del proyecto (Naranjal-Tenguel) suscrito ASOCIADO: "PROYECTO DE INVERSIÓN" 1.Cédula presupuestaria mes de agosto 2020 2. Monto devengado \$ 8,988,523.86	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	03/09/2020 - 11:01 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2020:</p> <p>ASOCIADO: "HITO 23"</p> <p>1. EJECUCIÓN: Decreto de Excepcionalidad del proyecto (Naranjal-Tenguel) suscrito</p> <p>ASOCIADO: "PROYECTO DE INVERSIÓN"</p> <p>1. Cédula presupuestaria mes de julio 2020</p> <p>2. Monto devengado \$ 85,546.43</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	05/08/2020 - 02:55 PM
<p>JUNIO 2020:</p> <p>ASOCIADO: "A LA ACCIÓN 3 Y 4 DEL PLAN DE ACCIÓN DE ABRIL A JUNIO 2020 DEL INDICADOR 14.1 PND-5.07-% DE KM DE LA RVE DELEGADOS CON MODELOS DE GESTIÓN SOSTENIBLE"</p> <p>1. Acción 3: Contratar con financiamiento CAF los estudios de ingeniería básica para obtener información y poder estructurar la viabilidad de delegación al sector privado (sujeto a disponibilidad de recursos CAF)</p> <p>2. Acción 2: Reestructurar Proyectos viales declarados desiertos</p> <p>ASOCIADO: "HITO 22"</p> <p>1. EJECUCIÓN: Decreto de Excepcionalidad del proyecto (Naranjal-Tenguel) elaborado</p> <p>ASOCIADO: "PROYECTO DE INVERSIÓN"</p> <p>1. Cédula presupuestaria mes de junio 2020</p> <p>ASOCIADO: "OBJETIVOS OPERATIVOS"</p> <p>1. 14.3 Porcentaje de iniciativas de origen público y privado para proyectos de delegación al sector privado (Infraestructura y gestión del transporte). "INFORME II TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2020"</p> <p>2. 14.4 PND-5.07- Porcentaje de kilómetros de la RVE delegados con modelos de gestión sostenibles "INFORME II TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2020"</p> <p>3. Resolución Nro. 057-2020 Buena Fe - Babahoyo Jujan</p> <p>ASOCIADO: "INDICADOR"</p> <p>1. Porcentaje de componentes ejecutados: INFORME I SEMESTRE PERIODO ENERO-JUNIO 2020</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	07/07/2020 - 10:14 AM
<p>MAYO 2020:</p> <p>"ASOCIADO A LA ACCIÓN 1 Y 2 DEL PLAN DE ACCIÓN DE ENERO A MARZO 2020 DEL INDICADOR 14.1 PND-5.07-% DE KM DE LA RVE DELEGADOS CON MODELOS DE GESTIÓN SOSTENIBLE"</p> <p>1. Acción 1: Proponer reformas al marco jurídico de delegaciones a fin de obtener procesos abreviados.</p> <p>2. Acción 2: Ejecutar por administración directa los estudios de aforos en las vías para tener un TPDA actualizado de los principales corredores a ser delegados al sector privado.</p> <p>"ASOCIADO AL HITO 21"</p> <p>1. EJECUCIÓN: Informe Jurídico del proyecto (Naranjal - Tenguel) elaborado</p> <p>"ASOCIADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN"</p> <p>1. Cédula presupuestaria mes de mayo 2020</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	10/06/2020 - 08:11 AM
<p>ABRIL 2020: "ASOCIADO AL HITO 20"</p> <p>1. Se ha procedido a ejecutar con la documentación respectiva del Informe Económico del proyecto (Naranjal - Tenguel) elaborado</p> <p>2. Control y reporte de la cédula presupuestaria correspondiente al mes de abril 2020 CUP: 382584</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	05/05/2020 - 09:23 AM
<p>MARZO 2020:</p> <p>1. Se realizó el seguimiento conforme consta en la cédula presupuestaria del mes de marzo del 2020 registrado en el Proyecto de Inversión</p> <p>2. Con Memorando Nro. MTOP-DF-2020-302-ME 27 de marzo de 2020 el director financiero informo a los Viceministros del MTOP la disminución de asignaciones presupuestarias para proyectos de inversión (AJUSTE AL PAI 2020 DE CONFORMIDAD AL ART. 74 DEL COPLAFIP) mediante el cual a este proyecto se le disminuyen 9,994,979.31 millones</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	03/04/2020 - 11:44 AM
<p>FEBRERO 2020:</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	06/03/2020 - 07:49 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Reprogramación del POA 2020, en el proyecto: gestión y operación de corredores de la red vial estatal a través de delegación - contrato de concesión rehabilitación, ampliación explotación y administración de carreteras-dentro del corredor Rumichaca - Riobamba</p> <p>ENERO 2020: Matriz de programación del POA 2020 se la ejecuta en base a una proporcionare entre items del proyecto. La programación del POA 2020 de acuerdo al dictamen de prioridad del proyecto gestión y operación de corredores de la red vial estatal a través de delegación</p>		
<p>DICIEMBRE 2019: "ASOCIADO AL HITO 13 Y 14" -Se ha procedido a ejecutar con la documentación respectiva al Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Rumichaca-Riobamba/ Río Siete - Huaquillas, pagos por supervisión) suscrito -Documento de obras nuevas a construir bajo Régimen de Delegación (Difusión e Información de los proyectos) aprobado</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	07/01/2020 - 08:19 AM
<p>NOVIEMBRE 2019: "ASOCIADO AL HITO 12" Se ha procedido a ejecutar con la documentación respectiva al Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Rumichaca-Riobamba, Aporte para construcción Paso Lateral de Ibarra) suscrito</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	10/12/2019 - 09:31 AM
<p>OCTUBRE 2019: "ASOCIADO AL HITO 11" Se ha procedido a ejecutar con la documentación respectiva al Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Río Siete - Huaquillas, Aporte Pago por Disponibilidad) legalizado y se ha adjuntado la documentación de la cédula presupuestaria del mes de octubre 2019</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	05/11/2019 - 04:23 PM
<p>SEPTIEMBRE 2019: "ASOCIADO AL HITO 11" Se ha procedido a ejecutar con la documentación respectiva al Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Transferencia para ampliación tramo Alóag - Santo Domingo), suscrito</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	01/10/2019 - 12:00 PM
<p>AGOSTO 2019: "ASOCIADO AL HITO 10" Se ha procedido a ejecutar con la documentación respectiva para la transferencia de recursos al GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA para ampliación tramo Alóag - Santo Domingo conforme se respalda en los archivos adjuntos</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	02/09/2019 - 09:50 AM
<p>JULIO 2019: "ASOCIADO AL HITO 10" Se ha procedido a ejecutar con la documentación respectiva para la transferencia de recursos al GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA para ampliación tramo Alóag - Santo Domingo conforme se respalda en los archivos adjuntos</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	01/08/2019 - 09:26 AM
<p>JUNIO 2019: A la fecha, este proyecto no cuenta con el dictamen de prioridad emitido por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador (ex SENPLADES). Con Oficio Nro. MTOP-MTOP-19-405-OF, el Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, de conformidad a las directrices emitidas por la SENPLADES, envió las fichas técnicas de evaluación y el sustento legal, técnico y financiero previo a la obtención del dictamen de prioridad. Así mismo, con Memorando Nro. MTOP-SDCT-2019-191-ME , el titular de la Subsecretaría de Delegaciones y Concesiones del Transporte gestionó ante el señor Ministro del MTOP el incremento al techo presupuestario del proyecto para ser reprogramado a la actividad "Rehabilitación, mejoramiento y ampliación del corredor vial Naranjal Tenguel".</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	05/07/2019 - 12:19 PM
<p>JUNIO 2019 "HITO ASOCIADO 9" Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Rumichaca-Riobamba Aporte para ampliación tramo Riobamba - Ambato) suscrito, Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el MINISTERIO TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, representado por el Ingeniero Jorge Aurelio Hidalgo Zavala, Ministro, quien comparece a través de su delegado el Doctor Ángel Laja Llanos, Viceministro de Gestión de Transporte, Encargado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por otra, la compañía PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL, legalmente representada por su Gerente General, el ingeniero Gonzalo Martínez Herdoíza, a quien en adelante y para efectos de este Contrato, se denominará, "LA CONCESIONARIA" o "EL CONCESIONARIO". Los nombramientos que acreditan la condición en la que comparecen.</p>	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	02/07/2019 - 08:52 AM
<p>MAYO 2019: Este proyecto se encuentra en proceso de obtener el Dictamen de Prioridad que lo emite "Planifica Ecuador", (ex SENPLADES), como parte fundamental de la documentación que evalúa la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, a fin de emitir el aval respectivo</p>	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	05/06/2019 - 10:00 AM
<p>ABRIL 2019: Conforme corresponde al mes de abril se adjunta cédulas presupuestarias del mes de marzo y abril refiriéndose a los montos devengados en el presente año</p>	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	02/05/2019 - 03:24 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2019: Conforme a lo señalado en los hitos anteriores de este proyecto de "Realización de Estudios para Tráfico, Adjudicado", se tiene establecido una programación para el 2019, en la cual se establecerá los productos entregables del Estudio de aforos, insumos importantes que deberán determinarse para la evaluación de los distintos proyectos que el MTOP esta ejecutando bajo la modalidad de Delegación</p> <p>FEBRERO 2019: Conforme a lo señalado en los hitos anteriores de este proyecto de "Realización de Estudios para Tráfico, Adjudicado", se tiene establecido una programación para el 2019, en la cual se establecerá los productos entregables del Estudio de aforos, insumos importantes que deberán determinarse para la evaluación de los distintos proyectos que el MTOP esta ejecutando bajo la modalidad de Delegación</p> <p>ENERO 2019: Conforme a lo señalado e los hitos anteriores de este proyecto de "Realización de Estudios para Tráfico, Adjudicado", se tiene establecido una programación para el 2019, en la cual se establecerá los productos entregables del Estudio de aforos, insumos importantes que deberán determinarse para la evaluación de los distintos proyectos que el MTOP esta ejecutando bajo la modalidad de Delegación</p>		
<p>DICIEMBRE 2018 "HITO ASOCIADO 13" Conforme a lo señalado e los hitos anteriores de este proyecto de "Realización de Estudios para Tráfico, Adjudicado", se tiene establecido una programación para el 2019, en la cual se establecerá los productos entregables del Estudio de aforos, insumos importantes que deberán determinarse para la evaluación de los distintos proyectos que el MTOP esta ejecutando bajo la modalidad de Delegación</p>	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	28/03/2019 - 10:28 AM
<p>NOVIEMBRE 2018 "HITO ASOCIADO 12" De acuerdo a lo señalado e los hitos anteriores de este proyecto de "Realización de Estudios para Tráfico, Adjudicado", y en base a los tiempos establecidos en el SERCOP para este tipo de procesos, se reprogramará este proyecyo para el siguiente año fiscal.</p>	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	05/12/2018 - 05:10 PM
<p>NOVIEMBRE 2018 "HITO ASOCIADO 11" Como parte del inicio de los estudios de aforo de tráfico, la Subsecretaría de Delegaciones y Concesiones del Transporte cuenta con el Informe de Idoneidad, Informe Técnico y Terminos de Referencia, actualmente el proceso se encuentra en la fase Precontractual, siguiendo lo establecido en el Reglamento Interno de Delegaciones de CCompetencia para la Ejecución de Procesos Administrativos en Materia de Contratación Pública.</p>	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	05/12/2018 - 05:05 PM
<p>"OCTUBRE 2018 HITO 10" EL MINISTERIO DE TRASNPORTE Y OBRAS PÚBLICAS TIENE COMO OBJETIVO REALIZAR EL ESTUDIO PARA AFOROS DE TRÁFICO EN VARIOS CORREDORES DE LA RED VIAL ESTATAL, EL MISMO QUE PERMITIRÁ DETERMINAR LA VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE CADA CORREDOR VIAL, ADICIONALMENTE SE PODRÁ DELEGAR AL SECTOR PRIVADO LA GESTIÓN Y EXPROPIACIÓN. HASTA EL MOMENTO SE CUENTA CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y EL INFORME TÉCNICO DE NECESIDAD, EL MISMO QUE SUTENTA LA INFORMACIÓN.</p>	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	05/11/2018 - 04:05 PM
<p>SEPTIEMBRE 2018 "HITO 9" En vista de las necesidades institucionales y en conformidad con el Modelo de Getión, la Subsecretaría de Delegaciones y Concesiones del Transporte, desde el septiembre del presente año, se ecuenta tramitando el dictamen de prioridad de conformidad con los lineamientos emitidos por SENPLADES, y ante lo cual se ha planteado un proyecto formado por 3 componentes: 1) Contratos de Concesiones y COnvenios de Delegaciones Vlgentes, 2) Infraestructura Vial a Administrar bajo el Régimen de Delegaciones y 3) Obras Nuevas a contruir y administrar bajo Régimen de Delegación.</p>	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	05/10/2018 - 10:55 AM
<p>AGOSTO 2018 "HITO ASOCIADO 7" El Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de la Subsecretaría de Delegaciones y Concesiones del Transporte avanza con la reconstrucción y ampliación de la vía Cuenca - Azogues - Biblian, para lo que cuenta con 12 frentes de trabajo a lo largo de los 43 km, los mismos que estan divididos en tres tramos: Salado - Guangarcucho, Guangarcucho - Azogues y Azogues - Biblian. Se prevee la construcción de veredas, cajoneras, areas verdes, estructura vial, letreros de señalización entre otros aspectos correspondientes a la carretera.</p>	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	05/09/2018 - 05:43 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2018 (HITO ASOCIADO 7)</p> <p>El proyecto se llama ahora Cumbe - El Salado - Biblian; El Descanso - Gualaceo; Bulcay - Paute. Se ha recibido una iniciativa privada por parte de la empresa Hidalgo e Hidalgo. El proyecto se encuentra en fase de preestructuración.</p>	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	03/08/2018 - 04:33 PM
<p>JUNIO 2018 (HITO ASOCIADO 6)</p> <p>El MTOP en base al modelo de Gestión Sostenible ha decidido reestructurar el proyecto Naranjal - Río Siete; modificando el punto final del proyecto, siendo éste ahora Ponce Enríquez y no Río Siete, contando con una longitud de 49,37 km. Al momento, no es factible determinar los PPD que requerirá el Proyecto, sin contar con el alcance técnico y análisis económico financiero definitivos.</p>	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	05/07/2018 - 04:54 PM
<p>MAYO 2018 (HITO ASOCIADO 5)</p> <p>El nombre del corredor cambió de "Naranjal - Río Siete" a "Naranjal - Ponce Enríquez". Se ha planteado un cronograma tentativo, el cual inicia en la cuarta semana de mayo del 2018 con la presentación del proyecto y finaliza en la primera semana de agosto con el lanzamiento a concurso público. Actualmente el proyecto se encuentra en la primera fase del cronograma planificado.</p>	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	05/06/2018 - 04:53 PM
<p>ABRIL 2018 (HITO ASOCIADO 4)</p> <p>El proyecto Naranjal - Río Siete se ha conceptualizado como una delegación al privado bajo modalidad de Asociación Público Privada para mejoramiento, ampliación de carriles, operación y mantenimiento periódico y rutinario. Como principal beneficio se tendrá una reducción de 30 minutos en el tiempo de viaje.</p>	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	04/05/2018 - 04:31 PM
<p>MARZO 2018 (HITO ASOCIADO 3)</p> <p>Se ha procedido con la transferencia de fondos para la ejecución de obras no previstas en el contrato principal, en base a las Ordenes de Variación 2 y 3; estas obras incluyen la terminación del tramo "Y" de Tillalles - "Y" de Corralitos (Intercambiador de Bella India), y la ampliación a 4 carriles del tramo el Guabo - "Y" de Tillalles.</p>	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	04/04/2018 - 03:06 PM
<p>FEBRERO 2018 (HITO ASOCIADO 2)</p> <p>El proyecto Diseño Financiamiento, Construcción, Ampliación y Explotación del Corredor Río Siete - Huaquillas, tiene un plazo total de 30 años, distribuidos de la siguiente manera: un periodo de organización de 34 meses, un periodo de construcción de 36 meses para la etapa 1 y 48 meses para la etapa 2 y el periodo de operación y mantenimiento de 360 meses.</p>	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	23/03/2018 - 12:52 PM
<p>ENERO 2018 (HITO ASOCIADO 1)</p> <p>El proyecto Diseño Financiamiento, Construcción, Ampliación y Explotación del Corredor Río Siete - Huaquillas, pretende ampliar y modernizar la infraestructura vial y el servicio que presta para mejorar la conectividad entre las principales ciudades del país.</p>	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	23/03/2018 - 12:50 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>5- PROYECTO. Recursos. la falta de asignación de recursos económicos por parte de la CAF CAUSARÍA que el proyecto no se ejecute en los tiempos previstos</p>	14/07/2020	Alvaro Luis Ayala Rodriguez	20 %	60	12	1/2

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado (preliminar)	1-Solicitud de Información	01/01/2018		01/01/2018		Sí	8.0
2	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado	1-Solicitud de Información	01/01/2018		01/01/2018		Sí	2.0
3	PLANEACIÓN: Acta de constitución del proyecto aprobada	1-Solicitud de Información	01/01/2018		01/01/2018		Sí	0.5
4	PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida	1-Solicitud de Información	01/01/2018		01/01/2018		Sí	4.5
5	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	1-Solicitud de Información	01/01/2018		01/01/2018		Sí	3.0
6	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	1-Solicitud de Información	01/01/2018		01/01/2018		Sí	2.0
7	EJECUCIÓN: Infraestructura vial a administrar bajo Régimen de Delegación (Estudio de Aforos de Trafico, adjudicado), en trámite obtener DICTAMEN DE PRIORIDAD	9-Entregables Formales	31/05/2019		31/05/2019		Sí	2.0
8	EJECUCIÓN: Convenio de Delegación con GAD de Guayas suscrito	5-Entregables Intermedios	28/06/2019		29/11/2018		Sí	1.5
9	EJECUCIÓN: Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Rumichaca-Riobamba Aporte para ampliación tramo Riobamba - Ambato) suscrito	9-Entregables Formales	31/07/2019		28/06/2019		Sí	2.0
10	EJECUCIÓN: Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Transferencia para ampliación tramo Alóag - Santo Domingo), suscrito	9-Entregables Formales	30/08/2019		31/07/2019		Sí	2.0
11	EJECUCIÓN: Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Río Siete - Huaquillas, Aporte Pago por Disponibilidad) legalizado	9-Entregables Formales	31/10/2019		30/09/2019		Sí	2.0
12	EJECUCIÓN: Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Rumichaca-Riobamba, Aporte para construcción Paso Lateral de Ibarra) suscrito	5-Entregables Intermedios	27/12/2019		29/11/2019		Sí	2.0
13	EJECUCIÓN: Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Rumichaca-Riobamba/ Río Siete - Huaquillas, pagos por supervisión) suscrito	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	2.0
14	EJECUCIÓN: Documento de obras nuevas a construir bajo Régimen de Delegación (Difusión e Información de los proyectos) aprobado	9-Entregables Formales	31/12/2019		31/12/2019		Sí	2.0
15	EJECUCIÓN: Matriz programación del POA (Plan	1-Solicitud de Información	01/01/2020		01/01/2020		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	operativo anual) 2020 - aprobada							
16	EJECUCIÓN: Reprogramación del POA (Plan operativo anual) 2020, aprobada	1-Solicitud de Información	01/02/2020		01/02/2020		Sí	1.0
17	EJECUCIÓN: Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Rumichaca-Riobamba Aporte para ampliación tramo Riobamba - Ambato) suscrito	9-Entregables Formales	01/03/2020		01/03/2020		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN: Informe de Corrida Financiera (Naranjal - Tenguel) elaborado	9-Entregables Formales	01/04/2020		01/04/2020		Sí	1.0
19	EJECUCIÓN: Informe de Evaluación Técnico del proyecto (Naranjal - Tenguel) elaborado	9-Entregables Formales	01/04/2020		01/04/2020		Sí	1.0
20	EJECUCIÓN: Informe Económico del proyecto (Naranjal - Tenguel) elaborado	9-Entregables Formales	01/05/2020		01/05/2020		Sí	1.0
21	EJECUCIÓN: Informe Jurídico del proyecto (Naranjal - Tenguel) elaborado	9-Entregables Formales	01/06/2020		01/06/2020		Sí	1.0
22	EJECUCIÓN: Decreto de Excepcionalidad del proyecto (Naranjal-Tenguel) elaborado	9-Entregables Formales	01/07/2020		01/07/2020		Sí	1.0
23	EJECUCIÓN: Decreto de Excepcionalidad del proyecto (Naranjal-Tenguel), suscrito	9-Entregables Formales	01/08/2020		01/08/2020		Sí	1.0
24	EJECUCIÓN: Nombramiento comisión técnica del proyecto (Naranjal-Tenguel) suscrito	9-Entregables Formales	01/09/2020		01/09/2020		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Modelo de contrato y anexos del proyecto (Naranjal-Tenguel), emisión de pliegos elaborado	9-Entregables Formales	01/10/2020	01/10/2020			No	1.0
26	EJECUCIÓN: Resolución de inicio del proyecto (Naranjal-Tenguel) suscrita	9-Entregables Formales	01/11/2020	01/11/2020			No	1.0
27	EJECUCIÓN: Concurso público del proyecto (Naranjal-Tenguel)	9-Entregables Formales	01/12/2020	01/12/2020			No	1.0
28	EJECUCIÓN: Delegaciones y Concesiones del portafolio de corredores viales 2021 priorizadas	9-Entregables Formales	30/12/2021	30/12/2021			No	36.5
29	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021			No	5.0
30	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2021	31/12/2021			No	2.0
31	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021			No	1.0
32	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	V - Verificación ejecutiva	31/12/2021	31/12/2021			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
33	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	V - Verificación ejecutiva	31/12/2021	31/12/2021			No	1.0
34	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	V - Verificación ejecutiva	31/12/2021	31/12/2021			No	1.5
35	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	V - Verificación ejecutiva	31/12/2021	31/12/2021			No	2.0
36	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	1.0
37	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021			No	0.5

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de componentes ejecutados		100.00 %	0.5	0.5	01/01/2019	Ene-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	136,944,217.25 **
Costo Total:	229,110,007.00
Total Devengado:	135,604,466.54
% Costo Total Devengado:	59.19 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 59.19 %

Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	285,253,535.00	79,506,548.41	0.00	364,760,083.41
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	64,917,269.13	20,000,000.00	0.00	84,917,269.13
Ppto. Codificado	131,120,065.20	10,413,821.00	0.00	141,533,886.20
Ppto. Comprometido	128,513,115.45	619,762.95	0.00	129,132,878.40
Planeado - Codificado (2020)		69,092,727.41		
Programado a Devengar	131,120,065.20	10,413,821.00	0.00	141,533,886.20
Ppto. Devengado	126,530,396.25	9,074,070.29	0.00	135,604,466.54
Pagado Real	56,937,567.73	44,862.69	0.00	56,982,430.42
Estimado a fin de año	* 126,530,396.25	0.00	0.00	126,530,396.25
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	4,589,668.95	10,413,821.00	0.00	15,003,489.95
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 96.50 %	87.13 %	0.00 %	95.81 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020

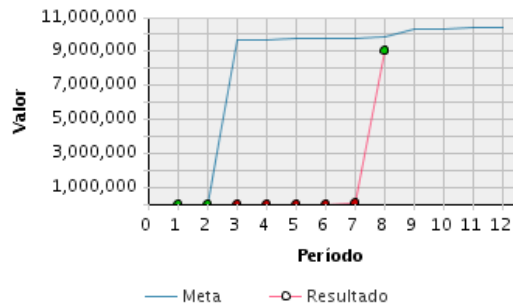

Presupuesto Mensual 2020

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	9,640,000.00	0.00	9,640,000.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Abr	40,000.00	0.00	9,680,000.00	0.00	0.00 %		0.00 %
May	40,000.00	0.00	9,720,000.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Jun	40,000.00	0.00	9,760,000.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Jul	40,000.00	85,546.43	9,800,000.00	85,546.43	0.87 %		0.82 %
Ago	40,000.00	8,988,523.86	9,840,000.00	9,074,070.29	92.22 %		87.13 %
Sep	453,821.00		10,293,821.00				
Oct	40,000.00		10,333,821.00				
Nov	40,000.00		10,373,821.00				
Dic	40,000.00		10,413,821.00				
Total	10,413,821.00	9,074,070.29					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
14	Incrementar la estructuración de la participación del sector privado en infraestructura (operación y mantenimiento en la Red Vial Estatal) y de gestión del transporte MEDIANTE modelos de gestión sostenibles.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A2. HITO 2, Cronograma Río Siete - Huaquillas	HITO_2__Cronograma_de_proyecto_Río_Siete_-_Huaquillas.pdf	23/03/2018
2	A3.Hito 1_Perfil del proyecto Río Siete_Huaquillas	HITO_1__Perfil_del_proyecto_Río_Siete_-_Huaquillas.pdf	23/03/2018
3	A3.Hito_3_ Información de compensación al concesionario por ejecución de obras no previstas Río Siete-Huaquillas	Hito_3__Inf._de_compensación_al_concesionario.pdf	04/04/2018
4	A4.Hito 4_Perfil de Naranjal - Río Siete	Hito_4_Perfil_de_Naranjal_-_Río_Siete.pdf	04/05/2018
5	A5.Hito 5 Cronograma Naranjal - Ponce Enríquez	Hito_5_proyecto_inversión.pdf	06/06/2018
6	A6.HITO6Gestión y Operación de Corredores de la Red Vial Estatal de Delegación de	Gestión y Operación de Corredores de la Red Vial Estatal de Delegación de	05/07/2018
7	A7.Hito 7_Perfil del proyecto Cumbe - El saludo - Biblian	Hito_7_Perfil_Cumbe_-_El_Salado_-_Biblian.pdf	06/08/2018
8	A7.HITO7. Ficha técnica del proyecto para aprobación de la autoridad designada para articular el Consejo Sectorial	2FICHA_TECNICA.pdf	22/03/2018
9	A7.HITO7. Informe de observaciones	anexo_3__informe_de_observaciones0433463001514408284200	23/03/2018
10	A7.HITO7. Informe legal	anexo_4__informe_legal0457351001514408303.pdf	23/03/2018
11	A7.HITO7. Memorando observaciones Senplades	senplades-sip-2017-0840-of.pdf	23/03/2018
12	A7.HITO7. Solicitud de dictamen	anexo_2__solicitud_de_dictamen0251423001508876433.pdf	23/03/2018
13	A8.HITO 8 CRONOGRAMA DE PROYECTO CUENCA AZOGUES BIBLIAN	PROYECTO_GASTO_DE_INVERSIÓN_AGOSTO_2018_HITO_8_CRONOGRAMA_DE_PROYECTO_CUENCA_AZOGUES_BIBLIAN	05/09/2018
14	A9.PROYECTO GASTO INVERSIÓN SEPTIEMBRE 2018 HITO 9 INFORMACION PAGO POR DISPONIBILIDAD (PPD)	PROYECTO_GASTO_DE_INVERSIÓN_HITO_9_INFORMACION_PAGO_POR_DISPONIBILIDAD(PPD)	06/10/2018
15	B1.OCTUBRE 2018 PROYECTO DE INVERSIÓN HITO 10 INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE TRÁFICO	PROYECTO_DE_INVERSIÓN_HITO_10_INFORMCIÓN_PARA_LA_REALIZACIÓN_DE_ESTUDIOS_DE_TRÁFICO	05/11/2018
16	B2.HITO_11_PROYECTO_DE_INERSIÓN_INICIO_DE ESTUDIOS PARA ACORDE DE INVERSIÓN CON RAEZ ESTUDIOS PARA AFOROS DE TRÁFICO	ESTUDIOS_PARA_ACORDE_DE_INVERSIÓN_CON_RAEZ_ESTUDIOS_PARA_AFOROS_DE_TRÁFICO	05/12/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta	
17	B3.PROYECTO DE INVERSIÓN PROYECTO DE REALIZACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE TRÁFICO EN LA ZONA DE ESTUDIOS	PROYECTO DE INVERSIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE TRÁFICO EN LA ZONA DE ESTUDIOS	04/01/2019	
18	B4.HITO 13: Informe proyecto, realizado	HITO13_Informe_proyecto__realizado.pdf	04/01/2019	
19	B5: Cédulas presupuestarias mes a mes Ene-Jun 2019	Cedulas_presupuestarias_mes_a_mes_Ene-Jun_2019.pdf	05/07/2019	
20	B6.HITO7:Infraestructura vial a administrar bajo Régimen de Delegación (Estudio de Aforos de Trafico, adjudicado)	HITO_7_(Estudio_de_Aforos_de_Trafico__adjudicado).pdf	05/06/2019	
21	B7.HITO9. EJECUCIÓN: Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Rumichaca-Riobamba Aporte para ampliación tramo Riobamba - Ambato) suscrito	HITO9_EJECUCIÓN_Contrato_de_Concesión_y_Convenios_de_Delegación_Vigentes_(Rumichaca-Riobamba_Aporte_para_ampliación_tramo_Riobamba_-_Ambato)_suscritoContrato_Adi_Ampliación_Ambato_Riobamba_compressed.pdf	24/06/2019	
22	B8. HITO 10 Transferencia para ampliación tramo Alóag - Santo Domingo, Se ha procedido a ejecutar conforme se respalda en los archivos adjuntos	Contrato_de_Concesión_y_Convenios_de_Delegación_Vigentes_(Santo_Domingo)_suscrito.PDF	15/07/2019	
23	B9. Cedula Presupuestaria mes de Julio 2019	A7.JULIO_2019.pdf	07/08/2019	
24	C1.Cédula Presupuestaria mes de Agosto 2019	A8.AGOSTO_2019.pdf	02/09/2019	
25	C2.HITO11. Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Santo Domingo) para ampliación tramo Alóag - Santo Domingo) suscrito	Contrato_de_Concesión_y_Convenios_de_Delegación_Vigentes_(Santo_Domingo)_suscrito.PDF	05/10/2019	
26	C3. Cedula Presupuestaria mes de Septiembre 2019	A9.SEPTIEMBRE_2019.pdf	01/10/2019	
27	C4. Cédula Presupuestaria mes de Octubre 2019	B1.OCTUBRE_2019.pdf	05/11/2019	
28	C5. Cédula Presupuestaria mes de Noviembre 2019	B2.NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019	
29	C6. Hlto 12. Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Rumichaca-Riobamba, Aporte para construcción Paso Lateral de Ibarra) suscrito	Paso_Lateral_Ibarra_.pdf	10/12/2019	
30	C7.Pagos por Disponibilidad (PPD) así como también el contrato de consultoría para llevar a cabo los estudios de aforos de tráfico, fondos para la contratación de la consultoría	Pagos_por_Disponibilidad_(PPD).pdf	17/12/2019	
31	C8.HITO13.(Rumichaca-Riobamba/ Río Siete - Huaquillas, pagos por supervisión) suscrito.	HITO13__PAGO_DE_CONTRATOS_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	01/01/2020	
32	C9.HITO14.Documento de obras nuevas a construir bajo Régimen de Delegación (Difusión e Información de los proyectos) aprobado	HITO_14__Proyectos_de_difusión_e_informacion.pdf	04/01/2020	
33	D1.Cédula Presupuestaria mes de Diciembre 2019	B3.DICIEMBRE_2019.pdf	07/01/2020	
34	D2.Cédula Presupuestaria mes de Enero 2020	Enero_2020.pdf	03/02/2020	
35	D3.Cédula Presupuestaria mes de Febrero 2020	Febrero_2020.pdf	05/03/2020	
36	D4. HITO 15. Matriz programación del POA (Plan operativo anual) 2020 - aprobada	POA_2020_REQUERIMIENTO.xlsx	05/03/2020	
37	D5. HITO 16. Reprogramación del POA (Plan operativo anual) 2020, aprobada	REPROGRAMACION_DEL_POA_2020.pdf	05/03/2020	
38	D6. Documento de Proyectos Formato SENPLADES	2020-01-28_02-15-26_PROYECTODEINVERSIN28ENERO2020.pdf	23/03/2020	
39	D7. Cedula Presupuestaria mes marzo 2020	Marzo_2020.pdf	03/04/2020	
40	D8. Ficha Proyecto Corredores viales por delegación SIPeIP	Ficha_Proyecto_Corredores_viales_por_delegacion_SIPeIP.pdf	03/04/2020	
41	D9. Comunicación de disminución de asignación presupuestaria por el monto de 9,994,979.31 millones (Por Pandemia COVID-19)	Desminucion_de_Presupuesto_2020.pdf	03/04/2020	
42	E1. HITO 17. Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Rumichaca-Riobamba Aporte para ampliación tramo Riobamba - Ambato) suscrito	MTOP-SDCT-2020-122-ME(2).pdf	13/04/2020	
43	E2. HITO 18. Informe de Corrida Financiera (Naranjal - Tenguel) elaborado	Informe_de_Evaluación_Económico.pdf	13/04/2020	
44	E3. HITO19. Informe de Evaluación Técnico del proyecto (Naranjal - Tenguel) elaborado	Informe_Tecnico_compressed.pdf	21/04/2020	
45	E4. HITO20. Informe Económico del proyecto (Naranjal - Tenguel) elaborado	Informe_de_Evaluación_Económico_compressed.pdf	04/05/2020	

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
46	E5. Cédula Presupuestaria mes abril 2020	Abril_2020__CUP_175200000.0000.382584.pdf	04/05/2020
47	E6. HITO 21. Informe Jurídico del proyecto (Naranjal - Tenguel) elaborado	Naranjal-Tenguel_Resolucion-de-Inicio-de-Concurso-Publico-1_compressed.pdf	04/06/2020
48	E7. Cédula presupuestaria mes de mayo 2020	Mayo_31_2020__CUP_175200000.0000.382584.pdf	04/06/2020
49	E8. Cédula presupuestaria mes de Junio 2020	Junio_2020.pdf	03/07/2020
50	E9. HITO 22. Decreto de Excepcionalidad del proyecto (Naranjal-Tenguel) elaborado	DECRETO_EXCEPCIONALIDAD_802_2019_NARANJAL_TENGUEL_2019.pdf	03/07/2020
51	F1. Riesgo 2. Gestionar con el Subsecretario de Delegaciones y Concesiones la asignación de recursos económicos por parte de la CAF para el Proyecto	programa_de_infraestructura_logística_en_ecuador_(caf2).pdf	14/07/2020
52	F2. HITO 23 Decreto de Excepcionalidad del proyecto (Naranjal-Tenguel), suscrito	Decreto_de_Excepcionalidad_Naranjal_Tenguel_802_2019_suscrito.pdf	03/08/2020
53	F3. Cédula presupuestaria del mes de julio 2020	Cédula_presupuestaria_mes_de_julio_2020.pdf	05/08/2020
54	F4. HITO 24. Nombramiento comisión técnica del proyecto (Naranjal-Tenguel) suscrito	Nombramiento_comisión_técnica_del_proyecto_(Naranjal-Tenguel)_suscrito.pdf	01/09/2020
55	F5. Cédula presupuestaria mes de Agosto 2020	Agosto_2020.pdf	02/09/2020

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Aguilar Ortiz, César Oswaldo	Director del Proyecto	Director de Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad Delegaciones y Concesiones	coaguilar@mtop.gob.ec	0991449151
Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	Analista de Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad de Delegaciones y Concesiones	Analista de Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad de Delegaciones y Concesiones 2	aayala@mtop.gob.ec	023974600
Garzón Guamán, Ana Lourdes	Entregar reportes SIPEIPE actualizados	Servidor Publico 6	agarzon@mtop.gob.ec	023974600
Loor Sojos, Jorge Marcelo	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretario de Delegaciones y Concesiones del Transporte	jloor@mtop.gob.ec	
Navarrete Veloz, Fidel Augusto	Supervisor del Proyecto (PANAVIAL)	Analista de Administración de Delegaciones y Concesiones	fnavarrete@mtop.gob.ec	26072
Patiño Carrillo, Denis Mauricio	Analista de Presupuesto	Analista de Presupuesto	dpatino@mtop.gob.ec	ext. 19040
Riofrio Inga, Fernando	Supervisor del Proyecto (ALOAG - SANTO DOMINGO)	Director de Administración de Delegaciones y Concesiones, Subrogante	friofrio@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
126119_1.jpg	25/03/2020
