

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 1**  
**Dirección Provincial Esmeraldas**

**PROYECTO: K033 MTOP - Proyecto de Reconstrucción de Obras por el Terremoto 2016 - Esmeraldas**

Líder del Proyecto:	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto (galdas@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Valencia Lara, Gustavo Stalin	Programas Relacionados:	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE OBRAS POR EL TERREMOTO 2016
Titular:	Estrella Charcopa, Stefani Andrea	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.381287	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	38,111,500.47
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	30/04/2016 - 31/12/2020
Fecha de última actualización:	05/01/2021	Fecha de Fin Base:	29/12/2017
Modificado por:	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	Fecha del siguiente Hito:	15/10/2020

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Terremoto de abril 2016

Objetivo: Realizar las demoliciones de las edificaciones que fueron afectadas a raíz del terremoto, para que el MIDUVI u otra entidad pueda construir una nueva vivienda.

Línea Base: Este proyecto inicia con la inspección por parte del MIDUVI quien son los encargados de evaluar la estructura y semaforizarla según el riesgo que está presente.

Producto:

Dar facilidades al propietario en cuanto a costos y evitar un colapso de la estructura.

Contratista: MIKLA S.A , AGURICOCHA S.A - Ing. Ricardo Montalvo y Consorcio CRBC - CEIEC

Monto: 2'000.000 - Quinindé - Las Golondrinas = Costo de la obra sin IVA: \$ 33'635.784,56 con IVA: \$ 37'672.078,71

**Beneficios Cualitativos**

Cantones de Quinindé - Recinto El Duana, Muisne, Atacames y Esmeraldas

**Tipo de Beneficiario**

El propietario de la vivienda afectada.

Directos: 122.570 habitantes

Indirectos: 932.336 habitantes

**Restricciones**

Nombre de la obra: Demoliciones, remoción de escombros y gastos varios post terremoto por los años 2016, 2017, 2018.

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 3 años.

COSTO: Monto Priorizado: USD \$ 63.991.197,82 (Nacional); Monto Ejecutado (inc. IVA): USD 2.651.531,61

ALCANCE: Actividades de demolición, remoción de escombros en la provincia de Esmeraldas culminadas.


RECURSOS: Ubicación de la vivienda. El aun no desalojo de las pertenencias. La inestabilidad del suelo., Maquinarias, Operadores.

Nombre de la obra: "Construcción de la carretera- La Y de Mataje - Puente Mataje de 18 km de longitud y construcción del puente internacional Mataje".

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



**Transcurrido:** 100.00 %  
**Fecha de Inicio:** 30/04/2016 **Fecha de Fin:** 31/12/2020

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

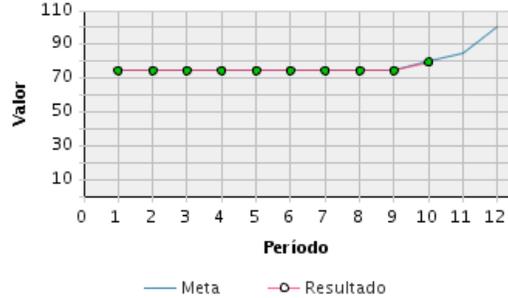

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	74 %	74 %	74 %	74 %	74 %	74 %	74 %	74 %	74 %	80 %	85 %	100 %
	Avance real acumulado											
	74 %	74 %	74 %	74 %	74 %	74 %	74 %	74 %	74 %	79 %		
	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>DICIEMBRE 2020:</b></p> <p>Se remite el documento del proyecto Proyecto de Reconstrucción de Obras por el terremoto 2016 CUP 175200000.0000.381287, dentro del cual está el Componente 4, Obra: "Rehabilitación, rectificación y mejora de la vía E29, tramo: Quinindé - Las Golondrinas", por US\$ 40.205.274,05 (incluido IVA), de los cuales US\$ 33.635.784,56 son recursos de crédito Eximbank de China y US \$ 6.569.489,49 son contraparte fiscal (Ley de Solidaridad), para el período 2018-2020.</p> <p>Es con este proyecto es que se han gestionado los recursos del proyecto Quinindé - Las Golondrinas.</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se terminó se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha 19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, pendiente cancelación de planilla de costo +% por la no presentación de la misma, pendiente Acta de Recepción Definitiva.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de noviembre 2020, mediante memorando MTOP-CON_ESM-2019-607-ME, se informa al Administrador del contrato del cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comisión Técnica previa la Recepción Definitiva.</p> <p>El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15 tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción, contrato terminado, se gestiona Terminación del contrato Unilateralmente.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/01/2021 - 10:44 AM
<p><b>NOVIEMBRE 2020:</b></p> <p>Se remite el documento del proyecto Proyecto de Reconstrucción de Obras por el terremoto 2016 CUP 175200000.0000.381287, dentro del cual está el Componente 4, Obra: "Rehabilitación, rectificación y mejora de la vía E29, tramo: Quinindé - Las Golondrinas", por US\$ 40.205.274,05 (incluido IVA), de los cuales US\$ 33.635.784,56 son recursos de crédito Eximbank de China y US \$ 6.569.489,49 son contraparte fiscal (Ley de Solidaridad), para el período 2018-2020.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	04/12/2020 - 12:25 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Es con este proyecto es que se han gestionado los recursos del proyecto Quinindé - Las Golondrinas.</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se terminó se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha 19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, pendiente cancelación de planilla de costo +% por la no presentación de la misma, pendiente Acta de Recepción Definitiva para fines de diciembre 2020, al momento se encuentra en proceso de Auditoria la obra y la fiscalización.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de noviembre 2020, mediante memorando MTOP-CON_ESM-2019-607-ME, se informa al Administrador del contrato del cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comisión Técnica previa la Recepción Definitiva.</p> <p>El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15 tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción, contrato terminado, se gestiona Terminación del contrato Unilateralmente.</p>		
<p>OCTUBRE 2020:</p> <p>Se remite el documento del proyecto Proyecto de Reconstrucción de Obras por el terremoto 2016 CUP 175200000.0000.381287, dentro del cual está el Componente 4, Obra: "Rehabilitación, rectificación y mejora de la vía E29, tramo: Quinindé - Las Golondrinas", por US\$ 40.205.274,05 (incluido IVA), de los cuales US\$ 33.635.784,56 son recursos de crédito Eximbank de China y US \$ 6.569.489,49 son contraparte fiscal (Ley de Solidaridad), para el período 2018-2020.</p> <p>Es con este proyecto es que se han gestionado los recursos del proyecto Quinindé - Las Golondrinas.</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se terminó se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha 19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, pendiente cancelación de planilla de costo +% por la no presentación de la misma, pendiente Acta de Recepción Definitiva para fines de noviembre 2020, al momento se encuentra en proceso de Auditoria la obra y la fiscalización.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de noviembre 2020, mediante memorando MTOP-CON_ESM-2019-607-ME, se informa al Administrador del contrato del cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comisión Técnica previa la Recepción Definitiva.</p> <p>El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15 tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción, contrato terminado, se gestiona Terminación del contrato Unilateralmente.</p>	<p>Aldas Palacios, Gustavo Ernesto</p>	<p>05/11/2020 - 11:17 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2020:</p> <p>Se remite el documento del proyecto Proyecto de Reconstrucción de Obras por el terremoto 2016 CUP 175200000.0000.381287, dentro del cual está el Componente 4, Obra: "Rehabilitación, rectificación y mejora de la vía E29, tramo: Quinindé - Las Golondrinas", por US\$ 40.205.274,05 (incluido IVA), de los cuales US\$ 33.635.784,56 son recursos de crédito Eximbank de China y US \$ 6.569.489,49 son contraparte fiscal (Ley de Solidaridad), para el período 2018-2020.</p> <p>Es con este proyecto es que se han gestionado los recursos del proyecto Quinindé - Las Golondrinas.</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se terminó se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha 19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, pendiente cancelación de planilla de costo +% por la no presentación de la misma, pendiente Acta de Recepción Definitiva para fines de octubre 2020, al momento se encuentra en proceso de Auditoria la obra y la fiscalización.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de octubre 2020, mediante memorando MTOP-CON_ESM-2019-607-ME, se informa al Administrador del contrato del cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comisión Técnica previa la Recepción Definitiva.</p>	<p>Aldas Palacios, Gustavo Ernesto</p>	<p>05/10/2020 - 10:41 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15 tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción, contrato terminado, se gestiona Terminación del contrato Unilateralmente.</p> <p>AGOSTO 2020 Se remite el documento del proyecto Proyecto de Reconstrucción de Obras por el terremoto 2016 CUP 175200000.0000.381287, dentro del cual está el Componente 4, Obra: "Rehabilitación, rectificación y mejora de la vía E29, tramo: Quinindé - Las Golondrinas", por US\$ 40.205.274,05 (incluido IVA), de los cuales US\$ 33.635.784,56 son recursos de crédito Eximbank de China y US \$ 6.569.489,49 son contraparte fiscal (Ley de Solidaridad), para el período 2018-2020.</p> <p>Es con este proyecto es que se han gestionado los recursos del proyecto Quinindé - Las Golondrinas.</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se terminó se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha 19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, pendiente cancelación de planilla de costo +% por la no presentación de la misma, pendiente Acta de Recepción Definitiva para fines de septiembre 2020, al momento se encuentra en proceso de Auditoria la obra y la fiscalización.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de octubre 2020, mediante memorando MTOP-CON_ESM-2019-607-ME, se informa al Administrador del contrato del cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comisión Técnica previa la Recepción Definitiva.</p> <p>El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15 tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción, contrato terminado, se gestiona Terminación del contrato Unilateralmente.</p>	<p>Aldas Palacios, Gustavo Ernesto</p>	<p>04/09/2020 - 12:50 PM</p>
<p>JULIO 2020 Mediante memorando MTOP-DVIT-2020-165-ME, suscrito por el Ing. Ricardo Paula, Viceministro de Infraestructura de Trasporte se designa nuevo supervisor del proyecto los mismo que pertenecen a la Dirección Distrital de Manabí, todo esto en vista que en la Dirección de Esmeraldas se redujo el personal, se encuentra retomadas las obras con las medidas de seguridad ante el COVID19.</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se terminó se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha 19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, pendiente cancelación de planilla de costo +% por la no presentación de la misma, pendiente Acta de Recepción Definitiva para fines de septiembre 2020, al momento se encuentra en proceso de Auditoria la obra y la fiscalización.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de agosto 2020, mediante memorando MTOP-CON_ESM-2019-607-ME, se informa al Administrador del contrato del cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comisión Técnica previa la Recepción Definitiva.</p> <p>El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15 tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción, contrato terminado, se gestiona Terminación del contrato Unilateralmente.</p>	<p>Aldas Palacios, Gustavo Ernesto</p>	<p>05/08/2020 - 09:10 PM</p>
<p>JUNIO 2020 Mediante memorando MTOP-DVIT-2020-165-ME, suscrito por el Ing. Ricardo Paula, Viceministro de Infraestructura de Trasporte se designa nuevo supervisor del proyecto los mismo que pertenecen a la Dirección Distrital de Manabí, todo esto en vista que en la Dirección de Esmeraldas se redujo el personal.</p> <p>Quinindé - Las Golondrinas: Avance Económico = 25.08 % Avance Físico = 30.00 %</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se terminó se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha 19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, pendiente cancelación de planilla de costo +% por la no presentación de la misma, pendiente Acta de Recepción Definitiva para fines de septiembre 2020.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de agosto 2020, mediante memorando MTOP-CON_ESM-2019-607-ME, se informa al Administrador del contrato del</p>	<p>Aldas Palacios, Gustavo Ernesto</p>	<p>03/07/2020 - 11:37 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comisión Técnica previa la Recepción Definitiva.</p> <p>El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15 tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción, contrato terminado, se gestiona Terminación del contrato Unilateralmente.</p>		
<p>MAYO 2020 Quindé - Las Golondrinas: Avance Económico = 25.08 % Avance Físico = 30.00 %</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha 19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, pendiente cancelación de planilla de costo +% por la no presentación de la misma, pendiente Acta de Recepción Definitiva para fines de septiembre 2020.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de agosto 2020, mediante memorando MTOP-CON_ESM-2019-607-ME, se informa al Administrador del contrato del cumplimiento de las observaciones realizadas por la Comisión Técnica previa la Recepción Definitiva.</p> <p>El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15 tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción, contrato terminado, se gestiona Terminación del contrato Unilateralmente.</p>	<p>Aldas Palacios, Gustavo Ernesto</p>	<p>05/06/2020 - 11:04 AM</p>
<p>ABRIL 2020 Quindé - Las Golondrinas: Avance Económico = 25.08 % Avance Físico = 30.00 %</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha 19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, pendiente cancelación de planilla de costo +% por la no presentación de la misma, pendiente Acta de Recepción Definitiva para fines de mayo 2020.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de abril 2020.</p> <p>El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15 tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción, contrato terminado, se gestiona Terminación del contrato Unilateralmente.</p>	<p>Vivero Cedeño, Cesar Heraclito</p>	<p>05/05/2020 - 10:27 AM</p>
<p>MARZO 2020 Quindé - Las Golondrinas: Se realizan los siguientes rubros en ejecución:</p> <p>Mediante CUR: 93211412 de fecha 04 de marzo de 2020 se solicita el pago del anticipo para la fiscalización del proyecto Quindé - Las Golondrinas. Mediante oficio Nro. 011-FISC-QQG-2020, del Ing. Aníbal Arturo Carrera Director de Fiscalización, informa el avance Económico y avance físico que tiene el proyecto hasta la presente fecha, mismo que se detalla a continuación: El avance del proyecto es el siguiente: Avance Económico = 25.08 % Avance Físico = 30.00 %</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha 19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, pendiente cancelación de planilla de costo +% por la no presentación de la misma, pendiente Acta de Recepción Definitiva para fines de mayo 2020.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de mayo 2020.</p> <p>El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15 tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción - Transporte de piedra, colocación de piedra, excavación y peinado de talud, actualmente esta en un 95% de avance físico.</p>	<p>Vivero Cedeño, Cesar Heraclito</p>	<p>05/04/2020 - 09:57 AM</p>
<p>FEBRERO 2020 Quindé - Las Golondrinas: Se realizan los siguientes rubros en ejecución:</p>	<p>Vivero Cedeño, Cesar Heraclito</p>	<p>05/03/2020 - 05:00 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Rubros en ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcción de alcantarillas</li> <li>- Préstamo importado</li> <li>- Sub base clase 3</li> <li>- Base clase 1</li> <li>- Desbroce</li> <li>- Retiro de capa vegetal</li> <li>- Explotación de material en las minas</li> <li>- Mantenimiento de accesos a minas</li> <li>- Colocación de Carpeta asfáltica</li> </ul> <p>El fin contractual del proyecto esta estimado para Diciembre del 2020, actualmente presenta un avance físico del 25%.</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha 19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, pendiente cancelación de planilla de costo +% por la no presentación de la misma, pendiente Acta de Recepción Definitiva para fines de mayo 2020.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de marzo 2020.</p> <p>El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15 tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción - Transporte de piedra, colocación de piedra, excavación y peinado de talud, actualmente esta en un 95% de avance físico.</p>		
<p>ENERO 2020:</p> <p>Qunindé - Las Golondrinas: Se realizan los siguientes rubros en ejecución:</p> <p>Rubros en ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>#Construcción de alcantarillas</li> <li>#Préstamo importado</li> <li>#Sub base clase 3</li> <li># Base clase 1</li> <li>#Desbroce</li> <li>#Retiro de capa vegetal</li> <li>#Explotación de material en las minas</li> <li>#Mantenimiento de accesos a minas</li> </ul> <p>El fin contractual del proyecto esta estimado para Diciembre del 2020, actualmente presenta un avance físico del 25%.</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha 19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, pendiente cancelación de planilla de costo +% por la no presentación de la misma, pendiente Acta de Recepción Definitiva para fines de mayo 2020.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de marzo 2020.</p> <p>El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15 tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción - Transporte de piedra, colocación de piedra, excavación y peinado de talud, actualmente esta en un 95% de avance físico.</p>	<p>Vivero Cedeño, Cesar Heraclito</p>	<p>05/02/2020 - 12:01 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2019:</p> <p>Qunindé - Las Golondrinas: Se realizan los siguientes rubros en ejecución:</p> <p>Rubros en ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>#Construcción de alcantarillas</li> <li>#Préstamo importado</li> <li>#Sub base clase 3</li> <li># Sub base clase 1</li> <li>#Desbroce</li> <li>#Retiro de capa vegetal</li> <li>#Explotación de material en las minas</li> <li>#Mantenimiento de accesos a minas</li> </ul>	<p>Vivero Cedeño, Cesar Heraclito</p>	<p>03/01/2020 - 02:14 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>.</p> <p>El fin contractual del proyecto esta estimado para noviembre del 2020.</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha 19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva, cabe indicar que no existe aval asignado para este año.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para principios de enero 2020.</p> <p>El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15 tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción - Trasporte de piedra, colocación de piedra, excavación y peinado de talud.</p>		
<p>NOVIEMBRE 2019:</p> <p>Quindé - Las Golondrinas: Se realizan los siguientes rubros en ejecución:</p> <p>Costo de construcción del puente sobre el río Guayllabamba (177,00 m) : \$ 5'213.886,35 (este valor se encuentra incluido en el costo de la obra)</p> <p>Costo de construcción del puente sobre el río Duana (28,00 m): \$ 365.933,52 (este valor se encuentra incluido en el costo de la obra)</p> <p>Rubros en ejecución:                      #Construcción de alcantarillas                      #Préstamo importado                      #Sub base clase 3                      # Sub base clase 1                      #Desbroce                      #Expropiaciones                      #Retiro de capa vegetal                      #Explotación de material en las minas                      #Mantenimiento de accesos a minas</p> <p>.</p> <p>El fin contractual del proyecto esta estimado para julio del 2020.</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha 19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva, cabe indicar que no existe aval asignado para este año.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite de legalización la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de noviembre 2019.</p> <p>El Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15 tramo Camarones - Achilube, Reconstrucción - Trasporte de piedra, colocación de piedra, excavación y peinado de talud.</p>	<p>Vivero Cedeño, Cesar Heraclito</p>	<p>03/01/2020 - 02:14 PM</p>
<p>OCTUBRE 2019:</p> <p>Quindé - Las Golondrinas: Se realizan los siguientes rubros en ejecución:                      Presentado por el Consorcio CRBC-CEIC determina que es necesario el incremento de este rubro debido a que las cantidades contractuales estaban sub estimadas, por lo que se tramita una Orden de Cambio por un monto de \$1.465.110,95, correspondiente al 4,36%.</p> <p>Para el Contrato Complementario, el Consorcio CRBC-CEIC determina que es necesaria la creación de rubros nuevos, por lo que se tramita un Contrato Complementario por un monto de \$ 776.803,79 correspondiente al 2,31 %.</p> <p>El fin contractual del proyecto esta estimado para julio del 2020.</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha 19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva, cabe indicar que no existe aval asignado para este año.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de noviembre 2019.</p>	<p>Vivero Cedeño, Cesar Heraclito</p>	<p>05/11/2019 - 04:56 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se suscribe contrato complementario 1, en el Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15 tramo Camarones - Achilube por un valor de \$ 3404168.47 dólares y un plazo de 145 días.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2019:</p> <p>Quindé - Las Golondrinas: Se realizan los siguientes rubros en ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Construcción de alcantarillas</li> <li>* Préstamo importado</li> <li>* Desbroce</li> <li>* Expropiaciones</li> <li>* Retiro de capa vegetal</li> <li>* Explotación de material en las minas</li> <li>* Mantenimiento de accesos a minas</li> </ul> <p>El fin contractual del proyecto esta estimado para julio del 2020.</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino se suscribe Acta Recepción Provisional con fecha 19 de julio 2019, con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva, cabe indicar que no existe aval asignado para este año.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de octubre 2019.</p> <p>Se suscribe contrato complementario 1, en el Proyecto Reconstrucción de Muro de Escolleras de Camarones y Plataforma de la vía E15 tramo Camarones - Achilube por un valor de \$ 3404168.47 dólares y un plazo de 145 días.</p>	<p>Vivero Cedeño, Cesar Heraclito</p>	<p>04/10/2019 - 02:45 PM</p>
<p>AGOSTO 2019:</p> <p>Quindé - Las Golondrinas: Se realizan los siguientes rubros en ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Construcción de alcantarillas</li> <li>* Préstamo importado</li> <li>* Desbroce</li> <li>* Expropiaciones</li> <li>* Retiro de capa vegetal</li> <li>* Explotación de material en las minas</li> <li>* Mantenimiento de accesos a minas</li> </ul> <p>El fin contractual del proyecto esta estimado para julio del 2020.</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva, prevista para fines de septiembre 2019, cabe indicar que no existe aval asignado para este año.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de septiembre 2019.</p>	<p>Vivero Cedeño, Cesar Heraclito</p>	<p>05/09/2019 - 10:51 AM</p>
<p>JULIO 2019:</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva, prevista para fines de agosto 2019, cabe indicar que no existe aval asignado para este año, por lo que se encuentra congelado.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de agosto 2019.</p>	<p>Vivero Cedeño, Cesar Heraclito</p>	<p>02/08/2019 - 05:10 PM</p>
<p>JUNIO 2019:</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva, prevista para fines de julio 2019, cabe indicar que no existe aval asignado para este año, por lo que se encuentra congelado.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de julio 2019.</p>	<p>Vivero Cedeño, Cesar Heraclito</p>	<p>04/07/2019 - 05:19 PM</p>
<p>MAYO 2019:</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva, prevista para fines de junio 2019, cabe indicar que no existe aval asignado para este año, por lo que se encuentra congelado.</p>	<p>Vivero Cedeño, Cesar Heraclito</p>	<p>05/06/2019 - 09:30 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisional del 19 de marzo de 2018, en trámite la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de junio 2019.		
<p>ABRIL 2019:</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva, prevista para fines de junio 2019, cabe indicar que no existe aval asignado para este año, por lo que se encuentra congelado.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisional del 19 de marzo de 2018, en trámite la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de junio 2019.</p>	Vivero Cedeño, Cesar Heraclito	02/05/2019 - 10:23 AM
<p>MARZO 2019:</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva, prevista para fines de marzo 2019, cabe indicar que no existe aval asignado para este año, por lo que se encuentra congelado.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisional del 19 de marzo de 2018, en trámite la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de abril 2019.</p>	Vivero Cedeño, Cesar Heraclito	03/04/2019 - 04:16 PM
<p>FEBRERO 2019:</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva, prevista para fines de marzo 2019, cabe indicar que no existe aval asignado para este año, por lo que se encuentra congelado.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisional del 19 de marzo de 2018, en trámite la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de marzo 2019.</p>	Ortiz Campos, Lenin Herminio	01/03/2019 - 05:13 PM
<p>ENERO 2019:</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva, prevista para fines de marzo 2019, cabe indicar que no existe aval asignado para este año, por lo que se encuentra congelado.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisional del 19 de marzo de 2018, en trámite la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de febrero 2019.</p>	Ortiz Campos, Lenin Herminio	05/02/2019 - 04:13 PM
<p>ENERO 2018:</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva, prevista para fines de marzo 2019, cabe indicar que no existe aval asignado para este año, por lo que se encuentra congelado.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisional del 19 de marzo de 2018, en trámite la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de febrero 2019.</p>	Ortiz Campos, Lenin Herminio	05/02/2019 - 03:07 PM
<p>DICIEMBRE 2018:</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva, prevista para fines de marzo 2019, cabe indicar que no existe aval para el pago.</p> <p>Demoliciones: Se da por finalizadas las Demoliciones, no se han recibido más solicitudes por parte del GADM.</p> <p>Puente Muisne: Se encuentra legalizada el Acta Recepción Definitiva y el Acta de entrega al GADM, proyecto terminado.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisional del 19 de marzo de 2018, en trámite la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de febrero 2019.</p>	Ortiz Campos, Lenin Herminio	04/01/2019 - 11:52 AM
<p>NOVIEMBRE 2018:</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva, prevista para fines de Diciembre 2018, cabe indicar que no existe aval para el pago.</p> <p>Demoliciones: Se da por finalizadas las Demoliciones, no se han recibido más solicitudes por parte del GADM.</p> <p>Puente Muisne: Se encuentra legalizada el Acta Recepción Definitiva y el Acta de entrega al GADM, proyecto terminado.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisional del 19 de marzo de 2018, en trámite la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de noviembre 2018.</p>	Ortiz Campos, Lenin Herminio	03/12/2018 - 12:19 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>OCTUBRE 2018:</b></p> <p>Demoliciones: Pendiente recepción de Demoliciones, la última se realizó con maquinaria del MTOP.</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva, prevista para fines de Diciembre 2018.</p> <p>Puente Muisne: Se encuentra legalizada el Acta Recepción Definitiva y el Acta de entrega al GADM, proyecto terminado.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de noviembre 2018.</p>	<p>Ortiz Campos, Lenin Herminio</p>	<p>05/11/2018 - 08:48 AM</p>
<p><b>SEPTIEMBRE 2018:</b></p> <p>Demoliciones: Pendiente recepción de Demoliciones, la última se realizó con maquinaria del MTOP.</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva.</p> <p>Puente Muisne: Se encuentra legalizada el Acta Recepción Definitiva y el Acta de entrega al GADM</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado y en trámite la Acta Recepción Provisional.</p>	<p>Ortiz Campos, Lenin Herminio</p>	<p>02/10/2018 - 02:24 PM</p>
<p><b>AGOSTO 2018:</b></p> <p>Demoliciones: Pendiente recepción de Demoliciones, la última se realizara con maquinaria del MTOP.</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%.</p> <p>Puente Muisne: Se encuentra legalizada el Acta Recepción Definitiva y el Acta de entrega al GADM</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado y en trámite la Acta Recepción Provisional.</p>	<p>Estupiñan Echeverria, Victor Hugo</p>	<p>04/09/2018 - 09:19 AM</p>
<p><b>JULIO 2018:</b></p> <p>Demoliciones: Pendiente recepción de Demoliciones, la última se realizara con maquinaria del MTOP.</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%.</p> <p>Puente Muisne: Se encuentra legalizada el Acta Recepción Definitiva y el Acta de entrega al GADM</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado y en trámite la Acta Recepción Provisional.</p>	<p>Estupiñan Echeverria, Victor Hugo</p>	<p>01/08/2018 - 11:02 AM</p>
<p><b>JUNIO 2018:</b></p> <p>Demoliciones: Pendiente trámites hasta completar documentación conforme protocolos establecidos en los cantones Muisne, Atacames, Quinindé y Esmeraldas.</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%.</p> <p>Puente Muisne: Se encuentra legalizada el Acta Recepción Definitiva y el Acta de entrega al GADM</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado y en trámite la Acta Recepción Provisional.</p>	<p>Estupiñan Echeverria, Victor Hugo</p>	<p>05/07/2018 - 08:39 AM</p>
<p><b>MAYO 2018:</b></p> <p>Demoliciones: Pendiente trámites hasta completar documentación conforme protocolos establecidos en los cantones Muisne, Atacames, Quinindé y Esmeraldas.</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%.</p> <p>Puente Muisne: Se encuentra legalizada el Acta Recepción Definitiva y el Acta de entrega al GADM</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado y en trámite la Acta Recepción Provisional.</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>05/06/2018 - 02:57 PM</p>
<p><b>ABRIL 2018:</b></p> <p>Demoliciones: Pendiente trámites hasta completar documentación conforme protocolos establecidos en los cantones Muisne, Atacames, Quinindé y Esmeraldas.</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%.</p> <p>Puente Muisne: Se encuentra legalizada el Acta Recepción Definitiva y el Acta de entrega al GADM</p>	<p>Rodas Mejía, Vicente Fernando</p>	<p>04/05/2018 - 05:38 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Puente Cupa: Se encuentra terminado y en trámite la Acta Recepción Provisional.		
<p>MARZO 2018:</p> <p>Demoliciones: Pendiente trámites hasta completar documentación conforme protocolos establecidos en los cantones Muisne, Atacames, Quinindé y Esmeraldas.</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%.</p> <p>Puente Muisne: Se encuentra en legalización el Acta Recepción Definitiva</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado y en trámite la Acta Recepción Provisional.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/04/2018 - 04:29 PM
<p>FEBRERO 2018:</p> <p>Demoliciones: Pendiente trámites hasta completar documentación conforme protocolos establecidos en los cantones Muisne, Atacames, Quinindé y Esmeraldas.</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%.</p> <p>Puente Muisne: Se encuentra en legalización el Acta Recepción Definitiva</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado en tramite Acta Recepción Provisional.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	19/03/2018 - 09:36 AM
<p>ENERO 2018:</p> <p>Demoliciones: Pendiente trámites hasta completar documentación conforme protocolos establecidos en los cantones Muisne, Atacames, Quinindé y Esmeraldas.</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%.</p> <p>Puente Muisne: Se encuentra en legalización el Acta Recepción Definitiva</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado en tramite Acta Recepción Provisional.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	20/02/2018 - 04:13 PM
<p>DICIEMBRE 2017:</p> <p>Demoliciones: Se culminó con las demoliciones en los cantones Muisne, Atacames y Esmeraldas.</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en o proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%</p> <p>Puente Muisne: Se encuentra en legalización el Acta Recepción Provisional.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado en tramite Acta Recepción Provisional.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/01/2018 - 03:37 PM
<p>NOVIEMBRE 2017:</p> <p>Demoliciones: Se se ejecutaron las demoliciones en los cantones Muisne, Atacames y Esmeraldas.</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en o proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%</p> <p>Puente Muisne: Se encuentra en legalización el Acta Recepción Provisional.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado en tramite Acta Recepción Provisional y Planillas pendientes de pago.</p>	Vivero Cedeño, Cesar Heraclito	05/12/2017 - 07:09 PM
<p>OCTUBRE 2017:</p> <p>Demoliciones: Se se contrataron las demoliciones en los cantones Muisne, Atacames y Esmeraldas.</p> <p>Reconstrucción Mataje: El proyecto se encuentra suspendido a partir del 7 de septiembre por motivos de lluvia. Con un avance de obra del 90%</p> <p>Puente Muisne: Se encuentra en legalización el Acta Recepción Provisional.</p> <p>Puente Cupa: Se encuentra terminado en tramite Acta Recepción Provisional y Planillas pendientes de pago.</p>	Vivero Cedeño, Cesar Heraclito	01/11/2017 - 09:30 AM
<p>SEPTIEMBRE 2017:</p> <p>Se encuentran en trámite la contratación para iniciar el proceso de derrocamiento remoción y desalojo de escombros en los cantones Muisne, Atacames y Esmeraldas.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/10/2017 - 04:43 PM
<p>AGOSTO 2017:</p> <p>Se encuentran en trámite la contratación para iniciar el proceso de derrocamiento remoción y desalojo de escombros en los cantones Muisne, Atacames y Esmeraldas.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/09/2017 - 03:31 PM
<p>JULIO 2017:</p> <p>Se encuentran en trámite la contratación para iniciar el proceso de derrocamiento remoción y desalojo de escombros en el cantón Muisne, Atacames y Esmeraldas.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	03/08/2017 - 04:51 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>JUNIO 2017:</b></p> <p>Se receipto información por parte de los GAD's de se ha efectuado demoliciones en Esmeraldas 3, en Atacames 3 y en Quinindé 59, se encuentran en tramite de contratación las demoliciones de Chamanga.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	04/07/2017 - 04:55 PM
<p><b>MAYO 2017:</b></p> <p>Se receipto información por parte de los GAD's de se ha efectuado 95 demoliciones de las cuales 93 en el cantón de Atacames y 2 en Esmeraldas, se prevé realizar en Quinindé y Chamanga para el mes de junio 2017.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	06/06/2017 - 04:06 PM
<p><b>ABRIL 2017:</b></p> <p>Se receipto información por parte de los GAD's de Atacames y Esmeraldas, se hizo la verificación de la viviendas se estan ejecutando los planes de trabajo.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/05/2017 - 07:17 PM
<p><b>MARZO 2017:</b></p> <p>Se receipto información por parte de los GAD's de Atacames y Esmeraldas, se hizo la verificación de la viviendas para armar los planes de trabajo.</p>	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/04/2017 - 04:28 PM
<p><b>FEBRERO 2017:</b></p> <p>Se demolio casas en Atacames y una casa en Esmeraldas, se estan tramitando los pagos correspondientes y se espera informes de GADPE para continuar los trabajos.</p>	Rodas Mejía, Vicente Fernando	03/03/2017 - 05:00 PM

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p><b>3- REGIONAL. Ambiental.</b> Las fuertes lluvias CAUSARÍAN el retraso de la ejecución de la obra</p>	05/01/2021	Gustavo Ernesto Aldas Palacios	60 %	80	48	1/1

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto
No hay información disponible

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	ANTEPROYECTO: Solicitud del propietario al MIDUVI, entregada	1-Solicitud de Información	03/01/2017		03/01/2017		Sí	0.0
2	ANTEPROYECTO: Inspección por parte del MIDUVI, realizada	1-Solicitud de Información	04/01/2017		04/01/2017		Sí	0.0
3	ANTEPROYECTO: Informe de inspección por parte del MIDUVI, realizada	1-Solicitud de Información	05/01/2017		05/01/2017		Sí	0.0
4	DEFINICIÓN: Aprobación de demolición por parte del propietario, realizada	1-Solicitud de Información	06/01/2017		06/01/2017		Sí	10.0
5	PLANEACIÓN: Orden de demolición por parte del GAD cantonal, emitida	5-Entregables Intermedios	12/01/2017		12/01/2017		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
6	PLANEACIÓN: informe por parte del GAD cantonal de las viviendas a demoler, emitida	5-Entregables Intermedios	13/01/2017		13/01/2017		Sí	5.0
7	EJECUCIÓN: Contratación del proyecto por parte del MTOP, realizada	3-Adjudicación	20/01/2017		20/01/2017		Sí	3.0
8	EJECUCIÓN: Creación del cronograma para la demolición, remoción y desalojos de escombros por parte contratista, realizada	4-Inicio de Trabajo	29/03/2017		29/03/2017		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Demolición, remoción y desalojos de escombros por parte contratista, realizada	4-Inicio de Trabajo	28/04/2017		28/04/2017		Sí	8.0
10	EJECUCIÓN: Construcción del puente sobre el río Mataje, realizada	4-Inicio de Trabajo	25/07/2017		15/04/2017		Sí	10.0
11	CIERRE: Liquidación económica - Muisne, pagada	5-Entregables Intermedios	04/08/2017		01/12/2017		Sí	0.1
12	CIERRE: Recepción Provisional - Muisne, legalizada	9-Entregables Formales	04/08/2017		12/07/2017		Sí	0.1
13	CIERRE: Informe por parte de fiscalización de las edificaciones demolidas, emitido	9-Entregables Formales	08/08/2017		16/12/2017		Sí	0.1
14	CIERRE: Liquidación económica de las demoliciones, emitido	9-Entregables Formales	09/08/2017		31/07/2018		Sí	0.5
15	EJECUCIÓN: Construcción de estructura del pavimento - Mataje, finalizada	4-Inicio de Trabajo	12/12/2017		28/11/2017		Sí	9.0
16	EJECUCIÓN: Construcción de alcantarillas - Mataje, realizada	4-Inicio de Trabajo	19/12/2017		31/03/2017		Sí	10.0
17	EJECUCIÓN: Señalización vertical y Horizontal - Mataje, realizada	4-Inicio de Trabajo	22/12/2017		22/12/2017		Sí	7.0
18	CIERRE: Informes de Fiscalización - Mataje aprobados	5-Entregables Intermedios	25/12/2017		23/09/2019		Sí	0.5
19	CIERRE: Recepción provisional legalizada - Mataje Suscrita	9-Entregables Formales	25/12/2017		19/07/2019		Sí	0.5
20	CIERRE: Recepción Definitiva - Demoliciones, legalizada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	29/12/2017		15/11/2018		Sí	0.5
21	CIERRE: Recepción Definitiva - Muisne, legalizada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	29/12/2017		26/01/2018		Sí	0.1
22	EJECUCIÓN: Ejecución de obra básica y conformación de plataforma de Quinindé - Las Golondrinas realizada	4-Inicio de Trabajo	01/10/2020		01/10/2020		Sí	5.0
23	CIERRE: Liquidación Económica - Mataje aprobada	5-Entregables Intermedios	15/10/2020	15/10/2020			No	0.1
24	CIERRE: Recepción Definitiva legalizada - Mataje suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/10/2020	30/10/2020			No	0.5

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
25	EJECUCIÓN: Transporte de materiales de Quinindé - Las Golondrinas realizada	4-Inicio de Trabajo	30/11/2020	30/11/2020		▼	No	5.0
26	EJECUCIÓN: Conformación de la estructura de pavimento de Quinindé - Las Golondrinas realizada	5-Entregables Intermedios	01/12/2020	01/12/2020		▼	No	2.0
27	EJECUCIÓN: Ejecución de obras de arte menor de Quinindé - Las Golondrinas realizada	5-Entregables Intermedios	07/12/2020	07/12/2020		▼	No	2.0
28	EJECUCIÓN: Señalización vial de Quinindé - Las Golondrinas realizada	5-Entregables Intermedios	14/12/2020	14/12/2020		▼	No	2.0
29	CIERRE: Informes de Fiscalización de Quinindé - Las Golondrinas aprobados	5-Entregables Intermedios	17/12/2020	17/12/2020		▼	No	1.0
30	CIERRE: Liquidación Económica de Quinindé - Las Golondrinas realizada	9-Entregables Formales	17/12/2020	17/12/2020		▼	No	1.0
31	CIERRE: Acta Entrega Recepción de Quinindé - Las Golondrinas suscrita	5-Entregables Intermedios	18/12/2020	18/12/2020		▼	No	1.0
32	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	18/12/2020	18/12/2020		▼	No	2.0
33	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	V - Verificación ejecutiva	21/12/2020	21/12/2020		▼	No	1.0
34	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	V - Verificación ejecutiva	30/12/2020	30/12/2020		▼	No	1.0
35	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	V - Verificación ejecutiva	30/12/2020	30/12/2020		▼	No	1.5
36	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	V - Verificación ejecutiva	30/12/2020	30/12/2020		▼	No	0.5
37	COMPLETADO: Informe de Cierre de Proyectos (SENPLADES) aprobado.	V - Verificación ejecutiva	31/12/2020	31/12/2020		▼	No	0.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de Obra del Proyecto Quinindé- Las Golondrinas		43.90 %	1	0.439	01/01/2020	Jul-Dic


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	38,111,500.47 **
Costo Total:	31,927,094.24
Total Devengado:	28,231,382.29
% Costo Total Devengado:	88.42 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 88.42 %

**Perfil Económico 2020**

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	18,061,024.60	0.00	0.00	18,061,024.60
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	28,751,476.51	18,167,592.33	0.00	46,919,068.84
Ppto. Comprometido	13,082,626.85	0.00	0.00	13,082,626.85
Planeado - Codificado (2020)		-18,167,592.33		
Programado a Devengar	24,780,464.65	16,543,641.59	0.00	41,324,106.24
Ppto. Devengado	21,567,858.88	6,663,523.41	0.00	28,231,382.29
Pagado Real	9,321,751.44	0.00	0.00	9,321,751.44
Estimado a fin de año	* 21,567,858.88	0.00	0.00	21,567,858.88
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	3,212,605.77	16,543,641.59	0.00	19,756,247.36
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 87.04 %	40.28 %	0.00 %	68.32 %
Ppto. Codificado 998	1,193,249.96	0.00	0.00	1,193,249.96
Ppto. Devengado 998	838,352.98	0.00	0.00	838,352.98

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020**

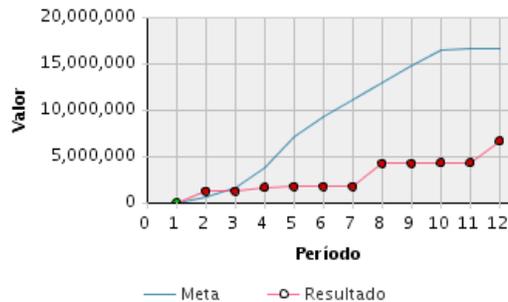

**Presupuesto Mensual 2020**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.00 %

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	618,966.70	1,246,331.72	618,966.70	1,246,331.72	201.36 %		7.53 %
Mar	975,880.92	0.00	1,594,847.62	1,246,331.72	78.15 %		7.53 %
Abr	2,132,492.70	372,261.06	3,727,340.32	1,618,592.78	43.42 %		9.78 %
May	3,315,334.33	117,748.67	7,042,674.65	1,736,341.45	24.65 %		10.50 %
Jun	2,197,949.64	7,784.64	9,240,624.29	1,744,126.09	18.87 %		10.54 %
Jul	1,823,279.31	0.00	11,063,903.60	1,744,126.09	15.76 %		10.54 %
Ago	1,823,279.31	2,463,898.78	12,887,182.91	4,208,024.87	32.65 %		25.44 %
Sep	1,823,279.31	1,671.85	14,710,462.22	4,209,696.72	28.62 %		25.45 %
Oct	1,734,085.05	99,221.98	16,444,547.27	4,308,918.70	26.20 %		26.05 %
Nov	99,094.32	0.00	16,543,641.59	4,308,918.70	26.05 %		26.05 %
Dic	0.00	2,354,604.71	16,543,641.59	6,663,523.41	40.28 %		40.28 %
<b>Total</b>	<b>16,543,641.59</b>	<b>6,663,523.41</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
15	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
16	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos
18	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1. Listado de casas a demoler	demoliciones.xlsx	03/03/2017
2	A2. INFORME DEMOLICIONES	INFORME_DEMOLICIONES.doc	05/04/2017
3	A3. FOTOS DEMOLICIONES	ANEXO_FOTOGRAFICO.xls	05/04/2017
4	A4.MEMORAMDO MTOP-CONS_ESM-2017-26-ME	A4.MEMORANDO_MTOP-CONS_ESM-2017-26-ME.pdf	05/07/2017
5	A5. 16552 -acta_definitiva_puente_muisne -2018	A5._16552_-acta_definitiva_puente_muisne_-2018.pdf	16/04/2018
6	A6. 16552-acta_entrega_puente_muisne_a_gad_de_muisne- 2018	A6._16552-acta_entrega_puente_muisne_a_gad_de_muisne-_2018.pdf	16/04/2018
7	A7. 17728-ACTA RECEPCION PROVISIONAL-2018	A7._17728-ACTA_RECEPCION_PROVISIONAL-2018.PDF	07/09/2018
8	A8. ACTA DE CUMPLIMIENTO DEMOLICIONES-2018	A8._ACTA_DE_CUMPLIMIENTO_DEMOLICIONES-2018.pdf	15/11/2018
9	A9. Devengado Esigef enero 2019	A9._Devengado_Esigef_enero_2019.pdf	02/08/2019
10	B1. Devengado Esigef Febrero 2019	B1._Devengado_Esigef_febrero_2019.pdf	05/08/2019
11	B2. Devengado Esigef marzo 2019	B2._Devengado_Esigef_marzo_2019.pdf	05/08/2019
12	B3. Devengado Esigef abril 2019	B3._Devengado_Esigef_abril_2019.pdf	05/08/2019
13	B4. Devengado Esigef mayo 2019	B4._Devengado_Esigef_mayo_2019.pdf	05/08/2019
14	B5. Devengado Esigef junio 2019	B5._Devengado_Esigef_junio_2019.pdf	05/08/2019
15	B6. Devengado Esigef julio 2019	B6._Devengado_Esigef_julio_2019.pdf	05/08/2019
16	B7. Devengado Esigef agosto 2019	B7._Devengado_Esigef_agosto_2019.pdf	05/09/2019

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
17	B8. Ayuda memoria Quininde Las Golondrinas-Agosto 2019	B8._Ayuda_memoria_Quininde_Las_Golondrinas-_Agosto_2019.pdf	05/09/2019
18	B9-Alineada al Hito 20 - 15925-ACTA PROVISIONAL-2019	B9-Alineada_al_Hito_20_-_15925-ACTA_PROVISIONAL-2019.pdf	16/09/2019
19	C1. Devengado eSIGEF - Septiembre 2019	C1._Devengado_eSIGEF_-_Septiembre_2019.pdf	04/10/2019
20	C2. CONTRATO COMPLEMENTARIO FOPECA	C2._CONTRATO_COMPLEMENTARIO_FOPECA.pdf	04/10/2019
21	C3. Devengado eSIGEF - Octubre 2019	C3._Devengado_eSIGEF_-_Octubre_2019.pdf	05/11/2019
22	C4. Ficha_Proyecto	C4._Ficha_Proyecto.pdf	25/11/2019
23	C5. COSTO TOTAL POR YECTO - SENPLADES - SIPeIP - Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública	C5._COSTO_TOTAL_PORYECTO_-_SENPLADES_-_SIPeIP_-_Sistema_Integrado_de_Planificación_e_Inversión_Pública.pdf	25/11/2019
24	C6. TERREMOTO DECRETO PRESIDENCIAL	C6._TERREMOTODECRETOPRESIDENCIAL.PDF	25/11/2019
25	C7. SOLICITUD A SENPLADES	C7._SOLICITUDASENPLADES.PDF	25/11/2019
26	C8. Devengados Noviembre 2019	C8._Devengados_Noviembre_2019.pdf	05/12/2019
27	C9. Alineado a Problema - Plan contingencia Dirección Distrital Esmeraldas	C9._Alineado_a_Problema_-_Plan_contingencia_dir_distrital_esmeraldas.pdf	03/01/2020
28	D1. cedula presupuestaria diciembre 2019	D1._cedula_presupuestaria_diciembre_2019.pdf	05/02/2020
29	D2. Cédula presupuestaria enero 2020	D2._Cédula_presupuestaria_enero_2020.pdf	05/02/2020
30	D3. Cedula_marzo 2020	D3._Cedula_marzo_2020.pdf	05/04/2020
31	D4. CEDULA_ABRIL 2020	D4._CEDULA_ABRIL_2020.pdf	05/05/2020
32	D5. DECRETO PRESIDENCIAL DE EMERGENCIA - NO HAY DICTAMEN DE PRIORIDAD	D5._DECRETO_PRESIDENCIAL_DE_EMERGENCIA_-_NO_HAY_DICTAMEN_DE_PRIORIDAD.PDF	26/05/2020
33	D6. DESIGNACION DE LIDER DE PROYECTO - MTOP-DDE-2020-498-ME	D6._DESIGNACION_DE_LIDER_DE_PROYECTO_-_MTOP-DDE-2020-498-ME.pdf	04/06/2020
34	D7. CEDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2020	D7._CEDULA_PRESUPUESTARIA_MAYO_2020.pdf	05/06/2020
35	D8. Cedula presupuestaria junio 2020	D8._Cedula_presupuestaria_junio_2020.pdf	03/07/2020
36	D9. Cedula presupuestaria julio 2020	D9._Cedula_presupuestaria_julio_2020.pdf	05/08/2020
37	E1. Dictamen de Prioridad Senplades-sip-2018-0832-Eximbank	E1._Dictamen_de_Prioridad_Senplades-sip-2018-0832-Eximbank.pdf	04/09/2020
38	E2. CEDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2020	E2._CEDULA_AGOSTO.pdf	04/09/2020
39	E3. CEDULA SEPTIEMBRE 2020	E3._CEDULA_SEPTIEMBRE_2020.pdf	05/10/2020
40	E4. Alineado a Hito 22-Reporte quininde-las golondrinas esmeraldas.xls-20-10-2020	E4._Alineado_a_Hito_22-Reporte_quininde-las_golondrinas_esmeraldas.xls-20-10-2020.xls	05/11/2020
41	E5. Reporte-Cedula Presupuestaria de Octubre 2020	E5._Reporte-Cedula_Presupuestaria_de_Octubre_2020.pdf	05/11/2020
42	E6.Cedula Presupuestaria noviembre2020	E6.Cedula_Presupuestaria_noviembre2020.pdf	04/12/2020
43	E7. CEDULA PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2020	E7._CEDULA_PRESUPUESTARIA_DICIEMBRE_2020.pdf	29/12/2020
44	E8. ALINEADO A RIESGO - Las fuertes lluvias CAUSARÍAN el retraso de la ejecución de la obra	E8._ALINEADO_A_RIESGO_-_Las_fuertes_lluvias_CAUSARÍAN_el_retraso_de_la_ejecución_de_la_obra.pdf	05/01/2021

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	Supervisor	Analista de Infraestructura Provincial 1	galdas@mtop.gob.ec	023974600 / 0958988062 / 11615
Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	Líder del proyecto	Analista de Infraestructura Provincial 1	galdas@mtop.gob.ec	023974600 / 0958988062 / 11615
Rezabala Zamora, Maritza Del Carmen	Supervisora Financiera (E)	Supervisora Financiera de Esmeraldas	mrezabala@mtop.gob.ec	0988270005 / 11606
Valencia Lara, Gustavo Stalin	Administrador del Proyecto	SUBSECRETARIO ZONAL 1	gvalencia@mtop.gob.ec	0983585159

## FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
119360_1.jpg	05/02/2020
