

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Proyectos SECOB

PROYECTO: K078 SECOB - MSP - Construcción del Hospital General Napoleón Dávila Córdova de 120 camas de Chone y la Provisión e instalación del Equipamiento médico y mobiliario en general destinado al hospital

Líder del Proyecto:	Topón Albornoz, Roberto Carlos (rtoyon@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Espinoza Vivanco, Darwin Gonzalo	Programas Relacionados:	
Titular:	Sotomayor Toro, John Francisco	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	123200000.632.2477	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	24,750,612.08
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	25/06/2018 - 31/03/2021
Fecha de última actualización:	04/05/2021	Fecha de Fin Base:	30/09/2020
Modificado por:	Topón Albornoz, Roberto Carlos	Fecha del siguiente Hito:	31/07/2020

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES

Descripción

PROYECTO: Programa de apoyo a la extensión en la protección social y atención integral en salud.

PRODUCTO: Hospital General Napoleón Dávila Córdova de 120 camas de Chone y la Provisión e instalación del Equipamiento médico y mobiliario en general destinado al hospital

PROPÓSITO: Dotar de infraestructura hospitalaria al Cantón Chone

Beneficios Cualitativos

Modernización, eficiencia y calidad del servicio hospitalario en las instituciones públicas,
.Adecuada funcionalidad espacial, confort ambiental y dotación de equipamiento -mobiliario y equipos- que dignifiquen las condiciones de trabajo tanto de los funcionarios como de los pacientes.
.Mejoramiento de las unidades hospitalarias, enmarcando una nueva imagen institucional, estandarizando materiales y mejorando la calidad de atención a sus habitantes.

Tipo de Beneficiario

Los habitantes del sector de Chone

Restricciones

TIEMPO:

El plazo del contrato es de 600 días

COSTO:

- El monto del contrato es de \$.50.312.053.38

ALCANCE: Los habitantes del sector de Chone


RECURSOS:

Tecnológicos, Humanos, Económicos

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 25/06/2018 Fecha de Fin: 31/03/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

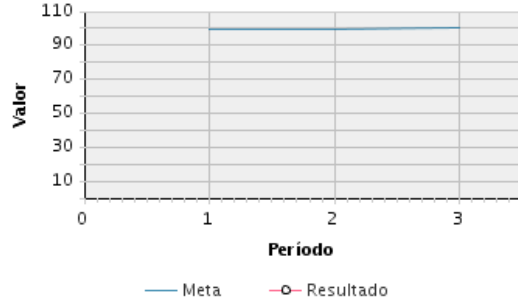

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	0 %								
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Abril 2021 1.- La obra se encuentra concluida. 2.- Pendiente entrega de Planos As Built y Manuales de operación y Mantenimiento. 3.- Pendiente inicio del proceso de Recepción Provisional, Acta única de recepción de equipamiento médico y mobiliario en general. 4.- Pendiente pagos de planillas.	Topón Albornoz, Roberto Carlos	04/05/2021 - 02:41 PM
Marzo 2021 1.- La obra se encuentra en ejecución, con un avance físico de 92,70 %, en lo que corresponde a las obras de infraestructura se encuentra concluido, lo mismo la provisión e instalación del equipamiento médico. 2.- Actualmente se interviene en la construcción del Contrato Complementario No. 3, que incluye, la RED DE MEDIO VOLTAJE DE 13.8 KV, que dotará de energía limpia y exclusiva para el Hospital de Chone, proyecto eléctrico que tiene un avance físico aproximado del 80,00 %. 3.- Se encuentran ejecutando relleno y compactación, armaduras para tapas de calzadas vehicular, pinturas en exteriores.	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	05/04/2021 - 11:04 PM
Febrero 2021 1.- Obra en ejecución 2.- Avance de obra 90.3 % 3.- La obra se encuentra en ejecución, principalmente, la construcción del Contrato Complementario No. 3, que incluye, la RED DE MEDIO VOLTAJE DE 13.8 KV, que dotará de energía limpia y exclusiva para el Hospital de Chone, tiene un avance físico aproximado del 55 %. 4.- Se realiza la cancelación de planillas	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	05/03/2021 - 10:59 AM
Enero 2021 1.- Obra en ejecución 2.- Avance de obra 88.25 % 3.- La obra se encuentra en ejecución, principalmente, la construcción del Contrato Complementario No. 3, que incluye, la RED DE MEDIO VOLTAJE DE 13.8 KV, que dotará de energía limpia y exclusiva para el Hospital de Chone, tiene un avance físico aproximado del 40 %.	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	03/02/2021 - 10:05 AM
JULIO 2020: Porcentaje de Avance de obra: 63% Fecha Inicio: 25 de julio 2018 Fecha Fin: 31/07/2020 (obra suspendida) Costo Total Devengado: 24,750,611.46	Prado Leverone, Juan Carlos	20/07/2020 - 08:49 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Nombre de Administrador Actual: Ing. José Luis Espinoza Bravo		
JUNIO 2020: 1. La obra se encuentra SUSPENDIDA desde el 16 de marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria. 2. Se solicitó informe del supervisor del mes de junio de 2020 mediante Memorando No. SECOB-STPCO-DNACO-2020-0256-M	Prado Leverone, Juan Carlos	06/07/2020 - 11:56 AM
MAYO 2020: 1. La obra se encuentra SUSPENDIDA desde el 16 de marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria. Se realizan trabajos de la intervención emergente (Anexo 25) 2. Se realizó el pago de planillas de los trimestres 4 y 5 en este periodo	Prado Leverone, Juan Carlos	05/06/2020 - 12:45 PM
ABRIL 2020: 1. La obra se encuentra SUSPENDIDA desde el 16 de marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria. (Anexo 24) 2. No se realizaron pago de planillas en este periodo	Prado Leverone, Juan Carlos	06/05/2020 - 01:53 PM
MARZO 2020: 1. El Hito 10: Obras Exteriores terminadas, NO cumplido al 100% de acuerdo al Informe del Supervisor de 27/3/2020. (Anexo 23). 2. Fecha de fin contractual el 4 de agosto de 2020 3. No se realizaron pago de planillas en este periodo 4. La obra se encuentra SUSPENDIDA	Prado Leverone, Juan Carlos	03/04/2020 - 11:18 AM
FEBRERO 2020: 1. El Hito 08: Estructura metálica vertical y horizontal terminada, cumplido al 100% de acuerdo al Informe del Supervisor de 3/3/2020. (Anexo 22). 2.- El Hito 09: Mampostería Terminada., cumplido al 100% de acuerdo al Informe del Supervisor de 3/3/2020. (Anexo 22). 3. Se aprobó una ampliación de plazo, siendo la fecha de fin contractual el 4 de agosto de 2020	Prado Leverone, Juan Carlos	04/03/2020 - 09:44 AM
ENERO 2020: 1. La obra se encuentra al 56% de avance físico. 2. El contratista solicitó una ampliación al plazo contractual	Prado Leverone, Juan Carlos	04/03/2020 - 08:13 AM
DICIEMBRE 2019: 1. El Hito 8: Estructura metálica vertical y horizontal del bloque principal se encuentra TERMINADA 100,00% en lo que respecta a bloques complementarios está a un 99,50% de avance físico. 2. El Hito 9: Mampostería del bloque principal se encuentra TERMINADA 100,00% en lo que respecta a bloques complementarios está a un 99,00% de avance físico. 3. El Hito 10: Obras exteriores terminadas se encuentra al 30,00%. 4. La obra se encuentra 54,30% de avance físico.	Freire Flores, Marlon Benigno	17/01/2020 - 11:38 AM
NOVIEMBRE 2019: 1. El Hito 8: Estructura metálica vertical y horizontal del bloque principal se encuentra TERMINADA 100,00% en lo que respecta a bloques complementarios está a un 99,15% de avance físico. 2. El Hito 9: Mampostería del bloque principal se encuentra TERMINADA 100,00% en lo que respecta a bloques complementarios está a un 98,25% de avance físico. 3. El Hito 10: Obras exteriores terminadas se encuentra al 20,00%. 4. Se adjunta el Informe Técnico del Supervisor de contrato (Anexo 21).	Castelo Quinga, Pablo Andres	09/12/2019 - 03:42 PM
OCTUBRE 2019: 1. El Hito 8: Estructura metálica vertical y horizontal del bloque principal se encuentra TERMINADA 100,00% en lo que respecta a bloques complementarios está a un 99,10% de avance físico. 2. El Hito 9: Mampostería del bloque principal se encuentra TERMINADA 100% en lo que respecta a bloques complementarios está a un 98,20% de avance físico. 3. Se adjunta el Informe Técnico del Supervisor de contrato (Anexo 20).	Castelo Quinga, Pablo Andres	06/11/2019 - 08:47 AM
SEPTIEMBRE 2019: 1. El Hito 8: Estructura metálica vertical y horizontal del bloque principal se encuentra TERMINADA 100% en lo que respecta a bloques complementarios esta a un 99% de avance físico. 2. El Hito 9: Mampostería del bloque principal se encuentra TERMINADA 100% en lo que respecta a bloques complementarios esta a un 98% de avance físico. 3. Se adjunta el Informe Técnico del Supervisor de contrato (Anexo 18). 4. De conformidad con lo indicado en el memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-2662-M de 01 de octubre de 2019 (Anexo 19) suscrito por el Director Financiero, no existen pagos realizados en este periodo.	Armijos Robles, Jessica Paola	10/10/2019 - 04:36 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2019: 1. En este periodo se terminó con la ejecución de las Excavaciones y desalojos (Hito 6); así como con el Movimiento de tierras (Hito 7). 2. De conformidad con lo indicado en el memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-2434-M no hay pagos realizados en este periodo.</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	05/09/2019 - 09:47 PM
<p>JULIO 2019: 1. El Hito 6: Excavaciones y desalojos terminados se encuentra al 100% ejecutado en el bloque principal y 90% en los bloques secundarios, el Hito 7: Movimiento de tierras terminadas se encuentra al 100% en el bloque principal y el 80% en los bloques secundarios, con lo cual el avance físico general de estos hitos corresponde al 95%. 2. De conformidad con el reporte del SISCOB (Anexo No. 16) se han pagado las siguientes planillas en este periodo: Planilla Trimestre 1: Usd. 1.651.674,49 Planilla Trimestre 2: Usd. 5.303.638,01 Planilla Trimestre 3: Usd. 8.319.870,04 Total: Usd. 15.275.182,54</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	07/08/2019 - 04:43 PM
<p>JUNIO 2019: 1. El Hito 6: Excavaciones y desalojos terminados se encuentra al 100% ejecutado en el bloque principal y 80% en los bloques secundarios, el Hito 7: Movimiento de tierras terminadas se encuentra al 100% en el bloque principal y el 80% en los bloques secundarios, con lo cual el avance físico general de estos hitos corresponde al 90%. 2. Se adjunta el Informe Técnico del Supervisor de contrato (Anexo 14). 3. De conformidad con lo indicado en el memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-1782-M de 03 de julio de 2019 (Anexo 15) suscrito por el Director Financiero, no existen pagos realizados en este periodo.</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	05/07/2019 - 11:25 AM
<p>MAYO 2019: 1.- El Ing. Carlos Miranda Vélez, Supervisor de contrato, informó que el avance del Hito 6: Excavaciones y desalojos terminados e Hito 7: Movimiento de tierras terminadas se encuentran en un 100% en el bloque principal y 75% en los bloques aladaños, teniendo un porcentaje de avance físico global de éstos hitos del 87,5%. 2.- Se adjunta el Informe Técnico del Supervisor de contrato (Anexo 12). 3.- Conforme el memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-1433-M (Anexo 13) de 04 de junio de 2019, no existen pagos realizados durante este periodo a este contrato.</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	06/06/2019 - 09:04 AM
<p>ABRIL 2019: 1.- El Ing. Carlos Miranda Vélez, Supervisor de contrato, informó que el avance del Hito 6: Excavaciones y desalojos terminados e Hito 7: Movimiento de tierras terminadas se encuentran en un 100% en el bloque principal y 70% en los bloques aladaños, teniendo un porcentaje de avance físico global de éstos hitos del 85%. 2.- Se adjunta el Informe Técnico del Supervisor de contrato (Anexo 11).</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	07/05/2019 - 10:48 AM
<p>MARZO 2019: 1.- El Ing. Carlos Miranda Vélez, Supervisor de contrato, informó que al 26 de marzo de 2019, el Hito Aisladores terminados tiene un avance del 93% (Hito 4) y el Hito Cimentación terminada tiene un avance del 98% (Hito 5) y que los mismos serán cumplidos en su totalidad hasta el 31 de marzo de 2019. 2.- De conformidad con lo antes expuesto, durante este periodo se cumplió con la ejecución de los hitos 4 y 5 (Anexo 9). 3.- De acuerdo con lo indicado por el Lcdo. Carlos Ramiro Coronel Ruiz, Director Financiero (Encargado), en el memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-0804-M no existen pagos realizando en este periodo (Anexo 10).</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	05/04/2019 - 08:53 AM
<p>FEBRERO 2019: El supervisor de contrato informó que: 1.- (Hito 4) Aisladores terminados tiene un avance del 45% (Anexo 8) 2.- (Hito 5) Cimentación terminada tiene un avance del 80% (Anexo 8)</p>	Tipan Guayasamín, César Eduardo	07/03/2019 - 09:20 AM
<p>ENERO 2019: El supervisor de contrato informó que: 1.- (Hito 4) Aisladores terminados tiene un avance del 19% (Anexo 7) 2.- (Hito 5) Cimentación terminada tiene un avance del 41% (Anexo 7)</p>	Tipan Guayasamín, César Eduardo	15/02/2019 - 10:31 AM
<p>DICIEMBRE 2018: El supervisor de contrato informó que: 1.- (Hito 3) Pilotaje Terminado tiene un avance del 100% (Anexo 6)</p>	Tipan Guayasamín, César Eduardo	07/01/2019 - 11:38 AM
<p>NOVIEMBRE 2018: El supervisor de contrato informó que: 1.- (Hito 3) Pilotaje Terminado tiene un avance del 77% (Anexo 5)</p>	Tipan Guayasamín, César Eduardo	06/12/2018 - 10:14 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
OCTUBRE 2018: El supervisor de contrato informó que: 1.- (Hito 3) Pilotaje Terminado tiene un avance del 39% (Anexo 4)	Tipan Guayasamín, César Eduardo	05/11/2018 - 03:56 PM
SEPTIEMBRE 2018 1. De acuerdo a informe de supervisor de la obra, el hito de pilotaje estaría listo para el 31 de diciembre de 2018. (Anexo 3) 2. De acuerdo al informe de supervisor de la obra, el hito de Cimentación estaría lista para el 31 de marzo de 2019. (Anexo 3)	Novoa Salgado, Andres Alejandro	04/10/2018 - 08:03 AM
AGOSTO 2018 1. De acuerdo a la Reprogramación No. 1, los trabajos preliminares definidos para el primer período (del 25 de julio al 31 de agosto de 2018) se encuentran terminados (Hito 2)	Novoa Salgado, Andres Alejandro	24/09/2018 - 11:52 AM
JULIO 2018 1. En la ciudad de Chone a los 25 días del mes de julio de 2018, habiéndose suscrito el contrato No. RE-SECOB-049-2017 el 25 de junio y en cumplimiento de su CLÁUSULA NOVENA.- PLAZO donde se indica que el plazo de 600 días correrá después de 30 días de la suscripción del contrato, se suscribe el Acta de Inicio de Obra entre el Administrador de Contrato SECOB, la Fiscalización el Consorcio Meditec y el Contratista China Camc Engineering Co. Ltd. (Anexo 1)	Novoa Salgado, Andres Alejandro	07/08/2018 - 09:50 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. La falta de conexión para aguas servidas (tratadas) y lluvias CAUSARÍA retraso en la ejecución de la obra.	04/06/2020	Juan Carlos Prado Leverone	10 %	10	1	0/1

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Chone

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Contrato de obra firmado	4-Inicio de Trabajo	25/06/2018		25/06/2018		Sí	0.38
2	EJECUCIÓN: Trabajos preliminares terminados	5-Entregables Intermedios	31/08/2018		31/08/2018		Sí	7.0
3	EJECUCIÓN: Pilotaje terminado	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		13/12/2018		Sí	7.0
4	EJECUCIÓN: Aisladores terminados	5-Entregables Intermedios	29/03/2019		29/03/2019		Sí	7.0
5	EJECUCIÓN: Cimentación terminada	5-Entregables Intermedios	29/03/2019		29/03/2019		Sí	8.0
6	EJECUCIÓN: Excavaciones y desalojos terminados	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		31/08/2019		Sí	8.0
7	EJECUCIÓN: Movimiento de tierras terminadas	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		31/08/2019		Sí	8.0
8	EJECUCIÓN: Estructura metálica vertical y horizontal terminada	5-Entregables Intermedios	30/12/2019		29/02/2020		Sí	8.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
9	EJECUCIÓN: Mampostería terminada	5-Entregables Intermedios	30/12/2019		29/02/2020		Sí	9.0
10	EJECUCIÓN: Acabados terminados	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	31/07/2020			No	7.0
11	EJECUCIÓN: Obras Exteriores terminadas	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	31/07/2020			No	8.0
12	EJECUCIÓN: Sistema hidrosanitario terminado	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	31/07/2020			No	7.0
13	EJECUCIÓN: Sistema hidráulico y contra incendios terminado	5-Entregables Intermedios	31/07/2020	31/07/2020			No	7.0
14	EJECUCIÓN: Equipamiento terminado	5-Entregables Intermedios	31/08/2020	31/08/2020			No	7.0
15	CIERRE: Acta de Recepción Provisional firmada	5-Entregables Intermedios	30/09/2020	30/09/2020			No	1.0
16	COMPLETADO: Acta de Recepción Definitiva firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2021	31/03/2021			No	0.37

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	24,750,612.08 **
Costo Total:	50,312,053.38
Total Devengado:	24,750,612.08
% Costo Total Devengado:	49.19 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 49.19 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	15,275,182.54	17,660,173.98	0.00	32,935,356.52
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	50,312,053.38	0.00	0.00	50,312,053.38
Ppto. Codificado	15,275,182.54	17,660,173.98	0.00	32,935,356.52
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	15,275,182.54	0.00	0.00	15,275,182.54
Ppto. Devengado	24,750,612.08	0.00	0.00	24,750,612.08
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 24,750,612.08	0.00	0.00	24,750,612.08
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-9,475,429.54	0.00	0.00	-9,475,429.54
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 162.03 %	0.00 %	0.00 %	162.03 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May							
Jun							
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
Total	0.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 - Hito 1 - Contrato firmado	Contrato_Hospital_General_Napoleón_Dávila.pdf	30/07/2018
2	A.2 - Anexo 1 - Acta de Inicio de Obra	Acta_de_Inicio_de_Obra.pdf	31/07/2018
3	A.3 - Hito 2 - Informe de Supervisor Memorando Nro. SECOB-CZ4-DPCO-2018-0926-M	SECOB-CZ4-DPCO-2018-0926-M.pdf	05/09/2018
4	A.4 - Anexo 2 - Informe de Supervisor de Agosto	HITOS_001_-_AGOSTO_2018.pdf	05/09/2018
5	A.5 - Anexo 3 - Informe de Supervisor de septiembre	HITOS_002_-_SEPTIEMBRE_2018.pdf	02/10/2018
6	A.6 - Anexo 4 - Informe de Supervisor de Octubre	SECOB-CZ4-HNDC-HITOS-003-2018.pdf	05/11/2018
7	A.7 - Anexo 5 - Informe de Supervisor de Noviembre	SECOB-CZ4-HNDC-HITOS-004-2018.pdf	04/12/2018
8	A.8 - Hito 3 - Informe de Supervisor de Diciembre (Anexo 6)	SECOB-CZ4-HNDC-HITOS-004-2018.pdf	03/01/2019
9	A.9 - Anexo 7 - Informe de Supervisor de enero 2019	SECOB-CZ4-HNDC-HITOS-001-2019.pdf	29/01/2019
10	B.1 - Anexo 8 - Informe de Supervisor de febrero 2019	SECOB-CZ4-DPCO-2019-0221-M.pdf	07/03/2019
11	B.2 - Hito 4 - Informe de Supervisor Marzo 2019 (Anexo 9)	Inf._GPR_Abril.pdf	03/04/2019
12	B.3 - Hito 5 - Informe de Supervisor Marzo 2019 (Anexo 9)	Inf._GPR_Abril.pdf	03/04/2019
13	B.4 - Anexo 10 - Memorando de la Dirección Financiera Marzo 2019	SECOB-CGAF-DF-2019-0804-M.pdf	05/04/2019
14	B.5 - Anexo 11 - Informe de supervisor de contrato	Informe_supervisor_GPR_Abril_2019.pdf	07/05/2019
15	B.6 - Anexo 12 - Informe de supervisor de contrato	Informe_supervisor_GPR_Mayo_2019.pdf	04/06/2019
16	B.7 - Anexo 13 - Memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-1433-M	Memorando_Nro._SECOB-CGAF-DF-2019-1433-M_Pagos_Mayo_2019.pdf	06/06/2019
17	B.8 - Anexo 14 - Informe de supervisor Junio 2019	Informe_supervisor_GPR_Junio_2019.pdf	05/07/2019
18	B.9 - Anexo 15 - Memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-1782-M	Memorando_Nro._SECOB-CGAF-DF-2019-1782-M.pdf	05/07/2019
19	C.1 - Anexo 16 - Reporte Kardex del SISCOB	kardex_contrato_CHONE.pdf	06/08/2019
20	C.2 - Hito 6 - Informe de supervisor de contrato	Chone_-_Agosto_2019.pdf	05/09/2019
21	C.3 - Hito 7 - Informe de supervisor de contrato	Chone_-_Agosto_2019.pdf	05/09/2019
22	C.4 - Anexo - Memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-2437-M	SECOB-CGAF-DF-2019-2437-M-Reporte_planillas_mes_Agosto-1.pdf	05/09/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
23	C.5 - Anexo 18 - Informe Supervisor Septiembre 2019	GPR-SEPT-2019.pdf	10/10/2019
24	C.6 - Anexo 19- Memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-2662-M	SECOB-CGAF-DF-2019-2662-M.pdf	10/10/2019
25	C.7 - Anexo 20 - Informe Supervisor Octubre 2019	GPR_OCTUBRE_2019.pdf	28/10/2019
26	C.8 - Anexo 21 - Informe Supervisor Noviembre 2019	Informe_GPR_Noviembre_Chone.pdf	29/11/2019
27	C.9 - Anexo 22 - Informe Supervisor Marzo 2020	Informe_del_Supervisor_Marzo_2020_Chone.pdf	04/03/2020
28	D.1 - Anexo 23 - Informe del Supervisor Marzo 2020	Informe_del_Supervisor_Marzo_2020.pdf	30/03/2020
29	D.2 - Anexo 24 - Suspensión de obra	SECOB-CZ4-2020-0213-O_(1).pdf	23/04/2020
30	D.3 - Anexo 25 - Informe supervisor del contrato - Mayo 2020	INFORME_EJECUTIVO_HOSPITAL_CHONE_27-05-2020.pdf	01/06/2020
31	D.4 - Anexo 26 - INFORME ADMINISTRADOR DE CONTRATO ENERO DE 2021	INFORME_ADMINISTRADOR_DE_CONTRATO_(K078).pdf	03/02/2021
32	D.5 - Anexo 27 - INFORME ADMINISTRADOR DE CONTRATO FEBRERO DE 2021	K078-hospital_chone_febrero_2021.pdf	04/03/2021
33	D.6 - Anexo 28 - INFORME ADMINISTRADOR DE CONTRATO MARZO DE 2021	K_078_informe_gpr-hospital_chone_29-03-2021-signed_(1).pdf	05/04/2021
34	D.7 - Anexo 29 - Informe de Administrador de contrato Abril 2021	informe_gpr-hospital_chone_30-04-2021-signed0272825001620064345.pdf	04/05/2021

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Cobena Moreira, Jenniffer Beatriz	Administrador de Contrato	Administrador de Contrato	jbcobena@secob.gob.ec	3964800
Prado Leverone, Juan Carlos	Analista de obra	Analista de Seguimiento y Control	jcprado@secob.gob.ec	
