

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 2
Dirección Provincial Pichincha

PROYECTO: K015 MTOP -AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIA CONCESIONADA DE LA VIA RUMICHACA - RIOBAMBA VARIOS TRAMOS (Contrato adicional de concesión para la ejecución de obras de mantenimiento, ampliación...Calderón - Guayllabamba)

Líder del Proyecto:	Yupangui Cushicondor, Ruth Verónica (ryupangui@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ramirez Barahona, Rodrigo Santiago	Programas Relacionados:	Provincia - Pichincha
Titular:	Rivadeneira Vasquez, Juan Diego	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.1005.6955	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	39,977,830.45
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	22/09/2010 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	23/01/2020	Fecha de Fin Base:	13/12/2013
Modificado por:	Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando	Fecha del siguiente Hito:	27/12/2019

DATOS GENERALES

Descripción
<p>Contratista: Panavial S.A. Longitud: 56.55 Km. Convertido del Proyecto de Gasto Corriente I003 el 03/10/2011. Objeto: Proyecto de Ampliación a 4 carriles del subtramo de vía Calderón-Guayllabamba, de la Panamericana Norte, en aproximadamente 18.24 Km, y que pertenece al cantón Quito, en la Provincia de Pichincha, de acuerdo al siguiente detalle: a.-Ampliación en 4 carriles del tramo Calderón Guayllabamba, con una longitud de 18.24 Km. b.-Construcción del nuevo puente sobre el río Guayllabamba a 4 carriles. c.-Ampliación del puente Coyago a 4 carriles. d.-Intersecciones a nivel en le inicio y final de la variante de Collas; y e.-Mantenimiento periodico rutinario de la vía en toda su extensión, es decir en 18.24 Km ESTE PROYECTO ENTRA DENTRO DEL PROYECTO "Ampliación de la Infraestructura de la Vía Concesionada Rumichaca-Riobamba en Varios Tramos".</p>
Beneficios Cualitativos
<p>*Disminución del tiempo de desplazamiento. *Seguridad vial. *Buena transitabilidad de los usuarios de la vía. *Mejor servicio de Acceso al Nuevo Aeropuerto de Quito.</p>
Tipo de Beneficiario
*Sector productivo, agrícola, comercial, turístico.
Restricciones
*Tiempo estimado: 6 meses para liberación de predios afectados por la ampliación de la vía.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	------------	------------------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 22/09/2010 Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

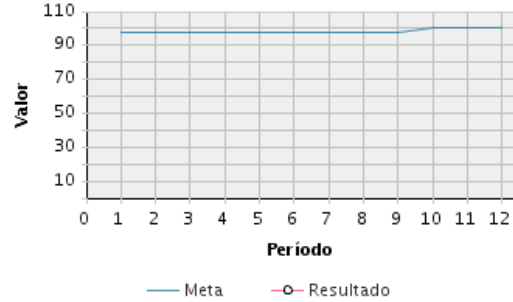

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2019:</p> <p>*En trámite para convenio de Pago -Con memorando Nro.MTOP-DPP-2018-982-ME de fecha 25 de junio de 2018 la Dirección Distrital de Pichincha gestiona la inclusión en el PAI 2018.-Para el respectivo Pago está incluido en el PAI 2019.</p> <p>*El 5 de noviembre del 2018 la compañía trazados presenta una demanda en contra del MTOP para que se cancele lo adeudado el 7 de marzo del 2019</p> <p>*El lunes 9 de diciembre del 2019 La Abogada de la DDP asistira a la Audiencia Judicial Preliminar en defensa del MTOP.</p> <p>*Se suspendió la audiencia y se espera la notificación de la nueva audiencia.</p>	Yupangui Cushicondor, Ruth Verónica	03/01/2020 - 11:46 AM
<p>NOVIEMBRE 2019:</p> <p>*En trámite para convenio de Pago -Con memorando Nro.MTOP-DPP-2018-982-ME de fecha 25 de junio de 2018 la Dirección Distrital de Pichincha gestiona la inclusión en el PAI 2018.-Para el respectivo Pago está incluido en el PAI 2019.</p> <p>*El 5 de noviembre del 2018 la compañía trazados presenta una demanda en contra del MTOP para que se cancele lo adeudado el 7 de marzo del 2019</p> <p>*El lunes 9 de diciembre del 2019 La Abogada de la DDP asistira a la Audiencia Judicial Preliminar en defensa del MTOP.</p>	Yupangui Cushicondor, Ruth Verónica	04/12/2019 - 09:34 AM
<p>OCTUBRE 2019:</p> <p>*En trámite para convenio de Pago -Con memorando Nro.MTOP-DPP-2018-982-ME de fecha 25 de junio de 2018 la Dirección Distrital de Pichincha gestiona la inclusión en el PAI 2018.-Para el respectivo Pago está incluido en el PAI 2019.</p> <p>*El 5 de noviembre del 2018 la compañía trazados presenta una demanda en contra del MTOP para que se cancele lo adeudado el 7 de marzo del 2019 la Función Judicial notifica que la audiencia preliminar es el 9 de abril del 2020.</p>	Yupangui Cushicondor, Ruth Verónica	04/11/2019 - 10:17 PM
<p>SEPTIEMBRE 2019:</p> <p>*En trámite para convenio de Pago -Con memorando Nro.MTOP-DPP-2018-982-ME de fecha 25 de junio de 2018 la Dirección Distrital de Pichincha gestiona la inclusión en el PAI 2018.-Para el respectivo Pago está incluido en el PAI 2019.</p> <p>*El 5 de noviembre del 2018 la compañía trazados presenta una demanda en contra del MTOP para que se cancele lo adeudado el 7 de marzo del 2019 la Función Judicial notifica que la audiencia preliminar es el 9 de abril del 2020.</p>	Yupangui Cushicondor, Ruth Verónica	04/10/2019 - 08:00 AM
<p>AGOSTO 2019:</p> <p>*En trámite para convenio de Pago -Con memorando Nro.MTOP-DPP-2018-982-ME de fecha 25 de junio de 2018 la Dirección Distrital de Pichincha gestiona la inclusión en el PAI 2018.-Para el respectivo Pago está incluido en el PAI 2019.</p>	Yupangui Cushicondor, Ruth Verónica	03/09/2019 - 12:47 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
*El 5 de noviembre del 2018 la compañía trazados presenta una demanda en contra del MTOP para que se cancele lo adeudado el 7 de marzo del 2019 la Función Judicial notifica que la audiencia preliminar es el 9 de abril del 2020.		
JULIO 2019: *En trámite para convenio de Pago -Con memorando Nro.MTOP-DPP-2018-982-ME de fecha 25 de junio de 2018 la Dirección Distrital de Pichincha gestiona la inclusión en el PAI 2018.-Para el respectivo Pago está incluido en el PAI 2019. *El 5 de noviembre del 2018 la compañía trazados presenta una demanda en contra del MTOP para que se cancele lo adeudado -el 7 de marzo del 2019 la Función Judicial notifica que la audiencia preliminar es el 9 de abril del 2020.	Yupangui Cushicondor, Ruth Verónica	05/08/2019 - 09:28 AM
JUNIO 2019: *En trámite para convenio de Pago -Con memorando Nro.MTOP-DPP-2018-982-ME de fecha 25 de junio de 2018 la Dirección Distrital de Pichincha gestiona la inclusión en el PAI 2018.-Para el respectivo Pago está incluido en el pai 2019. *El 5 de noviembre del 2018 la compañía trazados presenta una demanda en contra del MTOP para que se cancele lo adeudado -el 7 de marzo del 2019 la Función Judicial notifica que la audiencia preliminar es el 9 de abril del 2020	Yupangui Cushicondor, Ruth Verónica	05/07/2019 - 11:24 AM
MAYO 2019: *En trámite para convenio de Pago -Con memorando Nro.MTOP-DPP-2018-982-ME de fecha 25 de junio de 2018 la Dirección Distrital de Pichincha gestiona la inclusión en el PAI 2018.-Para el respectivo Pago está incluido en el pai 2019. *El 5 de noviembre del 2018 la compañía trazados presenta una demanda en contra del MTOP para que se cancele lo adeudado -el 7 de marzo del 2019 la Función Judicial notifica que la audiencia preliminar es el 9 de abril del 2020	Yupangui Cushicondor, Ruth Verónica	03/06/2019 - 10:22 AM
ABRIL 2019: *En trámite para convenio de Pago -Con memorando Nro.MTOP-DPP-2018-982-ME de fecha 25 de junio de 2018 la Dirección Distrital de Pichincha gestiona la inclusión en el PAI 2018.-Para el respectivo Pago está incluido en el pai 2019. *El 5 de noviembre del 2018 la compañía trazados presenta una demanda en contra del MTOP para que se cancele lo adeudado -el 7 de marzo del 2019 la Función Judicial notifica que la audiencia preliminar es el 9 de abril del 2020.	Yupangui Cushicondor, Ruth Verónica	01/05/2019 - 10:29 AM
MARZO 2019: *En trámite para convenio de Pago -Con memorando Nro.MTOP-DPP-2018-982-ME de fecha 25 de junio de 2018 la Dirección Distrital de Pichincha gestiona la inclusión en el PAI 2018.-Para el respectivo Pago está incluido en el pai 2019. *El 5 de noviembre del 2018 la compañía trazados presenta una demanda en contra del MTOP para que se cancele lo adeudado -el 7 de marzo del 2019 la Función Judicial notifica que la audiencia preliminar es el 9 de abril del 2020.	Yupangui Cushicondor, Ruth Verónica	05/04/2019 - 09:44 AM
MARZO 2019: EN TRAMITE PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO	Yupangui Cushicondor, Ruth Verónica	03/04/2019 - 11:01 AM
FEBRERO 2019: EN TRAMITE PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO	Yupangui Cushicondor, Ruth Verónica	03/04/2019 - 11:00 AM
ENERO 2019: EN TRAMITE PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO	Vargas Acuña, Carlos Andres	27/02/2019 - 01:33 PM
ABRIL 2016-DICIEMBRE 2016	Vargas Acuña, Carlos Andres	05/02/2019 - 11:14 AM
MARZO 2016: PROYECTO TERMINADO.	Aldas Aldas, Michael Dario	04/04/2016 - 01:45 PM
FEBRERO 2016: PROYECTO TERMINADO.	Aldas Aldas, Michael Dario	09/03/2016 - 09:03 AM
ENERO 2016: PROYECTO TERMINADO.	Aldas Aldas, Michael Dario	12/02/2016 - 03:15 PM
DICIEMBRE 2015: PROYECTO TERMINADO.	Aldas Aldas, Michael Dario	12/02/2016 - 03:14 PM
NOVIEMBRE 2015: PROYECTO TERMINADO.	Aldas Aldas, Michael Dario	09/12/2015 - 09:01 AM
OCTUBRE 2015: PROYECTO TERMINADO.	Aldas Aldas, Michael Dario	09/12/2015 - 09:01 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SEPTIEMBRE 2015: PROYECTO EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN, AL MOMENTO SE ENCUENTRAN CUADRANDO VALORES PENDIENTES Y VALORES DEVENGADOS.	Aldas Aldas, Michael Dario	07/10/2015 - 11:01 AM
AGOSTO 2015: PROYECTO TERMINADO, AL MOMENTO SE CUENTA CON EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL. SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA LIQUIDACIÓN DE VALORES PENDIENTES.	Aldas Aldas, Michael Dario	16/09/2015 - 03:49 PM
ABRIL 2015: PROYECTO TERMINADO.	Aldas Aldas, Michael Dario	12/05/2015 - 10:55 AM
MARZO 2015: PROYECTO TERMINADO.	Aldas Aldas, Michael Dario	10/04/2015 - 11:03 AM
FEBRERO 2015: PROYECTO TERMINADO.	Aldas Aldas, Michael Dario	16/03/2015 - 04:35 PM
ENERO 2015: OCTUBRE 2014: PROYECTO TERMINADO.	Aldas Aldas, Michael Dario	16/03/2015 - 04:34 PM
DICIEMBRE 2014: PROYECTO TERMINADO. Por los sismos sufridos en el mes de Agosto se suscribirá un contrato denominado "Obras Complementarias en la vía Calderón-Guayllabamba", con la finalidad de atender todas las emergencias viales.	Aldas Aldas, Michael Dario	16/03/2015 - 04:34 PM
NOVIEMBRE 2014: PROYECTO TERMINADO. Por los sismos sufridos en el mes de Agosto se suscribirá un contrato denominado "Obras Complementarias en la vía Calderón-Guayllabamba", con la finalidad de atender todas las emergencias viales.	Aldas Aldas, Michael Dario	16/03/2015 - 04:33 PM
OCTUBRE 2014: PROYECTO TERMINADO. Por los sismos sufridos en el mes de Agosto se suscribirá un contrato denominado "Obras Complementarias en la vía Calderón-Guayllabamba", con la finalidad de atender todas las emergencias viales.	Aldas Aldas, Michael Dario	16/03/2015 - 04:32 PM
SEPTIEMBRE 2014: PROYECTO TERMINADO. A la espera de que se firme la Adenda para continuar con los trabajos.	Aldas Aldas, Michael Dario	16/03/2015 - 04:30 PM
AGOSTO 2014: PROYECTO TERMINADO. A la espera de que se firme la Adenda para continuar con los trabajos.	Aldas Aldas, Michael Dario	16/03/2015 - 04:30 PM
JULIO 2014: PROYECTO TERMINADO. A la espera de que se firme la Adenda para continuar con los trabajos.	Aldas Aldas, Michael Dario	16/03/2015 - 04:24 PM
JUNIO 2014: PROYECTO TERMINADO. A la espera de que se firme la Adenda para continuar con los trabajos.	Aldas Aldas, Michael Dario	16/03/2015 - 04:24 PM
MAYO 2014: PROYECTO TERMINADO. A la espera de que se firme la Adenda para continuar con los trabajos.	Aldas Aldas, Michael Dario	16/03/2015 - 04:23 PM
ABRIL 2014: PROYECTO TERMINADO. A la espera de que se firme la Adenda para continuar con los trabajos.	Aldas Aldas, Michael Dario	16/03/2015 - 04:23 PM
MARZO 2014: PROYECTO TERMINADO. A la espera de que se firme la Adenda para continuar con los trabajos.	Aldas Aldas, Michael Dario	16/03/2015 - 04:22 PM
FEBRERO 2014: PROYECTO TERMINADO. A la espera de que se firme la Adenda para continuar con los trabajos.	Aldas Aldas, Michael Dario	16/03/2015 - 04:22 PM
ENERO 2014: PROYECTO TERMINADO. A la espera de que se firme la Adenda para continuar con los trabajos.	Aldas Aldas, Michael Dario	16/03/2015 - 04:22 PM
DICIEMBRE 2013: PROYECTO TERMINADO. A la espera de que se firme la Adenda para continuar con los trabajos.	Aldas Aldas, Michael Dario	16/03/2015 - 04:21 PM
Noviembre 2013: A la espera de que se firme la Adenda para continuar con los trabajos, OBRA TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA.	Aldas Aldas, Michael Dario	16/03/2015 - 04:20 PM
Octubre 2013: A la espera de que se firme la Adenda para continuar con los trabajos, OBRA TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA.	Aldas Aldas, Michael Dario	13/12/2013 - 11:50 AM
Septiembre 2013: Este mes se estan realizando los trabajos de excavación para cunetas de coronación desde la abscisa 8+370 hasta la 12+051, hormigón estructural clase b (alcantarillas, sifones y bajantes) desde la abscisa 14+370 hasta la 18+040, malla para descargas de talud hacia colector principal abscisa 10+700, sembrado de cesped en parter central abscisa 6+300.	Aldas Aldas, Michael Dario	30/10/2013 - 12:51 PM
Agosto 2013: Este mes se estan realizando los trabajos de excavación para cunetas laterales desde la abscisa 10+370 hasta la 12+825, excavación para cunetas de coronación desde la abscisa 6+370 hasta la 12+051, hormigón estructural clase b (alcantarillas, sifones y bajantes) desde la abscisa 14+370 hasta la 16+040, malla para descargas de talud hacia colector principal abscisa 8+700, sembrado de cesped en parter central abscisa 5+300.	Aldas Aldas, Michael Dario	01/10/2013 - 09:58 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Julio 2013: Este mes se están realizando los trabajos de excavación para cunetas laterales desde la abscisa 7+370 hasta la 9+825, excavación para cunetas de coronación desde la abscisa 6+370 hasta la 12+051, hormigón estructural clase b (alcantarillas, sifones y bajantes) desde la abscisa 12+370 hasta la 16+040, malla para descargas de talud hacia colector principal abscisa 8+700, sembrado de césped en parter central abscisa 5+300.	Aldas Aldas, Michael Dario	06/09/2013 - 11:11 AM
Junio 2013: Este mes se están realizando los trabajos de excavación para cunetas laterales desde la abscisa 5+370 hasta la 5+825, excavación para cunetas de coronación desde la abscisa 5+370 hasta la 6+051, hormigón estructural clase b (alcantarillas, sifones y bajantes) desde la abscisa 5+370 hasta la 6+040, malla para descargas de talud hacia colector principal abscisa 8+700, sembrado de césped en parter central abscisa 5+300.	Aldas Aldas, Michael Dario	06/08/2013 - 10:21 AM
Mayo 2013: En este mes de trabajos realizados se da prioridad a los acabados de la ampliación a cuatro carriles que se realizará su recepción el 15 de Febrero de 2013 según adenda suscrita el 15 de Agosto de 2012 y se aceleran labores como la de conformación vegetal de faja central, se realiza la pintura de bordes de la ruta en color blanco para el cercano a la cuneta y amarillo cercano al bordillo, también la división de carriles en los casos de ampliación a cuatro y seis carriles respectivamente y la doble línea amarilla en donde aún existen dos carriles únicos (ida y vuelta) sin posibilidad a la ampliación, todo esto con pintura acrílica. También se va terminando las fundiciones de bordillos desde la abscisa 11+800 hasta la 17+700 y también de los accesos a barrios aledaños.	Aldas Aldas, Michael Dario	08/07/2013 - 10:34 AM
Abril 2013: En este mes de trabajos realizados se da prioridad a los acabados de la ampliación a cuatro carriles que se realizará su recepción el 15 de Febrero de 2013 según adenda suscrita el 15 de Agosto de 2012 y se aceleran labores como la de conformación vegetal de faja central, se realiza la pintura de bordes de la ruta en color blanco para el cercano a la cuneta y amarillo cercano al bordillo, también la división de carriles en los casos de ampliación a cuatro y seis carriles respectivamente y la doble línea amarilla en donde aún existen dos carriles únicos (ida y vuelta) sin posibilidad a la ampliación, todo esto con pintura acrílica. También se va terminando las fundiciones de bordillos desde la abscisa 11+800 hasta la 17+700 y también de los accesos a barrios aledaños.	Aldas Aldas, Michael Dario	10/06/2013 - 03:17 PM
Marzo 2013: En este mes de trabajos realizados se da prioridad a los acabados de la ampliación a cuatro carriles que se realizará su recepción el 15 de Febrero de 2013 según adenda suscrita el 15 de Agosto de 2012 y se aceleran labores como la de conformación vegetal de faja central, se realiza la pintura de bordes de la ruta en color blanco para el cercano a la cuneta y amarillo cercano al bordillo, también la división de carriles en los casos de ampliación a cuatro y seis carriles respectivamente y la doble línea amarilla en donde aún existen dos carriles únicos (ida y vuelta) sin posibilidad a la ampliación, todo esto con pintura acrílica. También se va terminando las fundiciones de bordillos desde la abscisa 11+800 hasta la 17+700 y también de los accesos a barrios aledaños.	Aldas Aldas, Michael Dario	14/05/2013 - 10:18 AM
Febrero 2013: Se va terminando las fundiciones de bordillos desde la abscisa 4+890 hasta la 6+000 y también de los accesos a barrios aledaños. Continúan las labores de colocación de capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta, carril derecho e izquierdo desde la abscisa 6+900 hasta la 7+200 en ambas franjas terminando así el sector de Guayllabamba; también se realizaron trabajos de excavación y revestimiento de cunetas laterales, colocación de guardavías, asfalto emulsionado para riego de adherencia, módulos de protección de madera. riego con tanquero y el respectivo mantenimiento de tránsito del mes.	Aldas Aldas, Michael Dario	18/03/2013 - 02:27 PM
Enero 2013: En este mes de trabajos realizados se da prioridad a los acabados de la ampliación a cuatro carriles que se realizará su recepción el 15 de Febrero de 2013 según adenda suscrita el 15 de Agosto de 2012 y se aceleran labores como la conformación vegetal de faja central, se realiza la pintura de borde de la ruta en color blanco para el cercano a cuneta y amarillo el cercano al bordillo, también la división de carriles en los casos de la ampliación a cuatro y seis carriles respectivamente y la doble línea amarilla en donde aún existen dos carriles únicos (ida y vuelta) sin posibilidad a la ampliación, todo esto con pintura acrílica.	Aldas Aldas, Michael Dario	18/03/2013 - 02:07 PM
Diciembre 2012: Este mes se realizaron trabajos de hormigón base asfáltica, excavación para encauzamientos, bordillos de hormigón, hormigón simple $f_c=180\text{kg/cm}^2$, suministro y colocación de tubería PEAD $D=400\text{mm}$, desbroce, desbroce y limpieza, excavación en suelo para ampliación de vía, excavación y relleno para obras de arte menor, bordillos de hormigón $f_c=180\text{kg/cm}^2$ $v=0.06$ m ³ /m anclado, riego con tanquero.	Aldas Aldas, Michael Dario	15/01/2013 - 09:33 AM
Noviembre 2012: En este mes de trabajos se ha completado la labor entre las abscisas 0+395 a 0+505 en el carril derecho con la fundición de bordillos, cunetas y aceras. Continúan los trabajos de colocación de capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta, en el carril izquierdo desde la abscisa 2+120 hasta 3+560 en ambas franjas y en el sector de Oyacoto entre las abscisas 6+650 hasta 6+900 en el carril izquierdo, en el carril único de trabajos se realizan desde la abscisa 6+900 hasta 7+690. La carpeta asfáltica recuperada se realiza en dos tramos de la vía el primero entre las abscisa 6+700 hasta 7+680, el segundo en 16+647.91 hasta 17+130,	Aldas Aldas, Michael Dario	18/12/2012 - 03:23 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>estos reciclados se hace con profundidades hasta de 36 centímetros de carpeta antigua. También se realizaron trabajos de revestimiento de cunetas laterales, bordillos de hormigón, etc.</p>		
<p>Octubre 2012: Reconformación y colocación de material hasta nivel de Sub-base desde la abscisa 0+380 hasta 0+500. Colocación de emulsión asfáltica para imprimación desde la abscisa 7+040 hasta 7+300. Transporte y colocación carpeta asfáltica desde la abscisa 8+740 hasta 9+500. Excavación en suelo para ampliación de la vía y desalojo de material a escombrera desde la abscisa 6+450 hasta 6+890. Transporte y colocación de segunda capa asfáltica desde la abscisa 16+790-16+675 carril derecho; 17+030-16+675 carril izquierdo; 16+640-16+550 ambos carriles.</p>	<p>Aldas Aldas, Michael Dario</p>	<p>03/12/2012 - 09:09 AM</p>
<p>Septiembre 2012: Recuperación de base asfáltica desde la abscisa 6+085 a la 6+420; Colocación de la capa de rodadura desde la abscisa 7+700 a la abscisa 7+900; Excavación y relleno para obras de arte menor en la abscisa 3+200; Construcción de bordillos y cunetas desde la abscisa 9+930 a la 10+060; Conformación del parter central desde la abscisa 3+460 a la 3+500; Colocación de señales informativas de obra en construcción en las abscisas 0+250 a la 9+440. Agosto 2012: Desde la abscisa 16+400 a 16+800 se realiza desbanque de tierras; se está colocando en las abscisas 8+100 y 9+300 base de imprimación y luego base asfáltica; se realiza la colocación de tubería tipo ármico para desfogue de aguas servidas en las abscisas 14+200 hasta 14+900; se recuperó la carpeta asfáltica e=10 cm en el tramo 8+200 hasta 9+300. Julio 2012: Se realiza la construcción de bordillos en hormigón en la abscisa 1+900; se realizan ensayos de densidades por medio del densímetro nuclear en la abscisa 16+080; se realizan trabajos de compactación de las vías de acceso al NAIQ en la abscisa 7+300. Junio 2012: Se continua con trabajos de Construcción de cunetas como también se está midiendo la calidad de la carpeta asfáltica. Mayo 2012: Se continua con trabajos de Construcción de cunetas lado izquierdo y derecho de la vía. Abril 2012: Se efectúan remoción de edificaciones en el km 2+270, se realizan trabajos de excavación en el km 2+000 al km 2+999. Reciclado de material 2+200 al km 3+700. Marzo 2012: Se realizan trabajos de excavación en suelo para ampliación de vía; colocación de sub-base clase 3 e=20cm, colocación de hormigón base asfáltica; asfalto emulsionado para riego de adherencia; carpeta asfáltica recuperada e= 10cm; excavación y relleno para obras arte menor; excavación para encajonamientos y cunetas laterales; obras complementarias aceros fc= 180kg/cm2. Febrero 2012: Se realiza trabajos de colocación de sub-base clase e=20 cm; colocación de hormigón de base asfáltica, asfalto emulsionado para imprimación; excavación para cunetas laterales; colocación de hormigón estructural fc=280kg/cm2 para alcantarillas, sifones, bajantes; hormigón estructural fc= 210kg/cm2 para pozos, losetas; hormigón simple fc 180 kg/cm2 para replantillos ; colocación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2; junta de dilatación tipo JNA-52. Diciembre 2011: Se realiza trabajos de excavación en marginal; colocación de hormigón de base asfáltica; colocación de hormigón estructural fy=280kg/cm2 para puente sobre río Guayllabamba; montaje de acero estructural fy 3500kg/cm2 placas de neopreno; colocación de hormigón estructural fc=280kg/cm2 para puente sobre Río Coyago; colocación de acero de refuerzo fy= 4200kg/cm2; estabilización de taludes. Noviembre 2011: Revisado el cronograma de las obras hasta el mes de noviembre, se tiene que la ejecución del proyecto es del 93.8% hasta noviembre del 2011 del monto programado el proyecto está dentro del rango del 80% al 100% de lo ejecutado con lo programado al mes de noviembre del 2011. Octubre 2011: Se realiza trabajos de excavación en suelo para ampliación de vía, colocación de material sub-base clase 3 e= 20cm, colocación hormigón estructural fc 280 kg/cm2 puente sobre el Río Guayllabamba. Excavación y relleno para estructuras puente sobre el río Coyago, estabilización de taludes (hormigón lanzado e = 5 cm). Septiembre 2011: El Proyecto se desarrolla en forma normal a la presente fecha se tiene un porcentaje de avance de obras de los grupos de rubros de acuerdo al siguiente detalle: Reubicación de servicios 32% Movimiento de tierras 60% Obras de arte menor 50% Conformación de muros 15% Protección de taludes 60% Puente río Guayllabamba 80%</p>	<p>Aldas Aldas, Michael Dario</p>	<p>07/11/2012 - 03:27 PM</p>

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0



LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	INICIO: Firma del contrato. Realizado.	3-Adjudicación	22/09/2010		22/09/2010		Sí	1.0
2	INICIO: Entrega de anticipo. Realizado.	3-Adjudicación	30/09/2010		30/09/2010		Sí	1.0
3	EJECUCIÓN: Obrad de drenaje. Realizado.	5-Entregables Intermedios	30/01/2012		30/01/2012		Sí	9.5
4	EJECUCIÓN: Obras de arte menor. Realizado.	1-Solicitud de Información	30/01/2012		30/01/2012		Sí	9.5
5	EJECUCIÓN: Expropiaciones. Realizado.	5-Entregables Intermedios	29/02/2012		29/02/2012		Sí	8.0
6	EJECUCIÓN: Puente sobre el Río Guayllabamba (Infraestructura). Realizado.	5-Entregables Intermedios	29/02/2012		29/02/2012		Sí	8.0
7	EJECUCIÓN: Puente sobre el Río Guayllabamba (Superestructura). Realizado.	1-Solicitud de Información	29/02/2012		29/02/2012		Sí	8.0
8	EJECUCIÓN: Movimiento de tierras. Realizado.	5-Entregables Intermedios	30/03/2012		30/03/2012		Sí	4.0
9	EJECUCIÓN: Puente sobre el Río Coyago (Infraestructura). Realizado.	5-Entregables Intermedios	15/12/2012		15/12/2012		Sí	4.0
10	EJECUCIÓN: Puente sobre el Río Coyago (Superestructura). Realizado.	1-Solicitud de Información	31/01/2013		31/01/2013		Sí	4.0
11	EJECUCIÓN: Capa de rodadura. Realizado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	13/04/2013		13/04/2013		Sí	4.0
12	EJECUCIÓN: Impactos ambientales. Realizado.	5-Entregables Intermedios	13/04/2013		13/04/2013		Sí	4.0
13	EJECUCIÓN: Muros y Obras complementarias. Realizado.	5-Entregables Intermedios	13/04/2013		13/04/2013		Sí	4.0
14	EJECUCIÓN: Pavimento. Realizado.	5-Entregables Intermedios	13/04/2013		13/04/2013		Sí	4.0
15	EJECUCIÓN: Señalización horizontal. Realizado.	1-Solicitud de Información	13/04/2013		13/04/2013		Sí	3.0
16	EJECUCIÓN: Señalización vertical. Realizado.	1-Solicitud de Información	13/04/2013		13/04/2013		Sí	3.0
17	EJECUCIÓN: Obras de iluminación. Realizado.	5-Entregables Intermedios	16/06/2013		16/06/2013		Sí	3.0
18	EJECUCIÓN: Trabajos de encoframiento y canalización de bordillos. Realizado.	5-Entregables Intermedios	09/07/2013		09/07/2013		Sí	4.0
19	EJECUCIÓN: Trabajos de señalización informativa (ingresos a pueblos, etc). Realizado.	5-Entregables Intermedios	28/08/2013		28/08/2013		Sí	4.0
20	CIERRE: Liquidación económica. Realizado.	9-Entregables Formales	01/12/2015		01/11/2015		Sí	3.0
21	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional. Realizado.	9-Entregables Formales	07/12/2015		01/12/2015		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
22	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva. Realizado.	9-Entregables Formales	20/12/2015		07/12/2015		Sí	3.0
23	CIERRE: Convenio de pago servicios de fiscalización y consultoría de estudios	9-Entregables Formales	25/10/2019	31/12/2019			No	2.0
24	COMPLETADO	9-Entregables Formales	27/12/2019	27/12/2019			No	0.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Contrato Adicional de Concesión para la Ejecución de Obras de Mantenimiento, Ampliación, Explotación y Administración de la Infraestructura vial del t	Pabón Caranqui, Paola Verenice	{PR} - Provincia - PICHINCHA	29/11/2015
2	Contrato Adicional de Concesión para la Ejecución de Obras de Mantenimiento, Ampliación, Explotación y Administración de la Infraestructura vial del t	Guisamano Lasso, Juan Carlos	{PR} - Provincia - PICHINCHA	22/11/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	11,863,231.93
Estimado Al Fin Del Proyecto:	39,977,830.45 **
Costo Total:	39,977,830.45
Total Devengado:	39,977,830.45
% Costo Total Devengado:	100.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 100.00 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	39,977,830.45	3,530,967.51	0.00	43,508,797.96
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	39,977,830.45	2,280,725.63	0.00	42,258,556.08
Ppto. Codificado	39,977,830.45	0.00	0.00	39,977,830.45
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2019)		3,530,967.51		
Programado a Devengar	47,749,793.87	0.00	0.00	47,749,793.87
Ppto. Devengado	39,977,830.45	0.00	0.00	39,977,830.45
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 39,977,830.45	0.00	0.00	39,977,830.45
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	7,771,963.42	0.00	0.00	7,771,963.42
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 83.72 %	0.00 %	0.00 %	83.72 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	100.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Oct	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Nov	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Dic	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Total	0.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
14	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1. Anexo Fotográfico; Agosto 2012. (1)	Picture1_Agosto.pdf	18/09/2012
2	A2. Anexo Fotográfico; Agosto 2012. (2)	Picture2_Agosto.pdf	18/09/2012
3	A3. Anexo Fotográfico; Agosto 2012. (3)	Picture3_Agosto.pdf	18/09/2012
4	A4. Anexo Fotográfico; Agosto 2012. (4)	Picture4_Agosto.pdf	18/09/2012
5	A5. Informe Ejecutivo SITOP-Diciembre 2013.	Informe_Ejecutivo_SITOP-Diciembre_2013..pdf	17/03/2015
6	A6. Informe Ejecutivo SITOP-Marzo 2015.	Informe_Ejecutivo_SITOP-Marzo_2015..pdf	10/04/2015
7	A7. Fotografías del Proyecto; Octubre 2012.	Fotografias_del_Proyecto__Octubre_2012..pdf	12/11/2012
8	A8. Informe Ejecutivo SITOP; Abril 2013.	Informe_Ejecutivo_SITOP__Abril_2013..pdf	14/05/2013
9	Autorización de cambio a fase "Congelado", proyecto no consta en PAI 2020	2020.01.23_MTOP-CGP-2020-78-ME_y_anexos_K009_K012_K014_K018_y_a_fase_Congelado_K006_K007_K015_K	23/01/2020
10	B1. Informe Ejecutivo SITOP; Agosto 2012.	Informe_Ejecutivo_SITOP_Agosto_2012_5.pdf	12/09/2012
11	B2. Informe Ejecutivo SITOP; Agosto 2013.	Informe_Ejecutivo_SITOP__Agosto_2013..pdf	09/09/2013
12	B3. Informe Ejecutivo SITOP; Julio 2013.	Informe_Ejecutivo_SITOP__Julio_2013..pdf	06/08/2013
13	B4. Informe Ejecutivo SITOP; Marzo 2013.	Reporte_SITOP__Marzo_2013..pdf	15/04/2013
14	B5. Informe Ejecutivo SITOP; Octubre 2012.	Informe_Ejecutivo_SITOP__Octubre_2012..pdf	14/11/2012
15	B6. Informe Ejecutivo SITOP; Octubre 2013.	Informe_Ejecutivo_SITOP__Junio_2013..pdf	04/11/2013
16	B7. Informe Ejecutivo SITOP; Septiembre 2012.	Informe_Ejecutivo_SITOP-Septiembre_2012.pdf	15/10/2012
17	B8. Informe Ejecutivo SITOP; Septiembre 2013.	Reporte_Ejecutivo_SITOP-Junio_2013..pdf	01/10/2013
18	C1. Informe de Supervision y Fiscalizacion; Junio 2012.	INFORME_DE_SUP_2.doc	20/07/2012
19	C2. Informe de Avance de Obras; Octubre 2012.	Informe_de_Avance_de_Obras__Octubre_2012..pdf	12/11/2012
20	C3. Informe de Fiscalizacion; Septiembre 2012.	Informe_Fiscalizacion_Calderon-Guayllabamba.pdf	04/10/2012

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
21	C4. Informe de Fiscalización; Noviembre 2012.	Informe_de_Fiscalización_Calderon-Guayllabamba__Noviembre_2012..pdf	03/12/2012
22	C5. Informe de Trabajos Realizados; Octubre 2012.	Informe_de_Trabajos_Realizados__Octubre_2012..pdf	12/11/2012
23	C6. Reporte SITOP; Marzo 2013.	Reporte_SITOP__Marzo_2013..pdf	15/04/2013
24	C7. Resumen Calderon-Guayllabamba; Agosto 2012.	Resumen_Agosto_Calderon-Guayllabamba.pdf	10/09/2012
25	C8. Acta Recepcion Parcial Unica Paso Peatonal Oyacoto.	Acta_Recepcion_Parcial_Unica_Paso_Peatonal_Oyacoto..pdf	22/09/2015
26	D1. Acta Recepcion Parcial Unica Paso Peatonal San Miguel del Comun.	Acta_Recepcion_Parcial_Unica_Paso_Peatonal_San_Miguel_del_Comun..pdf	22/09/2015
27	D2. Acta Recepcion Parcial Unica Puente sobre el Rio Guayllabamba.	Acta_Recepcion_Parcial_Unica_Puente_sobre_el_Rio_Guayllabamba..pdf	22/09/2015
28	D3. Acta Recepcion Parcial Unica Rio Coyago.	Acta_Recepcion_Parcial_Unica_Rio_Coyago..pdf	22/09/2015
29	D4. Acta de Recepción Parcial Unica Calderón-Guayllabamba.	Acta_de_Recepción_Parcial_Unica_Calderon-Guayllabamba..pdf	09/12/2015
30	D5. Acta de Recepción Unica de los Servicios Técnicos y Legales.	Acta_de_Recepción_Unica_de_los_Servicios_Técnicos_y_Legales..pdf	09/12/2015
31	E1. CEDULA PRESUPUESTARIA_K015_JUNIO 2019	CEDULA_PRESUPUESTARIA_K015_JUNIO_2019.pdf	05/07/2019
32	E2. CEDULA PRESUPUESTARIA_K015_JULIO 2019	CEDULA_PRESUPUESTARIA_PICHINCHA_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
33	E3. CEDULA PRESUPUESTARIA_K015_AGOSTO 2019	CEDULA_PRESUPUESTARIA_PICHINCHA_AGOSTO_2019.pdf	09/09/2019
34	E3. CEDULA PRESUPUESTARIA_K015_SEPTIEMBRE 2019	Sep_2019.pdf	04/10/2019
35	E4. CEDULA PRESUPUESTARIA_K015_OCTUBRE 2019	CEDULA_PRESUPUESTARIA_PICHINCHA_OCTUBRE_2019.pdf	05/11/2019
36	E5. CEDULA PRESUPUESTARIA_K015_NOVIEMBRE 2019	Nov_2019.pdf	04/12/2019
37	E6. CEDULA PRESUPUESTARIA_K015_DICIEMBRE 2019	Dic_2019_(1).pdf	09/01/2020
38	F1_MATRIZ DE MARCO LOGICO_K012_SIPEIP	Rumichaca-Riobamba_M_L_175200000.1005.6955.pdf	05/07/2019

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Carlos Augusto, Cevallos Escobar	Financiero Dirección Distrital de Pichincha	Analista Administrativo Financiero Distrital	ccevallos@mtop.gob.ec	23310
Rodríguez Cepeda, Jorge Antonio	Soporte Técnico.	Analista de Infraestructura Provincial 2- MTOP	jrodriguez@mtop.gob.ec	023974600
Yupangui Cushicondor, Ruth Verónica	Supervisor del Proyecto.	Analista de Infraestructura Distrital 2	ryupangui@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
23530_1.jpg	08/12/2015
