

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 6**  
**Dirección Provincial Cañar**

**PROYECTO: K020** MTOP-Reconstrucción Vía Rápida Cuenca-Azogues-Biblián, incluido ampliación Tramo El Descanso-Azogues-Biblián de 42 km long.

Líder del Proyecto:	Soto Romero, José Gerardo (jsoto@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Barsallo Chavez, Luis Mario	Programas Relacionados:	Provincia - Azuay, Provincia - Cañar, RECONSTRUCCIONVIA RAPIDA CUENCA- AZOGUES-BIBLIAN INCLUIDO AMPLIACION TRAMOEL DESCANSO- AZOGUES-BIBLIAN, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	136,363,130.70
CUP:	175200000.0000.374212	TIR:	14.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	7,268,324.67
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	138,049,331.68
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	13/12/2012 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	03/12/2021	Fecha de Fin Base:	30/04/2019
Modificado por:	Soto Romero, José Gerardo	Fecha del siguiente Hito:	

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCION:**

El proyecto de inversión que se detalla a continuación se encuentra ubicado en los cantones de Cuenca y Azogues, de tal manera que se hace un breve diagnóstico de la zona de influencia del proyecto.

La Ciudad de Santa Ana de los cuatro Ríos de Cuenca, capital de la Provincia del Azuay y del Cantón Cuenca, se encuentra localizada en la Región Centro-Sur de la República del Ecuador, a una altura promedio de 2.560 m sobre el nivel del mar. Cuenca es la tercera ciudad más poblada del Ecuador, después de Guayaquil y Quito, con 329.928 habitantes en el área administrativa urbana; en datos reales de aglomeración urbana con las zonas suburbanas en la que se incluyen cabeceras rurales ya fusionadas con el casco urbano en las que se cuenta a Baños, Ricaurte, San Joaquín, Turi y Sayausi, determinan la población real de la ciudad de Cuenca con 385.456 habitantes. También cabe mencionar que el cantón en su conjunto tiene 505.585 habitantes. Todos estos datos según el último censo realizado el 28 noviembre de 2010 siendo la zona urbana la que posee la mayor cantidad de habitantes. Eso se debe, en parte, al incremento de las fuentes de trabajo disponibles y a la construcción de viviendas. La conurbación de Cuenca que incluye el cantón homónimo, al igual que los cantones de la Provincia de Cañar de Azogues, Biblián y Déleg pone la población metropolitana a 602.566 en la denominada conurbación Cuenca-Azogues

**PROPOSITO:** Permitir un mayor y mejor desarrollo socio - económico de las poblaciones involucradas al contar con una vía que permite mejorar la capacidad de circulación vehicular, imagen y seguridad, de la población.

**LINEA BASE:**

La carretera Vía Rápida Cuenca - Azogues - Biblián forma parte del Eje Vial E35 que conecta las provincias de Azuay y Cañar y constituye la arteria principal de conexión con el centro y norte del país, su longitud de es de 43.8 km s y cruza áreas de expansión urbana de las ciudades de Cuenca y Azogues.

La vía rápida Cuenca - Azogues - Biblián, prevee las siguientes actividades: 43,8 km de pavimento flexible colocados, 3 puentes rehabilitados, 1 puente construidos, 22 kilómetros de subdrenes construidos , 21 km de base colocados, 42 accesos rehabilitados, 100 % de señalización colocada (guardavías, preventiva, informativa, reglamentaria), 6 fallas geológicas intervenidas, 12 pasos peatonales.

**IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO.**

## DATOS GENERALES

### Descripción

Los beneficiarios directos del proyecto serán los pobladores de las provincias de Azuay y Cañar y en forma directa todos los del área de influencia, es decir los 594.466 habitantes (según el censo del 2010) los mismos que están divididos en 280.778 hombres y 315.688 mujeres.

El proyecto en sí se ubica entre las provincias de Azuay y Cañar, y constituye la puerta de entrada y salida hacia las ciudades de Cuenca y Azogues capitales de provincias antes mencionadas, además de ambas ser consideradas como centros públicos e industriales, en donde se realizan la mayor cantidad de actividades económicas y productivas de la región. Además los beneficiarios indirectos serán las poblaciones tanto de la parte costanera como la del norte del país.

#### OBJETIVO GENERAL:

Reconstruir la vía rápida Cuenca - Azogues - Biblián incluido ampliación tramo El Descanso - Azogues - Biblián de 43.60 km de longitud.

#### OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- .Construcción de la obra civil
- .Desarrollo Territorial
- .Gestión Administrativa del Proyecto
- .Mantenimiento

### Beneficios Cualitativos

Permitir un mayor y mejor desarrollo socio - económico de las poblaciones involucradas al contar con una vía que permita mejorar la capacidad de circulación vehicular, imagen y seguridad de la población.

Incrementar las fuentes de trabajo alrededor de la vía en un 20 % con respecto a la situación inicial

### Tipo de Beneficiario

Los beneficiarios directos del proyecto serán los pobladores de las provincias de Azuay y Cañar y en forma directa todos los del área de influencia, es decir los 1.162.790 habitantes (según la proyección al año 2020, del INEC según el censo del 2010) los mismos que están divididos en 556.590 son hombres y 606.200 son mujeres.

Además los beneficiarios indirectos serán las poblaciones tanto de la parte costanera como la del norte del país.

### Restricciones

Tiempo: El proyecto inició en agosto de 2013 con un plazo original de 20 meses para la construcción y 48 meses de mantenimiento. Sin embargo, existió ampliación de plazo por lo cual la etapa constructiva finalizó en noviembre 2018, fecha en la cual inició el periodo de mantenimiento de 4 años.

Costo: El valor del contrato original fue de \$ 80.827.338,50 (incluido IVA), el cual sufrió modificaciones debido a incremento de cantidades de obra y la inclusión de nuevos rubros, ascendiendo a un total de \$ 136.363.130,70.

Calidad: La infraestructura implementada para la Reconstrucción de la vía Rápida Cuenca - Azogues - Biblián debe cumplir lo siguiente:

- Brindar adecuados niveles de seguridad, servicialidad y comodidad a los usuarios de esta vía
- Contar con una carretera debidamente señalizada con seguridad vial.

- Cumplir con las especificaciones técnicas, cumpliendo con los estándares de calidad óptimos

Recursos: Equipo Caminera para obras civiles y personal calificado de la Empresa Hidalgo e Hidalgo S. A, los mismos que serán controlados mediante ensayos realizados con equipo de laboratorio de suelos, y personal especializado del Consorcio Austrovías. Los materiales se extraen del cerro tamuga y de la Mina Cochancay 1, 2 y 3.

Riesgos: La presencia de fallas geológicas y la deficiencia en la construcción causaría daños en la infraestructura vial.

Alcance: El proyecto de inversión se restringe a 46.3 km de infraestructura vial estatal que se encuentra geográficamente dentro de los límites de las provincias de Azuay y Cañar, considerando los tramos Cuenca - El Descanso - Azogues, y Azogues - Biblián, correspondientes a la Troncal de la Sierra (E35). Dentro de esta zona se incluyen los cantones de Cuenca, Azogues y Biblián. Se consideran los servicios de transporte, conectividad y seguridad de los usuarios. Las actividades planificadas se pueden ver afectadas por la influencia del clima, factores geológicos, desastres naturales y de fuerza mayor.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

**Ejecución**

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado


## AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 13/12/2012 Fecha de Fin: 31/12/2021

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

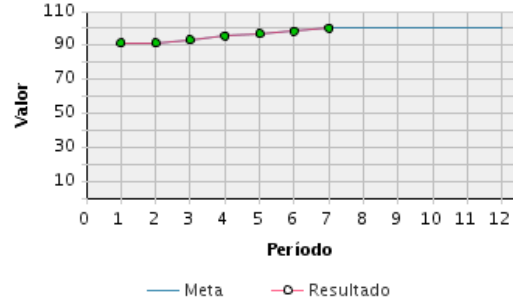

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	92 %	92 %	94 %	96 %	97 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	92 %	92 %	94 %	96 %	97 %	98 %	100 %					
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●					

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>NOVIEMBRE 2021</b></p> <p>El proyecto cuenta con recepción definitiva, se han cancelado los valores pendientes de la planilla de reajustes definitivos, sin embargo la Contratista ha realizado el reclamo de valores constantes en el acta de liquidación; además la Dirección Distrital del MTOP - Cañar, ha realizado la solicitud de la modificación presupuestaria para el pago de una Indemnización.</p>	Soto Romero, José Gerardo	03/12/2021 - 03:37 PM
<p><b>OCTUBRE 2021</b></p> <p>El proyecto cuenta con recepción definitiva, se han cancelado los valores pendientes de la planilla de reajustes definitivos, sin embargo la Contratista ha realizado el reclamo de valores constantes en el acta de liquidación; además la Dirección Distrital del MTOP - Cañar, nuevamente ha enviado los documentos en los nuevos formatos solicitadas por la Secretaría Planifica Ecuador con la actualización de las firmas, para la asignación de recursos, los mismos que se encuentran en revisión por parte de la Coordinación de Planificación, documento necesario para cumplir con el hito 154.</p>	Soto Romero, José Gerardo	05/11/2021 - 11:32 AM
<p><b>SEPTIEMBRE 2021</b></p> <p>El proyecto cuenta con recepción definitiva, se han cancelado los valores pendientes de la planilla de reajustes definitivos, sin embargo la Contratista ha realizado el reclamo de valores constantes en el acta de liquidación; además la Dirección Distrital del MTOP - Cañar, nuevamente ha enviado los documentos en los nuevos formatos solicitadas por la Secretaría Planifica Ecuador con la actualización de las firmas, para la asignación de recursos, los mismos que se encuentran en revisión por parte de la Coordinación de Planificación, documento necesario para cumplir con el hito 154.</p>	Soto Romero, José Gerardo	01/10/2021 - 08:46 AM
<p><b>AGOSTOO 2021</b></p> <p>El proyecto cuenta con recepción definitiva, se han cancelado los valores pendientes de la planilla de reajustes definitivos, sin embargo la Contratista ha realizado el reclamo de valores constantes en el acta de liquidación; además la Dirección Distrital del MTOP - Cañar, nuevamente ha enviado los documentos en los nuevos formatos solicitadas por la Secretaría Planifica Ecuador con la actualización de las firmas, para la obtención de la actualización del Dictamen de Prioridad, los mismos que se encuentran en revisión por parte de la Coordinación de Planificación, documento necesario para cumplir con el hito 154.</p>	Soto Romero, José Gerardo	02/09/2021 - 08:52 PM
<p><b>JULIO 2021</b></p> <p>El proyecto cuenta con recepción definitiva, se han cancelado los valores pendientes de la planilla de reajustes definitivos, sin embargo la Contratista ha realizado el reclamo de valores constantes</p>	Soto Romero, José Gerardo	04/08/2021 - 02:09 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>en el acta de liquidación; además la Dirección Distrital del MTOP - Cañar, nuevamente ha enviado los documentos en los nuevos formatos solicitadas por la Secretaría Planifica Ecuador con la actualización de las firmas, para la obtención de la actualización del Dictamen de Prioridad, los mismos que se encuentran en revisión por parte de la Coordinación de Planificación, documento necesario para cumplir con el hito 37.</p>		
<p>JUNIO 2021</p> <p>El proyecto cuenta con recepción definitiva, se han cancelado los valores pendientes de la planilla de reajustes definitivos, sin embargo la Contratista ha realizado el reclamo de valores constantes en el acta de liquidación; además la Dirección Distrital del MTOP - Cañar, nuevamente se ha enviado los documentos en los nuevos formatos solicitadas por la Secretaría Planifica Ecuador con la actualización de las firmas, para la obtención de la actualización del Dictamen de Prioridad, los mismos que se encuentran en revisión por parte de la Coordinación de Planificación, documento necesario para cumplir con el hito 37.</p>	<p>Soto Romero, José Gerardo</p>	<p>01/07/2021 - 01:00 PM</p>
<p>MAYO 2021.</p> <p>El proyecto cuenta con recepción definitiva, se han cancelado los valores pendientes de la planilla de reajustes definitivos, sin embargo la Contratista ha realizado el reclamo de valores constantes en el acta de liquidación; además la Dirección Distrital del MTOP - Cañar, ha enviado los documentos en los nuevos formatos solicitadas por la Secretaría Planifica Ecuador para la obtención de la actualización del Dictamen de Prioridad, los mismos que se encuentran en revisión por parte de la Coordinación de Planificación, documento necesario para cumplir con el hito 37.</p>	<p>Soto Romero, José Gerardo</p>	<p>02/06/2021 - 09:09 AM</p>
<p>Abril 2021.</p> <p>El proyecto cuenta con recepción definitiva, se han cancelado los valores pendientes de la planilla de reajustes definitivos, sin embargo la Contratista ha realizado el reclamo de valores constantes en el acta de liquidación; además la Dirección Distrital del MTOP - Cañar, ha enviado los documentos en los nuevos formatos solicitadas por la Secretaría Planifica Ecuador para la obtención de la actualización del Dictamen de Prioridad y cumplir con el hito 37.</p>	<p>Soto Romero, José Gerardo</p>	<p>04/05/2021 - 09:24 PM</p>
<p>Marzo 2021.</p> <p>El proyecto cuenta con recepción definitiva, se han cancelado los valores pendientes de la planilla de reajustes definitivos, sin embargo la Contratista ha realizado el reclamo de valores constantes en el acta de liquidación; además la Dirección Distrital del MTOP - Cañar, ha enviado los documentos en los nuevos formatos solicitadas por la Secretaría Planifica Ecuador para la obtención de la actualización del Dictamen de Prioridad y cumplir con el hito 37.</p>	<p>Soto Romero, José Gerardo</p>	<p>04/04/2021 - 09:11 PM</p>
<p>Febrero 2021.</p> <p>El proyecto cuenta con recepción definitiva, sin embargo se tienen valores pendientes de pago, no se ha logrado cancelar los valores adeudados en este mes debido a la falta de aprobación de reformas, además la Dirección Distrital del MTOP - Cañar, se encuentra elaborando los documentos en los nuevos formatos solicitadas por la Secretaría Planifica Ecuador para la obtención de la actualización del Dictamen de Prioridad y cumplir con el hito 37.</p>	<p>Soto Romero, José Gerardo</p>	<p>04/03/2021 - 03:01 PM</p>
<p>Enero 2021.</p> <p>El proyecto cuenta con recepción definitiva, sin embargo se tienen valores pendientes de pago, la Dirección ha logrado cancelar parte de los valores adeudados mediante reformas financieras, además la Dirección Distrital del MTOP - Cañar, se encuentra elaborando los documentos en los nuevos formatos solicitadas por la Secretaría Planifica Ecuador para la obtención de la actualización del Dictamen de Prioridad y cumplir con el hito 37.</p>	<p>Izquierdo Campoverde, Galo Fernando</p>	<p>02/02/2021 - 10:08 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2020</p> <p>El proyecto cuenta con recepción definitiva, sin embargo se tienen valores pendientes de pago, la Dirección ha logrado cancelar parte de los valores adeudados mediante reformas financieras, además se ha enviado las correcciones solicitadas por Planta Central para la obtención de la actualización del Dictamen de Prioridad y cumplir con el hito 37.</p>	<p>Izquierdo Campoverde, Galo Fernando</p>	<p>04/01/2021 - 10:46 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2020</p> <p>El proyecto cuenta con recepción definitiva, sin embargo se tienen valores pendientes de pago, la Dirección ha realizado reformas para cancelar parte de las planillas, además se ha enviado las correcciones solicitadas por Planta Central para la obtención de la actualización del Dictamen de Prioridad y cumplir con el hito 37.</p>	<p>Izquierdo Campoverde, Galo Fernando</p>	<p>03/12/2020 - 09:19 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>OCTUBRE 2020</b></p> <p>El proyecto cuenta con recepción definitiva, sin embargo se tienen valores pendientes de pago, la Dirección ha enviado las correcciones solicitadas por Planta Central para la obtención de la actualización del Dictamen de Prioridad y cumplir con el hito 37.</p>	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	03/12/2020 - 09:18 PM
<p><b>OCTUBRE 2020</b></p> <p>El proyecto cuenta con recepción definitiva, sin embargo se tienen valores pendientes de pago, la Dirección ha enviado las correcciones solicitadas por Planta Central para la obtención de la actualización del Dictamen de Prioridad y cumplir con el hito 37.</p>	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	04/11/2020 - 09:51 PM
<p><b>SEPTIEMBRE 2020</b></p> <p>El proyecto cuenta con recepción definitiva, sin embargo se tienen valores pendientes de pago, la Dirección se encuentra realizando las correcciones para la obtención de la actualización del Dictamen.</p>	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	03/10/2020 - 09:23 PM
<p><b>AGOSTO 2020</b></p> <p>El 07 de agosto de 2020 se procede con la recepción definitiva del proyecto de obra, en la cual se deja constancia de los valores adeudados a la Contratista.</p>	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	02/09/2020 - 10:21 PM
<p><b>JULIO 2020</b></p> <p>Se realiza la revisión de la planilla de reajustes definitivos, y continúa en trámite la recepción definitiva del proyecto.</p>	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	04/08/2020 - 09:13 PM
<p><b>JUNIO 2020</b></p> <p>Se realiza la inspección para el cierre ambiental del proyecto con Funcionarios del MTOP - Cañar, representantes de la Contratista y el Supervisor Zonal Ambiental. se ha retomado los trámites para la recepción definitiva de la obra, en lo que se refiere a la Fiscalización, esta ha solicitado la recepción presunta.</p>	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	01/07/2020 - 10:07 PM
<p><b>MAYO 2020</b></p> <p>Se encuentran paralizados los trámites de recepción definitiva de la obra, así como la liquidación económica de la misma, debido a la emergencia en la que se encuentra el país por el COVID - 19. En lo que respecta a la Fiscalización, se procedió con la liquidación económica, la misma que no fue aceptada por la consultora y ha procedido a demandar al MTOP.</p>	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	02/06/2020 - 10:15 PM
<p><b>ABRIL 2020</b></p> <p>Se encuentran paralizados los trámites de recepción definitiva de la obra, así como la liquidación económica de la misma, debido a la emergencia en la que se encuentra el país por el COVID - 19. En lo que respecta a la Fiscalización, se procedió con la liquidación económica, la misma que no fue aceptada por la consultora y ha procedido a demandar al MTOP.</p>	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	02/05/2020 - 09:36 PM
<p><b>Marzo 2020</b></p> <p>Se encuentra en trámite la recepción definitiva de la obra, así como la liquidación económica de la misma. En lo que respecta a la Fiscalización, se procedió con la liquidación económica, la misma que no fue aceptada por la consultora y ha procedido a demandar al MTOP.</p>	Soto Romero, José Gerardo	04/04/2020 - 09:03 PM
<p><b>FEBRERO 2020</b></p> <p>Se encuentra en trámite la recepción definitiva del proyecto, la Constructora ha procedido a realizar las observaciones hechas por los miembros de comisión en la inspección en campo.</p>	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	02/03/2020 - 11:39 AM
<p><b>ENERO 2020</b></p> <p>El 06 de enero de 2020, se firma el mutuo acuerdo para la etapa de mantenimiento, por lo que las microempresas trabajan hasta esta fecha.</p> <p><b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b> Limpieza de cunetas en los tres tramos.</p> <p><b>EVENTO SUCUTADO</b> Debido al impacto frontal de un trailer con la pasarela del puente peatonal de Nulti ubicado en el km 15 de la vía rápida, se provoco la caída de 32 m de longitud sobre la calzada, obstaculizando los seis carriles, cuya emergencia fue atendida inmediatamente y se logró abrir al tráfico a las 5:00 am.</p>	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	03/02/2020 - 09:27 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2019</p> <p>El proyecto ha sido recibido provisionalmente, la contratista realiza el mantenimiento rutinario de la vía con el empleo de dos microempresas desde el mes de Noviembre 2018. El contratista ha solicitado la terminación por mutuo acuerdo, en razón de que no es posible cumplir a cabalidad con las cláusulas contractuales.</p> <p><b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>                      Limpieza de cunetas en los tres tramos.                      Limpieza de material suelto en la calzada y bermas de los tres tramos.                      Roza a maquina en los tres tramos</p>	<p>Soto Romero, José Gerardo</p>	<p>04/01/2020 - 06:09 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2019</p> <p>El proyecto ha sido recibido provisionalmente, la contratista realiza el mantenimiento rutinario de la vía con el empleo de dos microempresas desde el mes de Noviembre 2018. El contratista ha solicitado la terminación por mutuo acuerdo, en razón de que no es posible cumplir a cabalidad con las cláusulas contractuales.</p> <p><b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>                      Limpieza de cunetas en los tres tramos.                      Limpieza de material suelto en la calzada y bermas de los tres tramos.                      Roza a maquina en los tres tramos</p> <p>Con las actividades realizadas en este mes, así como las detalladas en los meses de septiembre y octubre de 2019, se ha cumplido con el Hito Nro. 34 correspondiente a mantener un índice de servicio de la vía superior al 90 % en el periodo comprendido entre el 01 de Septiembre del 2019 y el 30 de noviembre del 2019</p>	<p>Soto Romero, José Gerardo</p>	<p>05/12/2019 - 12:43 PM</p>
<p>OCTUBRE 2019</p> <p>El proyecto ha sido recibido provisionalmente, la contratista realiza el mantenimiento rutinario de la vía con el empleo de dos microempresas desde el mes de Noviembre 2018.</p> <p><b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>                      Limpieza de cunetas en los tres tramos.                      Limpieza de material suelto en la calzada y bermas de los tres tramos.                      Roza a maquina en los tres tramos</p>	<p>Soto Romero, José Gerardo</p>	<p>05/11/2019 - 05:15 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2019</p> <p>El proyecto ha sido recibido provisionalmente, la contratista realiza el mantenimiento rutinario de la vía con el empleo de dos microempresas desde el mes de Noviembre 2018.</p> <p><b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>                      Limpieza de cunetas en los tres tramos.                      Limpieza de material suelto en la calzada y bermas de los tres tramos.                      Limpieza de alcantarillas y sumideros en el tramo 1.                      Roza a maquina en los tres tramos</p>	<p>Soto Romero, José Gerardo</p>	<p>02/10/2019 - 11:45 AM</p>
<p>AGOSTO 2019</p> <p>El proyecto ha sido recibido provisionalmente, la contratista realiza el mantenimiento rutinario de la vía con el empleo de dos microempresas.</p> <p><b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>                      Limpieza de cunetas en los tres tramos.                      Limpieza de material en la vía.                      Limpieza de alcantarillas en el tramo 1.                      Roza a maquina en los tres tramos.</p>	<p>Izquierdo Campoverde, Galo Fernando</p>	<p>02/09/2019 - 05:07 PM</p>
<p>JULIO 2019</p> <p>El proyecto ha sido recibido provisionalmente, la contratista realiza el mantenimiento rutinario de la vía con el empleo de dos microempresas.</p> <p><b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>                      Limpieza de cunetas en los tres tramos.                      Colocación de señalización vertical en el tramo 2.                      Limpieza de material en la vía.</p>	<p>Soto Romero, José Gerardo</p>	<p>01/08/2019 - 03:39 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Reposición de guardavías en sectores afectados por causa de accidentes de tránsito. Limpieza de sumideros.		
JUNIO 2019  El proyecto ha sido recibido provisionalmente, la contratista realiza el mantenimiento rutinario de la vía con el empleo de dos microempresas.  ACTIVIDADES REALIZADAS Limpieza de cunetas en los tre tramos. Limpieza de derrumbes en el tramo 2. Limpieza de señales verticales en el tramo 1. Limpieza de material en la vía. Retiro de guardavías dañados por causa de accidentes de tránsito y reposición de los mismos, dicha actividad se realiza con personal y maquinaria de la institución.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	02/07/2019 - 10:45 AM
MAYO 2019  El proyecto ha sido recibido provisionalmente, la contratista realiza el mantenimiento rutinario de la vía con el empleo de dos microempresas, se realiza la inspección al paso peatonal de Nulti, en la que se da detalles por parte del Especialista Estructural para corregir la traba antisísmica.	Soto Romero, José Gerardo	04/06/2019 - 09:35 AM
ABRIL 2019  El proyecto ha sido recibido provisionalmente, la contratista realiza el mantenimiento rutinario de la vía con el empleo de dos microempresas, se continua a la espera el diseño del Especialista estructural para la fundición de la traba antisísmica en el paso peatonal de Nulti.	Soto Romero, José Gerardo	02/05/2019 - 03:54 PM
MARZO 2019  El proyecto ha sido recibido provisionalmente, la contratista realiza el mantenimiento rutinario de la vía con el empleo de dos microempresas, se continua a la espera el diseño del Especialista estructural para la fundición de la traba antisísmica en el paso peatonal de Nulti.	Soto Romero, José Gerardo	03/04/2019 - 10:54 AM
FEBRERO 2019  El proyecto ha sido recibido provisionalmente, la contratista realiza el mantenimiento rutinario de la vía con el empleo de dos microempresas, además se realiza intervención en el paso peatonal de Nulti que fue afectado por el sismo del 21 de febrero de 2019.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	02/03/2019 - 10:14 AM
ENERO 2019  El proyecto ha sido recibido provisionalmente, la contratista realiza el mantenimiento rutinario de la vía con el empleo de dos microempresas.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	05/02/2019 - 12:38 PM
DICIEMBRE 2018  La obra se terminó el 28 de julio de 2018 , el proyecto ha sido recibido provisionalmente, la contratista realiza el mantenimiento rutinario de la vía con el empleo de dos microempresas.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	03/01/2019 - 03:21 PM
NOVIEMBRE 2018  La obra se terminó el 28 de julio de 2018 , el proyecto ha sido recibido provisionalmente, el 23 de noviembre de 2018 se inicia la etapa de mantenimiento.	Dután Sanango, Italo Medardo	05/12/2018 - 04:56 PM
OCTUBRE 2018  La obra se terminó el 28 de julio de 2018 , los miembros de comisión para la recepción provisional han informado a la Subsecretaría sobre las observaciones hechas en el recorrido de la vía en campo.	Dután Sanango, Italo Medardo	05/11/2018 - 03:47 PM
SEPTIEMBRE 2018  La obra se terminó el 28 de julio de 2018 , con fecha 25 de septiembre de 2018, se designa los miembros de comisión para la recepción provisional, los mismos que realizan la inspección en campo el 28 de septiembre de 2018.	Dután Sanango, Italo Medardo	05/10/2018 - 10:58 AM
AGOSTO 2018  La obra se terminó el 28 de julio de 2018 , se encuentra en trámite la quidación económica del la obra, previo a la recepción provisional.	Buestan Toral, José Remigio	05/09/2018 - 04:33 PM
JULIO 2018	Dután Sanango, Italo Medardo	03/08/2018 - 10:31 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
La contratista realiza los trabajos de construcción de pasos peatonales, colocación de carpeta asfáltica en los caminos de accesos a la vía rápida, hasta el 28 de julio de 2018 , fecha en la cual se terminó la etapa de construcción, se encuentra en trámite la liquidación económica del la obra.		
<b>JUNIO 2018</b> La contratista realiza los trabajos de construcción de pasos peatonales, colocación de carpeta asfáltica en los caminos de accesos a la vía rápida, hasta el mes de junio 2018 no se ha efectivizado el anticipo por parte del Minsiterio de Finanzas correspondiente al contrato complementario Nro. 3	Dután Sanango, Italo Medardo	05/07/2018 - 12:03 PM
<b>MAYO 2018</b> Con fecha 13 de mayo de 2018, la Contratista suspende los trabajos, debido a la falta de efectivización del anticipo por parte del Minsiterio de Finanzas correspondiente al contrato complementario Nro. 3	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/06/2018 - 04:29 PM
<b>ABRIL 2018</b> Con fecha 23 de abril de 2018, se firma el acta de levantamiento de Suspensión de Plazo Temporal del contrato "Reconstrucción de la vía rápida: Cuenca - Azogues - Biblián" con la cual se resuelve reanudar los trabajos del proyecto indicado. Además se ha firmado un nuevo contrato complementario para la terminación del contrato.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	04/05/2018 - 12:38 PM
<b>MARZO 2018</b> El proyecto se encuentra suspendido desde el 16 de febrero de 2018, se encuentra en trámite la aprobación del AVAL para la obtención de recursos para el nuevo contrato complementario.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/04/2018 - 12:23 PM
<b>FEBRERO 2018</b> El proyecto se encuentra suspendido desde el 16 de febrero de 2018, previo a la fecha de suspensión se realizó la colocación de carpeta asfáltica en los caminos de acceso, construcción del puente Ayancay, y pasos peatonales.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	23/03/2018 - 10:14 AM
<b>ENERO 2018</b> El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista HIDALGO E HIDALGO, se interviene en la construcción del puente Ayancay, colocación de carpeta asfáltica en el distribuidor del Valle y construcción de pasos peatonales. El proyecto no ha sido incluido en el PAI 2018, se ha solicitado un contrato complementario Nro. 3, el mismo que ésta en trámite para su aprobación.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	23/03/2018 - 10:12 AM
<b>DICIEMBRE 2017</b> El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista HIDALGO E HIDALGO, se interviene en la colocación de guardavías, hormigón lanzado para estabilización de taludes, construcción del puente Ayancay, colocación de carpeta asfáltica en el distribuidor del Valle y construcción de pasos peatonales. Se ha solicitado un contrato complementario Nro. 3, el mismo que ésta en trámite para su aprobación.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/01/2018 - 04:26 PM
<b>NOVIEMBRE 2017</b> El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista HIDALGO E HIDALGO, se interviene en la colocación de guardavías, hormigón lanzado para estabilización de taludes, construcción del puente Ayancay, colocación de carpeta asfáltica en el distribuidor del Valle y construcción de pasos peatonales. Se ha solicitado un contrato complementario Nro. 3, el mismo que cuenta con el AVAL respectivo y ésta en trámite para su aprobación.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/12/2017 - 03:28 PM
<b>OCTUBRE 2017</b> Mediante reunión de la Comisión Especial 451 se amplía el plazo en 120 días a partir del 28 de octubre de 2017 para la construcción del puente Ayancay, para terminar la obra del Contrato complementario 2 que se retraso debido a la terminación del convenio de la extracción de materiales del cerro Tamuga, restricciones de libre circulación por deslizamientos del cerro Tahuall. El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista HIDALGO E HIDALGO, se interviene en la colocación de guardavías, fundición de cunetas, y hormigón lanzado para estabilización de taludes, construcción de zapatas izquierda y derecha puente Ayancay, y construcción de pasos peatonales.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	01/11/2017 - 08:39 PM
<b>SEPTIEMBRE 2017</b>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	01/11/2017 - 10:33 AM



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Mediante reunión de la Comisión Especial 451 se amplía el plazo en 120 días a partir del 28 de octubre de 2017 para la construcción del puente Ayancay, para terminar la obra del Contrato complementario 2 que se retraso debido a la terminación del convenio de la extracción de materiales del cerro Tamuga, restricciones de libre circulación por deslizamientos del cerro Tahuall.</p> <p>El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista HIDALGO E HIDALGO, se interviene en la colocación de guardavías, fundición de cunetas, y hormigón lanzado para estabilización de taludes, construcción de zapatas izquierda y derecha puente Ayancay, y construcción de pasos peatonales.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2017</p> <p>Mediante reunión de la Comisión Especial 451 se amplía el plazo en 120 días a partir del 28 de octubre de 2017 para la construcción del puente Ayancay, para terminar la obra del Contrato complementario 2 que se retraso debido a la terminación del convenio de la extracción de materiales del cerro Tamuga, restricciones de libre circulación por deslizamientos del cerro Tahuall.</p> <p>El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista HIDALGO E HIDALGO, se interviene en la colocación de guardavías, fundición de cunetas, y hormigón lanzado para estabilización de taludes, y conformación de cajera del intercambiador del Valle, construcción de pasos peatonales.</p>	<p>Chaca Álvarez, Ivan Patricio</p>	<p>05/10/2017 - 12:17 PM</p>
<p>AGOSTO 2017</p> <p>El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista HIDALGO E HIDALGO, Los trabajos avanzan con normalidad</p> <p>Se interviene en la conformación de la estructura de pavimento en cajeras, tendido de base y carpeta asfáltica en ampliación de la calzada, fundición de beredas, además se realiza señalización horizontal y construcción de los pasos peatonales.</p>	<p>Chaca Álvarez, Ivan Patricio</p>	<p>05/09/2017 - 05:39 PM</p>
<p>JULIO 2017</p> <p>El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista HIDALGO E HIDALGO, Los trabajos avanzan con normalidad</p> <p>Se interviene en la estabilización del tramo Turi Chico y Turi Totoras; Conformación de la estructura de pavimento en cajeras, tendido de base y carpeta asfáltica en ampliación de la calzada, además se realiza señalización horizontal y construcción de los pasos peatonales. Los trabajos se están ejecutando dentro del cronograma valorado.</p>	<p>García González, Mariana Alexandra</p>	<p>05/08/2017 - 08:42 AM</p>
<p>JUNIO 2017</p> <p>El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista HIDALGO E HIDALGO, Los trabajos avanzan con normalidad</p> <p>Se interviene en la estabilización del tramo Turi Chico y Turi Totoras; Colocación de Hormigón lanzado en el km 10+800-11+200; En el tramo 2 se ejecuta rubros de fresado, colocación de base asfáltica y carpeta asfáltica y señalización horizontal y construcción de los pasos peatonales. Los trabajos se están ejecutando dentro del cronograma valorado.</p>	<p>García González, Mariana Alexandra</p>	<p>04/07/2017 - 03:28 PM</p>
<p>MAYO 2017</p> <p>El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista, Los trabajos avanzan con normalidad</p> <p>Se interviene en el sitio crítico Turi Chico, se coloca material de base y carpeta asfáltica en el Tramo 2 del proyecto, se realizan trabajos de señalización horizontal en el tramo 2, construcción de pasos peatonales. Los trabajos se están ejecutando dentro del cronograma valorado.</p>	<p>Guillen Luna, Andrés Ismael</p>	<p>01/06/2017 - 11:14 AM</p>
<p>ABRIL 2017</p> <p>El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista, Los trabajos avanzan con normalidad</p> <p>Se interviene en el sitio crítico Turi Chico, se coloca material de base y carpeta asfáltica en el Tramo 2 del proyecto, se realizan trabajos de señalización horizontal en el tramo 2, construcción de pasos peatonales. Los trabajos se están ejecutando dentro del cronograma valorado.</p>	<p>García González, Mariana Alexandra</p>	<p>05/05/2017 - 12:05 PM</p>
<p>MARZO 2017</p> <p>El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista, Los trabajos avanzan con normalidad</p>	<p>Guillen Luna, Andrés Ismael</p>	<p>04/04/2017 - 12:13 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se encuentran trabajando carpeta asfáltica en el tramo II, señalización vertical en el tramo II Los trabajos se están ejecutando dentro del cronograma valorado Esperando la aprobación para que se legalice el acto administrativo.		
<b>FEBRERO 2017</b>  El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista, Los trabajos avanzan con normalidad Se encuentran trabajando carpeta asfáltica en el tramo II Los trabajos se están ejecutando dentro del cronograma valorado Esperando la aprobación para que se legalice el acto administrativo.	Guillen Luna, Andrés Ismael	03/03/2017 - 12:19 PM
<b>ENERO 2017</b>  El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista los trabajos se reiniciaron desde el mes de agosto Se encuentran trabajando carpeta asfáltica en quimandel en el km 2+300 del tramo III Los trabajos se están ejecutando dentro del cronograma valorado Esperando la aprobación para que se legalice el acto administrativo.	Guillen Luna, Andrés Ismael	03/02/2017 - 11:31 AM
<b>DICIEMBRE 2016</b>  El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista los trabajos se reiniciaron desde el mes de agosto Se encuentran realizando trabajos de estabilización en la falla de quimandel en el km 2+300 del tramo III Los trabajos se están ejecutando dentro del cronograma valorado Esperando la aprobación para que se legalice el acto administrativo.	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/01/2017 - 06:58 PM
<b>NOVIEMBRE 2016</b>  El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista los trabajos se reiniciaron desde el mes de agosto Se encuentran realizando trabajos de estabilización en la falla de quimandel en el km 2+300 del tramo III Los trabajos se están ejecutando dentro del cronograma valorado Esperando la aprobación para que se legalice el acto administrativo.	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/12/2016 - 02:20 PM
<b>OCTUBRE 2016</b>  El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista los trabajos se reiniciaron desde el mes de agosto	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/11/2016 - 06:13 PM
<b>SEPTIEMBRE 2016</b>  El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista los trabajos se reiniciaron desde el mes de agosto	Guillen Luna, Andrés Ismael	04/10/2016 - 07:33 PM
<b>AGOSTO 2016 :</b>  El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista los trabajos se reiniciaron desde el mes de agosto	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/09/2016 - 06:54 PM
<b>JULIO 2016:</b>  La obra se encuentra suspendida desde el 1 de enero del 2016.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/08/2016 - 01:47 PM
<b>JUNIO 2016:</b>  La obra se encuentra suspendida desde el 1 de enero del 2016.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/07/2016 - 12:25 PM
<b>MAYO 2016:</b>  La obra se encuentra suspendida desde el 1 de enero por falta de recursos económicos. la compañía está realizando el mantenimiento de la vía, con la limpieza de derrumbes.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/06/2016 - 07:41 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2016:</p> <p>La obra se encuentra suspendida desde el 1 de enero por falta de recursos economicos. la compañía esta realizando el mantenimiento de la via.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	02/05/2016 - 03:17 PM
<p>MARZO 2016:</p> <p>La obra se encuentra suspendida desde el 1 de enero por falta de recursos economicos. la compañía esta realizando el mantenimiento de la via.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/04/2016 - 08:50 PM
<p>FEBRERO 2016:</p> <p>La obra se encuentra suspendida desde el 1 de enero por falta de recursos economicos. la compañía esta realizando el mantenimiento de la via.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/03/2016 - 05:10 PM
<p>ENERO 2016:</p> <p>La obra se encuentra suspendida desde el 1 de enero por falta de recursos economicos. la compañía esta realizando el mantenimiento de la via.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	11/02/2016 - 08:53 PM
<p>DICIEMBRE 2015:</p> <p>Se continua construyendo cunetas y bordillos en el tramo 2, del Km 22+000 al 34+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/01/2016 - 07:27 AM
<p>NOVIEMBRE 2015:</p> <p>Se continua construyendo cunetas y bordillos en el tramo 2, del Km 22+000 al 34+000. y la construccion de los redondeles en el tramo 2.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/12/2015 - 10:13 AM
<p>OCTUBRE 2015:</p> <p>Se esta construyendo cunetas y bordillos en el tramo 2, del Km 22+000 al 34+000. y continua la construccion de los redondeles en el tramo 2.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/11/2015 - 10:14 PM
<p>SEPTIEMBRE 2015</p> <p>Se esta construyendo cunetas y bordillos del Km 22+000 al 34+000. y continua la construccion de los redondeles en estas abscisas.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/10/2015 - 04:15 PM
<p>AGOSTO 2015</p> <p>Se estan realizando trabajos de estabilizacion del sitio critico en el sector del Guzho Km 1+000.</p> <p>Se esta construyendo cunetas y bordillos del Km 22+000 al 34+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/09/2015 - 11:49 AM
<p>JULIO 2015</p> <p>Se continua con la estabilizacion del sitio critico en el sector del Guzho Km 1+000.</p> <p>En el Km 4+3000 se esta tendiendo asfalto.</p> <p>Se esta construyendo cunetas y bordillos del Km 22+000 al 34+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/08/2015 - 01:58 PM
<p>JUNIO 2015</p> <p>Se continua con el tendido de carpeta asfaltica en las abscisas 20 + 000 a 35 + 000. Construccion de bordillos entre las abscisas entre 20+000 a 30+000. Estabilizacion del talud en el sector de Molinohuico.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/07/2015 - 03:31 PM
<p>MAYO 2015</p> <p>Tendido de carpeta asfaltica en las abscisas 20 + 000 a 35 + 000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	08/06/2015 - 01:45 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Construccion de bordillos entre las abscisas entre 20+000 a 30+000.		
<p>ABRIL 22 DEL 2015</p> <p>Tendido de carpeta asfaltica en las abscisas 8+000 a 9+000, 20 + 000 a 35 + 000.                      Construccion de aceras en las abscisas 1+700 a 1 + 900.                      Construccion de bordillos entre las abscisas 4+000 a 5+000, y entre 20+000 a 30+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	22/05/2015 - 11:21 AM
<p>ABRIL 2015</p> <p>Se continua realizando la estructura de la via desde el Km 22+000 al 34+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/05/2015 - 02:59 PM
<p>MARZO 2015</p> <p>Se continua realizando la estructura de la via desde el Km 22+000 al 34+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/04/2015 - 03:27 PM
<p>FEBRERO 2015</p> <p>Se continua realizando el movimiento de tierras y realizando la estructura de la via desde el Km 22+000 al 34+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	09/03/2015 - 09:32 AM
<p>ENERO 2015</p> <p>Se esta realizando el movimiento de tierras y realizando la estructura de la via desde el Km 22+000 al 34+000.                      Se termino la construcción de los puentes.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/02/2015 - 03:08 PM
<p>DICIEMBRE 2014</p> <p>Se esta terminando la estabilización de taludes en el Km 5+000 al 20+000                      Tambien se continua con la colocacion de estructura de la via en la ampliacion en el Km 25+000 al Km 38+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/01/2015 - 11:10 AM
<p>NOVIEMBRE 2014</p> <p>Se continua con la estabilización de taludes en el Km 5+000 al 20+000                      Tambien se continua con la colocacion de estructura de la via en la ampliacion en el Km 25+000 al Km 38+000</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/12/2014 - 03:04 PM
<p>OCTUBRE 2014</p> <p>Se continua con la estabilización de taludes.                      Tambien se continua con la colocacion de estructura de la via en la ampliacion en el Km 25+000 al Km 38+000-</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	10/11/2014 - 08:58 AM
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>Se continua realizando la estabilizacion de Taludes a lo largo de la via se esta comenzando a colocar asfalto en la ampliacion entre el Km 22+000 al 30+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/10/2014 - 12:15 PM
<p>AGOSTO 2014</p> <p>Se continua realizando la estabilizacion de Taludes a lo largo de la via se aprobo la orden de trabajo para la reubicacion de las lineas de subtrasmisión y distribución del tramo 2.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/09/2014 - 08:29 PM
<p>JULIO 2014</p> <p>Se continua realizando la estabilizacion del Talud desde el Km 13+320 hasta el 13+750                      Se esta realizando la estabilizacion de los taludes del Km 30+000 al 40+000.                      Se esta colocando carpeta asfaltica desde la ciudad de Biblian a la ciudad de Azogues.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/08/2014 - 10:20 PM
<p>JUNIO 2014</p> <p>Se continua realizando la estabilizacion del Talud desde el Km 13+320 hasta el 13+750                      Se esta realizando la estabilizacion de los taludes del Km 30+000 al 40+000.                      Continua el fresado de pavimento existente desde el Km 40+000 hasta el 44+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	10/07/2014 - 07:49 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO 2014</p> <p>Se continua realizando la estabilizacion del Talud desde el Km 13+320 hasta el 13+750 Excavacion de cajoneras para conformacion de obra basica desde el Km 20+000 al 35+000 Continua el fresado de pavimento existente desde el Km 40+000 hasta el 44+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/06/2014 - 04:23 PM
<p>ABRIL 2014</p> <p>Se esta realizando la estabilizacion del Talud desde el Km 13+320 hasta el 13+750 Excavacion de cajoneras para conformacion de obra basica desde el Km 20+000 al 35+000 Fresado de pavimento existente desde el Km 40+000 hasta el 44+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/05/2014 - 02:52 PM
<p>MARZO 2014</p> <p>Se esta terminando el movimiento de tierras entre la Ciudad de Azogues y el Descanso Se esta realizando la estabilizacion del talud antre el km 13+320 hasta el Km 13+750.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/04/2014 - 10:52 AM
<p>FEBRERO 2014</p> <p>En el tramo 1(El Salado-Guanguarcucho), se continua con la colocacion de la capa de nivelacion, construccion de subdrenes, estabilizacion de taludes, movimiento de tierras para completar el ancho de via; los trabajos se ejecutan de manera normal. En el tramo 2 (Guanguarcucho-Azogues), se continua con el movimiento de tierras, construccion de subdrenes,ampliacion de puente sobre los rios Cuenca y Deleg, asi como la ampliacion del puente en el distribuidor No 2(acceso al nuevo terminal terrestre Azogues). En el tramo 3 (Azogues-Biblian), construccion de subdrenes en el lado izquierdo de la via Rapida.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/03/2014 - 10:39 AM
<p>ENERO 2014</p> <p>En el tramo 1(El Salado-Guanguarcucho), se continua con la colocacion de la capa de nivelacion, construccion de subdrenes, estabilizacion de taludes, movimiento de tierras para completar el ancho de via; los trabajos se ejecutan de manera normal. En el tramo 2 (Guanguarcucho-Azogues), se continua con el movimiento de tierras, construccion de subdrenes,ampliacion de puente sobre los rios Cuenca y Deleg, asi como la ampliacion del puente en el distribuidor No 2(acceso al nuevo terminal terrestre Azogues). En el tramo 3 (Azogues-Biblian), construccion de subdrenes en el lado izquierdo de la via Rapida. Ademas, se encuentra en tramite el libre aprovechamiento de las minas Biblicay y Curiurcu.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/02/2014 - 02:31 PM
<p>DICIEMBRE 2013</p> <p>Se continua con la colocacion de la capa de nivelacion, construccion de subdrenes, estabilizacion de taludes, movimiento de tierras para completar el ancho de via; los trabajos se ejecutan de manera normal. Se encuentra en tramite el libre aprovechamiento de las minas Biblicay y Curiurcu.</p>	Calle Bravo, Oscar Leonardo	06/01/2014 - 01:11 PM
<p>NOVIEMBRE 2013</p> <p>Se esta colocando la capa de nivelacion, construccion de subdrenes, estabilizacion de taludes, movimiento de tierras para completar el ancho de via; los trabajos se ejecutan de manera normal. Se encuentra en tramite el libre aprovechamiento de las minas Bibircay y Curiurcu.</p>	Calle Bravo, Oscar Leonardo	06/12/2013 - 09:03 AM
<p>OCTUBRE 2013:</p> <p>Se esta colocando la capa de nivelacion, construccion de subdrenes, estabilizacion de taludes, movimiento de tierras para completar el ancho de via; los trabajos se ejecutan de manera normal.</p>	Calle Bravo, Oscar Leonardo	19/11/2013 - 01:43 PM

Problemas cerrados: 5, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 0

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Azuay > Cuenca
2	Zona 6 - Austro > Cañar > Azogues
3	Zona 6 - Austro > Cañar > Biblian

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Informe de necesidad y Términos de Referencia aprobados.	1-Solicitud de Información	08/05/2013		08/05/2013		Sí	2.0
2	DEFINICIÓN: Resolución de Inicio publicada.	1-Solicitud de Información	09/05/2013		09/05/2013		Sí	2.0
3	DEFINICIÓN: Ofertas presentadas.	1-Solicitud de Información	17/06/2013		17/06/2013		Sí	2.0
4	DEFINICIÓN: Informe de Ofertas y anexos calificados.	1-Solicitud de Información	17/07/2013		17/07/2013		Sí	2.0
5	DEFINICIÓN: Adjudicación del Contrato legalizado.	3-Adjudicación	18/07/2013		18/07/2013		Sí	2.0
6	PLANEACION: Firma del contrato realizada.	9-Entregables Formales	01/08/2013		01/08/2013		Sí	5.0
7	PLANEACIÓN: Dictamen de Prioridad emitido.	9-Entregables Formales	01/08/2013		01/08/2013		Sí	2.0
8	EJECUCION: Obras preliminares en un 5%, realizadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		30/09/2013		Sí	0.5
9	PLANEACION: Entrega del anticipo efectuado.	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		30/09/2013		Sí	3.0
10	EJECUCION: Obras preliminares en un 10%, realizadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.5
11	EJECUCION: Obras preliminares en un 15%, realizadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.5
12	EJECUCION: Obras preliminares en un 20%, realizadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.5
13	EJECUCION: Obras preliminares en un 25%, realizadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.5
14	EJECUCION: Obras preliminares en un 30%, realizadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/12/2013		30/12/2013		Sí	0.5
15	EJECUCION: Obras preliminares en un 50%, realizadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/12/2013		30/12/2013		Sí	1.0
16	EJECUCION: Estabilización de Taludes en un 10%, realizadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/01/2014		30/01/2014		Sí	0.5
17	EJECUCION: Estabilización de Taludes en un 5%, realizadas	5-Entregables Intermedios	30/01/2014		30/01/2014		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	(C1. Construcción de la Obra Civil)							
18	EJECUCION: Estabilización de Taludes en un 15%, realizadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.5
19	EJECUCION: Estabilización de Taludes en un 20%, realizadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.5
20	EJECUCION: Movimiento de Tierras en un 30%, realizado (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/03/2014		30/03/2014		Sí	1.5
21	EJECUCION: Obras preliminares en un 100%, concluida (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/03/2014		30/03/2014		Sí	2.0
22	EJECUCION: Puentes en un 25%, realizados (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	15/04/2014		15/04/2014		Sí	1.0
23	EJECUCION: Puentes en un 50%, realizados (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	1.0
24	EJECUCION: Estabilización de Taludes en un 35%, realizadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	15/05/2014		15/05/2014		Sí	1.0
25	EJECUCION: Estabilización de Taludes en un 50%, realizadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	31/05/2014		31/05/2014		Sí	1.0
26	EJECUCION: Muros de Suelo Armado y Gaviones en un 15%, realizados (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	15/06/2014		15/06/2014		Sí	1.0
27	EJECUCION: Muros de Suelo Armado y Gaviones en un 30%, realizados (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	1.0
28	EJECUCION: Muros de Suelo Armado y Gaviones en un 15%, realizados (C1. Construcción de la Obra Civil)	9-Entregables Formales	15/07/2014		15/07/2014		Sí	1.0
29	EJECUCION: Puentes en un 60%, realizados (C1. Construcción de la Obra Civil)	9-Entregables Formales	31/07/2014		31/07/2014		Sí	1.0
30	EJECUCION: Muros de Suelo Armado y Gaviones en un 50%, realizados (C1. Construcción de la Obra Civil)	9-Entregables Formales	30/08/2014		30/08/2014		Sí	1.0
31	EJECUCION: Puentes en un 75%, realizados (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/08/2014		30/08/2014		Sí	1.0
32	EJECUCION: Estabilización de Taludes en un 75%, realizado (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	01/09/2014		01/09/2014		Sí	1.0
33	EJECUCION: Estabilización de Taludes en un 100%, realizado	9-Entregables Formales	19/09/2014		19/09/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	(C1. Construcción de la Obra Civil)							
34	EJECUCION: Muros de Suelo Armado y Gaviones en un 75%, realizados (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	20/10/2014		20/10/2014		Sí	2.0
35	EJECUCION: Pavimento flexible en un 50%, realizado (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	20/10/2014		20/10/2014		Sí	2.0
36	EJECUCION: Estructura de pavimento existente en un 50%, realizado (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	3.0
37	EJECUCION: Movimiento de Tierras realizado en un 60%, realizado (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	2.0
38	EJECUCION: Muros de Suelo Armado y Gaviones en un 85%, realizados (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	15/11/2014		15/11/2014		Sí	1.0
39	EJECUCION: Movimiento de Tierras realizado en un 70%, realizado (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	1.0
40	EJECUCION: Movimiento de Tierras realizado en un 70%, realizado (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	15/12/2014		15/12/2014		Sí	1.0
41	EJECUCION: Movimiento de Tierras realizado en un 90%, realizado (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	0.5
42	EJECUCION: Muros de Suelo Armado y Gaviones en un 90%, realizados (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	20/01/2015		20/01/2015		Sí	0.5
43	EJECUCION: Muros de Suelo Armado y Gaviones en un 95%, realizados (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.5
44	EJECUCION: Movimiento de Tierras en un 100%, realizado (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	25/02/2015		25/02/2015		Sí	1.0
45	EJECUCION: Muros de Suelo Armado y Gaviones en un 100%, realizados (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.5
46	EJECUCION: Puentes en un 80%, realizados (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	01/03/2015		01/03/2015		Sí	0.5
47	EJECUCION: Estructura de pavimento existente en un 10%, en el Tramo 2 realizado (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/03/2015		30/03/2015		Sí	0.25
48	EJECUCION: Estructura de pavimento existente en un 25%, en el Tramo 2 realizado	5-Entregables Intermedios	15/04/2015		15/04/2015		Sí	0.25



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	(C1. Construcción de la Obra Civil)							
49	EJECUCION: Estructura del pavimento realizado en un 30% en el tramo 1 , el Salado el descanso realizado (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.5
50	EJECUCION: Estructura del pavimento realizado en un 60% en el tramo 1 , el Salado el descanso realizado (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	15/05/2015		15/05/2015		Sí	0.5
51	EJECUCION: Estructura de pavimento existente en un 50%, en el Tramo 2 realizado (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	0.25
52	EJECUCION: Estructura del pavimento realizado en un 70% en el tramo 1 , el Salado el descanso realizado (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	01/06/2015		01/06/2015		Sí	0.25
53	EJECUCION: Señalización en un 25%, realizada (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	29/06/2015		29/06/2015		Sí	1.0
54	EJECUCION: Estructura del pavimento realizado en un 80% en el tramo 1 , el Salado el descanso realizado (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	15/07/2015		15/07/2015		Sí	0.25
55	EJECUCION: Estructura de pavimento existente en un 75%, en el Tramo 2 realizado (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	29/07/2015		29/07/2015		Sí	0.25
56	EJECUCION: Estructura del pavimento realizado en un 100% en el tramo 1 , el Salado el descanso realizado (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	04/08/2015		04/08/2015		Sí	0.5
57	EJECUCION: Señalización en un 50%, realizada (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	04/08/2015		04/08/2015		Sí	1.0
58	EJECUCION: Señalización en un 50%, realizada (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	29/09/2015		29/09/2015		Sí	0.5
59	EJECUCION: Pavimento flexible en un 20%, realizado (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.5
60	EJECUCION: Pavimento flexible en un 30%, realizado (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	15/10/2015		15/10/2015		Sí	0.5
61	EJECUCION: Señalización en un 55%, realizada (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/10/2015		Sí	0.25
62	EJECUCION: Pavimento flexible en un 40%, realizado (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	15/11/2015		15/11/2015		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
63	EJECUCION: Pavimento flexible en un 50%, realizado (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.5
64	EJECUCION: Señalización en un 60%, realizada (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	15/12/2015		15/12/2015		Sí	0.25
65	EJECUCION: Pavimento flexible en un 60%, realizado (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.5
66	EJECUCION: Inicio de suspensión temporal aprobada	5-Entregables Intermedios	01/01/2016		01/01/2016		Sí	0.25
67	EJECUCION: Fin de Suspensión temporal aprobada	5-Entregables Intermedios	22/08/2016		22/08/2016		Sí	0.25
68	EJECUCION: Estructura de pavimento existente en un 80%, en el Tramo 2 realizado (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	0.25
69	EJECUCION: Estructura de pavimento existente en un 85%, en el Tramo 2 realizado (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	15/09/2016		15/09/2016		Sí	0.25
70	EJECUCION: Señalización en un 65%, realizada (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.25
71	EJECUCION: Estructura de pavimento existente en un 90%, en el Tramo 2 realizado (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	15/11/2016		15/11/2016		Sí	0.25
72	EJECUCION: Señalización en un 70%, realizada (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	0.25
73	EJECUCION: Estructura de pavimento existente en un 95%, en el Tramo 2 realizado (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	15/12/2016		15/12/2016		Sí	0.25
74	EJECUCION: Expropiaciones en un 80% realizadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.25
75	EJECUCION: Líneas eléctricas y postes reubicados en un 75% (C2. Desarrollo territorial)	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.25
76	EJECUCION: Obras de drenaje en un 60% ejecutadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.25
77	EJECUCION: Líneas eléctricas y postes reubicados en un 85% (C2. Desarrollo territorial)	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.25
78	EJECUCION: Obras de drenaje en un 70% ejecutadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.25
79	EJECUCION: Estructura de pavimento existente en un 100%, en el Tramo 2 realizado (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/03/2017		30/03/2017		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
80	EJECUCION: Señalización en un 75%, realizada (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/03/2017		30/03/2017		Sí	0.25
81	EJECUCION: Obras de drenaje en un 80% ejecutadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/04/2017		30/04/2017		Sí	0.25
82	EJECUCION: Expropiaciones en un 85% realizadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	15/05/2017		15/05/2017		Sí	0.25
83	EJECUCION: Obras de drenaje en un 90% ejecutadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.25
84	EJECUCION: Expropiaciones en un 90% realizadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	15/06/2017		15/06/2017		Sí	0.25
85	EJECUCION: Obras de drenaje en un 95% ejecutadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.25
86	EJECUCION: Obras de sostenimiento en un 75% ejecutadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	15/07/2017		15/07/2017		Sí	0.25
87	EJECUCION: Transporte de materiales en un 80% ejecutadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	0.25
88	EJECUCION: Obras de sostenimiento en un 80% ejecutadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	15/08/2017		15/08/2017		Sí	0.25
89	EJECUCION: Transporte de materiales en un 85% ejecutadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		31/08/2017		Sí	0.25
90	EJECUCION: Obras de sostenimiento en un 85% ejecutadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	15/09/2017		15/09/2017		Sí	0.25
91	EJECUCION: Transporte de materiales en un 90% ejecutadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/09/2017		30/09/2017		Sí	0.25
92	EJECUCION: Órdenes de Cambio, firmadas	5-Entregables Intermedios	12/10/2017		12/10/2017		Sí	1.0
93	EJECUCION: Obras de sostenimiento en un 90% ejecutadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	0.25
94	EJECUCION: Expropiaciones en un 95% realizadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		30/11/2017		Sí	0.25
95	EJECUCION: Obras de sostenimiento en un 95% ejecutadas (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		30/11/2017		Sí	0.25
96	EJECUCION: Señalización en un 80%, realizada (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		30/11/2017		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
97	EJECUCION: Obras de drenaje en un 100% ejecutadas (C1. Construccion de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/12/2017		30/12/2017		Sí	0.25
98	EJECUCION: Señalización en un 80%, realizada (C1. Construccion de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/12/2017		30/12/2017		Sí	0.25
99	EJECUCION: Señalización en un 90%, realizada (C1. Construccion de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	31/01/2018		31/01/2018		Sí	0.25
100	EJECUCION: Transporte de materiales en un 95% ejecutadas (C1. Construccion de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	31/01/2018		31/01/2018		Sí	0.25
101	EJECUCION: Obras de sostenimiento en un 95% ejecutadas (C1. Construccion de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	22/02/2018		22/02/2018		Sí	0.5
102	EJECUCION: Pavimento flexible en un 70%, realizado (C1. Construccion de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	0.25
103	EJECUCION: Mitigación ambiental en un 80%, realizada (C1. Construccion de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		31/03/2018		Sí	0.25
104	EJECUCION: Pavimento flexible en un 75%, realizado (C1. Construccion de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		31/03/2018		Sí	0.25
105	EJECUCION: Pavimento flexible en un 75%, realizado (C1. Construccion de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		31/03/2018		Sí	0.25
106	EJECUCION: Contratos Complementarios, firmados	5-Entregables Intermedios	27/04/2018		27/04/2018		Sí	0.25
107	EJECUCION: Mitigación ambiental en un 85%, realizada (C1. Construccion de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		30/04/2018		Sí	0.25
108	EJECUCION: Mitigación ambiental en un 90%, realizada (C1. Construccion de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	0.25
109	EJECUCION: Mitigación ambiental en un 95%, realizada (C1. Construccion de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	0.25
110	EJECUCION: Pavimento flexible en un 10%, realizado (C1. Construccion de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	0.25
111	EJECUCION: Obras de sostenimiento en un 100% ejecutadas (C1. Construccion de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	15/07/2018		15/07/2018		Sí	0.25
112	EJECUCION: Señalización en un 100%, realizada (C1. Construccion de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	20/07/2018		20/07/2018		Sí	0.25
113	EJECUCION: Petición de Informe a la Fiscalización para procedencia de recepción	5-Entregables Intermedios	30/07/2018		30/07/2018		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	solicitada (C1. Construcción de la Obra Civil)							
114	EJECUCION: Entrega de Informe de la Fiscalización para procedencia de recepción solicitada (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	02/08/2018		02/08/2018		Sí	0.25
115	EJECUCION: Entrega de Informe de la Supervisión para procedencia de recepción solicitada (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	21/08/2018		21/08/2018		Sí	0.25
116	EJECUCION: Petición de nombramiento de comisión de recepción solicitada (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	19/09/2018		19/09/2018		Sí	0.25
117	EJECUCION: Designación de miembros de comisión de recepción solicitada (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	25/09/2018		25/09/2018		Sí	0.25
118	EJECUCION: Revisión de documentos por parte de miembros de comisión de recepción solicitada (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	20/10/2018		20/10/2018		Sí	0.25
119	EJECUCION: Elaboración del acta por parte de miembros de comisión de recepción solicitada (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	30/10/2018		30/11/2018		Sí	0.25
120	EJECUCION: Revisión final del acta por parte de miembros de comisión de recepción solicitada (C1. Construcción de la Obra Civil)	5-Entregables Intermedios	15/11/2018		15/11/2018		Sí	0.25
121	CIERRE: Acta Entrega Recepcion Provisional firmada.	5-Entregables Intermedios	22/11/2018		22/11/2018		Sí	1.0
122	EJECUCION:Mantenimiento rutinario mes de diciembre 2018 realizado (C3. Mantenimiento)	5-Entregables Intermedios	30/12/2018		30/12/2018		Sí	0.25
123	EJECUCION:Revisión del mantenimiento rutinario mes de diciembre 2018 realizado (C3. Mantenimiento)	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.25
124	EJECUCION:Mantenimiento rutinario mes de enero de 2019 realizado (C3. Mantenimiento)	5-Entregables Intermedios	30/01/2019		30/01/2019		Sí	0.25
125	EJECUCION:Revisión del mantenimiento rutinario mes de enero de 2019 realizado (C3. Mantenimiento)	5-Entregables Intermedios	31/01/2019		31/01/2019		Sí	0.25
126	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	1.0
127	EJECUCION:Mantenimiento rutinario mes de febrero de 2019 realizado (C3. Mantenimiento)	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.25
128	EJECUCION: Índice de servicio de la vía desde el 23 de Noviembre del 2018 a 28 de	5-Entregables Intermedios	01/03/2019		01/03/2019		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	febrero del 2019, completado. (C3. Mantenimiento)							
129	EJECUCION:Mantenimiento rutinario mes de marzo de 2019 realizado (C3. Mantenimiento)	5-Entregables Intermedios	30/03/2019		30/03/2019		Sí	0.25
130	EJECUCION:Revisión del mantenimiento rutinario mes de marzo de 2019 realizado. (C3. Mantenimiento)	5-Entregables Intermedios	31/03/2019		31/03/2019		Sí	0.25
131	EJECUCION:Mantenimiento rutinario mes de abril de 2019 realizado (C3. Mantenimiento)	5-Entregables Intermedios	29/04/2019		29/04/2019		Sí	0.25
132	EJECUCION:Revisión del mantenimiento rutinario mes de abril de 2019 realizado. (C3. Mantenimiento)	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.25
133	EJECUCION:Mantenimiento rutinario mes de mayo de 2019 realizado (C3. Mantenimiento)	5-Entregables Intermedios	30/05/2019		30/05/2019		Sí	0.25
134	EJECUCION:Revisión del mantenimiento rutinario mes de mayo de 2019 realizado. (C3. Mantenimiento)	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.25
135	EJECUCION: Índice de servicio de la vía desde el 01 de Marzo del 2019 al 31 de mayo del 2019, completado. (C3. Mantenimiento)	5-Entregables Intermedios	03/06/2019		03/06/2019		Sí	0.25
136	EJECUCION:Mantenimiento rutinario mes de junio de 2019 realizado (C3. Mantenimiento)	5-Entregables Intermedios	29/06/2019		29/06/2019		Sí	0.25
137	EJECUCION:Mantenimiento rutinario mes de junio de 2019 realizado (C3. Mantenimiento)	5-Entregables Intermedios	30/07/2019		30/07/2019		Sí	0.25
138	EJECUCION:Revisión del mantenimiento rutinario mes de mayo de 2019 realizado. (C3. Mantenimiento)	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.5
139	EJECUCION:Mantenimiento rutinario mes de junio de 2019 realizado (C3. Mantenimiento)	5-Entregables Intermedios	30/08/2019		30/08/2019		Sí	0.25
140	EJECUCION: Índice de servicio de la vía desde el 01 de Junio del 2019 al 31 de agosto del 2019, completado. (C3. Mantenimiento)	5-Entregables Intermedios	31/08/2019		31/08/2019		Sí	0.25
141	EJECUCION:Mantenimiento rutinario mes de junio de 2019 realizado (C3. Mantenimiento)	5-Entregables Intermedios	29/09/2019		29/09/2019		Sí	0.25
142	EJECUCION:Revisión del mantenimiento rutinario mes de mayo de 2019 realizado. (C3. Mantenimiento)	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.25
143	EJECUCION:Mantenimiento rutinario mes de junio de 2019 realizado (C3. Mantenimiento)	5-Entregables Intermedios	30/10/2019		30/10/2019		Sí	0.25
144	EJECUCION:Revisión del mantenimiento rutinario mes de mayo de 2019 realizado. (C3. Mantenimiento)	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
145	EJECUCION:Mantenimiento rutinario mes de junio de 2019 realizado (C3. Mantenimiento)	5-Entregables Intermedios	29/11/2019		29/11/2019		Sí	0.25
146	EJECUCION:Revisión del mantenimiento rutinario mes de mayo de 2019 realizado. (C3. Mantenimiento)	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	0.25
147	EJECUCION: Índice de servicio de la vía desde el 01 de Septiembre del 2019 al 30 de noviembre del 2019, completado. (C3. Mantenimiento)	5-Entregables Intermedios	02/12/2019		02/12/2019		Sí	0.25
148	EJECUCION:Mantenimiento rutinario mes de junio de 2019 realizado (C3. Mantenimiento)	5-Entregables Intermedios	30/12/2019		30/12/2019		Sí	0.25
149	EJECUCION:Revisión del mantenimiento rutinario mes de mayo de 2019 realizado. (C3. Mantenimiento)	5-Entregables Intermedios	01/01/2020		01/01/2020		Sí	0.25
150	EJECUCION: Índice de servicio de la vía desde el 01 de Diciembre del 2019 al 28 de febrero del 2020, completado. (C3. Mantenimiento)	5-Entregables Intermedios	28/02/2020		28/02/2020		Sí	0.25
151	CIERRE: Liquidación Economica aprobada.	5-Entregables Intermedios	07/08/2020		07/08/2020		Sí	0.25
152	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	5-Entregables Intermedios	08/08/2020		08/08/2020		Sí	0.25
153	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	5-Entregables Intermedios	31/01/2021		31/01/2021		Sí	1.5
154	EJECUCION: Dictamen de prioridad actualizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2021		31/03/2021		Sí	2.0
155	EJECUCION: Planilla liquidación y reajustes definitivos, pagadas.	5-Entregables Intermedios	03/04/2021		03/04/2021		Sí	0.5
156	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	5-Entregables Intermedios	15/04/2021		15/04/2021		Sí	1.5
157	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	5-Entregables Intermedios	14/05/2021		14/05/2021		Sí	1.5
158	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	5-Entregables Intermedios	18/06/2021		18/06/2021		Sí	1.5
159	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	5-Entregables Intermedios	15/07/2021		15/07/2021		Sí	1.5

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	ING. XAVIER M. ENDERICA SALGADO	Enderica Salgado, Xavier Mauricio	{PR} - Provincia - AZUAY	30/10/2017
2	Supervisión Ejecutiva Negativa	Enderica Salgado, Xavier Mauricio	{PR} - Provincia - AZUAY	29/09/2017
3	Supervisión Positiva: Estabilización de taludes, colocación de base asfáltica	Quishpi Vélez, Luis Manuel	{PR} - Provincia - CAÑAR	26/07/2017
4	Supervisión Seguimiento	Muñoz Zhunio, Maria Augusta	{PR} - Provincia - AZUAY	24/06/2017
5	Supervisión Positiva: Trabajos de limpieza y estabilización de taludes	Padrón Saeteros, Gladys Paulina	{PR} - Provincia - CAÑAR	30/04/2017
6	Supervisión avance negativa	Muñoz Zhunio, Maria Augusta	{PR} - Provincia - AZUAY	18/03/2017
7	Supervisión Positiva - Colocación de asfalto	Padrón Saeteros, Gladys Paulina	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/02/2017
8	Supervisión negativa referente al avance	Muñoz Zhunio, Maria Augusta	{PR} - Provincia - AZUAY	30/01/2017
9	Supervisión de avance	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	29/12/2016
10	Supervisión Positiva - Colocación de carpeta asfáltica y construcción de aceras y bordillos.	Padrón Saeteros, Gladys Paulina	{PR} - Provincia - CAÑAR	29/12/2016
11	Supervisión Positiva - Colocación de carpeta asfáltica y construcción de aceras y bordillos.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/11/2016
12	Supervisión Positiva - Colocación de carpeta asfáltica y construcción de aceras y bordillos.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/10/2016
13	Supervisión Positiva - Colocación de carpeta asfáltica y señalética.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/08/2016
14	Supervisión Negativa - Obra paralizada falta de presupuesto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	20/07/2016
15	Verificación de estado de la obra.	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	29/07/2016
16	Supervisión Negativa - Obra paralizada falta de presupuesto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/04/2016
17	Supervisión Negativa - Obra paralizada.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/01/2016
18	Supervisión Positiva- colocación de carpeta asfáltica	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	23/12/2015
19	Supervisión Positiva- colocación de carpeta asfáltica	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/11/2015
20	Supervisión Positiva - trabajos de colocación de pavimento rígido.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	23/09/2015
21	Supervisión positiva al Tramo 1 El Salado - Guangarcucho en la reconstrucción de la Autopista Cuenca - Azogues - Biblian	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	29/09/2015
22	Supervisión Satisfactoria a la reconstrucción de la vía	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	31/07/2015
23	Aplicación de los puentes, colocación de carpeta asfáltica.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	21/05/2015
24	Supervisión positiva al proyecto en su ejecución; en los Hitos GPR existen demoras en avances	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	30/04/2015
25	Colocación de la carpeta asfáltica	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/03/2015
26	SUPERVISION SATISFACTORIA AL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS Y A LOS AVANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	13/02/2015
27	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/01/2015
28	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/01/2015
29	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	14/11/2014
30	Supervisión al avances del proyecto	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	23/10/2014
31	Supervisión Estado de Proyecto	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	29/08/2014



**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
32	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	23/08/2014
33	Movimiento de tierras y ampliacion de la Via	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	21/07/2014
34	Avance de obras en lo que corresponde a Azuay.	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	14/04/2014
35	Movimiento de Tierras	González Zhinin, Víctor Stalin	{PR} - Provincia - CAÑAR	21/04/2014
36	Trabajos de desalojo de material y compactación	González Zhinin, Víctor Stalin	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/01/2014
37	Supervisión del Proyecto	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	24/02/2014
38	Supervisión de Proyecto.	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	22/01/2014

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	28,866,906.61
Estimado Al Fin Del Proyecto:	138,049,331.68 **
Costo Total:	136,363,130.70
Total Devengado:	137,772,079.60
% Costo Total Devengado:	101.03 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 101.03 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	120,659,275.76	1,010,148.39	0.00	121,669,424.15
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	149,238,211.21	1,010,148.39	0.00	150,248,359.60
Ppto. Codificado	142,341,544.06	1,010,148.39	0.00	143,351,692.45
Ppto. Comprometido	131,517,959.42	0.00	0.00	131,517,959.42
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	142,028,924.99	1,010,148.39	0.00	143,039,073.38
Ppto. Devengado	137,039,183.29	732,896.31	0.00	137,772,079.60
Pagado Real	121,408,891.77	0.00	0.00	121,408,891.77
Estimado a fin de año	* 137,039,183.29	0.00	0.00	137,039,183.29
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	4,989,741.70	1,010,148.39	0.00	5,999,890.09
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 96.49 %	72.55 %	0.00 %	96.32 %
Ppto. Codificado 998	28,866,785.65	0.00	0.00	28,866,785.65
Ppto. Devengado 998	28,169,005.94	0.00	0.00	28,169,005.94

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021

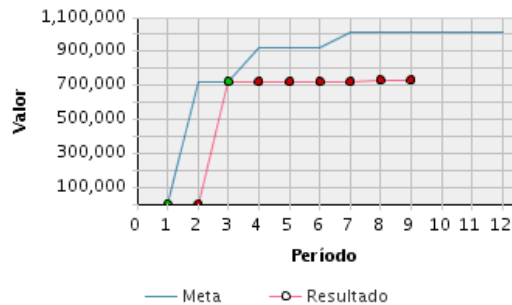

Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.00 %

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	722,641.30	0.00	722,641.30	0.00	0.00 %		0.00 %
Mar	0.00	722,641.30	722,641.30	722,641.30	100.00 %		71.54 %
Abr	195,000.00	0.00	917,641.30	722,641.30	78.75 %		71.54 %
May	0.00	0.00	917,641.30	722,641.30	78.75 %		71.54 %
Jun	0.00	0.00	917,641.30	722,641.30	78.75 %		71.54 %
Jul	92,507.09	0.00	1,010,148.39	722,641.30	71.54 %		71.54 %
Ago	0.00	10,255.01	1,010,148.39	732,896.31	72.55 %		72.55 %
Sep	0.00	0.00	1,010,148.39	732,896.31	72.55 %		72.55 %
Oct	0.00		1,010,148.39				
Nov	0.00		1,010,148.39				
Dic	0.00		1,010,148.39				
<b>Total</b>	<b>1,010,148.39</b>	<b>732,896.31</b>					

## OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
12	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
13	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
14	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
15	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1. Hito 1. Contrato Original	Contrato_original.pdf	08/07/2015
2	A2. Hito 2. Dictamen de prioridad Reconstrucción Vía Rápida Septiembre 2012	DICT_SENPLADES-SZ6A-2012-0429-OF.pdf	18/05/2017
3	A3. Hito 3. Notificación entrega anticipo	100_-DPC-MTOP-DPC_-_Entrega_de_anticipo.pdf	20/06/2019
4	A4. Hito 4. Sábana Planilla 29 Contrato Original (Se cumple 50% avance Obras Preliminares)	P29_2016_08_AGOSTO_C._ORIG.pdf	19/05/2017
5	A5. Hito 5. Sábana Planilla 18 Contrato Original (Se cumple 50% avance Estabilidad Taludes)	PLANILLA_18_compressed.pdf	20/06/2019
6	A6. Hito 6. Sábana Planilla 06 Contrato Original (Se cumple 30% avance Movimiento Tierras)	PLANILLA_06.pdf	20/06/2019
7	A7. Hito 7. Sábana Planilla 21 (Avance de 50% en Muros de Suelo Armado y Gaviones)	PLANILLA_21_compressed.pdf	20/06/2019
8	A8. Hito 8. Hito 19. Sábana Planilla 40 (Avance de 100% en Obras Preliminares; 75% Estructura pavimento existente)	PLANILLA_40.pdf	21/06/2019
9	A9 Hito 10. Sábana Planilla 44 Contrato Original (Se cumple 100% avance Estabilidad Taludes)	PLANILLA_44.pdf	20/06/2019
10	B0 Hito 11. Sábana Planilla 34 Contrato Original (Avance 75% Muros de Suelo Armado y Gavión Armado)	P34_2017_01_ENERO_C._ORIG.pdf	19/05/2017
11	B1. Hito 12. Sábana Planilla 20 Contrato Original (Se cumple 50% avance Pavimento Flexible)	PLANILLA_20_compressed.pdf	20/06/2019

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
12	B2. Hito 13. Sábana Planilla 22 Contrato Original (Se cumple 50% avance Estructure Pavimento Existente)	PLANILLA_22_compressed.pdf	21/06/2019
13	B3. Hito 14. Sábana Planilla 10 Contrato Original (Se cumple 60% avance Movimiento Tierras)	PLANILLA_10.pdf	21/06/2019
14	B4. Hito 15. Hito 16. Hito 17. Hito 26. Hito 27. Sábana Planilla 47 (Avance de 100% en Muros de Suelo Armado y Gaviones; Movimiento de Tierras; Puentes; Pavimento Flexible, Señalización)	PLANILLA_47.pdf	21/06/2019
15	B5. Hito 22. Sábana Planilla 31 (Avance de 50% en Señalización)	P31_2016_10_OCTUBRE_C._ORIG.pdf	24/06/2019
16	B6. Hito 23. Sábana Planilla 33 (Avance de 75% en Señalización)	P33_2016_12_DICIEMBRE_C._ORIG.pdf	24/06/2019
17	B7. Hito 24. Orden de cambio 1 -Via-Rapida	Orden_de_Cambio_1-Via_Rapida.pdf	22/05/2015
18	B8. Hito 24. Orden de cambio 2-Via Rapida	ORDEN_DE_CAMBIO_2_VIA_RAPIDA.pdf	22/05/2015
19	B9. Hito 24. Orden de Cambio Nro. 3	orden_de_cambio_3.pdf	19/05/2017
20	C0. Hito 24. Orden de Cambio 4	orden_de_cambio_4.pdf	19/05/2017
21	C1. Hito 24. Orden de Cambio Nro. 5	Orden_de_Cambio_Nro._5.pdf	21/06/2019
22	C2. Hito 25. Contrato Complementario 1	Contrato_Complementario-Via-Rapida.pdf	22/05/2015
23	C3. Hito 25. Contrato Complementario Nro. 2	contrato_complementario_2.pdf	19/05/2017
24	C4. Hito 25. Contrato complementario Nro. 3	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_Nro_3.pdf	04/05/2018
25	C5. Hito 25. Costo mas Porcentaje 01	Costo_mas_Porcentaje_01.pdf	28/12/2016
26	C6. Hito 25. Costo mas Porcentaje 02	Costo_mas_Porcentaje_02.pdf	28/12/2016
27	C7. Hito 28. Acta de recepción provisional	recepcion_provisional_rapida.pdf	05/12/2018
28	C8. Hito 28. Informe hecha por la Comisión con las observaciones del Proyecto.	MTOP-CONS_CAÑ-2018-171-ME.pdf	05/11/2018
29	C9. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 1	In505FISQuin1-0.pdf	18/05/2017
30	D0. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 2	In505FISQuin2-0.pdf	18/05/2017
31	D1. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 3	In505FISQuin3-0.pdf	18/05/2017
32	D2. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 4	In505FISQuin4-0.pdf	18/05/2017
33	D3. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 5	In505FISQuin5-0.pdf	18/05/2017
34	D4. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 6	In505FISQuin6-0.pdf	18/05/2017
35	D5. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 7	In505FISQuin7-0.pdf	18/05/2017
36	D6. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 8	In505FISQuin8-0.pdf	18/05/2017
37	D7. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 9	In505FISQuin9-0.pdf	18/05/2017
38	D8. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 10	In505FISQuin10-0.pdf	18/05/2017
39	D9. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 11	In505FISQuin11-0.pdf	18/05/2017
40	E0. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 12	In505FISQuin12-0.pdf	18/05/2017
41	E1. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 13	In505FISQuin13-0.pdf	18/05/2017
42	E2. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 14	In505FISQuin14-0.pdf	18/05/2017
43	E3. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 15	In505FISQuin15-0.pdf	18/05/2017
44	E4. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 16	In505FISQuin16-0.pdf	18/05/2017
45	E5. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 17	In505FISQuin17-0.pdf	18/05/2017
46	E6. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 18	In505FISQuin18-0.pdf	18/05/2017
47	E7. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 19	In505FISQuin19-0.pdf	18/05/2017
48	E8. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 20	In505FISQuin20-0.pdf	18/05/2017
49	E9. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 21	In505FISQuin21-0.pdf	18/05/2017
50	F0. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 22	In505FISQuin22-0.pdf	18/05/2017
51	F1. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro.23	In505FISQuin23-0.pdf	18/05/2017
52	F2. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 24	In505FISQuin24-0.pdf	18/05/2017
53	F3. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 25	In505FISQuin25-0.pdf	18/05/2017
54	F4. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 26	In505FISQuin26-0.pdf	18/05/2017

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
55	F5. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 27	In505FISQuin27-0.pdf	18/05/2017
56	F6. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 28	In505FISQuin28-0.pdf	18/05/2017
57	F7. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 29	In505FISQuin29-0.pdf	18/05/2017
58	F8. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 30	In505FISQuin30-0.pdf	18/05/2017
59	F9. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 31	In505FISQuin31-0.pdf	18/05/2017
60	G0. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 32	In505FISQuin32-0.pdf	18/05/2017
61	G1. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 33	In505FISQuin33-0.pdf	18/05/2017
62	G2. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 34	In505FISQuin34-0.pdf	18/05/2017
63	G3. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 35	In505FISQuin35-0.pdf	18/05/2017
64	G4. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 36	In505FISQuin36-0.pdf	18/05/2017
65	G5. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 37	In505FISQuin37-0.pdf	18/05/2017
66	G6. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 38	In505FISQuin38-0.pdf	18/05/2017
67	G7. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 39	In505FISQuin39-0.pdf	18/05/2017
68	G8. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 40	In505FISQuin40-0.pdf	18/05/2017
69	G9. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 41	In505FISQuin41-0.pdf	18/05/2017
70	H0. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 42	In505FISQuin42-0.pdf	18/05/2017
71	H1. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 43	In505FISQuin43-0.pdf	18/05/2017
72	H2. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 44	In505FISQuin44-0.pdf	18/05/2017
73	H3. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 45	In505FISQuin45-0.pdf	18/05/2017
74	H4. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 46	In505FISQuin46-0.pdf	18/05/2017
75	H5. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 47	In505FISQuin47-0.pdf	18/05/2017
76	H6. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 48	In505FISQuin48-0.pdf	18/05/2017
77	H7. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 49	In505FISQuin49-0.pdf	18/05/2017
78	H8. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 50	In505FISQuin50-0.pdf	18/05/2017
79	H9. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 51	In505FISQuin51-0.pdf	18/05/2017
80	I0. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 52	In505FISQuin52-0.pdf	18/05/2017
81	I1. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 53	In505FISQuin53-0.pdf	18/05/2017
82	I2. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 54	In505FISQuin54-0.pdf	18/05/2017
83	I3. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 55	In505FISQuin55-0.pdf	18/05/2017
84	I4. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 56	In505FISQuin56-0.pdf	18/05/2017
85	I5. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 57	In505FISQuin57-0.pdf	18/05/2017
86	I6. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 58	In505FISQuin58-0.pdf	05/07/2017
87	I7. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 59	In505FISQuin59-0.pdf	05/07/2017
88	I8. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 60	In505FISQuin60-0.pdf	05/07/2017
89	I9. Hito 29. Informe Qincenal de Fiscalización	In505FISQuin63-0.pdf	05/08/2017
90	J0. Hito 29. Informe Qincenal de Fiscalización agosto 2017	In505FISQuin65-0.pdf	05/09/2017
91	J1. Hito 29. Informe Fiscalización Nro. 67 septiembre de 2017	In505FISQuin67-0.pdf	05/10/2017
92	J2. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 68	In505FISQuin68-0.pdf	05/12/2017
93	J3. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 69	informe_quincenal_69.pdf	01/11/2017
94	J4. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 70	In505FISQuin70-0.pdf	05/12/2017
95	J5. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 72	In505FISQuin72-0.pdf	05/01/2018
96	J6. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 73	In505FISQuin73-0.pdf	05/04/2018
97	J7. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 74	In505FISQuin74-0.pdf	05/04/2018
98	J8. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 75	In505FISQuin75-0.pdf	05/04/2018
99	J9. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 76	In505FISQuin76-0.pdf	05/04/2018
100	K0. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 77	In505FISQuin77-0.pdf	05/04/2018
101	K1. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 78	In505FISQuin78-0.pdf	05/04/2018

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
102	K2. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 79	In505FISQuin79-0.pdf	05/04/2018
103	K3. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 80	In505FISQuin80-0.pdf	05/07/2018
104	K4. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 81	In505FISQuin81-0.pdf	05/07/2018
105	K5. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 82	In505FISQuin82-0.pdf	05/07/2018
106	K6. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 83	In505FISQuin83-0.pdf	05/07/2018
107	K7. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 84	In505FISQuin84-0.pdf	05/07/2018
108	K8. Hito 29. Informe de Fiscalización Nro. 85	In505FISQuin85-0.pdf	05/07/2018
109	K9. Hito 29. Liquidacion económica Fiscalización.	Liquidacion_Fiscalizacion1.pdf	05/09/2018
110	L0. Hito 29. Ratificación de liquidación económica Fiscalización	Ratificacion_liq_Fisc.pdf	05/09/2018
111	L1. Hito 30. Designación Supervisor y Fiscalizador de la etapa de mantenimiento.	MTOP-SUBZ6-2018-1854-ME_(Designación_por_parte_de_Subsecretaria).pdf	03/01/2019
112	L2. Hito 30. Índice de servicio en el periodo noviembre 2018 a febrero 2019. Etapa de mantenimiento	INDICE_SERVICIO_NOV_18_-_FEB_19.pdf	25/06/2019
113	L3. Hito 31. Índice de servicio en el periodo Marzo 19 a Mayo 19. Etapa de Mantenimiento	Indice_de_servicio_MAR_19_-_MAY_19.pdf	25/06/2019
114	L4. Hito 32. Índice de servicio en el periodo Junio 19 a Agosto 19. Etapa de Mantenimiento	INDICE_SERVICIO_JUN_19_-_AGO_19.pdf	02/10/2019
115	L5. Hito 33. Actualización de Dictamen de Prioridad Septiembre 2014	ACT_DICT_SENPLADES-SZ6A-2014-0439-OF.pdf	18/05/2017
116	L6. Hito 33. Actualización de Dictamen de Prioridad Septiembre 2014 anexo	ANEXO_SENPLADES-SZ6A-2014-0439-OF.pdf	18/05/2017
117	L7. Hito 33. Actualización de prioridad proyecto	ACT_DIC_SENPLADES-SZ6A-2014-0065-OF.pdf	18/05/2017
118	L8. Hito 33. Dictamen Favorable febrero 2013	DIC_FAV_SENPLADES-SGPBV-2013-0141-OF.pdf	18/05/2017
119	L9. Hito 33. PROYECTO DE SEMPLADES	A4.docx	26/12/2013
120	M0. Hito 33. OFICIO-DICTAMEN-PRIORIDAD-SEMPLEDES	ACT_DICT_SENPLADES-SZ6A-2014-0439-OF-DICTAMEN-PRIORIDAD-VIA_RAPIDA.pdf	08/08/2015
121	M1. Hito 33. Documento SENPLADES OCT-19	FORMATO_SENPLADES_01-10-2019_(VIA_RAPIDA).pdf	03/12/2019
122	M2. Acción 1. Problema 2 (Talud 5+500)	Informe_Problema_1_(Talud_5+500).pdf	06/01/2020
123	M3. Acción 1. Problema 3 (Talud 1+650)	Informe_problema_2_(Talud_1+650).pdf	06/01/2020
124	M4. Hito 34. Índice de servicio en el periodo Septiembre 19 a Noviembre 19. Etapa de Mantenimiento	INDICE_SERVICIO_SEP_19_-_NOV_19.pdf	07/01/2020
125	M5. FORMATO SENPLADES MARZO 2020	FORMATO_SENPLADES_16-03-2020_VIA_RAPIDA.pdf	06/04/2020
126	M6 Hito 37 Acta de recepción definitiva PART. 1	ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_P-C-A-B.part1.rar	03/09/2020
127	M6. Hito 37 Acta de recepción definitiva PART. 2	ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_P-C-A-B.part2.rar	03/09/2020
128	M6. Hito 37. Acta de recepción definitiva PART. 3	ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA_P-C-A-B.part3.rar	03/09/2020
129	M7. EJECUCION PRESUPUESTARIA ENE - AGO 2020	EJECUCION_PRESUP_ENE_-_AGO_2020.pdf	20/10/2020
130	M8. Acción 1. Problema 4	Problema_4_acción_1.pdf	22/12/2020
131	M9. Acción 1. Problema 5	Problema_5_acción_1..pdf	22/12/2020
132	N0 Riesgo 3. Acción 1	Riesgo_3_acción_1..pdf	31/12/2020
133	N1 FORMATO SENPLADES DICIEMBRE 2020	formato_Senplades_vía_Rápida_(Dic-20)_compressed.pdf	12/01/2021
134	N2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEP - DIC 2020	EJECUCION_PRESUPUESTARIA_SEP-DIC_2020_VIA_RAPIDA.pdf	13/01/2021
135	PLANILLAS H&H	PLANILLA_VIA_RAPIDA_CUENCA_AZOGUES.rar	30/12/2016

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	Titular	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Cañar	gizquierdo@mtop.gob.ec	

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Jaramillo Martinez, David Andres	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretario Zonal 6	djaramillo@mtop.gob.ec	
Soto Romero, José Gerardo	Lider de Proyecto	Analista de Infraestructura Provincial 2	jsoto@mtop.gob.ec	023974600
Torres Jara, Julia Brumilda	Coordinador Administrativa Financiera	Analista Administrativa Financiero	jtorres@mtop.gob.ec	072240227 ext 62814

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
73104_1.jpg	05/04/2018
