

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 2**  
**Dirección Provincial Napo**

**PROYECTO: K046** MTOP - Construcción de los Puentes Sardinas Chico, Sardinas Grande, Santa Rosa, Salado y Malo, Accesos carretera Baeza lago Agrío

Líder del Proyecto:	Villacis Miranda, Rolando Alberto (ravillacis@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Zambrano Vacacela, José Gabriel	Programas Relacionados:	
Titular:	Coello Lopez, German Vinicio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.766.3684	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	02/08/2009 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	03/05/2021	Fecha de Fin Base:	31/12/2019
Modificado por:	Villacis Miranda, Rolando Alberto	Fecha del siguiente Hito:	

**DATOS GENERALES**

Descripción
<p><b>DESCRIPCIÓN:</b></p> <p>La construcción del Puente sobre el Río Jatuntinagua de 28.00 metros de longitud, ubicado en la carretera Papallacta - Baeza, Provincia de Napo. Se realizó con la finalidad de mejorar la calidad de vida de un sector importante de la población asentada a lo largo de la vía por lo que es imprescindible contar con la construcción del puente que mejore y amplíe la circulación vehicular de dicha carretera y que cumpla con las normas vigentes de diseño.</p> <p>Contratista: Compañía Obras Civiles I&amp;G Cia. Ltda.  Fiscalizador: MTOP NAPO  Monto Construcción: \$ 535.0906,98  Monto total: \$659.291,81</p> <p><b>LINEA BASE DEL PROYECTO:</b>  La capacidad de carga del Puente sobre el río Jatuntinagua de 30 toneladas.  La estructura del Puente Jatuntinagua es de Hormigón Armado de 12.38 m de ancho, doble carril.  El tiempo de viaje desde Tena - Baeza es de 1.30 horas</p> <p><b>OBJETIVO GENERAL:</b>  La construcción del Puente Jatuntinagua de una longitud de 28 m, ubicado en la provincia de Napo, con un ancho de 12.38 metros mejorará las condiciones de transitabilidad permanente.</p> <p><b>PRODUCTO:</b>  Mejorar y ampliar la circulación vehicular de dicha carretera y que cumpla con las normas vigentes de diseño para tener una vía estable, eficaz, confiable y permanente, capaz de resistir los embates de la naturaleza ante la eventualidad de fenómenos cíclicos como el Niño, que permita seguridad en el viaje desde Quito hasta Baeza.</p> <p><b>ESTRATEGIA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Supervisión técnica permanente</li> <li>Disponibilidad de cupo presupuestario</li> <li>Pago oportuno de planilla</li> <li>Seguimiento al plan de obra</li> <li>Aseguramiento del control de calidad</li> </ol> <p><b>Beneficios Cualitativos</b></p> <p>Se disminuirá el riesgo de accidente por el paso vehicular sobre los puentes provisionales que ya cumplieron su tiempo de servicio. La calidad de la infraestructura vial mejorará el servicio a la circulación vehicular.</p>

**Beneficios Cualitativos**

Influirá en beneficio del desarrollo de las comunidades del sector al acortar los tiempos de movilización de mercadería, personal, turismo y comercio.

**Tipo de Beneficiario**

Sector petrolero.  
Turístico  
Población de la Región

**Restricciones**

**TIEMPO:** La entrega de la obra según cronograma, plazo 7 meses para culminación del contrato y 5 meses de ampliación de plazo. Siendo el inicio de la obra el 02 de agosto de 2009 hasta el 03 de agosto de 2010. El proyecto se lo manejaba en Planta Cental del MTOP, pero debido a que existe un convenio de pago se lo va a tramitar en la Dirección Distrital de Napo.

**RECURSOS:** La mano de obra calificada requerida para la Ejecución del Proyecto considerando la experiencia que cada uno de los miembros del personal técnico mínimo deberá acreditar como mínimo, ya sea en años, número o monto de proyectos en los que haya participado.


Los Equipos y Materiales utilizados son de excelente calidad y rendimiento con el fin de desarrollar de manera afectiva y en el plazo estimado sumando al desarrollo del País con obras emblemáticas.

**ALCANCE:** Las especificaciones técnicas que regirán cada uno de los Proyectos contratados por medio del MTOP Napo serán las "Especificaciones generales para la ejecución de puentes y caminos MOP-001-F 2002", del MTOP del Ecuador.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado **Congelado** Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
Fecha de Inicio: 02/08/2009      Fecha de Fin: 31/12/2021

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

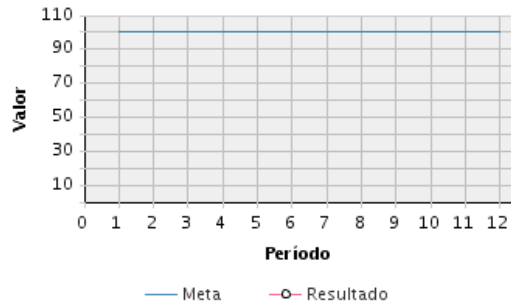

**Porcentaje de Avance**

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2021 un valor que asciende a USD. 64.202,36 monto incluye IVA, Requerimiento de documentos habilitantes y suscripción de convenio de Pago "trabajos extracontractuales realizados en los accesos del puente Sobre el rio Jatuntinagua" Con memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2019-0138-O de fecha 16712/2019. esta incluido en el POA 2020.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	03/05/2021 - 05:17 PM
ABRIL 2021 un valor que asciende a USD. 64.202,36 monto incluye IVA, Requerimiento de documentos habilitantes y suscripción de convenio de Pago "trabajos extracontractuales realizados en los accesos del puente Sobre el rio Jatuntinagua" Con memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2019-0138-O de fecha 16712/2019. esta incluido en el POA 2020.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	03/05/2021 - 05:17 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MARZO 2021 un valor que asciende a USD. 64.202,36 monto incluye IVA, Requerimiento de documentos habilitantes y suscripción de convenio de Pago "trabajos extracontractuales realizados en los accesos del puente Sobre el rio Jatuntinagua" Con memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2019-0138-O de fecha 16712/2019. esta incluido en el POA 2020.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	05/04/2021 - 04:36 PM
FEBRERO 2021 un valor que asciende a USD. 64.202,36 monto incluye IVA, Requerimiento de documentos habilitantes y suscripción de convenio de Pago "trabajos extracontractuales realizados en los accesos del puente Sobre el rio Jatuntinagua" Con memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2019-0138-O de fecha 16712/2019. esta incluido en el POA 2020.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	05/03/2021 - 04:39 PM
ENERO 2021 un valor que asciende a USD. 64.202,36 monto incluye IVA, Requerimiento de documentos habilitantes y suscripción de convenio de Pago "trabajos extracontractuales realizados en los accesos del puente Sobre el rio Jatuntinagua" Con memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2019-0138-O de fecha 16712/2019. esta incluido en el POA 2020.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	03/02/2021 - 06:14 PM
DICIEMBRE 2020 un valor que asciende a USD. 64.202,36 monto incluye IVA, Requerimiento de documentos habilitantes y suscripción de convenio de Pago "trabajos extracontractuales realizados en los accesos del puente Sobre el rio Jatuntinagua" Con memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2019-0138-O de fecha 16712/2019. esta incluido en el POA 2020.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	04/01/2021 - 04:52 PM
NOVIEMBRE 2020 un valor que asciende a USD. 64.202,36 monto incluye IVA, Requerimiento de documentos habilitantes y suscripción de convenio de Pago "trabajos extracontractuales realizados en los accesos del puente Sobre el rio Jatuntinagua" Con memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2019-0138-O de fecha 16712/2019. esta incluido en el POA 2020.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	07/12/2020 - 08:24 AM
OCTUBRE 2020 un valor que asciende a USD. 64.202,36 monto incluye IVA, Requerimiento de documentos habilitantes y suscripción de convenio de Pago "trabajos extracontractuales realizados en los accesos del puente Sobre el rio Jatuntinagua" Con memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2019-0138-O de fecha 16712/2019. esta incluido en el POA 2020.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	04/11/2020 - 04:09 PM
SEPTIEMBRE 2020 un valor que asciende a USD. 64.202,36 monto incluye IVA, Requerimiento de documentos habilitantes y suscripción de convenio de Pago "trabajos extracontractuales realizados en los accesos del puente Sobre el rio Jatuntinagua" Con memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2019-0138-O de fecha 16712/2019. esta incluido en el POA 2020.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	05/10/2020 - 09:36 AM
AGOSTO 2020 un valor que asciende a USD. 64.202,36 monto incluye IVA, Requerimiento de documentos habilitantes y suscripción de convenio de Pago "trabajos extracontractuales realizados en los accesos del puente Sobre el rio Jatuntinagua" Con memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2019-0138-O de fecha 16712/2019. esta incluido en el POA 2020.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	04/09/2020 - 08:36 PM
JULIO 2020 un valor que asciende a USD. 64.202,36 monto incluye IVA, Requerimiento de documentos habilitantes y suscripción de convenio de Pago "trabajos extracontractuales realizados en los accesos del puente Sobre el rio Jatuntinagua" Con memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2019-0138-O de fecha 16712/2019. esta incluido en el POA 2020.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	03/08/2020 - 12:06 PM
JUNIO 2020 un valor que asciende a USD. 64.202,36 monto incluye IVA, Requerimiento de documentos habilitantes y suscripción de convenio de Pago "trabajos extracontractuales realizados en los accesos del puente Sobre el rio Jatuntinagua" Con memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2019-0138-O de fecha 16712/2019. esta incluido en el POA 2020.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	02/07/2020 - 12:52 AM
MAYO 2020 un valor que asciende a USD. 64.202,36 monto incluye IVA, Requerimiento de documentos habilitantes y suscripción de convenio de Pago "trabajos extracontractuales realizados en los accesos del puente Sobre el rio Jatuntinagua" Con memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2019-0138-O de fecha 16712/2019. esta incluido en el POA 2020.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	05/06/2020 - 11:46 PM
ABRIL 2020 un valor que asciende a USD. 64.202,36 monto incluye IVA, Requerimiento de documentos habilitantes y suscripción de convenio de Pago "trabajos extracontractuales realizados en los accesos del puente Sobre el rio Jatuntinagua" Con memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2019-0138-O de fecha 16712/2019. esta incluido en el POA 2020.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	04/05/2020 - 10:56 PM
MARZO 2020 un valor que asciende a USD. 64.202,36 monto incluye IVA, Requerimiento de documentos habilitantes y suscripción de convenio de Pago "trabajos extracontractuales realizados en los accesos del puente Sobre el rio Jatuntinagua" Con memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2019-0138-O de fecha 16712/2019. esta incluido en el POA 2020.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	03/04/2020 - 10:19 PM
FEBRERO 2020 un valor que asciende a USD. 64.202,36 monto incluye IVA, Requerimiento de documentos habilitantes y suscripción de convenio de Pago "trabajos extracontractuales realizados en los accesos del puente Sobre el rio Jatuntinagua" Con memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2019-0138-O de fecha 16712/2019.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	05/03/2020 - 08:46 PM
ENERO 2020: Se ha firmado el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 27 de septiembre de 2010; se ha firmado el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 23 de agosto de 2011. Se adeuda una planilla por un valor que asciende a USD. 64.202,36 monto incluye IVA, Requerimiento de documentos habilitantes y suscripción de convenio de Pago	Villacis Miranda, Rolando Alberto	05/02/2020 - 03:34 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
"trabajos extracontractuales realizados en los accesos del puente Sobre el rio Jatuntinagua" Con memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2019-0138-O de fecha 16712/2019.		
DICIEMBRE 2019: Se ha firmado el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 27 de septiembre de 2010; se ha firmado el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 23 de agosto de 2011. Se adeuda una planilla por un valor que asciende a USD. 64.202,36 monto incluye IVA.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	04/01/2020 - 11:59 AM
NOVIEMBRE 2019: Se ha firmado el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 27 de septiembre de 2010; se ha firmado el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 23 de agosto de 2011. Se adeuda una planilla por un valor que asciende a USD. 64.202,36 monto incluye IVA.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	04/12/2019 - 03:55 PM
OCTUBRE 2019: Se ha firmado el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 27 de septiembre de 2010; se ha firmado el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 23 de agosto de 2011. Se adeuda una planilla por un valor que asciende a USD. 64.202,36 monto incluye IVA.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	05/11/2019 - 03:41 PM
SEPTIEMBRE 2019: Se ha firmado el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 27 de septiembre de 2010; se ha firmado el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 23 de agosto de 2011. Se adeuda una planilla por un valor que asciende a USD. 64.202,36 monto incluye IVA.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	03/10/2019 - 05:21 PM
ENERO 2019: Se ha firmado el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 27 de septiembre de 2010; se ha firmado el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 23 de agosto de 2011. Se adeuda una planilla por un valor que asciende a USD. 64202,36 monto incluye IVA.	Villacis Miranda, Rolando Alberto	01/10/2019 - 12:03 PM
AGOSTO 2019: Se ha firmado el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 27 de septiembre de 2010; se ha firmado el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 23 de agosto de 2011. Se adeuda una planilla por un valor que asciende a USD. 64.202,36 monto incluye IVA.	Calero Cordonez, Olga Margarita	04/09/2019 - 06:30 PM
JULIO 2019: Se ha firmado el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 27 de septiembre de 2010; se ha firmado el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 23 de agosto de 2011. Se adeuda una planilla por un valor que asciende a USD. 64.202,36 monto incluye IVA.	Espin Poaquiza, Tannia Maribel	05/08/2019 - 03:26 PM
JUNIO 2019: Se ha firmado el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 27 de septiembre de 2010; se ha firmado el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 23 de agosto de 2011. Se adeuda una planilla por un valor que asciende a USD. 64.202,36 monto incluye IVA.	Espin Poaquiza, Tannia Maribel	04/07/2019 - 05:05 PM
MAYO 2019: Se ha firmado el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 27 de septiembre de 2010; se ha firmado el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 23 de agosto de 2011. Se adeuda una planilla por un valor que asciende a USD. 64.202,36 monto incluye IVA.	Espin Poaquiza, Tannia Maribel	03/06/2019 - 12:21 PM
ABRIL 2019: Se ha firmado el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 27 de septiembre de 2010; se ha firmado el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 23 de agosto de 2011. Se adeuda una planilla por un valor que asciende a USD. 64.202,36 monto incluye IVA.	Espin Poaquiza, Tannia Maribel	02/05/2019 - 08:30 AM
MARZO 2019: Se ha firmado el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 27 de septiembre de 2010; se ha firmado el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 23 de agosto de 2011. Se adeuda una planilla por un valor que asciende a USD. 64.202,36 monto incluye IVA.	Espin Poaquiza, Tannia Maribel	03/04/2019 - 01:59 PM
FEBRERO 2019: Se ha firmado el Acta de Entrega Recepción Provisional con fecha 27 de septiembre de 2010; se ha firmado el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 23 de agosto de 2011. Se adeuda una planilla por un valor que asciende a USD. 64202,36 monto incluye IVA.	Espin Poaquiza, Tannia Maribel	01/03/2019 - 04:00 PM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Quijos

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	9-Entregables Formales	30/08/2010		30/08/2010		Sí	1.0
2	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional (AÑO 2010) suscrita	9-Entregables Formales	27/09/2010		27/09/2010		Sí	1.0
3	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva (AÑO 2011) suscrita	9-Entregables Formales	23/08/2011		23/08/2011		Sí	1.0
4	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado.	1-Solicitud de Información	15/08/2018		15/08/2018		Sí	10.0
5	PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida.	5-Entregables Intermedios	09/11/2018		09/11/2018		Sí	5.0
6	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	1-Solicitud de Información	09/11/2018		09/11/2018		Sí	3.0
7	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	1-Solicitud de Información	09/11/2018		09/11/2018		Sí	2.0
8	EJECUCIÓN: Contrato Principal (AÑO 2009) suscrito	5-Entregables Intermedios	03/12/2018		03/12/2018		Sí	24.0
9	EJECUCIÓN: Programación presupuestaria aprobada 2019	1-Solicitud de Información	07/01/2019		07/01/2019		Sí	34.0
10	EJECUCIÓN: Programación presupuestaria aprobada 2020	9-Entregables Formales	31/01/2020		31/01/2020		Sí	10.0
11	CIERRE: Aval aprobado	1-Solicitud de Información	15/04/2020		15/04/2020		Sí	1.0
12	CIERRE: Certificación presupuestaria aprobada	5-Entregables Intermedios	17/04/2020		17/04/2020		Sí	1.0
13	CIERRE: Convenio de Pago de arrastre suscrito	5-Entregables Intermedios	22/06/2020		22/06/2020		Sí	2.0
14	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	5-Entregables Intermedios	31/07/2020		31/07/2020		Sí	1.0
15	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	9-Entregables Formales	31/08/2020		31/08/2020		Sí	1.0
16	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	5-Entregables Intermedios	31/08/2020		31/08/2020		Sí	1.0
17	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	31/12/2020		31/12/2020		Sí	1.0
18	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	31/12/2020		31/12/2020		Sí	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						




## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

### COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	64,202.37
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

### % COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

### Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	128,404.72	0.00	0.00	128,404.72
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	111,979.13	0.00	0.00	111,979.13
Ppto. Codificado	128,404.74	0.00	0.00	128,404.74
Ppto. Comprometido	128,404.73	0.00	0.00	128,404.73
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	128,404.74	0.00	0.00	128,404.74
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	128,404.74	0.00	0.00	128,404.74
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

### OBJETIVOS ALINEADOS

#### Objetivos Operativos

13	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
----	--

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1. Proyecto en SIPeIP postulado (MTOPI-SUBZ2-2018-1197-M)	Proyecto_en_SIPeIP_postulado_(MTOPI-SUBZ2-2018-1197-M).pdf	23/01/2019
2	A.2. Priorización SENPLADES emitida (MTOPI-CGP-2018-1492-ME)	Priorización_SENPLADES_emitida_(MTOPI-CGP-2018-1492-ME).pdf	23/01/2019
3	A.3. Proyecto con recursos económicos asignados (MTOPI-CGP-2018-1492-ME)	Proyecto_con_recursos_economicos_asignados_(MTOPI-CGP-2018-1492-ME).pdf	23/01/2019
4	A.4. Proyecto en PAI incluido (MTOPI-CGP-2018-1492-ME)	Proyecto_en_PAI_incluido_(MTOPI-CGP-2018-1492-ME).pdf	23/01/2019
5	A.5. CONTRATO (AÑO 2009)	CONTRATO_(AÑO_2009).pdf	25/01/2019

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
6	A.6. Programación presupuestaria aprobada (MTOPI-SUBZ2-2019-0017-M)	Programación_presupuestaria_aprobada_(MTOPI-SUBZ2-2019-0017-M).pdf	23/01/2019
7	A.7. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL (AÑO 2010)	ACTA_DE_ENTREGA_RECEPCIÓN_PROVISIONAL_(AÑO_2010).pdf	25/01/2019
8	A.8. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA (AÑO 2011)	ACTA_DE_ENTREGA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA_(AÑO_2011).pdf	25/01/2019
9	A9.CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2019 NAPO	C1.CEDULA_PRESUPUESTARIA_ENERO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
10	B1.CEDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2019 NAPO	C2.CEDULA_PRESUPUESTARIA_FEBRERO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
11	B2.CEDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2019 NAPO	C3.CEDULA_PRESUPUESTARIA_MARZO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
12	B3.CEDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2019 NAPO	C4.CEDULA_PRESUPUESTARIA_ABRIL_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
13	B4.CEDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2019 NAPO	C5.CEDULA_PRESUPUESTARIA_MAYO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
14	B5.CEDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2019 NAPO	C6.CEDULA_PRESUPUESTARIA_JUNIO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
15	B6.CEDULA PRESUPUESTARIA JULIO 2019 NAPO	C7.CEDULA_PRESUPUESTARIA_JULIO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
16	B7.CEDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2019 NAPO	C8.CEDULA_PRESUPUESTARIA_AGOSTO_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
17	B8.CEDULA PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2019 NAPO	C9.CEDULA_PRESUPUESTARIA_SEPTIEMBRE_2019_NAPO.pdf	03/10/2019
18	B9.CEDULA PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2019 NAPO	C10.CEDULA_PRESUPUESTARIA_OCTUBRE_2019_NAPO.pdf	05/11/2019
19	C1. COSTO TOTAL K046	COSTO_TOTAL_K046.pdf	27/11/2019
20	C2.CEDULA PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 2019 NAPO	D1.CEDULA_PRESUPUESTARIA_NOVIEMBRE_2019_NAPO.pdf	04/12/2019
21	C3.CEDULA PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2019 NAPO	D2.CEDULA_PRESUPUESTARIA_DICIEMBRE_2019_NAPO.pdf	06/01/2020
22	C4.SOLICITUD DE DOCUMENTACION (MTOPI-SUBZ2-2019-0138-O)	D3.R1.SOLICITUD_DE_DOCUMENTACION_(MTOPI-SUBZ2-2019-0138-O).pdf	10/01/2020
23	C5.TRÁMITE CONVENIO DE PAGO (MTOPI-SUBZ2-2019-1752-M)	D4.P1.REVISIÓN_DOCUMENTACIÓN_(MTOPI-SUBZ2-2019-1752-M).pdf	10/01/2020
24	C6.CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2020 NAPO	D.5.cedula_presupuestaria_enero_2020_napo.pdf	05/02/2020
25	C7. CEDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2020 NAPO	L7.CEDULA_PRESUPUESTARIA_FEBRERO_2020_NAPO.pdf	05/03/2020
26	C8. Cédula presupuestaria marzo 2020 Napo.	C8._Cédula_presupuestaria_marzo_2020_napo.pdf	03/04/2020
27	C9. Devengado Abril 2020	cedula_presupuestaria_puente_sardinas_chico...abril_2020.pdf	05/05/2020
28	D1. Cédula presupuestaria puente sardinas chico...mayo 2020	D1.Cédula_presupuestaria_puente_sardinas_chico...mayo_2020.pdf	05/06/2020
29	D2.cédula presupuestaria puente sardinas chico...junio 2020	D2.cédula_presupuestaria_puente_sardinas_chico...junio_2020.pdf	07/07/2020
30	D4. cédula presuuestaria Puente Sardinas Chico julio 2020.	D4.Cédula_presupuestaria_puente_sardinas_chico...julio_2020.pdf	08/08/2020
31	D5.Cédula presupuestaria Sardinas Chico Agosto 2020	D5.Cédula_presupuestaria_Sardinas_Chico_Agosto_2020.pdf	04/09/2020
32	D6.Cédula presupuestaria Sardinas Chico Año 2009	D6.Cédula_presupuestaria_Sardinas_Chico_Año_2009.pdf	04/09/2020
33	D7.Cédula presupuestaria Sardinas Chico Año 2010	D7.Cédula_presupuestaria_Sardinas_Chico_Año_2010.pdf	04/09/2020
34	D8.Cédula presupuestaria Sardinas Chico Año 2011	D8.Cédula_presupuestaria_Sardinas_Chico_Año_2011.pdf	04/09/2020
35	D9.Cédula presupuestaria Sardinas Chico Año 2012	D9.Cédula_presupuestaria_Sardinas_Chico_Año_2012.pdf	04/09/2020
36	E1.Cédula presupuestaria Sardinas Chico Año 2013	E1.Cédula_presupuestaria_Sardinas_Chico_Año_2013.pdf	04/09/2020
37	E2.Cédula presupuestaria Sardinas Chico Año 2014	E2.Cédula_presupuestaria_Sardinas_Chico_Año_2014.pdf	04/09/2020
38	E3.Cédula presupuestaria Sardinas Chico Año 2015	E3.Cédula_presupuestaria_Sardinas_Chico_Año_2015.pdf	04/09/2020
39	E4.Cédula presupuestaria Sardinas Chico Año 2016	E4.Cédula_presupuestaria_Sardinas_Chico_Año_2016.pdf	04/09/2020
40	E5Cédula presupuestaria Sardinas Chico Año 2017	E5.Cédula_presupuestaria_Sardinas_Chico_Año_2017.pdf	04/09/2020
41	E7.Cédula presupuestaria Sardinas Chico Año 2019	E7.Cédula_presupuestaria_Sardinas_Chico_Año_2019.pdf	04/09/2020
42	E8.Cédula presupuestaria Sardinas Chico Año 2018	E6.Cédula_presupuestaria_Sardinas_Chico_Año_2018.pdf	04/09/2020
43	E8.Cédula presupuestaria Sardinas Chico Año 2020	E8.Cédula_presupuestaria_Sardinas_Chico_2020.pdf	04/09/2020



### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
44	E9. cédula presupuestaria puente sardinas chico...sept 2020	E9._cédula_presupuestaria_puente_sardinas_chico...sept_2020.pdf	20/11/2020
45	F1.cédula presupuestaria puente sardinas chico...octubre 2020	F1.cédula_presupuestaria_puente_sardinas_chico...octubre_2020.pdf	20/11/2020
46	F2.cédula presupuestaria Sardinas Chico Noviembre 2020	F2.cédula_presupuestaria_Sardinas_Chico_Noviembre_2020.pdf	07/12/2020
47	F3. MTOP-SUBZ2-2020-1803-M Solicitud de Pago	F3._MTOP-SUBZ2-2020-1803-M_SOLICITUD_DE_PAGO.pdf	29/12/2020
48	F4. Cédula presupuestaria puente sardinas chico...diciembre 2020.	F4._Cédula_presupuestaria_puente_sardinas_chico...diciembre_2020.pdf	04/12/2020
49	F5. Cambio de fase a Congelado_23-02-2021	MTOP-CGP-2021-148-ME_Proyectos_SZ2_2021_cambio_de_fase_a_congelado_23-02-2021-fusionado.pdf	23/02/2021
50	F6. cÉDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2021	F6._Cédula_presupuestaria_enero-marzo_2021_Napo..pdf	05/04/2021
51	G1. Cédula presupuestaria enero-abril 2021 Napo	G1._Cédula_presupuestaria_enero-abril_2021_Napo.pdf	03/05/2021

### EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Pita Suárez, Esteban Alejandro	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Napo	Subsecretario Zonal 2, Encargado	epita@mtop.gob.ec	Ext: 23901
Velastegui Nagua, Jefferson Fabricio	Financiera (Encargada)	Analista Administrativo Financiero, Encargado	jvelastegui@mtop.gob.ec	0992900275
Villacis Miranda, Rolando Alberto	Supervisor	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Napo, Encargado	ravillacis@mtop.gob.ec	0995564279
Zambrano Vacacela, José Gabriel	Subsecretario Zonal 2	Subsecretario Zonal 2	jzambrano@mtop.gob.ec	0999886130

### FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
132162_1.jpg	25/01/2019
