

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 1
Dirección Provincial Sucumbíos

PROYECTO: K035 MTOP-Contrato de Estudios de Factibilidad, impactos ambientales e ingeniería definitivos del Anillo Vial de Lago Agrio, L = 35KM- Provincia de Sucumbios

Líder del Proyecto:	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo (aarizaga@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Benavides Morillo, Omar Alexander	Programas Relacionados:	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LAGO AGRIO CON UNA LON, Provincia - Sucumbíos, Proyectos Prioritarios PAI, STPE - Inversión en 40km de frontera norte
Titular:	Villacres Angulo, Oscar Ivan	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.860.6943	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,262,213.10
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	19/04/2012 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	19/01/2022	Fecha de Fin Base:	22/09/2013
Modificado por:	Cardenas Alvarracín, Marcela Edith	Fecha del siguiente Hito:	29/12/2017

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN:

Estudios de Factibilidad, impactos ambientales e ingeniería definitivos del Anillo Vial de Lago Agrio, L = 35KM- Provincia de Sucumbios

PRODUCTO / SERVICIO:

El producto esperado, es el informe de factibilidad para la reconstrucción y mejoramiento Vial de la provincia Sucumbios.

LÍNEA BASE:

La línea base para los estudios, se considera siempre a partir de cero, conforme a los trabajos realizados se va incrementando hasta llegar a cien, incluida la aprobación de los informes.

OBJETIVO GENERAL:

Mantener la Red Vial Estatal Provincial en las condiciones adecuadas para el tránsito vehicular.

OBJETIVO ESPECIFICO:

Disminuir el riesgo de accidentes de tránsito

Incrementar el nivel de servicio en las carreteras de la Red Vial estatal de la Provincia de Sucumbios

Contratista: Asociación ACE

Valor contractual:

1222461.86

Beneficios Cualitativos

Trazar una ruta alterna para eliminar la congestión vehicular en el centro de la ciudad de Lago Agrio.

SE EJECUTAN LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LAGO AGRIO, OBRA QUE SE REALIZARÁ CON EL PROPOSITO DE DESCONCENTRAR EL TRANSITO VEHICULAR QUE INGRESA HACIA LA CIUDAD DE LAGO AGRIO Y SE DERIVA HACIA VARIOS SECTORES DE LA AMAZONIA COMO SON CHIRITZA, CUYABENO, PUERTO EL CARMEN Y HACIA COLOMBIA EN EL LADO NOROCCIDENTAL Y HACIA SHUSHUFINDI, LA JOYA DE LOS SACHAS Y EL COCA EN EL LADO SUR ORIENTAL DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, ESTA VIA TIENE CONDICIONES DE AUTOVIA DE MEDIANA CAPACIDAD, INCLUYE UNA SECCION TRANSVERSAL DE CUATRO CARRILES DE CIRCULACION, DOS POR SENTIDO, SEPARADOS POR UN PARTERRE CENTRAL,

Beneficios Cualitativos

SE INCLUYE ADEMÁS 10 PUENTES VEHICULARES Y VARIAS INTERSECCIONES A NIVEL EN SITIOS IMPORTANTES DE LA TRAMA VIAL DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. ESTA OBRA BENEFICIARA A TODA LA POBLACION DEL CANTON LAGO AGRIO E INDIRECTAMENTE BENEFICIA A TODA LA PROVINCIA DE SUCUMBOS. LA LONGITUD ESTIMADA DEL ANILLO PERIMETRAL ES DE 44 KM. EL CONTRATISTA AL MOMENTO ESTÁ TERMINANDO LOS TRABAJOS DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO QUE TIENE RELACIÓN AL ESTUDIOS DE PUENTES Y DE IMPACTOS AMBIENTALES.

Tipo de Beneficiario

El sector Transportista, petrolero, turístico de la provincia de Sucumbios


Restricciones

Tiempo : Los trabajos se deben ejecutar en base a los estipulado en el contrato.
 Costo : El presupuesto estimado en el contrato
 Alcance : El objeto del contrato.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado **Congelado** Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 19/04/2012 Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Diciembre 2019: La Subsecretaría Regional 1 y el MTOP Matriz están revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	03/01/2020 - 02:45 PM
Noviembre 2019: La Subsecretaría Regional 1 y el MTOP Matriz están revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	04/12/2019 - 05:03 PM
Octubre 2019: La Subsecretaría Regional 1 y el MTOP Matriz están revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción	Orellana Sarmiento, Galo Oswaldo	05/11/2019 - 10:19 AM
Septiembre 2019:	Solano Blacio, Wimper Vicente	04/10/2019 - 03:43 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
La Subsecretaría Regional 1 y el MTOP Matriz están revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción		
Agosto 2019: La Subsecretaría Regional 1 y el MTOP Matriz están revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción	Solano Blacio, Wimper Vicente	05/09/2019 - 04:44 PM
Julio 2019: La Subsecretaría Regional 1 y el MTOP Matriz están revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción	López Mendoza, Cristhian Manuel	02/08/2019 - 03:47 PM
Junio 2019: La Subsecretaría Regional 1 y el MTOP Matriz están revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción	López Mendoza, Cristhian Manuel	02/07/2019 - 09:00 AM
Mayo 2019: La Subsecretaría Regional 1 y el MTOP Matriz están revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción	López Mendoza, Cristhian Manuel	05/06/2019 - 02:52 PM
Abril 2019: La Subsecretaría Regional 1 y el MTOP Matriz están revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción	López Mendoza, Cristhian Manuel	02/05/2019 - 09:08 AM
Marzo 2019: La Subsecretaría Regional 1 y el MTOP Matriz están revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción	López Mendoza, Cristhian Manuel	03/04/2019 - 01:46 PM
Febrero 2019: La Subsecretaría Regional 1 y el MTOP Matriz están revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.	López Mendoza, Cristhian Manuel	27/02/2019 - 08:01 AM
ENERO 2019: La Subsecretaría Regional 1 y el MTOP Matriz están revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.	López Mendoza, Cristhian Manuel	05/02/2019 - 01:42 PM
DICIEMBRE 2018: La Subsecretaría Regional 1 y el MTOP Matriz están revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.	López Mendoza, Cristhian Manuel	04/01/2019 - 09:00 AM
NOVIEMBRE 2018 La Subsecretaría Regional 1 y el MTOP Matriz están revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.	López Mendoza, Cristhian Manuel	06/12/2018 - 08:08 AM
Octubre 2018: La Subsecretaría Regional 1 y el MTOP Matriz están revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.	López Mendoza, Cristhian Manuel	05/11/2018 - 03:59 PM
Septiembre 2018: La Subsecretaría Regional 1 y el MTOP Matriz están revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.	López Mendoza, Cristhian Manuel	03/10/2018 - 02:52 PM
AGOSTO 2018: La Subsecretaría Regional 1 y el MTOP Matriz están revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.	López Mendoza, Cristhian Manuel	04/09/2018 - 02:30 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
La Subsecretaría Regional 1 y el MTOP Matriz están revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.		
<p>Julio 2018:</p> <p>La Subsecretaría Regional 1 y el MTOP Matriz están revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	03/08/2018 - 02:46 PM
<p>JUNIO 2018:</p> <p>La Subsecretaría Regional 1 y el MTOP Matriz están revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	06/07/2018 - 08:00 AM
<p>MAYO 2018:</p> <p>La Subsecretaría Regional 1 y el MTOP Matriz estan revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	01/06/2018 - 03:51 PM
<p>Abril 2018:</p> <p>La Subsecretaría Regional 1 y el MTOP Matriz estan revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	03/05/2018 - 05:35 PM
<p>Marzo 2018:</p> <p>La Subsecretaría Regional 1 y el MTOP Matriz estan revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	04/04/2018 - 12:04 PM
<p>Febrero 2018:</p> <p>La Subsecretaría Rgional 1 y el MTOP Matriz estan revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	04/04/2018 - 12:03 PM
<p>Enero 2018:</p> <p>La Subsecretaría Regional 1 y el MTOP Matriz estan revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	08/02/2018 - 10:55 AM
<p>DICIEMBRE 2017:</p> <p>La Subsecretaría Regional 1 y el MTOP Matriz estan revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	05/01/2018 - 05:08 PM
<p>Noviembre 2017:</p> <p>La Subsecretaría Regional 1 y el MTOP Matriz estan revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	05/01/2018 - 05:08 PM
<p>Octubre 2017:</p> <p>La Subsecretaría Regional 1 y el Mtop Matriz estan revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	01/11/2017 - 04:20 PM
<p>Septiembre 2017:</p> <p>La Subsecretaría Regional 1 y el Mtop Matriz estan revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	04/10/2017 - 08:52 AM
<p>Agosto 2017:</p> <p>La Subsecretaría Regional 1 y el Mtop Matriz estan revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/09/2017 - 09:57 PM
<p>Julio 2017:</p> <p>La Subsecretaría Regional 1 y el Mtop Matriz estan revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	02/08/2017 - 02:50 PM
<p>Junio 2017:</p> <p>La Subsecretaría Regional 1 y el Mtop Matriz estan revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	04/07/2017 - 04:13 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Mayo 2017: La Subsecretaría Regional 1 y el Mtop Matriz estan revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	01/06/2017 - 11:34 AM
<p>Abril 2017: La Subsecretaría Regional 1 y el Mtop Matriz estan revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	03/05/2017 - 01:30 PM
<p>Marzo 2017: La Subsecretaría Regional 1 y el Mtop Matriz estan revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	30/03/2017 - 12:01 PM
<p>Febrero 2017: La Subsecretaría Regional 1 y el Mtop Matriz estan revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/03/2017 - 01:53 PM
<p>Enero 2017: La Subsecretaría Regional 1 y el Mtop Matriz estan revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.</p>		
<p>Diciembre 2016: La Subsecretaría Regional 1 y el Mtop Matriz estan revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.</p>	Benavides Morillo, Omar Alexander	05/01/2017 - 02:23 PM
<p>Noviembre 2016: La Subsecretaría Regional 1 y el Mtop Matriz estan revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/12/2016 - 09:27 AM
<p>Octubre 2016: La Subsecretaría Regional 1 y el Mtop Matriz estan revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	31/10/2016 - 12:45 PM
<p>Septiembre 2016: La Subsecretaría Regional 1 y el Mtop Matriz estan revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.</p>	Benavides Morillo, Omar Alexander	06/10/2016 - 05:00 PM
<p>Julio 2016: La Subsecretaría Regional 1 y el Mtop Matriz estan revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.</p>	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	29/07/2016 - 12:19 PM
<p>Junio 2016: La Subsecretaría Regional 1 y el Mtop Matriz estan revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.</p>	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	28/06/2016 - 04:09 PM
<p>Mayo 2016: La Subsecretaría Regional 1 y el Mtop Matriz estan revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.</p>	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	02/06/2016 - 03:27 PM
<p>Abril 2016: La Subsecretaría Regional 1 y el Mtop Matriz estan revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.</p>	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	05/05/2016 - 03:30 PM
<p>Marzo 2016: La Subsecretaría Regional 1 y el Mtop Matriz estan revisando para la aprobación los últimos capítulos solicitados como son: Estudio de los puentes, Expropiaciones y Presupuesto de la construcción.</p>	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	07/04/2016 - 12:57 PM
<p>Febrero 2016: El contratista en el mes de diciembre a presentado 6 planillas (2 planillas del contrato orginal y 4 planillas del contrato complementario Nro. 3) de trabajo para el trámite respectivo, este proyecto esta con el PAI para el 2016 y luego del cobro se hara el acta de liquidación y la presentación de todos los estudios para su aprobación respectiva.</p>	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	08/03/2016 - 04:36 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Enero 2016: El contratista en el mes de diciembre a presentado 6 planillas (2 planillas del contrato original y 4 planillas del contrato complementario Nro. 3) de trabajo para el trámite respectivo, este proyecto esta con el PAI para el 2016 y luego del cobro se hara el acta de liquidación y la presentación de todos los estudios para su aprobación respectiva.	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	10/02/2016 - 12:43 PM
Diciembre 2015: El contratista en el mes de diciembre a presentado 6 planillas (2 planillas del contrato original y 4 planillas del contrato complementario Nro. 3) de trabajo para el trámite respectivo, este proyecto esta con el PAI para el 2016 y luego del cobro se hara el acta de liquidación y la presentación de todos los estudios para su aprobación respectiva.	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	04/01/2016 - 04:48 PM
Noviembre 2015: Los estudios fueron presentados en la Subsecretaría Regional 1, el 01 de diciembre de 2014, actualmente se están realizando las revisión de los estudios en Matriz del MTOP. La consultora presentó las planillas de liquidación en la Subsecretaría Regional 1, para el trámite respectivo.	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	07/12/2015 - 11:17 AM
Octubre 2015: La consultora no presenta el diseño de puentes para su revisión y aprobación en la Subsecretaria Regional 1, por lo que no se puede aprobar el capítulo estructuras. La consultora argumenta que el MTOP le adeuda haberes de trabajos anteriores, proyecto que no está incluido en el PAI 2015 razón por la cual el ministerio no puede cancelar dicha deuda. Se tramito la inclusión en el PAI 2016.	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	10/11/2015 - 04:23 PM
SEPTIEMBRE 2015: La consultora no presenta el diseño de puentes para su revisión y aprobación en la Subsecretaria Regional 1, por lo que no se puede aprobar el capítulo estructuras. La consultora argumenta que el MTOP le adeuda haberes de trabajos anteriores, proyecto que no está incluido en el PAI 2015 razón por la cual el ministerio no puede cancelar dicha deuda. Se tramito la inclusión en el PAI 2016.	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	10/11/2015 - 04:11 PM
SEPTIEMBRE 2015: No se aprueban aun los estudios por parte de la Subsecretaría Regional 1.	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	29/09/2015 - 10:35 AM
AGOSTO 2015: No se aprueban aun los estudios por parte de la Subsecretaría Regional 1.	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	04/09/2015 - 10:00 AM
JULIO 2015: No se aprueban aun los estudios por parte de la Subsecretaria Regional 1.	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	12/08/2015 - 02:42 PM
JUNIO 2015: No se aprueban aun los estudios por parte de la Subsecretaria Regional 1.	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	03/07/2015 - 03:29 PM
MAYO 2015: No se aprueban aun los estudios por parte de la Subsecretaria Regional 1.	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	03/07/2015 - 03:28 PM
Febrero 2015: En el mes de Diciembre se terminó el plazo de ejecución de los estudios, la consultora, entregó la documentación respectiva para la revisión y aprobación de los estudios, por parte de la Subsecretaria Regional 1. No es posible realizar el arrastre de este proyecto al año 2014, debido a que el plazo contractual finalizó en el año 2013, por lo tanto existen hitos que se encuentran en rojo y amarillo.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/03/2015 - 08:49 AM
Enero 2015: En el mes de Diciembre se terminó el plazo de ejecución de los estudios, la consultora, entregó la documentación respectiva para la revisión y aprobación de los estudios, por parte de la Subsecretaria Regional 1. No es posible realizar el arrastre de este proyecto al año 2014, debido a que el plazo contractual finalizó en el año 2013, por lo tanto existen hitos que se encuentran en rojo y amarillo.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/02/2015 - 11:55 AM
Diciembre 2014: En el mes de Diciembre se terminó el plazo de ejecución de los estudios, la consultora, entregó la documentación respectiva para la revisión y aprobación de los estudios, por parte de la Subsecretaria Regional 1. No es posible realizar el arrastre de este proyecto al año 2014, debido a que el plazo contractual finalizó en el año 2013, por lo tanto existen hitos que se encuentran en rojo y amarillo.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	23/01/2015 - 11:30 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Noviembre 2014: En el mes de Diciembre se terminó el plazo de ejecución de los estudios, la consultora, entregó la documentación respectiva para la revisión y aprobación de los estudios, por parte de la Subsecretaría Regional 1. No es posible realizar el arrastre de este proyecto al año 2014, debido a que el plazo contractual finalizó en el año 2013, por lo tanto existen hitos que se encuentran en rojo y amarillo.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/12/2014 - 09:07 AM
<p>Octubre 2014: En el mes de Diciembre se terminó el plazo de ejecución de los estudios, la consultora, entregó la documentación respectiva para la revisión y aprobación de los estudios, por parte de la Subsecretaría Regional 1. No es posible realizar el arrastre de este proyecto al año 2014, debido a que el plazo contractual finalizó en el año 2013, por lo tanto existen hitos que se encuentran en rojo y amarillo.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/11/2014 - 12:48 PM
<p>Septiembre 2014: En el mes de Diciembre se terminó el plazo de ejecución de los estudios, la consultora, entregó la documentación respectiva para la revisión y aprobación de los estudios, por parte de la Subsecretaría Regional 1. No es posible realizar el arrastre de este proyecto al año 2014, debido a que el plazo contractual finalizó en el año 2013, por lo tanto existen hitos que se encuentran en rojo y amarillo. Arizaga Davila , Abelardo 09/09/2014 - 04:28 PM</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/10/2014 - 10:14 AM
<p>Agosto 2014: En el mes de Diciembre se terminó el plazo de ejecución de los estudios, la consultora, entregó la documentación respectiva para la revisión y aprobación de los estudios, por parte de la Subsecretaría Regional 1. No es posible realizar el arrastre de este proyecto al año 2014, debido a que el plazo contractual finalizó en el año 2013, por lo tanto existen hitos que se encuentran en rojo y amarillo.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	09/09/2014 - 04:28 PM
<p>Julio 2014: En el mes de Diciembre se terminó el plazo de ejecución de los estudios, la consultora, entregó la documentación respectiva para la revisión y aprobación de los estudios, por parte de la Subsecretaría Regional 1. No es posible realizar el arrastre de este proyecto al año 2014, debido a que el plazo contractual finalizó en el año 2013, por lo tanto existen hitos que se encuentran en rojo y amarillo.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	21/08/2014 - 04:33 AM
<p>Junio 2014: En el mes de Diciembre se terminó el plazo de ejecución de los estudios, la consultora, entregó la documentación respectiva para la revisión y aprobación de los estudios, por parte de la Subsecretaría Regional 1. No es posible realizar el arrastre de este proyecto al año 2014, debido a que el plazo contractual finalizó en el año 2013, por lo tanto existen hitos que se encuentran en rojo y amarillo.</p> <p>Mediante Memorando N°MTOPEITZ1-2014-0264-M, del 24 de Junio del presente año, el administrador del contrato recomienda que el consultor realice los trámites que correspondan para el contrato complementario N°3, El valor del contrato complementario incluyendo reajuste de precios aproximado y el IVA es de 96.000,00 USD, con un plazo de sesenta días.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	02/07/2014 - 02:43 PM
<p>Mayo 2014: En el mes de Diciembre se terminó el plazo de ejecución de los estudios, la consultora, entregó la documentación respectiva para la revisión y aprobación de los estudios, por parte de la Subsecretaría Regional 1. No es posible realizar el arrastre de este proyecto al año 2014, debido a que el plazo contractual finalizó en el año 2013, por lo tanto existen hitos que se encuentran en rojo y amarillo.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	02/07/2014 - 02:39 PM
<p>Abril 2014: En el mes de Diciembre se terminó el plazo de ejecución de los estudios, la consultora, entregó la documentación respectiva para la revisión y aprobación de los estudios, por parte de la Subsecretaría Regional 1. No es posible realizar el arrastre de este proyecto al año 2014, debido a que el plazo contractual finalizó en el año 2013, por lo tanto existen hitos que se encuentran en rojo y amarillo.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	02/07/2014 - 02:39 PM
<p>Marzo 2014: En el mes de Diciembre se terminó el plazo de ejecución de los estudios, la consultora, entregó la documentación respectiva para la revisión y aprobación de los estudios, por parte de la Subsecretaría Regional 1. No es posible realizar el arrastre de este proyecto al año 2014, debido a que el plazo contractual finalizó en el año 2013, por lo tanto existen hitos que se encuentran en rojo y amarillo.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	15/04/2014 - 03:32 PM
<p>Febrero 2014: En el mes de Diciembre se terminó el plazo de ejecución de los estudios, la consultora, entregó la documentación respectiva para la revisión y aprobación de los estudios, por parte de la</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	17/03/2014 - 08:12 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Subsecretaria Regional 1. No es posible realizar el arrastre de este proyecto al año 2014, debido a que el plazo contractual finalizó en el año 2013.		
Enero 2014 En el mes de Diciembre se terminó el plazo de ejecución de los estudios, la consultora, entregó la documentación respectiva para la revisión y aprobación de los estudios, por parte de la Subsecretaria Regional 1.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	17/03/2014 - 08:11 AM
DICIEMBRE 2013 En el mes de Diciembre se terminó el plazo de ejecución de los estudios, la consultora, entregó la documentación respectiva para la revisión y aprobación de los estudios, por parte de la Subsecretaria Regional 1.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	08/03/2014 - 10:08 AM
NOVIEMBRE 2013.- Los trabajos de campo Contrato Original, se encuentran concluídos, acualmente la consultora se encuentra entregando documentación en la Subsecretaria Regional 1. Actualmente, la consultora presento la Planillar N°2 correspondiente al Contrato CComplementario 1 del mes del Agosto del 2013 por un avalor de \$34,025.52. No es posible reprogramar el hito 11 debido a que aún no se aprueba el Contrato Complementario	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	08/01/2014 - 02:52 PM
OCTUBRE 2013.- Los trabajos de campo Contrato Original, se encuentran concluídos, acualmente la consultora se encuentra entregando documentación en la Subsecretaria Regional 1. Actualmente, la consultora presento la Planillar N°2 correspondiente al Contrato CComplementario 1 del mes del Agosto del 2013 por un avalor de \$34,025.52. No es posible reprogramar el hito 11 debido a que aún no se aprueba el Contrato Complementario	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	09/12/2013 - 01:02 AM
SEPTIEMBRE 2013 Los trabajos de campo Contrato Original, se encuentran concluídos, acualmente la consultora se encuentra entregando documentación en la Subsecretaria Regional 1. Actualmente, la consultora presento la Planillar N°2 correspondiente al Contrato CComplementario 1 del mes del Agosto del 2013 por un avalor de \$34,025.52. Porcentaje de avance fisico del Contrato Complemetario 57%. No se ha podido cumplir con el hito N°11, debido a que se está tramitando un Contrato Complementario, una vez que este se apruebe se reprogramará la fecha del hito N° 11	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/11/2013 - 03:00 PM
AGOSTO 2013 Los trabajos de campo Contrato Original, se encuentran concluídos, acualmente la consultora se encuentra entregando documentación en la Subsecretaria Regional 1. Actualmente, la consultora presento la Planillar N°2 correspondiente al Contrato CComplementario 1 del mes del Agosto del 2013 por un avalor de \$34,025.52. Porcentaje de avance fisico del Contrato Complemetario 57%. No se ha podido cumplir con el hito N°11, debido a que se setá tramitando un Contrato Complementario, una vez que este se apruebe se reprogramará la fecha del hito N° 11	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/10/2013 - 02:44 PM
JULIO 2013 Los trabajos de campo se encuentran concluídos, acualmente la consultora se encuentra entregando documentación en la Subsecretaria Regional 1.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	06/09/2013 - 10:16 AM
JUNIO 2013 Se entregó en anticipo del Contrato CComplementario N°1 con fecha 27 de Junio del 2013, con un plazo adicional de 2 meses, mismo que termina el 27 de Agosto del 2013.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	02/08/2013 - 03:00 PM
MAYO 2013 Se ha continuado con reuniones con Petroecuador y ARCH con l fin de arreglar los cruces de la linea de estudios con las tuberías tanto privadas como estatales. Se está preparando el Acta respectiva. No se ha podido realizar el Acta de Recepción porque se encuentra en trámite un Contrato Complementario debido a aumento de kilometraje contratado. Los estudios de campo se encuentran concluidos y el consultor se encuentra realizado trabajos de gabinete. Porcentaje de avance fisico 85.08%	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/07/2013 - 11:56 AM
ABRIL 2013	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	06/06/2013 - 02:45 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se ha realizado la socialización del proyecto con la Agencia de regulación y control hidrocarburífero, con el objeto de solucionar los problemas presentados por el paso de la tuberías de oleoducto y poliducto en el trazado de la vía. Los estudios de campo se encuentran concluidos y el consultor se encuentra realizando trabajos de gabinete. Porcentaje de avance físico 35%		
MARZO 2013 Se espera que la Subsecretaría Regional 1, proceda con la firma del Contrato Complementario con la Cia. ACE, en el cual se aumenta el kilometraje de los estudios. La Cia. hasta la presente fecha no entrega planillas correspondientes al 2013.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/04/2013 - 11:05 AM
FEBRERO 2013 En la Subsecretaría Regional 1 se está tramitando un contrato complementario.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/04/2013 - 11:04 AM
ENERO 2013 En la Subsecretaría Regional 1 se está tramitando un contrato complementario. Desde el 22 de Febrero hasta el jueves 28 de Febrero se va a realizar la socialización de las rutas que se han planteado como alternativas con el fin de escoger la mejor opción.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	06/03/2013 - 04:38 PM
DICIEMBRE 2012 Replanteo, nivelación, referencias y perfiles transversales, estudio de suelo de la subrasante.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	20/02/2013 - 05:17 PM
NOVIEMBRE 2012 Estudio de evaluación y mitigación de impactos ambientales 25%.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/01/2013 - 03:41 PM
OCTUBRE 2012 Estudios de factibilidad, polígono y nivelación de perfiles transversales, selección de rutas.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/01/2013 - 03:40 PM
Septiembre 2012 Contratista: ACE Estudios de factibilidad, polígono y nivelación de perfiles transversales, selección de rutas. Agosto 2012 Se entrega el Anticipo y se comienzan los trabajos del Estudio. Julio 2012 Se realiza la firma del contrato con la Asociación ACE se nombra como Administrador del Contrato al Ing. Omar Benavidez de la Subsecretaría Regional 1 y como Supervisor al Ing. Iván Camacho como de la Dirección Provincial de Sucumbios.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	09/11/2012 - 09:19 AM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Demora en la entrega y aprobación de informes finales .	25/11/2019	Leoncio Abelardo Arizaga Davila	10	10	1	0/1

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Recursos. La falta de recursos económicos CAUSARÍA el retraso en el plazo establecido del proyecto.	25/11/2019	Leoncio Abelardo Arizaga Davila	40 %	80	32	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Lago Agrio

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Publicación Pliegos, realizado,	2-Publicación de Pliegos	19/04/2012		19/04/2012		Sí	2.0
2	PLANEACIÓN: Publicación de Resultados, realizado.	1-Solicitud de Información	30/05/2012		30/05/2012		Sí	2.0
3	PLANEACIÓN: Adjudicación, realizado.	3-Adjudicación	06/06/2012		06/06/2012		Sí	5.0
4	EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos y entrega del anticipo, realizado	4-Inicio de Trabajo	25/07/2012		25/07/2012		Sí	5.0
5	EJECUCIÓN: Estudios Factibilidad, realizado.	5-Entregables Intermedios	25/09/2012		25/09/2012		Sí	10.0
6	EJECUCIÓN: Estudios Pre-Preliminar, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2012		30/09/2012		Sí	10.0
7	EJECUCIÓN: Estudios Preliminar, realizado.	5-Entregables Intermedios	15/10/2012		15/10/2012		Sí	10.0
8	EJECUCIÓN: Estudio de Ingeniería Definitivos, realizado	5-Entregables Intermedios	05/11/2012		05/11/2012		Sí	15.0
9	EJECUCIÓN: Obras Complementarias, realizado.	5-Entregables Intermedios	05/12/2012		20/04/2013		Sí	15.0
10	EJECUCIÓN: Estudios de impactos ambientales, realizado.	5-Entregables Intermedios	05/01/2013		20/04/2013		Sí	15.0
11	CIERRE: Entrega de informes finales, realizado.	9-Entregables Formales	15/12/2016	29/12/2017			No	5.0
12	CIERRE: Liquidación económica, realizado.	9-Entregables Formales	17/12/2016	30/12/2017			No	3.0
13	CIERRE: Acta entrega Recepción Definitiva, realizado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2016	30/12/2017			No	3.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	17/11/2015

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance de los Estudios para la construcción del anillo vial de Lago Agrio		100.00 %	0.01	0.01	01/01/2017	Ene-Mar


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	262,284.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,262,213.10 **
Costo Total:	1,272,941.74
Total Devengado:	1,262,213.10
% Costo Total Devengado:	99.16 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 99.16 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1,579,019.79	0.00	0.00	1,579,019.79
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	1,627,919.36	0.00	0.00	1,627,919.36
Ppto. Codificado	1,439,140.31	0.00	0.00	1,439,140.31
Ppto. Comprometido	348,031.42	0.00	0.00	348,031.42
Planeado - Codificado (2019)		0.00		
Programado a Devengar	1,933,847.81	0.00	0.00	1,933,847.81
Ppto. Devengado	1,262,213.10	0.00	0.00	1,262,213.10
Pagado Real	269,635.49	0.00	0.00	269,635.49
Estimado a fin de año	* 1,262,213.10	0.00	0.00	1,262,213.10
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	671,634.71	0.00	0.00	671,634.71
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 65.27 %	0.00 %	0.00 %	65.27 %
Ppto. Codificado 998	209,441.33	0.00	0.00	209,441.33
Ppto. Devengado 998	77,507.62	0.00	0.00	77,507.62

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

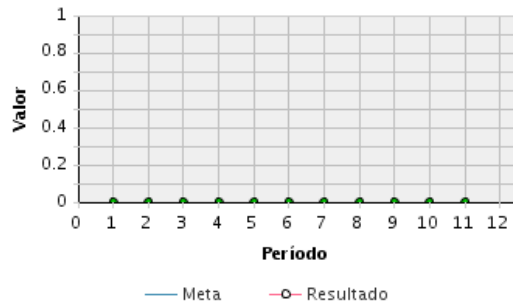

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	100.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Oct	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Nov	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
17	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.0038 DEVENGADO MES DE NOVIEMBRE	DEVENGADO_2019-11.PDF	04/12/2019
2	A.0039 COSTO TOTAL DE PROYECTO	Ficha_Proyecto_K035.pdf	28/11/2019
3	A.0040 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2017	Informe_ejecutivo_id_4825.pdf	05/01/2018
4	A.0041 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	informe_ejecutivo_noviembre_id_4825.pdf	04/12/2017
5	A.0042 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2017_PROYECTO_K035.pdf	05/01/2017
6	A.0043 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2017_ID_4825.pdf	04/10/2017
7	A.0045 INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2017	ID_CONTRATO_4825.pdf	05/09/2017
8	A.0046 INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2017	INFORME_SITOP_JULIO_2017_ID_4825.pdf	02/08/2017
9	A.0047 INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2017	INFORME_SITOP_JUNIO_2017_ID_4825.pdf	04/07/2017
10	A.049 INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2017	INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2017_PROYECTO_4825.pdf	06/05/2017
11	A.050 INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2017	INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2017_PROYECTO_4825.pdf	01/03/2017
12	A1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO 2014	A1_EJECUCIÓN_PRESUPUESTARIA_MES_DE_FEBRERO_2014.pdf	17/03/2014
13	A2 INFORME EJECUTIVO SITOP FEBRERO	A2_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_FEBRERO.pdf	17/03/2014
14	A3 ENTREGA DE INFORMES CONSULTORA	A3_ENTREGA_DE_INFORMES_CONSULTORA.pdf	17/04/2014
15	A4 INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2015 ACE	A4_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MARZO_2015_ACE.pdf	10/04/2015
16	A5 INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2015	A5_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_ABRIL_2015.pdf	09/06/2015
17	A6 INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2015	A6_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MAYO_2015.pdf	09/06/2015
18	A7 INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2015	A7_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_JUNIO_2015.pdf	03/07/2015
19	A8 INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2015	A8_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_AGOSTO_2015.pdf	04/09/2015
20	A9 INFORME EJECUTIVO SITOP SEPTIEMBRE 2015	A9_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_SEPTIEMBRE_2015.pdf	29/09/2015
21	B1 INFORME EJECUTIVO SITOP OCTUBRE 2015	B1_INFORME_OCTUBRE.pdf	10/11/2015
22	B2 INFORME EJECUTIVO SITOP NOVIEMBRE 2015	B2_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_NOVIEMBRE_2015.pdf	07/12/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
23	B3 INFORME EJECUTIVO SITOP DICIEMBRE 2015	ANILLO_VIAL_SUCUMBIOS_-_DICIEMRBE_2015.pdf	04/01/2016
24	B4 INFORME EJECUTIVO SITOP ENE 2016	ESTUDIOS_ANILLO_VIAL_DE_LAGO_AGRIO_ENERO_2016.pdf	08/02/2016
25	B5 INFORME EJECUTIVO SITOP FEB 2016	INFORME_SITOP_FEBRERO_2016.pdf	08/03/2016
26	B6 INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2016	MARZO_2016_-_ANILLO_VIAL_LAGO_AGRIO.pdf	07/04/2016
27	B7 INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2016	Abril_2016_-Anillo_Vial_Lago_agrio.pdf	05/05/2016
28	B8 INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2016	MAYO_2016.pdf	06/06/2016
29	B9 INFORME EJECUTIVO SITOP OCTUBRE 2016	B9_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_OCTUBRE_2016-ANILLO_VIAL_LAGO_AGRIO1.pdf	01/11/2016
30	CONTRATO	CONTRATO.pdf	08/10/2015
31	CONTRATO COMPLEMENTARIO	contrato_complentario_No._anillo_vial.pdf	07/06/2013
32	CONTRATO COMPLEMENTARIO DE PLAZO	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_DE_PLAZO.pdf	08/10/2015
33	CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 2	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_No._2.pdf	08/10/2015
34	CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 3	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_No._3.pdf	08/10/2015
35	DICATAMEN SENPLADES 2010	DICATAMEN_SENPLADES_2010.pdf	08/10/2015
36	DICATAMEN SENPLADES 2011	DICATAMEN_SENPLADES_2011.pdf	08/10/2015
37	DICATAMEN SENPLADES 2012	DICATAMEN_SENPLADES_2012.pdf	08/10/2015
38	EJECUCION PRESUPUESTARIA AGOSTO 2013	Reporte_Ejecucion_Agosto_2013[1].pdf	09/09/2013
39	EJECUCION PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE	Ejecucion_Septiembre_del_2012(1).pdf	05/10/2012
40	EJECUCION PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2013	devengado_septiembre.pdf	07/10/2013
41	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2013	Reporte_de_Ejecucion_mes_de_Junio_2013[1].pdf	05/07/2013
42	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2013	Reporte_de_Ejecucion_mes_de_Junio_2013[1].pdf	05/07/2013
43	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MES DE JULIO 2013	REPORTE_JULIO-2013[1]_ejecucion_presupuestaria.pdf	02/08/2013
44	INFOME EJECUTIVO SITOP MES DE JULIO 2013	INFORME_EJECUTIVO_MES_DE_JULIO_2013.pdf	02/08/2013
45	INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2013	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MES_DE_JUNIO_2013_ace.pdf	05/07/2013
46	INFORME EJECUTIVO SITOP MES DE SEPT 2013	anillo_vial.pdf	07/10/2013
47	INFORME EJECUTIVO SITOP NOV 2013	INFORME_EJECUTIVO_ANILLO_VIAL.pdf	09/12/2013
48	REPORTE DEVENGADO MES DE MAYO	REPORTE_MES_DE_MAYO_devengado.pdf	07/06/2013

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	Líder de proyecto			
Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	Supervisor	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Sucumbios, Encargado	aarizaga@mtop.gob.ec	023974600
Cruz Chicaiza, Rene Alejandro	Patrocinador Ejecutivo	Director	ccruz@mtop.gob.ec	023974600
Noroña, Víctor	Supervisor Financiero	Analista	vnorona@mtop.gob.ec	Ext. 13706
Solano Blacio, Wimper Vicente	Director Provincial		salio@mtop.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
51815_1.jpg	30/03/2017
