

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Zonal 5**  
**Dirección de Transporte y Obras Públicas Distrital Bolívar**

**PROYECTO: K025** MTOP - Construcción y fiscalización del paso lateral de Guaranda Ambato

Líder del Proyecto:	Flores Solano, Antonio Guillermo (aflores@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Barzallo Romero, Rafael Marcelo	Programas Relacionados:	
Titular:	Barzallo Romero, Rafael Marcelo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.375906	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	189,845.54
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Inversionista internacional	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/08/2018 - 31/12/2024
Fecha de última actualización:	01/09/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2022
Modificado por:	Barzallo Romero, Rafael Marcelo	Fecha del siguiente Hito:	31/07/2022

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de movilidad de los usuarios, disminuyendo el tiempo de traslado y mejorando la conectividad con las distintas poblaciones.

**Beneficios Cualitativos**

Descongestinar el tránsito vehicular de la zona poblada de la Ciudad de Guaranda, brindando comodidad y seguridad al transportista.

**Tipo de Beneficiario**

Comercio  
 Turístico  
 Social  
 Industrial  
 Agropecuario


**Restricciones**

Tiempo:  
 Costo:  
 Recursos: El flujo económico normal del proyecto y con buenas condiciones climatológicas permitirán que la obra se ejecute durante el plazo previsto.  
 Alcance:  
 Riesgo:  
 Calidad:

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 63.62 %  
 Fecha de Inicio: 01/08/2018 Fecha de Fin: 31/12/2024

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>AGOSTO 2022:</b></p> <p>Con fecha 2 de agosto del 2022 se levanta la suspensión temporal de trabajos Nro. 2, se reinician los mismos en el tramo km 11+340 al 12+320 sector Laguacoto, predios de la Universidad Estatal de Bolívar.</p> <p>Se realizan movimiento de tierras, excavación en marginal, transporte de material de excavación, y conformación de escombreras.</p>	Barzallo Romero, Rafael Marcelo	01/09/2022 - 08:55 AM
<p><b>JULIO 2022:</b></p> <p>- Se levanta la suspensión de la obra y actualmente se encuentra trabajando en el predio liberado de la Universidad Estatal de Bolívar, Sector Aguacoto Bajo se desarrollan trabajos preliminares y movimiento de tierras.</p> <p>- Hasta la fecha se han elaborado 417 expedientes, total de expedientes entregados por la fiscalización a la gestión interna nacional de caminos y expropiaciones 417, Total de expedientes aprobados por la GINCE 106, Total de expedientes consignados o pagados 62, total de expedientes legalizados y en trámite de pago en el área financiera 20, total de expedientes para elaboración de minutas en el área Jurídica 15, y total de expedientes para resolución de ocupación inmediata en el área Jurídica 9.</p>	Barzallo Romero, Rafael Marcelo	31/08/2022 - 02:56 PM
<p><b>JUNIO 2022:</b></p> <p>- Se encuentra trabajando en el predio liberado de la Universidad Estatal de Bolívar, Sector Aguacoto Bajo se desarrollan trabajos preliminares y movimiento de tierras.</p> <p>- Hasta la fecha se han elaborado 417 expedientes, total de expedientes entregados por la fiscalización a la gestión interna nacional de caminos y expropiaciones 417, Total de expedientes aprobados por la GINCE 106, Total de expedientes consignados o pagados 62, total de expedientes legalizados y en trámite de pago en el área financiera 20, total de expedientes para elaboración de minutas en el área Jurídica 15, y total de expedientes para resolución de ocupación inmediata en el área Jurídica 9.</p>	Barzallo Romero, Rafael Marcelo	05/07/2022 - 03:37 PM
<p><b>MAYO 2022</b></p> <p>- Se encuentra suspendido los trabajos a partir del 17 de marzo del 2022, por falta de predios liberados.</p> <p>- Hasta la fecha se han elaborado 417 expedientes, total de expedientes entregados por la fiscalización a la gestión interna nacional de caminos y expropiaciones 417, Total de expedientes</p>	Barzallo Romero, Rafael Marcelo	03/06/2022 - 02:34 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>aprobados por la GINCE 106, Total de expedientes consignados o pagados 62, total de expedientes legalizados y en trámite de pago en el área financiera 20, total de expedientes para elaboración de minutas en el área Jurídica 15, y total de expedientes para resolución de ocupación inmediata en el área Jurídica 9.</p>		
<p><b>ABRIL 2022</b></p> <p>- Es necesario la asignación de recursos económicos para el pago de expropiaciones y costas judiciales. Se realizan trabajos preliminares (movimiento de tierras, material présamo importado y mejoramiento de la subrazante). Tramos km 0+000 - 0+550, 1+750 - 2+600 y 2+250-3520 con un avance del 97%, Tranajos por concluir , por lo que es indispensable los recursos económicos para el pago y liberación de nuevos predios, que permitan la continuidad de los trabajos.</p> <p>- Hasta la fecha se han elaborado 417 expedientes, total de expedientes entregados por la fiscalización a la gestión interna nacional de caminos y expropiaciones 417, Total de expedientes aprobados por la GINCE 106, Total de expedientes consignados o pagados 62, total de expedientes legalizados y en trámite de pago en el área financiera 20, total de expedientes para elaboración de minutas en el área Jurídica 15, y total de expedientes para resolución de ocupación inmediata en el área Jurídica 9.</p>	<p>Barzallo Romero, Rafael Marcelo</p>	<p>13/05/2022 - 09:49 AM</p>
<p><b>MAYO 2022</b></p> <p>- Es necesario la asignación de recursos económicos para el pago de expropiaciones y costas judiciales. Se realizan trabajos preliminares (movimiento de tierras, material présamo importado y mejoramiento de la subrazante). Tramos km 0+000 - 0+550, 1+750 - 2+600 y 2+250-3520 con un avance del 97%, Tranajos por concluir , por lo que es indispensable los recursos económicos para el pago y liberación de nuevos predios, que permitan la continuidad de los trabajos.</p> <p>- Hasta la fecha se han elaborado 417 expedientes, total de expedientes entregados por la fiscalización a la gestión interna nacional de caminos y expropiaciones 417, Total de expedientes aprobados por la GINCE 106, Total de expedientes consignados o pagados 62, total de expedientes legalizados y en trámite de pago en el área financiera 20, total de expedientes para elaboración de minutas en el área Jurídica 15, y total de expedientes para resolución de ocupación inmediata en el área Jurídica 9.</p>	<p>Barzallo Romero, Rafael Marcelo</p>	<p>05/05/2022 - 02:01 PM</p>
<p><b>MARZO 2022</b></p> <p>- Es necesario la asignación de recursos económicos para el pago de expropiaciones y costas judiciales. Se realizan trabajos preliminares (movimiento de tierras, material présamo importado y mejoramiento de la subrazante). Tramos km 0+000 - 0+550, 1+750 - 2+600 y 2+250-3520 con un avance del 97%, Tranajos por concluir , por lo que es indispensable los recursos económicos para el pago y liberación de nuevos predios, que permitan la continuidad de los trabajos.</p> <p>- Hasta la fecha se han elaborado 417 expedientes, total de expedientes entregados por la fiscalización a la gestión interna nacional de caminos y expropiaciones 417, Total de expedientes aprobados por la GINCE 106, Total de expedientes consignados o pagados 62, total de expedientes legalizados y en trámite de pago en el área financiera 20, total de expedientes para elaboración de minutas en el área Jurídica 15, y total de expedientes para resolución de ocupación inmediata en el área Jurídica 9.</p>	<p>Barzallo Romero, Rafael Marcelo</p>	<p>06/04/2022 - 11:35 AM</p>
<p><b>Febrero 2022</b></p> <p>- Es necesario priorizar los procesos de los pagos de expropiaciones, se realizan trabajos preliminares en tres tramos, se encuentra a la espera de las asignaciones presupuestarias del año 2022, para continuar con los pagos de expropiaciones.</p> <p>- Hasta la fecha se han elaborado 265 expedientes de los cuales han sido entregados a la Unidad de Caminos y Expropiaciones. Dentro de los 118 expedientes están en etapa de revisión técnica por parte de la Unidad de Caminos y Expropiaciones, 25 Expedientes están en etapa de correcciones por parte del Contratista, 17 En Procesos de Elaboración de Declaratoria de Utilidad Pública, 21 en Elaboración de Resolución de Ocupación Inmediata, 5 están listos para firma de la Declaratoria de Utilidad Pública, 14 expedientes están para la firma de Resolución de Ocupación Inmediata por parte del SIT, 22 están en el Registro de Propiedad para inscripción de Declaratoria de Utilidad Pública, 11 Escrituras a favor del MTOP, y 11 expedientes están en inscripción de la Resolución de Ocupación Inmediata en el Registro del Trazado Paso Lateral de Guaranda.</p>	<p>Barzallo Romero, Rafael Marcelo</p>	<p>04/03/2022 - 03:45 PM</p>
<p><b>Enero 2022</b></p> <p>- Se realizan trabajos preliminares en tres tramos, se encuentra a la espera de las asignaciones presupuestarias del año 2022, para continuar con los pagos de expropiaciones.</p>	<p>Barzallo Romero, Rafael Marcelo</p>	<p>04/02/2022 - 03:36 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>- Hasta la fecha se han elaborado 265 expedientes de los cuales han sido entregados a la Unidad de Caminos y Expropiaciones. Dentro de los 118 expedientes están en etapa de revisión técnica por parte de la Unidad de Caminos y Expropiaciones, 25 Expedientes están en etapa de correcciones por parte del Contratista, 17 En Procesos de Elaboración de Declaratoria de Utilidad Pública, 21 en Elaboración de Resolución de Ocupación Inmediata, 5 están listos para firma de la Declaratoria de Utilidad Pública, 14 expedientes están para la firma de Resolución de Ocupación Inmediata por parte del SIT, 22 están en el Registro de Propiedad para inscripción de Declaratoria de Utilidad Pública, 11 Escrituras a favor del MTOP, y 11 expedientes están en inscripción de la Resolución de Ocupación Inmediata en el Registro del Trazado Paso Lateral de Guaranda.</p>		
<p>Diciembre 2021</p> <p>-Avanzamos con la elaboración de los expedientes de expropiación para proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública y su respectivo pago.</p> <p>- Hasta la fecha se han elaborado 265 expedientes de los cuales han sido entregados a la Unidad de Caminos y Expropiaciones. Dentro de los 118 expedientes están en etapa de revisión técnica por parte de la Unidad de Caminos y Expropiaciones, 25 Expedientes están en etapa de correcciones por parte del Contratista, 17 En Procesos de Elaboración de Declaratoria de Utilidad Pública, 21 en Elaboración de Resolución de Ocupación Inmediata, 5 están listos para firma de la Declaratoria de Utilidad Pública, 14 expedientes están para la firma de Resolución de Ocupación Inmediata por parte del SIT, 22 están en el Registro de Propiedad para inscripción de Declaratoria de Utilidad Pública, 11 Escrituras a favor del MTOP, y 11 expedientes están en inscripción de la Resolución de Ocupación Inmediata en el Registro del Trazado Paso Lateral de Guaranda.</p> <p>- El Contrato de Obra se suscribió el 05 de diciembre de 2019, el anticipo de la obra se entrego el 25 de septiembre de 2020, el plazo del proyecto se encuentra suspendido desde el 26 de septiembre de 2020 hasta que se disponga de los terrenos debidamente expropiados. Se han realizado trabajos preliminares como el replanteo del proyecto y la implementación del campamento.</p> <p>- La Contratación de la Fiscalización se encuentra en proceso de suscripción del Contrato una vez se disponga de la aprobación de la Certificación Presupuestaria Plurianual por parte del Ministerio de Economía y Finanzas</p>	<p>Barzallo Romero, Rafael Marcelo</p>	<p>04/01/2022 - 04:39 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2021</p> <p>-Se continúa con la elaboración de los expedientes de expropiación para proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública y su respectivo pago. Hasta la fecha se han elaborado 265 expedientes de los cuales han sido entregados a la Unidad de Caminos y Expropiaciones. Dentro de los 118 expedientes están en etapa de revisión técnica por parte de la Unidad de Caminos y Expropiaciones, 25 Expedientes están en etapa de correcciones por parte del Contratista, 17 En Procesos de Elaboración de Declaratoria de Utilidad Pública, 21 en Elaboración de Resolución de Ocupación Inmediata, 5 están listos para firma de la Declaratoria de Utilidad Pública, 14 expedientes están para la firma de Resolución de Ocupación Inmediata por parte del SIT, 22 están en el Registro de Propiedad para inscripción de Declaratoria de Utilidad Pública, 11 Escrituras a favor del MTOP, y 11 expedientes están en inscripción de la Resolución de Ocupación Inmediata en el Registro del Trazado Paso Lateral de Guaranda.</p> <p>- El Contrato de Obra se suscribió el 05 de diciembre de 2019, el anticipo de la obra se entrego el 25 de septiembre de 2020, el plazo del proyecto se encuentra suspendido desde el 26 de septiembre de 2020 hasta que se disponga de los terrenos debidamente expropiados. Se han realizado trabajos preliminares como el replanteo del proyecto y la implementación del campamento.</p> <p>- La Contratación de la Fiscalización se encuentra en proceso de suscripción del Contrato una vez se disponga de la aprobación de la Certificación Presupuestaria Plurianual por parte del Ministerio de Economía y Finanzas</p>	<p>Yacchirema Chimbo, Juan Carlos</p>	<p>03/12/2021 - 10:04 AM</p>
<p>OCTUBRE 2021</p> <p>-Se continúa con la elaboración de los expedientes de expropiación para proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública y su respectivo pago. Hasta la fecha se han elaborado 265 expedientes de los cuales han sido entregados a la Unidad de Caminos y Expropiaciones. Dentro de los 118 expedientes están en etapa de revisión técnica por parte de la Unidad de Caminos y Expropiaciones, 25 Expedientes están en etapa de correcciones por parte del Contratista, 17 En Procesos de Elaboración de Declaratoria de Utilidad Pública, 21 en Elaboración de Resolución de Ocupación Inmediata, 5 están listos para firma de la Declaratoria de Utilidad</p>	<p>Yacchirema Chimbo, Juan Carlos</p>	<p>04/11/2021 - 04:24 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Pública, 14 expedientes están para la firma de Resolución de Ocupación Inmediata por parte del SIT, 22 están en el Registro de Propiedad para inscripción de Declaratoria de Utilidad Pública, 11 Escrituras a favor del MTOP, y 11 expedientes están en inscripción de la Resolución de Ocupación Inmediata en el Registro del Trazado Paso Lateral de Guaranda.</p> <p>- El Contrato de Obra se suscribió el 05 de diciembre de 2019, el anticipo de la obra se entregó el 25 de septiembre de 2020, el plazo del proyecto se encuentra suspendido desde el 26 de septiembre de 2020 hasta que se disponga de los terrenos debidamente expropiados. Se han realizado trabajos preliminares como el replanteo del proyecto y la implementación del campamento.</p> <p>- La Contratación de la Fiscalización se encuentra en proceso de suscripción del Contrato una vez se disponga de la aprobación de la Certificación Presupuestaria Plurianual por parte del Ministerio de Economía y Finanzas..</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2021</p> <p>-Se continúa con la elaboración de los expedientes de expropiación para proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública y su respectivo pago. Hasta la fecha se han elaborado 265 expedientes de los cuales han sido entregados a la Unidad de Caminos y Expropiaciones. Dentro de los 118 expedientes están en etapa de revisión técnica por parte de la Unidad de Caminos y Expropiaciones, 25 Expedientes están en etapa de correcciones por parte del Contratista, 17 En Procesos de Elaboración de Declaratoria de Utilidad Pública, 21 en Elaboración de Resolución de Ocupación Inmediata, 5 están listos para firma de la Declaratoria de Utilidad Pública, 14 expedientes están para la firma de Resolución de Ocupación Inmediata por parte del SIT, 22 están en el Registro de Propiedad para inscripción de Declaratoria de Utilidad Pública, 11 Escrituras a favor del MTOP, y 11 expedientes están en inscripción de la Resolución de Ocupación Inmediata en el Registro del Trazado Paso Lateral de Guaranda.</p> <p>- El Contrato de Obra se suscribió el 05 de diciembre de 2019, el anticipo de la obra se entregó el 25 de septiembre de 2020, el plazo del proyecto se encuentra suspendido desde el 26 de septiembre de 2020 hasta que se disponga de los terrenos debidamente expropiados. Se han realizado trabajos preliminares como el replanteo del proyecto y la implementación del campamento.</p> <p>- La Contratación de la Fiscalización se encuentra en proceso de suscripción del Contrato una vez se disponga de la aprobación de la Certificación Presupuestaria Plurianual por parte del Ministerio de Economía y Finanzas..</p>	<p>Yacchirema Chimbo, Juan Carlos</p>	<p>04/10/2021 - 02:28 PM</p>
<p>AGOSTO 2021</p> <p>-Se continúa con la complementación de los expedientes de expropiación para proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública y su respectivo pago. Hasta la fecha se han elaborado 252 expedientes de los cuales han sido entregados a la Unidad de Caminos y Expropiaciones. Dentro de los 131 expedientes están en etapa de revisión técnica por parte de la Unidad de Caminos y Expropiaciones, 23 Expedientes están en etapa de correcciones por parte del Contratista, 23 En Procesos de Elaboración de Declaratoria de Utilidad Pública, 4 en Elaboración de Resolución de Ocupación Inmediata, 5 están listos para firma de la Declaratoria de Utilidad Pública, 14 expedientes están para la firma de Resolución de Ocupación Inmediata por parte del SIT, 22 están en el Registro de Propiedad para inscripción de Declaratoria de Utilidad Pública, 10 Escrituras a favor del MTOP y 11 expedientes están listos para la inscripción de la Resolución de Ocupación Inmediata en el Registro del Trazado Paso Lateral de Guaranda.</p> <p>- El Contrato de Obra se suscribió el 05 de diciembre de 2019, el anticipo de la obra se entregó el 25 de septiembre de 2020, el plazo del proyecto se encuentra suspendido desde el 26 de septiembre de 2020 hasta que se disponga de los terrenos debidamente expropiados. Se han realizado trabajos preliminares como el replanteo del proyecto y la implementación del campamento.</p> <p>- La Contratación de la Fiscalización se encuentra en proceso de suscripción del Contrato una vez se disponga de la aprobación de la Certificación Presupuestaria Plurianual por parte del Ministerio de Economía y Finanzas..</p>	<p>Yacchirema Chimbo, Juan Carlos</p>	<p>01/09/2021 - 03:25 PM</p>
<p>AGOSTO 2021</p> <p>- El Contrato de Obra se suscribió el 05 de diciembre de 2019, el anticipo de la obra se entregó el 25 de septiembre de 2020, el plazo del proyecto se encuentra suspendido desde el 26 de septiembre de 2020 hasta que se disponga de los terrenos debidamente expropiados. Se</p>	<p>Yacchirema Chimbo, Juan Carlos</p>	<p>05/08/2021 - 07:01 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>han realizado trabajos preliminares como el replanteo del proyecto y la implementación del campamento.</p> <p>- La Contratación de la Fiscalización se encuentra en proceso de suscripción del Contrato una vez se disponga de la aprobación de la Certificación Presupuestaria Plurianual por parte del Ministerio de Economía y Finanzas..</p> <p>-Se continúa con la implementación de los expedientes de expropiación para proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública y su respectivo pago. Hasta la fecha se han elaborado 252 expedientes de los cuales han sido entregados a la Unidad de Caminos y Expropiaciones. Dentro de los 131 expedientes están en etapa de revisión técnica por parte de la Unidad de Caminos y Expropiaciones, 23 Expedientes están en etapa de correcciones por parte del Contratista, 23 En Procesos de Elaboración de Declaratoria de Utilidad Pública, 4 en Elaboracion de Resolución de Ocupación Inmediata, 5 están listos para firma de la Declaratoria de Utilidad Pública, 14 expedientes están para la firma de Resolución de Ocupación Inmediata por parte del SIT, 22 están en el Registro de Propiedad para inscripción de Declaratoria de Utilidad Pública, 10 Escrituras a favor del MTOP y 11 expedientes están listos para la inscripción de la Resolución de Ocupación Inmediata en el Registro del Trazado Paso Lateral de Guaranda.</p>		
<p><b>JULIO</b></p> <p>- El Contrato de Obra se suscribió el 05 de diciembre de 2019, el anticipo de la obra se entrego el 25 de septiembre de 2020, el plazo del proyecto se encuentra suspendido desde el 26 de septiembre de 2020 hasta que se disponga de los terrenos debidamente expropiados. Se han realizado trabajos preliminares como el replanteo del proyecto e implementación del campamento.</p> <p>- La Contratación de la Fiscalización se encuentra en proceso de suscripción del Contrato una vez se disponga de la aprobación de la Certificación Presupuestaria Plurianual por parte de Planifica Ecuador.</p> <p>-Se continúa con la implementación de los expedientes de expropiación para proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública y su respectivo pago. Hasta la fecha se han elaborado 247 expedientes de los cuales; 247 expedientes han sido entregados a la Unidad de Caminos y Expropiaciones. Dentro de los 131 expedientes están en etapa de revisión técnica por parte de la Unidad de Caminos y Expropiaciones, 23 Expedientes están en etapa de correcciones por parte del Contratista, 23 En Procesos de Elaboración de Declaratoria de Utilidad Pública, 4 en Elaboracion de Resolución de Ocupación Inmediata, 5 están listos para firma de la Declaratoria de Utilidad Pública, 14 expedientes están para la firma de Resolución de Ocupación Inmediata por parte del SIT, 22 están en el Registro de Propiedad para inscripción de Declaratoria de Utilidad Pública, 4 Escrituras a favor del MTOP están en proceso de inscripción en el registro de propiedad, 9 expedientes están en proceso de elaboración de minutas en la Notaria y 12 expedientes están listos para la protocolización de la Resolución de Ocupación Inmediata</p>	<p>Yacchirema Chimbo, Juan Carlos</p>	<p>30/07/2021 - 11:51 AM</p>
<p><b>JUNIO 2021</b></p> <p>-Aun falta por complementar 339 expedientes, de los cuales 122 expedientes corresponden a viviendas que no se encuentran catastradas y 217 corresponden que no propietarios que no tienen escritura y son herederos.</p> <p>- La Contratación de la Fiscalización se encuentra en proceso de suscripción del Contrato una vez se disponga de la aprobación de la Certificación Presupuestaria Plurianual por parte de Planifica Ecuador.</p> <p>- Una vez realizado el pago de los primeros predios expropiados se iniciara la obra.</p> <p>- El Contrato de Obra se suscribió el 05 de diciembre de 2019, el anticipo de la obra se entrego el 25 de septiembre de 2020, el plazo del proyecto se encuentra suspendido desde el 26 de septiembre de 2020 hasta que se disponga de los terrenos debidamente expropiados. Se han realizado trabajos preliminares como el replanteo del proyecto e implementación del campamento.</p> <p>-Se continúa con la implementación de los expedientes de expropiación para proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública y su respectivo pago. Hasta la fecha se han elaborado 226 expedientes de los cuales; 188 expedientes han sido entregados a la Unidad de Caminos y Expropiaciones; y, 38 expedientes estan en revisión por parte de la Fiscalización. Dentro de los 188 expedientes existen: 40 expedientes con Declaratoria de Utiidad Pública de los cuales 8 tienen Acuerdo de Negociación dentro de los cuales 4 expedientes se encuentran en la Notaría para la Protocolización de la Escritura, 12 expedientes están para firma de Resolución de</p>	<p>Yacchirema Chimbo, Juan Carlos</p>	<p>02/07/2021 - 08:58 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Ocupación Inmediata por el SIT, se están elaborando la resolución de ocupación inmediata de 14 expedientes, también está en elaboración el Acuerdo de Negociación de 2 expedientes y 4 cuadro expedientes están listos para firma de Acuerdo de Negociación. Además 51 expedientes están en corrección por parte del Contratista, 27 expedientes en elaboración de Utilidad Pública y 70 están en revisión técnica en la Unidad de Caminos y Expropiaciones.</p>		
<p>MAYO 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El Contrato de Obra se suscribió el 05 de diciembre de 2019, el anticipo de la obra se entregó el 25 de septiembre de 2020, el plazo del proyecto se encuentra suspendido desde el 26 de septiembre de 2020 hasta que se disponga de los terrenos debidamente expropiados. Se han realizado trabajos preliminares como el replanteo del proyecto e implementación del campamento.</li> <li>-Se continúa con la implementación de los expedientes de expropiación para proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública y su respectivo pago. Hasta la fecha se han elaborado 226 expedientes de los cuales; 188 expedientes han sido entregados a la Unidad de Caminos y Expropiaciones; y, 38 expedientes están en revisión por parte de la Fiscalización. Dentro de los 188 expedientes existen: 40 expedientes con Declaratoria de Utilidad Pública de los cuales 8 tienen Acuerdo de Negociación dentro de los cuales 4 expedientes se encuentran en la Notaría para la Protocolización de la Escritura, 12 expedientes están para firma de Resolución de Ocupación Inmediata por el SIT, se están elaborando la resolución de ocupación inmediata de 14 expedientes, también está en elaboración el Acuerdo de Negociación de 2 expedientes y 4 cuadro expedientes están listos para firma de Acuerdo de Negociación. Además 51 expedientes están en corrección por parte del Contratista, 27 expedientes en elaboración de Utilidad Pública y 70 están en revisión técnica en la Unidad de Caminos y Expropiaciones.</li> <li>-Aun falta por complementar 339 expedientes, de los cuales 122 expedientes corresponden a viviendas que no se encuentran catastradas y 217 corresponden que no propietarios que no tienen escritura y son herederos.</li> <li>- La Contratación de la Fiscalización se encuentra en proceso de suscripción del Contrato una vez se disponga de la aprobación de la Certificación Presupuestaria Plurianual por parte de Planifica Ecuador.</li> <li>- Una vez realizado el pago de los primeros predios expropiados se iniciará la obra.</li> </ul>	<p>Pulecio Montalvo, Roger Alberto</p>	<p>04/06/2021 - 04:51 PM</p>
<p>ABRIL 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se entregó un anticipo de la obra el 25 de septiembre de 2020, el plazo del proyecto se encuentra suspendido desde el 26 de septiembre de 2020 hasta que se disponga de los terrenos debidamente expropiados para lo cual se ha realizado las Declaratorias de Utilidad Pública de 50 propiedades, la Contratista realiza los expedientes de expropiación en base a la información que proporcionados por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda. Una vez que se disponga de los predios expropiados se realizará los trabajos de movimiento de tierras. Para el pago de la expropiación está pendiente la aprobación de la Actualización de la Certificación Presupuestaria Plurianual. por parte de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador. La Contratación de la Fiscalización se encuentra en proceso de suscripción del Contrato una vez se disponga de la Partida Presupuestaria.</li> </ul>	<p>Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier</p>	<p>04/06/2021 - 04:29 PM</p>
<p>MARZO 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se entregó un anticipo de la obra el 25 de septiembre de 2020, el plazo del proyecto se encuentra suspendido desde el 26 de septiembre de 2020 hasta que se disponga de los terrenos debidamente expropiados para lo cual se ha realizado las Declaratorias de Utilidad Pública de 50 propiedades, la Contratista realiza los expedientes de expropiación en base a la información que proporcionados por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda. Una vez que se disponga de los predios expropiados se realizará los trabajos de movimiento de tierras. La Contratación de la Fiscalización se encuentra en proceso de suscripción del Contrato.</li> </ul>	<p>Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier</p>	<p>08/03/2021 - 12:49 PM</p>
<p>FEBRERO 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se entregó un anticipo de la obra el 25 de septiembre de 2020, el plazo del proyecto se encuentra suspendido desde el 26 de septiembre de 2020 hasta que se disponga de los terrenos debidamente expropiados para lo cual se ha realizado las Declaratorias de Utilidad Pública de 40 propiedades, la Contratista realiza los expedientes de expropiación en base a la información que proporcionados por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda. Una vez que se disponga de los predios expropiados se realizará los trabajos de movimiento de tierras.</li> </ul>	<p>Pulecio Montalvo, Roger Alberto</p>	<p>05/03/2021 - 03:39 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO 2021</p> <p>- Se entrego un anticipo de la obra el 25 de septiembre de 2020, el plazo del proyecto se encuentra suspendido desde el 26 de septiembre de 2020 hasta que se disponga de los terrenos debidamente expropiados para lo cual se ha realizado las Declaratorias de Utilidad Pública de 40 propiedades, la Contratista realiza los expedientes de expropiación en base a la información que porporcionados por el Gobierno Autonomo Descentralizado del Cantón Guaranda. Una vez que se disponga de los predios expropiados se realizará los trabajos de movimiento de tierras.</p>	<p>Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier</p>	<p>07/01/2021 - 02:24 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2020</p> <p>- Está entregado el anticipo del 19.30% con fecha 25 de septiembre , se encuentra en tramite de suspensión parcial debido a que no se tiene predios liberados, ya que la entidad correspondiente del GAD GUARANDA remite el informe de lote mínimo con fecha 19 de octubre ,la resolución de la reforma de ordenanza. Actualmente se ha enviado a Planta Central 30 expedientes para la debida expropiación</p>	<p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p>	<p>07/01/2021 - 11:36 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2020</p> <p>- Está entregado el anticipo del 19.30% con fecha 25 de septiembre , se encuentra en tramite de suspensión parcial debido a que no se tiene predios liberados, ya que la entidad correspondiente del GAD GUARANDA remite el informe de lote mínimo con fecha 19 de octubre ,la resolución de la reforma de ordenanza. Actualmente se ha enviado a Planta Central 30 expedientes para la debida expropiación.</p>	<p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p>	<p>02/12/2020 - 11:36 AM</p>
<p>OCTUBRE 2020</p> <p>- Está entregado el anticipo del 19.30% con fecha 25 de septiembre , se encuentra en tramite de suspensión parcial debido a que no se tiene predios liberados, ya que la entidad correspondiente del GAD GUARANDA remite el informe de lote mínimo con fecha 19 de octubre ,la resolución de la reforma de ordenanza. Actualmente se ha enviado a Planta Central 30 expedientes para la debida expropiación.</p>	<p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p>	<p>04/11/2020 - 01:30 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2020:</p> <p>- El contrato del Paso Lateral de Guaranda fue suscrito el 5 de diciembre de 2019, entre el MTOP y la empresa de la República Popular de China CRCC 14TH Bureau Group Ecuador Co. Ltd.; posteriormente se suscribe un Contrato Modificatorio de fecha 13 de marzo de 2020, en el cual se realiza una aclaración a la forma de pago del contrato original. El plazo de ejecución de la obra, inicia a la entrega del anticipo, sin embargo no inicia la ejecución de la obra por cuanto no se acredita el anticipo. Continúa en trámite la aprobación de la Reforma por cambio correlativo y fuente de financiamiento del IVA</p>	<p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p>	<p>05/10/2020 - 12:57 PM</p>
<p>JULIO 2020:</p> <p>- El contrato del Paso Lateral de Guaranda fue suscrito el 5 de diciembre de 2019, entre el MTOP y la empresa de la República Popular de China CRCC 14TH Bureau Group Ecuador Co. Ltd.; posteriormente se suscribe un Contrato Modificatorio de fecha 13 de marzo de 2020, en el cual se realiza una aclaración a la forma de pago del contrato original. El plazo de ejecución de la obra, inicia a la entrega del anticipo, sin embargo no inicia la ejecución de la obra por cuanto no se acredita el anticipo. Continúa en trámite la aprobación de la Reforma por cambio correlativo y fuente de financiamiento del IVA</p>	<p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p>	<p>04/09/2020 - 01:54 PM</p>
<p>JULIO 2020:</p> <p>- El contrato del Paso Lateral de Guaranda fue suscrito el 5 de diciembre de 2019, entre el MTOP y la empresa de la República Popular de China CRCC 14TH Bureau Group Ecuador Co. Ltd.; posteriormente se suscribe un Contrato Modificatorio de fecha 13 de marzo de 2020, en el cual se realiza una aclaración a la forma de pago del contrato original. El plazo de ejecución de la obra, inicia a la entrega del anticipo, sin embargo no inicia la ejecución de la obra por cuanto no se acredita el anticipo. Continúa en trámite la aprobación de la Reforma por cambio correlativo y fuente de financiamiento del IVA</p>	<p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p>	<p>04/08/2020 - 11:00 AM</p>
<p>JUNIO 2020:</p> <p>- El contrato del Paso Lateral de Guaranda fue suscrito el 5 de diciembre de 2019, entre el MTOP y la empresa de la República Popular de China CRCC 14TH Bureau Group Ecuador Co. Ltd.; posteriormente se suscribe un Contrato Modificatorio de fecha 13 de marzo de 2020, en el cual se realiza una aclaración a la forma de pago del contrato original. El plazo de ejecución de la obra, inicia a la entrega del anticipo, sin embargo no inicia la ejecución de la obra por cuanto no</p>	<p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p>	<p>05/07/2020 - 03:42 PM</p>



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
se acredita el anticipo. Continúa en trámite la aprobación de la Reforma por cambio correlativo y fuente de financiamiento del IVA.		
<p>MAYO 2020:</p> <p>- El contrato del Paso Lateral de Guaranda fue suscrito el 5 de diciembre de 2019, entre el MTOP y la empresa de la República Popular de China CRCC 14TH Bureau Group Ecuador Co. Ltd.; posteriormente se suscribe un Contrato Modificatorio de fecha 13 de marzo de 2020, en el cual se realiza una aclaración a la forma de pago del contrato original. El plazo de ejecución de la obra, inicia a la entrega del anticipo, sin embargo no inicia la ejecución de la obra por cuanto no se ha acreditado el anticipo. Se está tramitando la aprobación de la Reforma por cambio correlativo y fuente de financiamiento del IVA.</p>	Lara Villacis, Ligia Elena	05/07/2020 - 11:44 AM
<p>ABRIL 2020:</p> <p>- El contrato del Paso Lateral de Guaranda fue suscrito el 5 de diciembre de 2019, entre el MTOP y la empresa de la República Popular de China CRCC 14TH Bureau Group Ecuador Co. Ltd.; posteriormente se suscribe un Contrato Modificatorio de fecha 13 de marzo de 2020, en el cual se realiza una aclaración a la forma de pago del contrato original.</p>	Agualongo Amangandi, Mercy Maribel	05/05/2020 - 12:01 PM
<p>MARZO 2020:</p> <p>- El contrato del Paso Lateral de Guaranda fue suscrito el 5 de diciembre de 2019, entre el MTOP y la empresa de la República Popular de China CRCC 14TH Bureau Group Ecuador Co. Ltd.; posteriormente se suscribe un Contrato Modificatorio de fecha 13 de marzo de 2020, en el cual se realiza una aclaración a la forma de pago del contrato original.</p> <p>El plazo del contrato No inicia, pues el plazo arranca a la fecha de notificación de la entrega del anticipo en la cuenta del contratista, siendo que ha la fecha 18 de marzo de 2020, no se ha acreditado el anticipo, por consiguiente el avance físico y económico es del 0%</p>	Agualongo Amangandi, Mercy Maribel	03/04/2020 - 07:08 PM
<p>Febrero 2020:</p> <p>- El plazo del contrato de obra Paso Lateral de Guaranda inicia a la fecha de la entrega del anticipo. A la fecha del presente resumen ejecutivo, no se ha efectivizado el pago del anticipo a la contratista.</p>	Agualongo Amangandi, Mercy Maribel	04/03/2020 - 03:01 PM
<p>Enero 2020:</p> <p>- El plazo del contrato de obra Paso Lateral de Guaranda inicia a la fecha de la entrega del anticipo. A la fecha del presente resumen ejecutivo 15/01/2020, no se ha efectivizado el pago del anticipo a la contratista.</p>	Agualongo Amangandi, Mercy Maribel	06/02/2020 - 09:42 AM
<p>Diciembre 2019:</p> <p>1.- Se realizó la actualización de claves catastrales de los predios afectados por la construcción del nuevo proyecto Paso Lateral de Guaranda, obteniendo un registro total del 60% de predios afectados, sin embargo nos resta por recopilar información de la parte afectada, con el fin de proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública, lo que faculta al MTOP liberar los predios afectados y arrancar con el inicio con el proceso de contratación de obra del paso lateral de Guaranda.</p>	Agualongo Amangandi, Mercy Maribel	08/01/2020 - 09:13 AM
<p>Diciembre 2019:</p> <p>1.- Se realizó la actualización de claves catastrales de los predios afectados por la construcción del nuevo proyecto Paso Lateral de Guaranda, obteniendo un registro total del 60% de predios afectados, sin embargo nos resta por recopilar información de la parte afectada, con el fin de proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública, lo que faculta al MTOP liberar los predios afectados y arrancar con el inicio con el proceso de contratación de obra del paso lateral de Guaranda.</p> <p>2.- Proyecto con acta de recepción definitiva , en espera que se asigne presupuesto para la liquidación económica final.</p>	Agualongo Amangandi, Mercy Maribel	08/01/2020 - 09:12 AM
<p>NOVIEMBRE 2019:</p> <p>1.- Se realizó la actualización de claves catastrales de los predios afectados por la construcción del nuevo proyecto Paso Lateral de Guaranda, obteniendo un registro total del 60% de predios afectados, sin embargo nos resta por recopilar información de la parte afectada, con el fin de proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública, lo que faculta al MTOP liberar los predios afectados y arrancar con el inicio con el proceso de contratación de obra del paso lateral de Guaranda.</p>	Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier	05/11/2019 - 03:51 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2.- Proyecto con acta de recepción definitiva , en espera que se asigne presupuesto para la liquidación económica final.		
<p>SEPTIEMBRE 2019:</p> <p>1.- Se realizó la actualización de claves catastrales de los predios afectados por la construcción del nuevo proyecto Paso Lateral de Guaranda, obteniendo un registro total del 60% de predios afectados, sin embargo nos resta por recopilar información de la parte afectada, con el fin de proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública, lo que faculta al MTOP liberar los predios afectados y arrancar con el inicio con el proceso de contratación de obra del paso lateral de Guaranda.</p> <p>2.- Proyecto con acta de recepción definitiva , en espera que se asigne presupuesto para la liquidación económica final.</p>	Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier	02/10/2019 - 09:17 AM
<p>AGOSTO 2019:</p> <p>1.- Se realizó la actualización de claves catastrales de los predios afectados por la construcción del nuevo proyecto Paso Lateral de Guaranda, obteniendo un registro total del 60% de predios afectados, sin embargo nos resta por recopilar información de la parte afectada, con el fin de proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública, lo que faculta al MTOP liberar los predios afectados y arrancar con el inicio con el proceso de contratación de obra del paso lateral de Guaranda.</p> <p>2.- Proyecto con acta de recepción definitiva , en espera que se asigne presupuesto para la liquidación económica final.</p>	Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier	12/09/2019 - 04:35 PM
<p>JULIO 2019:</p> <p>1.- Se realizó la actualización de claves catastrales de los predios afectados por la construcción del nuevo proyecto Paso Lateral de Guaranda, obteniendo un registro total del 60% de predios afectados, sin embargo nos resta por recopilar información de la parte afectada, con el fin de proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública, lo que faculta al MTOP liberar los predios afectados y arrancar con el inicio con el proceso de contratación de obra</p>	Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier	06/08/2019 - 09:52 AM
<p>JUNIO 2019:</p> <p>1.- Se realizó la actualización de claves catastrales de los predios afectados por la construcción del nuevo proyecto Paso Lateral de Guaranda, obteniendo un registro total del 60% de predios afectados, sin embargo nos resta por recopilar información de la parte afectada, con el fin de proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública, lo que faculta al MTOP liberar los predios afectados y arrancar con el inicio con el proceso de contratación de obra.</p>	Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier	04/07/2019 - 08:40 AM
<p>MAYO 2019</p> <p>1.- Se realizó la actualización de claves catastrales de los predios afectados por la construcción del nuevo proyecto Paso Lateral de Guaranda, obteniendo un registro total del 60% de predios afectados, sin embargo nos resta por recopilar información de la parte afectada, con el fin de proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública, lo que faculta al MTOP liberar los predios afectados y arrancar con el inicio con el proceso de contratación de obra.</p>	Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier	04/06/2019 - 10:10 AM
<p>ABRIL 2019</p> <p>1.- Se realizó la actualización de claves catastrales de los predios afectados por la construcción del nuevo proyecto Paso Lateral de Guaranda, obteniendo un registro total del 60% de predios afectados, sin embargo nos resta por recopilar información de la parte afectada, con el fin de proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública, lo que faculta al MTOP liberar los predios afectados y arrancar con el inicio con el proceso de contratación de obra.</p>	Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier	09/05/2019 - 04:17 PM
<p>MARZO 2019</p> <p>1.- Se realizó la actualización de claves catastrales de los predios afectados por la construcción del nuevo proyecto Paso Lateral de Guaranda, obteniendo un registro total del 60% de predios afectados, sin embargo nos resta por recopilar información de la parte afectada, con el fin de proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública, lo que faculta al MTOP liberar los predios afectados y arrancar con el inicio con el proceso de contratación de obra.</p>	Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier	05/04/2019 - 12:20 PM
<p>FEBRERO 2019</p> <p>1.- Se realizó la actualización de claves catastrales de los predios afectados por la construcción del nuevo proyecto Paso Lateral de Guaranda, obteniendo un registro total del 60% de predios</p>	Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier	01/03/2019 - 02:21 PM

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
afectados, sin embargo nos resta por recopilar información de la parte afectada, con el fin de proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública, lo que faculta al MTOP liberar los predios afectados y arrancar con el inicio con el proceso de contratación de obra.		
ENERO 2019  1.- Se realizó la actualización de claves catastrales de los predios afectados por la construcción del nuevo proyecto Paso Lateral de Guaranda, obteniendo un registro total del 60% de predios afectados, sin embargo nos resta por recopilar información de la parte afectada, con el fin de proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública, lo que faculta al MTOP liberar los predios afectados y arrancar con el inicio con el proceso de contratación de obra.	Lara Villacis, Ligia Elena	05/02/2019 - 09:44 AM

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

## LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Chimbo
2	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Guaranda
3	Zona 5 - Litoral > Bolívar > San Miguel

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	1-Solicitud de Información	01/08/2018		01/08/2018		Sí	5.0
2	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado	1-Solicitud de Información	16/08/2018		16/08/2018		Sí	5.0
3	PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida	1-Solicitud de Información	20/08/2018		20/08/2018		Sí	2.0
4	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	1-Solicitud de Información	11/01/2019		11/01/2019		Sí	2.0
5	PLANEACIÓN: Programación presupuestaria aprobada (Patrocinador Ejecutivo)	1-Solicitud de Información	29/01/2019		29/01/2019		Sí	2.0
6	PLANEACIÓN: Acta de constitución del proyecto aprobada	1-Solicitud de Información	30/05/2019		30/05/2019		Sí	2.5
7	PLANEACIÓN: Aval aprobado	1-Solicitud de Información	30/05/2019		30/05/2019		Sí	2.0
8	EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada	1-Solicitud de Información	25/06/2019		25/06/2019		Sí	1.0
9	EJECUCIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	1-Solicitud de Información	25/06/2019		25/06/2019		Sí	1.0
10	EJECUCIÓN: Términos de Referencia aprobados	2-Publicación de Pliegos	28/09/2019		28/09/2019		Sí	1.0
11	EJECUCIÓN: Adjudicación realizada	3-Adjudicación	15/11/2019		15/11/2019		Sí	2.0
12	EJECUCIÓN: Contrato Principal y/o Complementario suscrito/Anticipo Entregado	4-Inicio de Trabajo	25/09/2020		25/09/2020		Sí	3.0
13	EJECUCIÓN: Notificación a afectados Enero 2021, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2021		31/01/2021		Sí	1.0


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
14	EJECUCIÓN: ESTABILIZACIÓN TALUDES ABS 10+800-12+173 PASO LATERAL GUARANDA	5-Entregables Intermedios	25/02/2021	31/07/2022			No	8.0
15	EJECUCIÓN: PUENTE SALINAS	5-Entregables Intermedios	27/02/2021	31/07/2022			No	5.0
16	EJECUCIÓN:TRÁMITE Y PAGO DE EXPROPIACIONES I	5-Entregables Intermedios	31/03/2021		31/12/2021		Sí	0.2
17	EJECUCIÓN: PASO SUPERIOR 12+330 LATERAL GUARANDA	5-Entregables Intermedios	05/04/2021	31/07/2022			No	3.0
18	EJECUCIÓN: PASO SUPERIOR 2+660 LATERAL GUARANDA	5-Entregables Intermedios	05/04/2021	31/07/2022			No	3.0
19	EJECUCIÓN: PASO SUPERIOR 0+566 LATERAL GUARANDA	5-Entregables Intermedios	05/04/2021	31/07/2022			No	4.0
20	EJECUCIÓN: ESTABILIZACIÓN TALUDES ABS 2+500-2+850 PASO LATERAL GUARANDA	5-Entregables Intermedios	30/04/2021	31/07/2022			No	0.2
21	EJECUCIÓN: ESTABILIZACIÓN TALUDES ABS 3+250-4+413 PASO LATERAL GUARANDA	5-Entregables Intermedios	30/04/2021	31/07/2022			No	0.2
22	EJECUCIÓN: ESTABILIZACIÓN TALUDES ABS 5+200-5+618 PASO LATERAL GUARANDA	5-Entregables Intermedios	30/04/2021	31/07/2022			No	0.2
23	EJECUCIÓN:ESTABILIZACIÓN TALUDES 5+826-7+657 PASO LATERAL GUARANDA	5-Entregables Intermedios	30/04/2021	31/07/2022			No	0.2
24	EJECUCIÓN: ESTABILIZACIÓN TALUDES ABS 7+850-8+586 PASO LATERAL GUARANDA	5-Entregables Intermedios	30/04/2021	31/07/2022			No	0.2
25	EJECUCIÓN:ESTABILIZACIÓN TALUDES ABS 8+843-9+955 PASO LATERAL GUARANDA	5-Entregables Intermedios	30/04/2021	31/07/2022			No	7.1
26	EJECUCIÓN: Convenio de Pago suscrito	5-Entregables Intermedios	22/05/2021	31/07/2022			No	0.1
27	EJECUCIÓN: ILUMINACION PASO LATERAL GUARANDA	5-Entregables Intermedios	05/09/2021	31/07/2022			No	4.6
28	EJECUCIÓN: DRENAJE (OBRAS DE ARTE MENOR)	5-Entregables Intermedios	25/10/2021	31/07/2022			No	2.0
29	EJECUCIÓN: SEÑALIZACION PASO LATERAL GUARANDA	5-Entregables Intermedios	12/11/2021	31/07/2022			No	2.0
30	EJECUCIÓN: EXPROPIACIONES PASO LATERAL GUARANDA	5-Entregables Intermedios	12/11/2021	31/07/2022			No	5.0
31	EJECUCIÓN:MEDIDAS AMBIENTALES PASO LATERAL DE GUARANDA	5-Entregables Intermedios	12/11/2021	31/07/2022			No	4.0
32	EJECUCIÓN: OBRAS PRELIMINARES PASO LATERAL GUARANDA	5-Entregables Intermedios	15/11/2021	31/07/2022			No	5.0
33	EJECUCIÓN: Fiscalizacion del Paso Lateral de Guaranda.	5-Entregables Intermedios	19/11/2021	31/07/2022			No	5.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
34	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	5-Entregables Intermedios	22/11/2021	31/12/2024		▼	No	1.0
35	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	5-Entregables Intermedios	26/11/2021	31/12/2024		▼	No	1.0
36	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	29/11/2021	31/12/2024		▼	No	1.0
37	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	21/12/2021	31/12/2024		▼	No	1.0
38	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	22/12/2021	31/12/2024		▼	No	2.0
39	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	V - Verificación ejecutiva	23/12/2021	31/12/2024		▼	No	1.0
40	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	V - Verificación ejecutiva	24/12/2021	31/12/2024		▼	No	1.0
41	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	V - Verificación ejecutiva	27/12/2021	31/12/2024		▼	No	1.0
42	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	Z - Compromiso Ministerial	31/12/2021	31/12/2024		▼	No	2.5

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance físico de la obra.		100.00 %	0.02	0.02	01/04/2020	Abr-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	189,845.54 **
Costo Total:	55,460,277.01
Total Devengado:	163,560.82
% Costo Total Devengado:	0.29 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 0.29 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	42,805,855.26	0.00	0.00	42,805,855.26
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	39,590,560.33	12,519,839.71	0.00	52,110,400.04
Ppto. Codificado	27,740,309.75	8,670,847.89	0.00	36,411,157.64
Ppto. Comprometido	194,450.53	89,719.21	0.00	284,169.74
Planeado - Codificado (2022)		-8,670,847.89		
Programado a Devengar	27,740,309.75	26,284.72	0.00	27,766,594.47
Ppto. Devengado	163,560.82	0.00	0.00	163,560.82
Pagado Real	163,560.82	89,719.21	0.00	253,280.03
Estimado a fin de año	* 163,560.82	0.00	0.00	163,560.82
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	27,576,748.93	26,284.72	0.00	27,603,033.65
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.59 %	0.00 %	0.00 %	0.59 %
Ppto. Codificado 998	27,483.44	151,008.18	0.00	178,491.62
Ppto. Devengado 998	11,642.68	12,223.56	0.00	23,866.24

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022

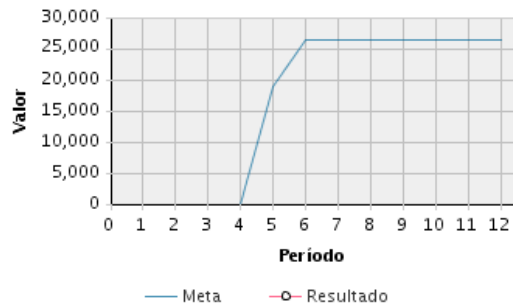

Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	18,755.06		18,755.06				
Jun	7,529.66		26,284.72				
Jul	0.00		26,284.72				
Ago	0.00		26,284.72				
Sep	0.00		26,284.72				
Oct	0.00		26,284.72				
Nov	0.00		26,284.72				
Dic	0.00		26,284.72				
<b>Total</b>	<b>26,284.72</b>						

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
18	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada,

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1. SOLICITUD DE GESTION PARA OBTENER LA AUTORIZACION DE INICIO DE ETAPA PRECONTRACTUAL PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA PASO LATERAL DE GUARANDA.	A1._mtop-ddb-2019-1569-me_fase_precontractual.pdf	18/03/2020
2	A10. CONTRATO MODIFICATORIO PASO LATERAL GUARANDA	Contrato_Modificadorio_Paso_Lateral.pdf	27/05/2020
3	A2. APROBACIÓN DE INICIO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA PASO LATERAL DE GUARANDA	A2._MTOPE-SUBZ5-2019-1407-ME_Aprobación_Fase_Preparatoria.pdf	18/03/2020
4	A2.1. DOCUMENTOS HABILITANTES PARA LA CONTRATACIÓN DE L PASO LATERAL DE GUARANDA.	A2.1._Memorandos_habilitantes.PDF	18/03/2020
5	A3. Aprobación de Especificaciones Técnicas	Aprobación_Especificaciones_Técnicas.PDF	06/02/2020
6	A4. Certificación Presupuestaria Plurianual	Anexo_9.-_Certificación_Presupuestaria.PDF	06/02/2020
7	A5. Certificación de Inclusión al PAI 2019	Anexo_8.-_Certificación_Inclusion_PAI_2019.PDF	06/02/2020
8	A6. Contrato Paso Lateral de Guaranda	Contrato_Paso_Lateral_de_Guaranda.PDF	06/02/2020
9	A7. Cédula Presupuestaria del Proyecto al año 2020	cedula_presupuestaria.pdf	06/02/2020
10	A8. Dictamen de Prioridad SENPLADES	Anexo_3.-_Dictamen_Prioridad_Senplades.PDF	06/02/2020
11	A9. Resolución de Adjudicación	Resolucion_Adjudicación__Nro._242-2019.PDF	06/02/2020
12	B1. Solicitud de AVAL	Anexo_7.-_Solicitud_de_Aval.PDF	06/02/2020
13	B2. PROYECTO EN FORMATO SENPLADES	Marco_lógico_Paso_Lateral_de_Guaranda.doc	03/04/2020
14	B3. CRPONOGRAMA VALORADO DEL PROYECTO	Anexo_5._formato_cronograma_valorado._Paso_L._Guaranda.doc	03/04/2020
15	B4. CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2020	enero_paso_lateral.pdf	09/05/2020
16	B5. CEDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2020	febrero_paso_lateral.pdf	09/05/2020
17	B6. CEDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2020	marzo_paso_lateral.pdf	09/05/2020
18	B7. CEDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2020	abril_paso_lateral.pdf	09/05/2020
19	B8. Cédula Presupuestaria Año 2018	CEDULA_PRESUPUESTARIA_DEL_PASO_LARERAL_GUARANDA_2018.pdf	09/05/2020

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
20	B9. Cédula Presupuestaria Año 2019	CEDULA_PRESUPUESTARIA_DEL_PASO_LARERAL_GUARANDA-2019.pdf	03/06/2020
21	C1. REPORTE ENTREGA DE ANTICIPO DEL PASO LATERAL DE GUARANDA	Anticipo_Paso_Lateral.pdf	03/12/2020
22	C2. CEDULA PRESUPUESTARIA PAGO JUNIO	PASO_LATERAL_JUNIO.pdf	05/08/2021
23	C3. CEDULA PRESUPUESTARIA PAGO JULIO 2021	PASO_LATERAL_JULIO.pdf	05/08/2021
24	C4. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZO, COMUNICACION DE PAGOS DE EXPROPIACIÓN MTOP-CONS_BOL-2021-434-ME	PASO_LATERAL_MTOP-CONS_BOL-2021-434-ME.pdf	05/08/2021
25	C5. CÉDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2021	PASO_LATERAL.PDF	01/09/2021
26	C6. Cedula Presupuestaria Septiembre 2021	cedula_presupuestaria_septiembre.pdf	05/10/2021
27	C7. CEDULA PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2021	Cedula_Presupuestaria_Octubre_2021.pdf	04/11/2021
28	C8. CEDULA PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 2021	REPORTE_PASO_LATERAL_DE_NOVIEMBRE.pdf	03/12/2021
29	C9. Documento respaldo cierre de riegos del Proyecto Paso Lateral de Guaranda.	MTOP-DDB-21-291-OF.pdf	28/12/2021
30	D1. CEDULA PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2021	cedula_presupuestaria_diciembre_2021.pdf	05/01/2022
31	D2. CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO A ABRIL 2022	Cedula_presupuestaria_Enero_a_Abril_2022.pdf	03/06/2022
32	D3. CEDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2022	Cedula_Presupuestaria_Mayo_2022.pdf	03/06/2022
33	D4. CEDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2022	reporte_paso_lateral_guaranda_mes_junio.pdf	05/07/2022
34	D5. Acta de levantamiento de suspensión temporal Nro. 2	ACTA_DE_LEVANTAMIENTO_DE_SUSPENCION.pdf	01/09/2022
35	D6. Informe ejecutivo estado actual Paso Lateral de Guaranda Agosto 2022	Informe_ejecutivo_Paso_Lateral_30-Agosto-2022-signed.pdf	01/09/2022

### EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Barzallo Romero, Rafael Marcelo	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Bolívar	Director Distrital de Bolívar	rbarzallo@mtop.gob.ec	
Flores Solano, Antonio Guillermo	Supervisor	Supervisor de Construcciones de Bolívar	aflores@mtop.gob.ec	023974600
Pungaña Zaruma, Sergio Washington	Fiscalizador	Supervisor de Conservación Vial de Bolívar	spungana@mtop.gob.ec	023974600

### FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
131264_1.jpg	28/12/2021
