

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas
PROYECTO: K003 Mi Hospital

Líder del Proyecto:	Boada Saavedra, Andrea Catalina (aboada@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Santamaría Loor, Kiura Ninoska	Programas Relacionados:	
Titular:	Romero Echeverría, Antonina de los Angeles	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	123200000.510.6303	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,877,235.04
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	03/08/2011 - 31/12/2023
Fecha de última actualización:	31/10/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2023
Modificado por:	Romero Echeverría, Antonina de los Angeles	Fecha del siguiente Hito:	07/11/2022

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN: Expansión de la capacidad de atención a nivel hospitalario (segundo y tercer nivel)

PRODUCTO / SERVICIO: Mejoramiento de los hospitales en infraestructura equipamiento y recurso humano

LÍNEA BASE: Expansión de la capacidad de atención a nivel hospitalario (segundo y tercer nivel)

OBJETIVO GENERAL: Contratar los Estudios Obra y Fiscalización de las unidades de salud contempladas bajo el Convenio Interinstitucional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Reestructurar y mejorar las áreas de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, modelo de gestión, comunicación y control de calidad.

Beneficios Cualitativos

Mejorar la calidad de vida de la población a través de la prestación de servicios de salud con calidad y calidez

Tipo de Beneficiario

1. Beneficiarios Directos 2,804,473.00

Beneficiarios Directos Femenino 1,374,191.00

Beneficiarios Directos Masculino 1,430,282.00

2. Beneficiarios Indirectos 2,816,024.00

Restricciones

TIEMPO: El tiempo de ejecución será el estipulado bajo las cláusulas contempladas en el convenio marco interinstitucional aproximadamente 12 años

COSTO : valor de la ficha SIPeIP 819,601,924.36


RECURSO: Materiales, Humanos y materiales

ALCANCE: Cumplir con las fases precontractual y contractual de estudios, obra y fiscalización según sea del caso (Hospitales y/o Centros de Salud)

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 90.60 %
Fecha de Inicio: 03/08/2011 **Fecha de Fin:** 31/12/2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

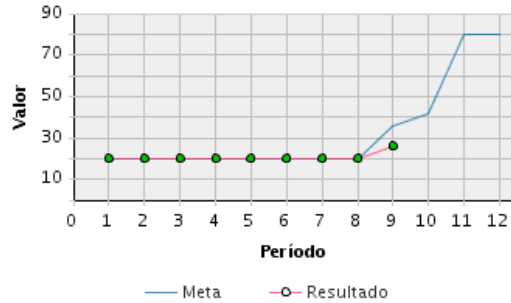

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	36 %	42 %	80 %	80 %
	Avance real acumulado											
	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	26 %			
	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mediante memorando Nro. MTOP-SOP-2022-1211-ME de 06 de septiembre de 2022, remitido por la Ing. Kiura Ninoska Santamaria Loor, SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS se realiza la designación de LÍDERES DE PROYECTO para proyectos inversión Ex-SECOB y Ecuador Estratégico E.P. en la herramienta GPR. Mediante memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-1985-ME, de 26 de septiembre de 2022, se realiza la solicitud información a las distintas Direcciones de la SOP, correspondiente a los contratos parte del proyecto MI HOSPITAL Modificación de los datos económicos del proyecto, debido a un incremento en los valores asignados según cédula presupuestaria de septiembre 2022. Se da cumplimiento de los siguientes Hitos. <p>Hito 1: convenio Interinstitucional</p> <p>Hito 2: Identificación de recursos asignados</p> <p>Hito 3: Solicitud de Información a las Direcciones de Fiscalización, Estudios y Obras perteneciente a la Subsecretaria de Obras Publica.</p> Se registra el devengado correspondiente al mes de Septiembre, se anexa Cedula Presupuestaria. 	Pinos Lopez, Maria Soledad	05/10/2022 - 09:31 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Retraso en la entrega de recursos para los distintos contratos	21/10/2022	Maria Soledad Pinos Lopez	10	10	1	1/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1- INTERNACIONAL.Económico. Limitada asignación de recursos por parte de las Entidades Requirentes causarían el retraso en los procesos de ejecución y entrega de obras de infraestructura pública.	05/10/2022	Antonina de los Angeles Romero Echeverria	10 %	10	1	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Carchi > Tulcán
2	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas
3	Zona 3 - Centro > Pastaza > Pastaza
4	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Guaranda
5	Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil
6	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICION: Firma de convenio Interinstitucional	Z - Compromiso Ministerial	03/08/2011		03/08/2011		Sí	10.0
2	PLANEACION: Identificación de recursos asignados	9-Entregables Formales	08/12/2011		08/12/2011		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN: Solicitud de información de contratos de estudios	1-Solicitud de Información	26/09/2022		26/09/2022		Sí	2.0
4	EJECUCIÓN: Solicitud de información de contratos de fiscalización	1-Solicitud de Información	26/09/2022		26/09/2022		Sí	2.0
5	EJECUCIÓN: Solicitud de información de contratos de obras	1-Solicitud de Información	26/09/2022		26/09/2022		Sí	2.0
6	PLANEACION: Identificación de recursos asignados	1-Solicitud de Información	30/09/2022	04/01/2023			No	10.0
7	EJECUCION : Determinación de contratos cerrados de fiscalización	5-Entregables Intermedios	11/10/2022	07/11/2022			No	2.0
8	EJECUCION : Determinación de contratos cerrados de obra	5-Entregables Intermedios	11/10/2022	08/11/2022			No	2.0
9	EJECUCIÓN Determinación de contratos cerrados de estudios	5-Entregables Intermedios	11/10/2022	07/11/2022			No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
10	EJECUCION : Determinación del estado de contratos pendientes	4-Inicio de Trabajo	01/11/2022	30/11/2022		▼	No	38.0
11	CIERRE : Firma de actas definitivas	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	01/01/2023	30/06/2023		▼	No	10.0
12	CIERRE : Informe de cierre de proyecto de inversión suscrito	9-Entregables Formales	07/01/2023	31/12/2023		▼	No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de informes de monitoreo y control de los procesos .		-	-	-	01/10/2022	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,877,235.04 **
Costo Total:	1,877,235.00
Total Devengado:	1,877,235.03
% Costo Total Devengado:	100.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 100.00 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	1,877,235.00	0.00	1,877,235.00
Ppto. Codificado	0.00	1,954,679.04	0.00	1,954,679.04
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2022)		-1,954,679.04		
Programado a Devengar	0.00	1,877,235.04	0.00	1,877,235.04
Ppto. Devengado	0.00	1,877,235.03	0.00	1,877,235.03
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	1,877,235.04	0.00	1,877,235.04
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	768,200.87	0.00	768,200.87
Ppto. Devengado 998	0.00	768,200.87	0.00	768,200.87

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	1,877,235.04	1,877,235.03	1,877,235.04	1,877,235.03	100.00 %		100.00 %
Ago	0.00	0.00	1,877,235.04	1,877,235.03	100.00 %		100.00 %
Sep	0.00	0.00	1,877,235.04	1,877,235.03	100.00 %		100.00 %
Oct	0.00		1,877,235.04				
Nov	0.00		1,877,235.04				
Dic	0.00		1,877,235.04				
Total	1,877,235.04	1,877,235.03					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

1	Incrementar el desarrollo de estudios de Obras Públicas requeridos por las entidades de la administración gubernamental, MEDIANTE la administración y supervisión de los procesos en la fase preparatoria de contratación de obras publicas, bajo la normativa y especificaciones técnicas.
---	---

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL	01._MSP-US-2011-00055.pdf	08/09/2022
2	A.2 Ficha_Proyecto-SIPrIP	02.Ficha_Proyecto-SIPrIP.pdf	08/09/2022
3	A.3 Memorando de solicitud de informacion MTOP-DNEOP-2022-1985-ME	Solicitud_de_Informacion_MTOP-DNEOP-2022-1985-ME_(1).pdf	05/10/2022
4	A.4 CEDULA PRESUPUESTARIA SEP- 2022 - INCREMENTO	09_Cedula_Septiembre.pdf	03/10/2022
5	A.5 Respaldo de cumplimiento de la acción del Riesgo	Solicitud_de_Informacion_MTOP-DNEOP-2022-1985-ME_(1).pdf	05/10/2022
6	A6. Designación de nuevo lider de proyecto Oct 2022	Memorando_Nro._MTOP-SOP-2022-1395-ME.pdf	13/10/2022

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Pinos Lopez, Maria Soledad	Lider de Proyecto	Analista de Transporte Ferroviario 2	mspinosa@mtop.gob.ec	
Romero Echeverría, Antonina de los Angeles	Directora Nacional de Estudios de Obras Públicas	Director/a Nacional Estudios de Obras Públicas	Aaromero@mtop.gob.ec	
Santamaría Loor, Kiura Ninoska	Subsecretaria de Obras Publicas	Subsecretaria de Obras Públicas	ksantamaria@mtop.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
150608_1.jpg	28/09/2022
