

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Zonal 6**  
**Dirección de Transporte y Obras Públicas Distrital Cañar**

**PROYECTO: K019** MTOP - Rehabilitación y mantenimiento de los caminos vecinales Ducur-Gualleturo de 21 Km y Jalupata-Chontamarca de 4 Km

Líder del Proyecto:	Dután Sanango, Italo Medardo (imdutan@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Barsallo Chavez, Luis Mario	Programas Relacionados:	Provincia - Cañar, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES: DUCUR-GUALLETURO 21 KM. Y JALUPATA-CHONTAMARCA 4 KM., SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Barsallo Chavez, Luis Mario	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	14,674,214.16
CUP:	175200000.0000372186	TIR:	13.82 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	1,328,135.58
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	16,832,395.38
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	24/10/2012 - 31/12/2022
Fecha de última actualización:	13/10/2022	Fecha de Fin Base:	20/10/2014
Modificado por:	Cifuentes Vasquez, Diana Carolina	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2018

**DATOS GENERALES**

Descripción
<p>DESCRIPCION:</p> <p>REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DUCUR-GUALLETURO DE 21KM Y JALUPATA-CHONTAMARCA DE 4KM</p> <p>CONTRATISTA : PROGECON S.A.</p> <p>FISCALIZADOR: IRIGOYEN</p> <p>SERVICIO: Mejorada la calidad de vida de los habitantes de la Zona de influencia al contar con una vía a nivel de capa asfáltica</p> <p>LINEA BASE: A lo largo del proyecto, Las viviendas están concentradas en las cercanías de los centros comunales y otras dispersas. Para la construcción de las viviendas se usa principalmente el cemento, ladrillo, bloque, techos de eternit, ardex, teja vidriada de fibra plástica. Las casas son de variados modelos y colores, en algunos casos modelos adoptados de las ciudades con espacios de parqueaderos, corredores amplios, todas las comodidades y lujos que en un gran porcentaje de población el dinero de la migración puede ofrecer; construcciones de tipo tradicional queda aproximadamente un 10%.</p> <p>OBJETIVO GENERAL: Mejorar la capacidad de circulación en la vía, imagen y seguridad, de la comunidad con la dotación de infraestructura vial en buen estado.</p> <p>OBJETIVOS ESPECIFICOS:</p> <p>1.1Obras Preliminares terminadas.  1.2Terracería realizada  1.3Drenajes concluidos  1.4Calzada construida.  1.5Señalización realizada.  1.6 Obras de manejo ambiental realizadas.  1.7Estabilización de Taludes efectuados.</p>

**Beneficios Cualitativos**

Reduccion de los costos del traslado en las vias, mejorar la calidad de vida de la poblacion, incremento del comercio y turismo en la zona.

**Tipo de Beneficiario**

Poblacion Regional

**Restricciones**


Tiempo: El plazo para la ejecución del mProyecto es de 1633 días, los mismos que se ampliana hasta el 11 de agosto de 2017.  
 Costo: El valor de la rehabilitacion de los caminos vecinales es de 14.116.586,53.  
 Alcance: Se espera contar con un camino vecinal con 21 y 4 km en pavimento flexible, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos que transitan por la misma.  
 Recursos: Equipo caminero y personal calificado por parte de la Empresa progecon, los mismos que son controlados por un peronal de Fiscalización de la Compañia Irigyen hasta el 30/10/2015, a partir de est fecha lo realizan personal Técnico del MTOP- cAÑAR, se emplean equipo de laboratorio de suelos, los materiales se extraen de la mina Santa Marianita.

Fase Actual:

- Anteproyecto
- Definición
- Planeación
- Ejecución**
- Cierre
- Completado
- Congelado
- Cancelado

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 98.36 %  
 Fecha de Inicio: 24/10/2012      Fecha de Fin: 31/12/2022

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Septiembre 2022  Se ha tramitado la última planilla del proyecto, considerando las recomendaciones hechas por la Contraloría General en el informe final de auditoría Interna efectuado al proyecto, la misma que no ha sido pagada por falta de entrega de Facturas por parte del Contratista, a quien se le ha realizado varias insistencias a fin de que se presenten las facturas para proceder con el pago.	Castro Vásquez, Luis Alberto	04/10/2022 - 09:24 AM
Agosto 2022  Se ha tramitado la última planilla del proyecto, considerando las recomendaciones hechas por la Contraloría General en el informe final de auditoría Interna efectuado al proyecto, la misma que no ha sido pagada por falta de entrega de Facturas por parte del Contratista.	Ramirez Cabrera, Paul Esteban	01/09/2022 - 03:52 PM
JULIO 2022  Se ha tramitado la última planilla del proyecto, considerando las recomendaciones hechas por la Contraloría General en el informe final de auditoría Interna efectuado al proyecto, la misma que no ha sido pagada por falta de entrega de Facturas por parte del Contratista.	Ramirez Cabrera, Paul Esteban	05/08/2022 - 08:34 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>DICIEMBRE 2018</b> Se ha tramitado la última planilla del proyecto, considerando las recomendaciones hechas por la Contraloría General en el informe final de auditoría Interna efectuado al proyecto, la misma que no ha sido pagada por falta de entrega de Facturas por parte del Contratista. La Contratista ha solicitado la recepción definitiva del proyecto el 10 de diciembre de 2018. El 06 de junio de 2018 se firma el acta de recepción definitiva del contrato.</p>	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	03/01/2019 - 03:07 PM
<p><b>NOVIEMBRE 2018</b> Se ha tramitado la última planilla del proyecto, considerando las recomendaciones hechas por la Contraloría General en el informe final de auditoría Interna efectuado al proyecto, la misma que no ha sido pagada por falta de entrega de Facturas por parte del Contratista. La Contratista ha iniciado los trabajos de pintura termoplástica para la señalización horizontal., así como la intervención del asentamiento en el km 3+100 El 06 de junio de 2018 se firma el acta de recepción definitiva del contrato.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	05/12/2018 - 04:40 PM
<p><b>OCTUBRE 2018</b> Se ha tramitado la última planilla del proyecto, considerando las recomendaciones hechas por la Contraloría General en el informe final de auditoría Interna efectuado al proyecto, la misma que no ha sido pagada por falta de entrega de Facturas por parte del Contratista. La Contratista ha iniciado los trabajos de pintura termoplástica para la señalización horizontal. El 06 de junio de 2018 se firma el acta de recepción definitiva del contrato.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	05/11/2018 - 03:43 PM
<p><b>SEPTIEMBRE 2018</b> Se ha tramitado la última planilla del proyecto, considerando las recomendaciones hechas por la Contraloría General en el informe final de auditoría Interna efectuado al proyecto, la misma que no ha sido pagada por falta de entrega de Facturas por parte del Contratista. El 26 de septiembre de 2018, Especialistas de la subsecretaría zonal 6 realizan inspección técnica al asentamiento del km 3+100. El 06 de junio de 2018 se firma el acta de recepción definitiva del contrato.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	05/10/2018 - 09:17 AM
<p><b>AGOSTO 2018</b> Se ha tramitado la última planilla del proyecto, considerando las recomendaciones hechas por la Contraloría General en el informe final de auditoría Interna efectuado al proyecto, la misma que no ha sido pagada por falta de entrega de Facturas por parte del Contratista. El 06 de junio de 2018 se firma el acta de recepción definitiva del contrato.</p>	Buestan Toral, José Remigio	05/09/2018 - 03:57 PM
<p><b>JULIO 2018</b> Se ha tramitado la última planilla del proyecto, considerando las recomendaciones hechas por la Contraloría General en el informe final de auditoría Interna efectuado al proyecto, la misma que no ha sido pagada por falta de entrega de Facturas por parte del Contratista. El 06 de junio de 2018 se firma el acta de recepción definitiva del contrato.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	03/08/2018 - 10:20 AM
<p><b>MAYO 2018</b> Se ha tramitado la última planilla del proyecto, considerando las recomendaciones hechas por la Contraloría General en el informe final de auditoría Interna efectuado al proyecto, la misma que no ha sido pagada por falta de entrega de Facturas por parte del Contratista. El 27 de junio de 2018 se realiza una reunión en el despacho del Viceministerio, en donde se trato el tema de multas, y se resolvió que estas observaciones queden escritas en el acta de recepción provisional.</p>	Dután Sanango, Italo Medardo	05/07/2018 - 11:03 AM
<p><b>MAYO 2018</b> Se ha tramitado la última planilla del proyecto, considerando las recomendaciones hechas por la Contraloría General en el informe final de auditoría Interna efectuado al proyecto.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/06/2018 - 03:45 PM
<p><b>ABRIL 2018</b> La supervisión del proyecto se encuentra revisando la última planilla del proyecto, la Comisión de Recepción indico que existen observaciones en los trabajos realizados, los mismos que deben ser subsanados por la Contratista para proceder con la recepción provisional del Proyecto.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	04/05/2018 - 10:32 AM
<p><b>Marzo 2018</b> La Fiscalización del proyecto se encuentra revisando la última planilla del proyecto, la Comisión de Recepción indico que existen observaciones en los trabajos realizados, los mismos que deben ser subsanados por la Contratista para proceder con la recepción provisional del Proyecto.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/04/2018 - 12:06 PM
<p><b>Febrero 2018</b> La Fiscalización del proyecto continua realizando la última planilla del proyecto, por lo que no se ha procedido con la recepción provisional del Proyecto.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	23/03/2018 - 09:09 AM
<p><b>Enero 2018</b></p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	23/03/2018 - 09:06 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
La Contratista realiza las correcciones al proyecto de acuerdo a las observaciones hechas por la comisión, además el Fiscalizador del proyecto se encuentra realizando la liquidación económica del proyecto.		
Diciembre 2017 La Comisión técnica ha realizado observaciones en el recorrido realizado previo a la recepción provisional.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	23/03/2018 - 09:05 AM
NOVIEMBRE 2017 La Contratista ha solicitado la recepción Provisional del Proyecto, por lo que el Administrador del Contrato ha nombrado los miembros de la Comisión, los mismos que realizarán la inspección técnica el 08 de diciembre de 2017.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	04/12/2017 - 05:29 PM
OCTUBRE 2017 Con fecha 28 de septiembre de 2017, se reúne la Comisión del 451, y aprueba la ampliación de plazo por 46 días para el Proyecto, por lo que el plazo contractual termina el 13 de noviembre de 2017, se ejecutan trabajos de drenaje, colocación de carpeta asfáltica y señalización vertical.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	01/11/2017 - 10:21 AM
SEPTIEMBRE 2017 Con fecha 28 de septiembre de 2017, se reúne la Comisión del 451, y aprueba la ampliación de plazo por 46 días para el Proyecto, por lo que se levanta la suspensión del plazo y la contratista reinicia los trabajos en el proyecto, en la actualidad realizan la colocación de mezcla asfáltica para capa de rodadura, reconfiguración de base y cunetas.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/10/2017 - 11:30 AM
AGOSTO 2017 Con fecha 10 de agosto de 2017, se suspende el plazo de ejecución del Proyecto. La Dirección Distrital del Cañar ha solicitado se reúna la Comisión del 451 para determinar la ampliación o no del plazo solicitado por el contratista. En los 10 días del mes de agosto no hubo un avance de obra representativo.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/09/2017 - 05:27 PM
JULIO 2017 La Contratista Progecon S.A, realiza la colocación de base e imprimación previo a la colocación de carpeta asfáltica, construcción de cunetas de hormigón $f'c=180\text{ kg/cm}^2$ , los mismos que son controlados y supervisados por el personal del MTOP - Cañar. El avance de obra no es el adecuado, la Fiscalización ha exigido se inicie con la colocación de carpeta asfáltica.	García González, Mariana Alexandra	05/08/2017 - 08:15 AM
JUNIO 2017 La Contratista Progecon S.A, realiza la colocación de base e imprimación previo a la colocación de carpeta asfáltica, limpieza de cunetas y stock de materiales de base y agregados para carpeta asfáltica, los mismos que son controlados y supervisados por el personal del MTOP - Cañar.	García González, Mariana Alexandra	04/07/2017 - 03:05 PM
MAYO 2017 Se realiza trabajos de mantenimiento de la vía, como son limpieza de derrumbes para mantener habilitada la vía, puesto que las condiciones climáticas en la zona son desfavorables. La Fiscalización de la obra se realiza a partir de marzo 2017 por administración directa.	Guillen Luna, Andrés Ismael	01/06/2017 - 10:54 AM
Abril 2017 Se realiza trabajos de mantenimiento de la vía, como son limpieza de derrumbes para mantener habilitada la vía, puesto que las condiciones climáticas en la zona son desfavorables. La Fiscalización de la obra se realiza a partir de marzo 2017 por administración directa.	García González, Mariana Alexandra	05/05/2017 - 11:14 AM
MARZO 2017 Se reactiva el proyecto con fecha de 14 de marzo, en la reunión del 451 se aprobaron 150 días de plazo para la ejecución de la obra. La Compañía contratista está dando mantenimiento a la vía con la limpieza de varios derrumbes debido a la fuerte época invernal.	Guillen Luna, Andrés Ismael	04/04/2017 - 12:08 PM
FEBRERO 2017 La construcción de la obra se encuentra suspendida. Se han realizado las reformas respectivas para proceder con el pago de la planilla correspondiente al mes de Junio del 2015, desde la planilla de Julio en adelante no se pueden tramitar por cuanto no se ha legalizado la actualización de la legalización	Guillen Luna, Andrés Ismael	03/03/2017 - 12:11 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
La Compañía contratista esta dando mantenimiento a la via debido a la epoca invernal .		
ENERO 2017  La construcción de la obra se encuentra suspendida. Se han realizado las reformas respectivas para proceder con el pago de la planilla correspondiente al mes de Junio del 2015, desde la planilla de Julio en adelante no se pueden tramitar por cuanto no se ha legalizado la acutacion de la legalización La Compañía contratista esta dando mantenimiento a la via debido a la epoca invernal .	Guillen Luna, Andrés Ismael	03/02/2017 - 11:20 AM
DICIEMBRE 2016  La construcción de la obra se encuentra suspendida. Se han realizado las reformas respectivas para proceder con el pago de la planilla correspondiente al mes de Junio del 2015, desde la planilla de Julio en adelante no se pueden tramitar por cuanto no se ha legalizado la acutacion de la legalización	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/01/2017 - 06:54 PM
NOVIEMBRE 2016  La construcción de la obra se encuentra suspendida. Se han realizado las reformas respectivas para proceder con el pago de la planilla correspondiente al mes de Junio del 2015, desde la planilla de Julio en adelante no se pueden tramitar por cuanto no se ha legalizado la acutacion de la legalización	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/12/2016 - 11:30 AM
OCTUBRE 2016  La construcción de la obra se encuentra suspendida por la temporada invernal y falta de pagos. La compañía contratista esta realizando la limpieza de derrumbes en la via.	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/11/2016 - 06:10 PM
SEPTIEMBRE 2016  La construcción de la obra se encuentra suspendida por la temporada invernal y falta de pagos. La compañía contratista esta realizando la limpieza de derrumbes en la via.	Guillen Luna, Andrés Ismael	04/10/2016 - 07:25 PM
AGOSTO 2016:  La construcción de la obra se encuentra suspendida por la temporada invernal y falta de pagos. La compañía contratista esta realizando la limpieza de derrumbes en la via.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/09/2016 - 06:46 PM
JULIO 2016:  La construcción de la obra se encuentra suspendida por la temporada invernal y falta de pagos. La compañía contratista esta realizando la limpieza de derrumbes en la via.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	03/08/2016 - 11:27 AM
JUNIO 2016:  La construcción de la obra se encuentra suspendida por la temporada invernal y falta de pagos. La compañía contratista esta realizando la limpieza de derrumbes en la via.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/07/2016 - 12:17 PM
MAYO 2016:  La construcción de la obra se encuentra suspendida por la temporada invernal y falta de pagos. La compañía contratista esta realizando la limpieza de derrumbes en la via.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/07/2016 - 12:17 PM
ABRIL 2016:  La construcción de la obra se encuentra suspendida	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	02/05/2016 - 02:56 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
por la temporada invernal y falta de pagos. La compañía contratista esta realizando la limpieza de derrumbes en la vía.		
MARZO 2016:  La construcción de la obra se encuentra suspendida por la temporada invernal y falta de pagos. La compañía contratista esta realizando la limpieza de derrumbes en la vía.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/04/2016 - 08:37 PM
FEBRERO 2016:  La construcción de la obra se encuentra suspendida por la temporada invernal y falta de pagos. La compañía contratista esta realizando la limpieza de derrumbes.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/03/2016 - 04:40 PM
ENERO 2016:  La construcción de la obra se encuentra suspendida por la temporada invernal y falta de pagos.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/02/2016 - 10:30 AM
DICIEMBRE 2015:  La construcción de la obra se encuentra suspendida por la temporada invernal.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/01/2016 - 07:10 AM
NOVIEMBRE 2015:  La construcción de la obra se encuentra suspendida por la temporada invernal.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/12/2015 - 10:10 AM
OCTUBRE 2015:  Se continua la construcción de cunetas ,tambien la reconformación de base Clase 2 desde el puente del río Cañar hacia Gualleturo.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/11/2015 - 10:05 PM
SEPTIEMBRE 2015  Se continua la construcción de cunetas y muros de escollera, Reconformación de base Clase 2 desde el puente del río Cañar hacia Gualleturo.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/10/2015 - 04:09 PM
AGOSTO 2015  Se esta construyendo cunetas y muros de escollera, Reconformación de base Clase 2 en la Abscisa 16+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/09/2015 - 11:43 AM
JULIO 2015  Se esta construyendo cunetas y muros de escollera, Reconformación de base Clase 2 en la Abscisa 16+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/08/2015 - 01:42 PM
JUNIO 2015  Por la presencia de la temporada invernal. La empresa contratista esta realizando la limpieza de derrumbes en la carretera Ducur - Gualleturo.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/07/2015 - 02:55 PM
MAYO 2015  Por la presencia de la temporada invernal se esta realizando la limpieza de derrumbes en la carretera Ducur - Gualleturo.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	08/06/2015 - 11:40 AM
ABRIL 2015  Por la presencia de la temporada invernal se esta realizando la limpieza de derrumbes en la carretera Ducur - Gualleturo.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/05/2015 - 02:40 PM
MARZO 2015  Por la presencia de la temporada invernal se esta realizando la limpieza de derrumbes en la carretera Ducur - Gualleturo.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/04/2015 - 12:18 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>FEBRERO 2015</b></p> <p>Se esta realizando trabajos de terminacion de la calzada entre el Rio Cañar y Gualleturo.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	09/03/2015 - 09:24 AM
<p><b>ENERO 2015</b></p> <p>Se termino la fundición de la losa sobre el puente sobre el rio Cañar.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/02/2015 - 02:55 PM
<p><b>DICIEMBRE 2014</b></p> <p>S e continua con la construccion del puente sobre el rio Cañar, se esta armando la losa para su fundición.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/01/2015 - 10:55 AM
<p><b>NOVIEMBRE 2014</b></p> <p>S e continua con la construccion del puente sobre el rio Cañar, se esta armando el tablero para la fundición de la losa. Se continua con la colocación de asfalto en la carretera Ducur-Gualleturo.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/12/2014 - 02:58 PM
<p><b>OCTUBRE 2014</b></p> <p>S e continua con la construccion del puente sobre el rio Cañar, esta colocada las vigas y se esta armando el tablero para la fundición de la losa. Se continua con la colocación de asfalto en la carretera Ducur-Gualleturo.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	10/11/2014 - 08:50 AM
<p><b>SEPTIEMBRE 2014</b></p> <p>La compañía contratista continua con la colocacion de asfalto en la carretera Jalupata-Chontamarca y realiza limpieza de derrumbes en la carretera Ducur-Gualleturo.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/10/2014 - 11:54 AM
<p><b>AGOSTO 2014</b></p> <p>La compañía contratista continua con la colocacion de asfalto en la carretera Jalupata-Chontamarca y realiza limpieza de derrumbes en la carretera Ducur-Gualleturo.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/09/2014 - 08:11 PM
<p><b>JULIO 2014</b></p> <p>La compañía contratista esta realizando la colocacion de asfalto en la carretera Jalupata-Chontamarca y realiza limpieza de derrumbes en la carretera Ducur-Gualleturo. Esta pendiente la orden de cambio para la ampliacion del plazo, como tambien el incremento del costo de la obra.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/08/2014 - 10:07 PM
<p><b>JUNIO 2014</b></p> <p>La compañía contratista realiza la colocacion de base en la carretera Jalupata-Chontamarca y realiza limpieza de derrumbes en la carretera Ducur-Gualleturo.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	09/07/2014 - 10:21 PM
<p><b>MAYO 2014</b></p> <p>La compañía contratista realiza la limpieza de la via en la carretera Jalupata-Chontamarca y realiza estabilizacion de taludes y movimiento de tierras en la carretera Ducur-Gualleturo. En virtud de que la estacion invernal no deja avanzar de mejor manera.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/06/2014 - 04:09 PM
<p><b>ABRIL 2014</b></p> <p>La compañía contratista realiza la limpieza de la via en la carretera Jalupata-Chontamarca y realiza estabilizacion de taludes y movimiento de tierras en la carretera Ducur-Gualleturo..</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/05/2014 - 01:24 PM
<p><b>MARZO 2014</b></p> <p>La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de las carreteras: Ducur-Gualleturo y Jalupata-Chontamarca. Esta en tramite la legalizacion de la ampliacion del plazo debido a la fuerte estacion invernal.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/04/2014 - 08:23 AM



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>FEBRERO 2014</p> <p>Falta el libre aprovechamiento de la mina asignada al proyecto, por lo que se encuentran suspendidos los trabajos de la colocacion de la estructura del pavimento, ademas se ha solicitado la suspencion de trabajos por la compañía contratista debidoa la estacion invernal la misma se encuentra siendo analizada.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>07/03/2014 - 02:29 PM</p>
<p>ENERO 2014</p> <p>La contratista ha solicitado una ampliacion de plazo de 90 dias, la misma que se encuentra aprobada por la fiscalizacion y se encuentra en tramite. falta el libre aprovechamiento de la mina asignada al proyecto, por lo que se encuentran suspendidos los trabajos de la colocacion de la estructura del pavimento, ademas se ha solicitado la suspencion de trabajos la misma se encuentra siendo analizada.</p>	<p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p>	<p>07/03/2014 - 02:28 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2013</p> <p>La contratista ha solicitado una ampliacion de plazo de 90 dias, la misma que se encuentra aprobada por la fiscalizacion y se encuentra en tramite. falta el libre aprovechamiento de la mina asignada al proyecto, por lo que se encuentran suspendidos los trabajos de la colocacion de la estructura del pavimento.</p>	<p>Calle Bravo, Oscar Leonardo</p>	<p>07/01/2014 - 08:22 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2013</p> <p>La contratista ha solicitado una ampliacion de plazo de 90 dias, la misma que se encuentra aprobada por la fiscalizacion y se encuentra en tramite. Los trabajos se estan realizando acorde a una nueva reprogramacion</p>	<p>Calle Bravo, Oscar Leonardo</p>	<p>05/12/2013 - 03:19 PM</p>
<p>OCTUBRE 2013</p> <p>La contratista ha solicitado una ampliacion de plazo de 90 dias, la misma que se encuentra aprobada por la fiscalizacion y se encuentra en tramite. Los trabajos se estan realizando acorde a una nueva reprogramacion.</p>	<p>Calle Bravo, Oscar Leonardo</p>	<p>06/11/2013 - 03:14 PM</p>
<p>Septiembre 2013</p> <p>Se realiza colocacion de subbase en el km 2+300 al 3+000 y , movimiento de tierras en diferentes tramos de la carretera Ducur-Gualleturo y en jalupata -Chontamarca se realiza construccion de cabezales y se completa la estructura de la via a nivel de subbase.</p>	<p>Calle Bravo, Oscar Leonardo</p>	<p>04/10/2013 - 09:46 AM</p>
<p>AGOSTO 2013</p> <p>Los trabajos avanzan con retraso debido a que las condiciones climaticas en los meses Febrero a Junio fueron desfavorables, se realiza reuniones con el Director de Estudios del puente sobre el rio Cañar, para sugerir el desplazamiento de este 7 m aguas abajo.</p>	<p>Calle Bravo, Oscar Leonardo</p>	<p>04/10/2013 - 09:44 AM</p>
<p>JULIO 2013</p> <p>Los trabajos avanzan con retraso debido a que las condiciones climaticas en los meses Febrero a Junio fueron desfavorables, se realiza reuniones con el Director de Estudios del puente sobre el rio Cañar, para sugerir el desplazamiento de este 7 m aguas abajo.</p>	<p>Calle Bravo, Oscar Leonardo</p>	<p>05/08/2013 - 08:32 AM</p>
<p>JUNIO 2013</p> <p>Se termina el movimiento de tierras en la via Jalupata-Chontamarca, se relaiza colocacion de alcantarillas de via y se realiza escarificacion para llegar a nivel de proyecto. En la via Ducur-Gualleturo se realiza el movimiento de tierras.</p>	<p>Calle Bravo, Oscar Leonardo</p>	<p>05/07/2013 - 09:02 AM</p>
<p>MAYO 2013</p> <p>Ingresa la fiscalizacion contratada, y controla los trabajos de movimiento de tierras que realiza la contratista. El clima impide el normal desarrollo de los trabajos.</p>	<p>Calle Bravo, Oscar Leonardo</p>	<p>05/07/2013 - 09:00 AM</p>
<p>ABRIL 2013</p>	<p>Calle Bravo, Oscar Leonardo</p>	<p>05/07/2013 - 08:57 AM</p>



## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se inicia el movimiento de tierras en el camino Jalupata-Chontamarca, y se continua con el replanteo de la vía.		
MARZO 2013 Se continua con el replanteo de vía y se realiza mantenimiento emergente para seguridad de los usuarios.	Calle Bravo, Oscar Leonardo	05/07/2013 - 08:56 AM
FEBRERO 2013 la contratista realiza trabajos de replanteo de vía conjuntamente con el equipo de topografía del MTOP Cañar	Calle Bravo, Oscar Leonardo	05/07/2013 - 08:55 AM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

## LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACION: Inicio del proceso de contratación, realizada	2-Publicación de Pliegos	24/10/2012		24/10/2012		Sí	2.0
2	EJECUCION: Inicio de los trabajos, realizados	4-Inicio de Trabajo	20/02/2013		20/02/2013		Sí	2.0
3	PLANEACION: Firma del contrato, efectuado	3-Adjudicación	20/02/2013		20/02/2013		Sí	2.0
4	EJECUCION: , Obras Preliminares de la carretera Jalupata-Chontamarca, efectuada	5-Entregables Intermedios	30/08/2013		30/08/2013		Sí	6.0
5	EJECUCION: Obras Preliminares de la carretera Ducur - Gualleturo, efectuada	5-Entregables Intermedios	30/08/2013		30/08/2013		Sí	6.0
6	EJECUCION: Drenajes construidos en la carretera jalupata-Chontamarca, realizados	5-Entregables Intermedios	29/11/2013		29/11/2013		Sí	6.0
7	EJECUCION: Obras de Terracería concluidas en la carretera Jalupata-Chontamarca, realizada	5-Entregables Intermedios	29/11/2013		29/11/2013		Sí	6.0
8	EJECUCION: Estabilización de taludes en la carretera Ducur-Gualleturo realizado un 50%, realizado	5-Entregables Intermedios	30/12/2013		31/10/2014		Sí	3.0
9	EJECUCION: Construcción de la calzada del ejecutado en un 50% en la carretera Ducur-Gualleturo, realizado	5-Entregables Intermedios	20/10/2014		20/10/2014		Sí	6.0
10	EJECUCION: Construcción del puente sobre el río Cañar en un 50%, ejecutado	5-Entregables Intermedios	20/10/2014		20/10/2014		Sí	4.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
11	EJECUCION: Obras de Drenaje en la carretera Ducur-Gualleturo en un 50%, ejecutado	5-Entregables Intermedios	20/10/2014		20/10/2014		Sí	3.0
12	EJECUCION: Obras de terracería en la carretera Ducur-Gualleturo en un 50%, realizadas	5-Entregables Intermedios	20/10/2014		20/10/2014		Sí	3.0
13	EJECUCION: Terminacion de la construccion de la calzada de la carretera Jalupata-Chontamarca, realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	6.0
14	EJECUCION: Obras de terracería en la carretera Ducur-Gualleturo en un 100%, realizadas	5-Entregables Intermedios	21/11/2014		21/11/2014		Sí	3.0
15	EJECUCION: Construccion de la calzada en un 75% en la carretera Ducur-Gualleturo, realizado	5-Entregables Intermedios	29/11/2014		25/10/2017		Sí	7.0
16	EJECUCION: Construccion del puente sobre el rio Cañar en un 100%, realizado	5-Entregables Intermedios	19/12/2014		31/07/2015		Sí	3.0
17	EJECUCION: Estabilizacion de taludes en la carretera Ducur-Gualleturo un 100%, realizado	5-Entregables Intermedios	19/12/2014		01/11/2017		Sí	3.0
18	EJECUCION: Construccion de la calzada en un 100 % en la carretera Ducur-Gualleturo, realizado	5-Entregables Intermedios	20/12/2014		08/11/2017		Sí	6.0
19	EJECUCION: Obras de Drenaje en la carretera Ducur-Gualleturo en un 50%, realizado	5-Entregables Intermedios	20/12/2014		01/11/2017		Sí	3.0
20	EJECUCION: Señalización en la carretera Ducur-Gualleturo, realizado	5-Entregables Intermedios	20/12/2014		13/11/2017		Sí	4.0
21	EJECUCION: Señalización en la carretera jalupata-chontamarca, realizado	5-Entregables Intermedios	20/12/2014		31/07/2015		Sí	5.0
22	CIERRE: :Realizacion de la Recepcion Provisional de la obra, realizado	9-Entregables Formales	20/02/2015		06/06/2018		Sí	5.0
23	CIERRE: La liquidación económica de la obra, realizada	9-Entregables Formales	20/08/2015	31/12/2018			No	4.0
24	COMPLETADO: La Recepción Definitiva de la Obra, legalizada	9-Entregables Formales	20/08/2015	31/12/2018			No	2.0

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión Positiva: Trabajos de limpieza y estabilización de taludes	Padrón Saeteros, Gladys Paulina	{PR} - Provincia - CAÑAR	29/05/2017
2	Supervisión Negativa.- Deslizamiento de la vía en varios sectores.	Padrón Saeteros, Gladys Paulina	{PR} - Provincia - CAÑAR	27/12/2016
3	Supervisión Negativa - Obra paralizada falta de presupuesto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	23/06/2016

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
4	Supervisión Negativa - Obra no inicia - a los contratista no se le acredita el dinero	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/03/2016
5	Supervisión Negativa - Construcción en general en mal estado	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/09/2015
6	Supervisión Negativa - Obra con retrasos en el tramo Ducur-Gualleturo	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/11/2015
7	Supervisión Negativa retraso en lo planificado(tiempo)	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	26/07/2015
8	Proyecto en mal estado	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/02/2015
9	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	21/10/2014
10	Tendido y compactación de sub-base	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/07/2014
11	Limpieza de deslizamiento de tierra	González Zhinin, Víctor Stalin	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/01/2014

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	4,478,704.83
Estimado Al Fin Del Proyecto:	16,832,395.38 **
Costo Total:	14,674,214.16
Total Devengado:	16,457,024.35
% Costo Total Devengado:	112.15 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 112.15 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	20,145,779.77	2,497,135.43	0.00	22,642,915.20
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ppto. Aprobado Inicial</b>	<b>15,473,885.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,473,885.59</b>
Ppto. Codificado	22,779,530.31	2,497,135.43	0.00	25,276,665.74
Ppto. Comprometido	11,462,157.38	2,121,765.08	0.00	13,583,922.46
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
<b>Programado a Devengar</b>	<b>23,469,608.33</b>	<b>2,497,135.43</b>	<b>0.00</b>	<b>25,966,743.76</b>
Ppto. Devengado	14,335,259.95	2,121,764.40	0.00	16,457,024.35
Pagado Real	9,516,625.95	0.00	0.00	9,516,625.95
Estimado a fin de año	* 14,335,259.95	0.00	0.00	14,335,259.95
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	9,134,348.38	2,497,135.43	0.00	11,631,483.81
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 61.08 %	84.97 %	0.00 %	63.38 %
<b>Ppto. Codificado 998</b>	<b>3,777,879.15</b>	<b>150,148.45</b>	<b>0.00</b>	<b>3,928,027.60</b>
<b>Ppto. Devengado 998</b>	<b>3,511,467.23</b>	<b>0.05</b>	<b>0.00</b>	<b>3,511,467.28</b>

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022

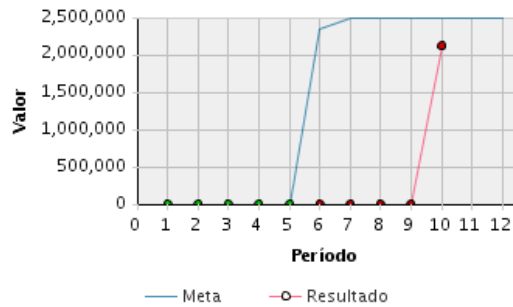

Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.00 %

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	2,346,986.98	0.00	2,346,986.98	0.00	0.00 %		0.00 %
Jul	150,148.45	0.00	2,497,135.43	0.00	0.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	2,497,135.43	0.00	0.00 %		0.00 %
Sep	0.00	0.00	2,497,135.43	0.00	0.00 %		0.00 %
Oct	0.00	2,121,764.40	2,497,135.43	2,121,764.40	84.97 %		84.97 %
Nov	0.00		2,497,135.43				
Dic	0.00		2,497,135.43				
<b>Total</b>	<b>2,497,135.43</b>	<b>2,121,764.40</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
16	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1-Informe sitop Julio 2014	C3-Inf-sitop-julio-04.pdf	05/08/2014
2	A2-Informe Sitop agosto 2014	C4-Inf-sitop-agosto-04.pdf	07/09/2014
3	A3-Informe-sitop-septiembre-2014	C5-Inf-sitop-septiembre-04.pdf	06/10/2014
4	A4- Informe sitop octubre 2014	C7-Inf-sitop-octubre-04.pdf	10/11/2014
5	A5-inf-sitop-noviembre-04	C8-Inf-sitop-noviembre-04.pdf	05/12/2014
6	A6-Inf-sitop-dic-04	C9-Inf-sitop-dic-04.pdf	06/01/2015
7	A7-Inf-sitop-ene-05	D1-Inf-sitop-ene-05.pdf	06/02/2015
8	A8-Inf-sitop-marzo	D3-Inf-sitop-marz-05-JC-DG.pdf	07/04/2015
9	A9-Inf-sitop-Abr-05	D4-Inf-sitop-abr-05JC-DG.pdf	08/05/2015
10	Acta 451 ampliación de plazo	ACTA_451_DUCUR_GUALLETURO-1.pdf	05/10/2017
11	Acta de recepcón provisional	ACTA_DUCUR_-_GUALLETURO.pdf	05/07/2018
12	Acta suspension de plazo	Acta_suspencion_de_plazo.pdf	28/12/2016
13	Autorización para ejecución de obras km 3+100 de la vía Ducur	MTOP-CONS_CAÑ-18-15-OF.pdf	05/11/2018
14	B2 Informe Sitop junio 05	Informe-sitop-05-Ducur-G.pdf	07/07/2015
15	B3-CONTRATO ORIGINAL	Contrato_Original.pdf	08/07/2015
16	B4-Inf-sitop-julio-2015-D-G-J-C	B4-Inf-Sitop-jul-05-D-G-J-C.pdf	07/08/2015
17	B5-OFICIO DICTAMEN DE PRIORIDAD SEMPLADES	17_SENPLADES-SZ6A-2012-0314-OF-DUCUR-GUALLETURO-DICTAMEN-PRIORIDAD.pdf	08/08/2015
18	B6-Informe-sitop-Ducur-Gualleturo-Agosto-05	Inf-sitop-Ducur-Guall-Agos-05.pdf	07/09/2015
19	B7-Informe-sitop-septiembre-05-Ducur-G	B7-Informe-sitop-septiembre-05-Ducur-G.pdf	07/10/2015
20	B8-Informe-sitop-octubre-05-D-G	B8-Inf-sitop-0ct-05-D-G.pdf	05/11/2015
21	B9-Inf-sitop-Nov-05-D-G	reconstruccion_de_la_ducur_galleturo.pdf	07/12/2015

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
22	C1-Inf-sitop-dic-D-G	C1-Inf-sitop-dic-D-G.pdf	06/01/2016
23	C2-Informe-sitop-ene-06-D-G	C2-Inf-sitop-ene-06-D-G.pdf	05/02/2016
24	C3-Inf-sitop-feb-06-D-G	C3_Inf-sitop-feb-06-D-G.pdf	07/03/2016
25	C4_Inf-sitop-marzo-06-D-G-J-CH	C4-Inf-sitop-mar-D-G-J-CH.pdf	04/04/2016
26	C5-Inf-sitop-abril-06-D-G-J-CH	C5-Inf-sitop-abril-06-D-G-J-CH.pdf	05/05/2016
27	C6-Inf-sitop-mayo-06-D_G_J_CH	C6-Inf-sitop-mayo-06-D_G_J_CH.pdf	05/06/2016
28	C7_Inf-sitop-junio-06-D-G-J-CH	C7-Inf-sitop-junio-06-D-G-J-CH.pdf	04/07/2016
29	C8-Inf-sitop-julio-06-D-G-J-CH	C8-Inf-sitop-julio-06-D-G-J-CH.pdf	04/08/2016
30	C9 informe sitop agosto	ducur_gualleturo.pdf	05/09/2016
31	CEDULA-REPORTE 2013	REPORTE_2013.pdf	30/12/2016
32	CEDULA-REPORTE 2014	REPORTE_2014.pdf	30/12/2016
33	CEDULA-REPORTE 2015	REPORTE_2015.pdf	30/12/2016
34	CEDULA-REPORTE 2016	REPORTE_2016.pdf	30/12/2016
35	Cédula presupuestaria mes de Julio 2017	CEDULA_JULIO_2017_DUCUR_GUALLETURO.pdf	05/08/2017
36	D1 informe sitop ducur gualleturo septiembre 2016	ducur_gualleturo.pdf	04/10/2016
37	D2 informe sitop octubre ducur gualleturo	DUCUR_GUALLETURO.pdf	05/11/2016
38	D3 Informe sitop ducur gualleturo noviembre 2016	Ducur_Gualleturo.pdf	05/12/2016
39	D4_informe_sitop_Dic_2016_Ducur_Gualleturo	ducur_gualleturo.pdf	06/01/2017
40	D5 Ducur Gualleruto	Ducur_Gualleruto.pdf	03/02/2017
41	D6 INFORME SITOP DUCUR GUALLETURO FEB 2017	Camino_Vecinales_Ducur_Gualleturo.pdf	03/03/2017
42	D7 INFORME SITOP DUCUR GUALLETURO MARZO 2017	DUCUR_GUALLETURO.pdf	05/04/2017
43	D8 INFORME SITOP DUCUR GUALLETURO ABRIL 2017	Informe_ejecutivo_ducur_abril_2017.pdf	05/05/2017
44	D9 INFORME SITOP DUCUR GUALLETURO MAYO 2017	DUCUR_GUALLETURO.pdf	02/06/2017
45	DEVOLUCIÓN DE PLANILLA UNILATERAL NRO.27	MTOP-CON_CAÑ-17-70-OF-1.pdf	05/09/2017
46	DEVOLUCIÓN DE PLANILLAS 28 Y 29	OFICIO_DEVOLUCIÓN_DE_LAS_PLANILLAS_28_Y_29_162017.pdf	05/09/2017
47	Informe Ampliacion de Plazo Fiscalizador	B9-INFORME_DE_PRORROGA_DE_PLAZO_FISCALIZACION.pdf	12/05/2014
48	Informe ejecutivo mes de octubre 2017	Informe_Ejecutivo_Ducur_Gualleturo.pdf	01/11/2017
49	Informe ejecutivo mes de agosto 2017	INFORME_EJECUTIVO_DUCUR_CONS.pdf	05/09/2017
50	Informe ejecutivo mes de Agosto 2018	Informe_ejecutivo_Ducur.pdf	05/09/2018
51	Informe ejecutivo mes de junio 2017	informe_Ducur.pdf	04/07/2017
52	Informe ejecutivo mes de marzo 2018	Informe_ejecutivo_Ducur.pdf	05/04/2018
53	Informe ejecutivo mes de noviembre 2018	informe_ejcutivo_noviembre.pdf	05/12/2018
54	Informe Ejecutivo sitop Abril 2013	A3.pdf	29/11/2013
55	Informe Ejecutivo Sitop Abril 2014	B7-Inf-Abr-04-sitop.pdf	12/05/2014
56	Informe Ejecutivo sitop Agosto 2013	A7.pdf	29/11/2013
57	Informe Ejecutivo Sitop Diciembre 2013	B3.pdf	06/01/2014
58	Informe Ejecutivo sitop Febrero 2013	A1.pdf	29/11/2013
59	Informe Ejecutivo sitop julio 2013	A6.pdf	29/11/2013
60	Informe Ejecutivo sitop junio 2013	A5.pdf	29/11/2013
61	Informe Ejecutivo sitop Marzo 2013	A2.pdf	29/11/2013
62	Informe Ejecutivo Sitop Marzo 2014	B6-Inf-mar-04-sitop.pdf	12/05/2014
63	Informe Ejecutivo sitop Mayo 2013	A4.pdf	29/11/2013
64	Informe Ejecutivo sitop mayo 2014	C1-Inf-sitop-mayo-04.pdf	04/06/2014
65	Informe Ejecutivo sitop Octubre 2013	A9.pdf	29/11/2013
66	Informe Ejecutivo sitop Septiembre 2013	A8.pdf	29/11/2013
67	Informe Geológico del Camino Vecinal Ducur Gualleturo.	INFORME_COMISION_12_05_2017.pdf	04/07/2017

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
68	Informe Sitop Enero 2014	B4.pdf	05/05/2014
69	Informe Sitop Febrero 2014	B5.pdf	05/05/2014
70	Informe Sitop mes de Noviembre 2013	A10.pdf	26/12/2013
71	Informe sobre ampliación de plazo solicitada	_respuesta_ampliacion_de_plazo.pdf	05/08/2017
72	Insistencia suscripción de Contrato Modificatorio, Constructora PROGECON S.A	MTOP-DDCA-2018-973-ME_DUCUR_SEPT.pdf	05/10/2018
73	oficio con informe de multas	MTOP-CONS_CAÑ-2018-80-ME_(CON_FIRMAY_ANEXO)_MULTAS_DUCUR.pdf	05/06/2018
74	Oficio contratista indicando que se han cumplido con las observaciones.	oficio_no_csp-001-2018.pdf	23/03/2018
75	Oficio convocatoria 451	MTOP-DDCA-2017-912-ME.pdf	05/10/2017
76	Oficio de Fiscalización respondiendo a las observaciones hechas al informe final.	oficio_ia-2294-2017.pdf	23/03/2018
77	Oficio de levantamiento de Suspensión de Plazo	Oficio_de_levantamiento_de_Suspension.pdf	05/10/2017
78	Oficio de respuesta a liquidación	5673.pdf	03/08/2018
79	Oficio devolución del informe final de Ingeniería	MTOP-DDCA-18-61-OF.pdf	23/03/2018
80	Oficio dirigido a la Comisión indicando que el Contratista ha cumplido con observaciones.	MTOP-DDCA-2018-49-ME-1.pdf	23/03/2018
81	Oficio ejecución de trabajos pendientes.	MTOP-CONS_CAÑ-18-12-OF.pdf	05/09/2018
82	OFICIO INFORME DE LA COMISION REFERENTE A LA RECEPCIÓN PROVISIONAL	oficio_Informe_comision.pdf	04/05/2018
83	Oficio nombramiento de la Comisión	MTOP-DDCA-2017-1137-ME.pdf	05/12/2017
84	oficio solicitud de reunión	SOLICITUD_REUNION_PROGECON.pdf	05/07/2018
85	Oficio solicitud de revisión de multas	MTOP-CGJ-2018-288-ME.pdf	23/03/2018
86	Orden de cambio 01	Orden_de_Cambio_01.pdf	28/12/2016
87	Orden de cambio 02	Orden_de_Cambio_02.pdf	28/12/2016
88	Orden de Cambio 03	Orden_de_Cambio_03.pdf	28/12/2016
89	Planilla 18	Planilla_18.pdf	28/12/2016
90	Planilla 20	Planilla_20.pdf	28/12/2016
91	Planilla 21	Planilla_21.pdf	28/12/2016
92	Planilla 21	Planilla_21.pdf	28/12/2016
93	Planilla 22	Planilla_22.pdf	28/12/2016
94	Planilla 23	Planilla_23.pdf	28/12/2016
95	Planilla 25	Planilla_25.pdf	28/12/2016
96	Planilla 26	Planilla_26.pdf	28/12/2016
97	Planilla 27 mes de octubre de 2015	Sabana_Pl_-27_Ducur_-_Gualleturo.pdf	01/11/2017
98	Planilla 28 mes de marzo de 2017	Planilla_Ducur_28.pdf	04/12/2017
99	Planilla 29 mes de abril de 2017	Planilla_Ducur_29.pdf	04/12/2017
100	Planilla 30 mes de mayo de 2017	Planilla_Ducur_30.pdf	04/12/2017
101	Planilla 31 mes de junio de 2017	Planilla_Ducur_31.pdf	04/12/2017
102	Planilla 32 mes de julio y agosto de 2017	Planilla_Ducur_32.pdf	04/12/2017
103	Planilla 33 de septiembre 2017	Planilla_33_Ducur.pdf	05/01/2018
104	Planilla 33A de septiembre 2017	Planilla_33A_Ducur.pdf	05/01/2018
105	Planilla 34 de Octubre 2017	Planilla_34_Ducur.pdf	05/01/2018
106	Planilla 34A de octubre 2017	Planilla_34A_Ducur.pdf	05/01/2018
107	PROYECTO DE SEMPLADES DUCUR-GUALLETURO	B1.docx	26/12/2013
108	PROYECTO DE SEMPLADES JALUPATA-CHONTAMARCA	B2.docx	26/12/2013
109	Retornar Trabajos de carpeta asfáltica	Tendido_de_carpeta_asfaltica.pdf	05/08/2017
110	Solicitud de ampliacion de plazo contratista	B8-SOLICITUD_PRORROGA_DE_AMPLIACION_DE_PLAZO_CONTRATISTA.pdf	12/05/2014



**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
111	solicitud de recepción definitiva.	solicitud_de_recepción_definitiva.pdf	03/01/2019
112	Suspensión de plazo	SUSPENSION_10-08-2017.pdf	05/09/2017

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Barsallo Chavez, Luis Mario	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretario/a Zonal 6	lbarsallo@mtop.gob.ec	
Castro Vásquez, Luis Alberto	Lider de Proyecto	Director de Transporte y Obras Públicas Distrital del Cañar	lcastro@mtop.gob.ec	
Castro Vásquez, Luis Alberto	Titular	Director de Transporte y Obras Públicas Distrital del Cañar	lcastro@mtop.gob.ec	

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
70111_1.jpg	05/04/2018
