

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Zonal 3
Dirección de Transporte y Obras Públicas Distrital Tungurahua

PROYECTO: K016 MTOP - Construcción de la carretera Cahuají- Pillate- Cotaló-Empalme (carretera Ambato- Baños) de 26,12 Km.

Líder del Proyecto:	Gamboa López, Enma Katherine (egamboa@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Chavez Lopez, Guillermo Javier	Programas Relacionados:	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJI-PILLATE-COTALO-EMPALME CARRETERA AMBATO-BANOS, Provincia - Tungurahua, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Rosero Freire, Carlos Ernesto	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	1.17
CUP:	175200000.21.6223	TIR:	14.73 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	8,086,330.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	61,464,906.59
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/11/2011 - 31/12/2022
Fecha de última actualización:	01/11/2022	Fecha de Fin Base:	01/02/2015
Modificado por:	Gamboa López, Enma Katherine	Fecha del siguiente Hito:	30/11/2022

DATOS GENERALES

Descripción

Convertido del Proyecto de Gasto Corriente I003 el 05/02/2015
 Convertido del Proyecto de Inversión K024 el 05/02/2015
 DESCRIPCION DEL PROYECTO: Ejecutar la construcción de la Carretera Cahuají- Pillate- Cotaló-Empalme (carretera Ambato- Baños), localizado entre las provincias de Tungurahua y Chimborazo y tener el vínculo entre las mismas provincias, en donde se contribuirá parte la comunicación terrestre, y que no sea afectada por el proceso eruptivo del volcán Tungurahua.
 Contratista: Compañía HIDALGO & HIDALGO
 Fiscalizador: Ing. Luis Sánchez Arévalo (MTOP)
 MONTO CONTRACTUAL: USD. 57'368.089,35
 MONTO DE FISCALIZACIÓN: 1'691.189,55
 PRODUCTO/SERVICIO: Mantener y mejorar el tiempo para trasladar personas, alimentos y productos necesarios para la economía nacional.
 LINEA BASE: Va a cambiar el estado actual de los habitantes y el proyecto va a influir cambiando y mejorando la vida de los habitantes.
 OBJETIVO GENERAL: Alcanzar mejor economía, educación y calidad de vida de la población.

Beneficios Cualitativos

El tiempo de desplazamiento se reducirá.
 El comercio va a mejorar en las dos provincias y el entorno de la región central
 Se va a contar con mayor seguridad vial para las personas que se trasladan de Chimborazo a Tungurahua.
 Se contribuye con la interconexión provincial y nacional.
 Facilitar el flujo turístico

Tipo de Beneficiario

- Turístico
- Industrial
- Agrícola
- Ganadero
- Comercio en general
- Desarrollo Urbano del sector


Restricciones

La repetida erupción de lahares del volcán Tungurahua, causa efectos en el normal desenvolvimiento de los trabajos

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	------------	------------------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 99.24 %
 Fecha de Inicio: 01/11/2011 Fecha de Fin: 31/12/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

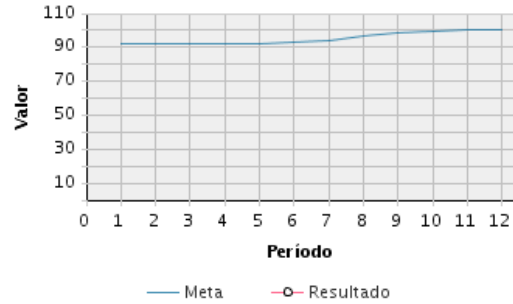

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	93 %	94 %	97 %	99 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2022</p> <p>Se cuenta con el visto bueno de la Coordinación Jurídica para el Convenio de Pago, actualmente se cuenta con recursos para proceder a solicitar la certificación y la elaboración de el convenio, y posterior legalización de pago, misma que se ya fue solicitada en proceso de revisión para su pago en el mes noviembre, puesto que se encuentra en control previo con disposición de pago</p>	Gamboa López, Enma Katherine	01/11/2022 - 11:27 AM
<p>SEPTIEMBRE 2022</p> <p>Se cuenta con el visto bueno de la Coordinación Jurídica para el Convenio de Pago, actualmente se cuenta con recursos para proceder a solicitar la certificación y la elaboración de el convenio, y posterior legalización de pago, misma que se ya fue solicitada en proceso de revisión para su pago en el mes de octubre</p>	Gamboa López, Enma Katherine	05/10/2022 - 05:28 PM
<p>AGOSTO 2022</p> <p>Se cuenta con el visto bueno de la Coordinación Jurídica para el Convenio de Pago, actualmente se cuenta con recursos para proceder a solicitar la certificación y la elaboración de el convenio, y posterior legalización de pago, misma que se ya fue solicitada en proceso de revisión para su pago en el mes de septiembre</p>	Rosero Freire, Carlos Ernesto	01/09/2022 - 02:20 PM
<p>JULIO 2022</p> <p>Se cuenta con el visto bueno de la Coordinación Jurídica para el Convenio de Pago, actualmente se cuenta con recursos para proceder a solicitar la certificación y la elaboración de el convenio, y posterior legalización de pago, misma que se solicitara en el mes de agosto según lo programado.</p>	Gamboa López, Enma Katherine	01/08/2022 - 10:11 AM
<p>JUNIO 2022</p> <p>Se cuenta con el visto bueno de la Coordinación Jurídica para el Convenio de Pago, actualmente a la espera de asignación de recursos para proceder a solicitar la certificación y la elaboración de el convenio, y posterior legalización de pago.</p>	Gamboa López, Enma Katherine	07/07/2022 - 12:24 PM
<p>MAYO 2022</p>	Gamboa López, Enma Katherine	03/06/2022 - 04:36 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se cuenta con el visto bueno de la Coordinación Jurídica para el Convenio de Pago, actualmente a la espera de asignación de recursos para proceder a solicitar la certificación y la elaboración de el convenio, y posterior legalización de pago.		
ABRIL 2022 Se cuenta con el visto bueno de la Coordinación Jurídica para el Convenio de Pago, actualmente a la espera de asignación de recursos para proceder a solicitar la certificación y la elaboración de el convenio, y posterior legalización de pago.	Gamboa López, Enma Katherine	02/05/2022 - 05:28 PM
MARZO 2022 Se cuenta con el visto bueno de la Coordinación Jurídica para el Convenio de Pago, actualmente a la espera de asignación de recursos para proceder a solicitar la certificación y la elaboración de el convenio, y posterior legalización de pago.	Gamboa López, Enma Katherine	04/04/2022 - 08:37 AM
FEBRERO 2022 Se cuenta con el visto bueno de la Coordinación Jurídica para el Convenio de Pago, actualmente a la espera de asignación de recursos para proceder a solicitar la certificación y la elaboración de el convenio, y posterior legalización de pago.	Gamboa López, Enma Katherine	02/03/2022 - 01:30 PM
ENERO 2022 Se cuenta con el visto bueno de la Coordinación Jurídica para el Convenio de Pago, actualmente a la espera de asignación de recursos para proceder a solicitar la certificación y la elaboración de el convenio, y posterior legalización de pago.	Gamboa López, Enma Katherine	01/02/2022 - 03:55 PM
DICIEMBRE 2019 Se encuentra en la Coordinación Jurídica el Convenio de Pago, para la revisión y aprobación, mismo que es necesario para poder liquidar el proyecto	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	04/01/2020 - 03:55 PM
NOVIEMBRE 2019 Se encuentra en la Coordinación Jurídica el Convenio de Pago, para la revisión y aprobación, mismo que es necesario para poder liquidar el proyecto	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	05/12/2019 - 08:15 AM
OCTUBRE 2019 Se encuentra en la Coordinación Jurídica el Convenio de Pago, para la revisión y aprobación, mismo que es necesario para poder liquidar el proyecto	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	04/11/2019 - 09:36 PM
SEPTIEMBRE 2019 Se encuentra en la Coordinación Jurídica el Convenio de Pago, para la revisión y aprobación, mismo que es necesario para poder liquidar el proyecto	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	03/10/2019 - 10:59 AM
AGOSTO 2019 Se encuentra en la Coordinación Jurídica el Convenio de Pago, para la revisión y aprobación, mismo que es necesario para poder liquidar el proyecto	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	04/09/2019 - 11:02 AM
JULIO 2019 Se encuentra en la Coordinación Jurídica el Convenio de Pago, para la revisión y aprobación, mismo que es necesario para poder liquidar el proyecto	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	01/08/2019 - 04:18 PM
JUNIO 2019 Se encuentra en la Coordinación Jurídica el Convenio de Pago, para la revisión y aprobación, mismo que es necesario para poder liquidar el proyecto	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	03/07/2019 - 10:32 AM
MAYO 2019 Se encuentra en la Coordinación Jurídica el Convenio de Pago, para la revisión y aprobación, mismo que es necesario para poder liquidar el proyecto	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	04/06/2019 - 11:22 AM
ABRIL 2019 Se encuentra en la Coordinación Jurídica el Convenio de Pago, para la revisión y aprobación, mismo que es necesario para poder liquidar el proyecto.	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	02/05/2019 - 03:48 PM
MARZO 2019	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	01/04/2019 - 08:42 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se encuentra en la Coordinación Jurídica el Convenio de Pago, para la revisión y aprobación, mismo que es necesario para poder liquidar el proyecto.		
FEBRERO 2019 Se encuentra en la Coordinación Jurídica el Convenio de Pago, para la revisión y aprobación, mismo que es necesario para poder liquidar el proyecto.	Rodríguez Martínez, Edison Fabian	01/03/2019 - 12:23 PM
ENERO 2019 Se encuentra en la Coordinación Jurídica el Convenio de Pago, para la revisión y aprobación, mismo que es necesario para poder liquidar el proyecto.	González Chávez, Alexandra del Rocio	05/02/2019 - 08:16 PM
DICIEMBRE 2018: Se encuentra en la Coordinación Jurídica el Convenio de Pago, para la revisión y aprobación, mismo que es necesario para poder liquidar el proyecto.	González Chávez, Alexandra del Rocio	04/01/2019 - 04:15 PM
NOVIEMBRE 2018: Se encuentra en la Coordinación Jurídica el Convenio de Pago, para la revisión y aprobación, mismos que es necesario para poder liquidar el proyecto.	González Chávez, Alexandra del Rocio	05/12/2018 - 03:56 PM
OCTUBRE 2018: Se encuentra en la Coordinación Jurídica el Convenio de Pago, para la revisión y aprobación, mismos que es necesario para poder liquidar el proyecto.	González Chávez, Alexandra del Rocio	05/11/2018 - 04:33 PM
SEPTIEMBRE 2018: Se encuentra en la Coordinación Jurídica el Convenio de Pago, para la revisión y aprobación para su aprobación, mimos que es necesario para poder liquidar el proyecto.	González Chávez, Alexandra del Rocio	05/10/2018 - 07:40 PM
AGOSTO 2018: Se encuentra en la Coordinación Jurídica el Convenio de Pago, para la revisión y aprobación para su aprobación, mimos que es necesario para poder liquidar el proyecto.	Galarza García, Diego Fernando	05/09/2018 - 06:30 PM
JULIO 2018: Se encuentra en la Coordinación Jurídica el Convenio de Pago, para la revisión y aprobación para su aprobación, mimos que es necesario para poder liquidar el proyecto.	Galarza García, Diego Fernando	02/08/2018 - 09:59 PM
JUNIO 2018: Se encuentra en la Coordinación Jurídica el Convenio de Pago, para la revisión y aprobación para su aprobación, mimos que es necesario para poder liquidar el proyecto.	Galarza García, Diego Fernando	05/07/2018 - 05:48 PM
MAYO 2018: Se encuentra en la Coordinación Jurídica el Convenio de Pago, para la revisión y aprobación del mismo.	Galarza García, Diego Fernando	05/06/2018 - 11:28 AM
ABRIL 2018: Se encuentra en la Coordinación Jurídica el Convenio de Pago, para la revisión y aprobación del mismo.	Galarza García, Diego Fernando	04/05/2018 - 04:39 PM
MARZO 2018: Las fiscalizaciones a cargo de EDBRIDYC CONSTRUCTORA CIA. LTDA, se ha cancelado, mientras que MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, se encuentran en proceso de convenio de pago para su cierre, mediante Memorando MTOP-DDT-94-ME, se emite el criterio jurídico correspondiente a la planilla de costo más porcentaje de la Fiscalización de MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, misma en la cual se menciona que legalmente el pago no es procedente.	Galarza García, Diego Fernando	05/04/2018 - 12:07 PM
FEBRERO 2018: Las fiscalizaciones a cargo de EDBRIDYC CONSTRUCTORA CIA. LTDA, se ha cancelado, mientras que MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, se encuentran en proceso de convenio de pago para su cierre, mediante Memorando MTOP-DDT-94-ME, se emite el criterio jurídico correspondiente a la planilla de costo más porcentaje de la Fiscalización de MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, misma en la cual se menciona que legalmente el pago no es procedente.	Galarza García, Diego Fernando	05/03/2018 - 07:13 PM
ENERO 2018: Las fiscalizaciones a cargo de EDBRIDYC CONSTRUCTORA CIA. LTDA, se ha cancelado, mientras que MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, se encuentran en proceso de convenio de pago para su cierre, mediante Memorando MTOP-DDT-94-ME, se emite el criterio jurídico correspondiente a la planilla de costo más porcentaje de la Fiscalización de MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, misma en la cual se menciona que legalmente el pago no es procedente.	Galarza García, Diego Fernando	28/02/2018 - 05:41 PM
DICIEMBRE 2017:	Galarza García, Diego Fernando	05/01/2018 - 05:01 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Las fiscalizaciones a cargo de EDBRIDYC CONSTRUCTORA CIA. LTDA, se ha cancelado, mientras que MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, se encuentran en proceso de convenio de pago para su cierre, mediante Memorando MTOP-DDT-94-ME, se emite el criterio jurídico correspondiente a la planilla de costo más porcentaje de la Fiscalización de MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, misma en la cual se menciona que legalmente el pago no es procedente.</p>		
<p>NOVIEMBRE 2017: Las fiscalizaciones a cargo de EDBRIDYC CONSTRUCTORA CIA. LTDA, se ha cancelado, mientras que MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, se encuentran en proceso de convenio de pago para su cierre, mediante Memorando MTOP-DDT-94-ME, se emite el criterio jurídico correspondiente a la planilla de costo más porcentaje de la Fiscalización de MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, misma en la cual se menciona que legalmente el pago no es procedente.</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/12/2017 - 04:30 PM
<p>OCTUBRE 2017: Las fiscalizaciones a cargo de EDBRIDYC CONSTRUCTORA CIA. LTDA, se ha cancelado, mientras que MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, se encuentran en proceso de convenio de pago para su cierre, mediante Memorando MTOP-DDT-94-ME, se emite el criterio jurídico correspondiente a la planilla de costo más porcentaje de la Fiscalización de MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, misma en la cual se menciona que legalmente el pago no es procedente. El mantenimiento está a cargo de la Dirección Distrital de Tungurahua, con el apoyo de microempresas, personal y equipo de la Dirección</p>	Galarza García, Diego Fernando	01/11/2017 - 01:25 PM
<p>SEPTIEMBRE 2017: Se mantiene datos del informe del mes de julio, con las siguientes características: El 23 de Febrero del 2016, se realizó la Recepción Definitiva de la Obra y se legalizó el Acta por parte de la Comisión. Se ha realizado el pago de la Planilla de liquidación del reajuste. Las fiscalizaciones a cargo de EDBRIDYC CONSTRUCTORA CIA. LTDA., se ha cancelado, mientras que MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, se encuentran en proceso de convenio de pago para su cierre. Mediante Memorando MTOP-DDT-94-ME, se emite el criterio jurídico correspondiente a la planilla de costo más porcentaje de la Fiscalización de MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, misma en la cual se menciona que legalmente el pago no es procedente El mantenimiento está a cargo de la Dirección Distrital de Tungurahua, mismo que se realiza con el apoyo de microempresas, personal y equipo de la Dirección</p>	Valencia Vasconez, Jairo David	05/10/2017 - 06:15 PM
<p>AGOSTO 2017: Se mantiene datos del informe del mes de julio, con las siguientes características: El 23 de Febrero del 2016, se realizó la Recepción Definitiva de la Obra y se legalizó el Acta por parte de la Comisión. Se ha realizado el pago de la Planilla de liquidación del reajuste. Las fiscalizaciones a cargo de EDBRIDYC CONSTRUCTORA CIA. LTDA., se ha cancelado, mientras que MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, se encuentran en proceso de convenio de pago para su cierre. Mediante Memorando MTOP-DDT-94-ME, se emite el criterio jurídico correspondiente a la planilla de costo más porcentaje de la Fiscalización de MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, misma en la cual se menciona que legalmente el pago no es procedente El mantenimiento está a cargo de la Dirección Distrital de Tungurahua, mismo que se realiza con el apoyo de microempresas, personal y equipo de la Dirección</p>	Valencia Vasconez, Jairo David	12/09/2017 - 04:05 PM
<p>JULIO 2017: Se mantiene datos del informe del mes de julio, con las siguientes características: El 23 de Febrero del 2016, se realizó la Recepción Definitiva de la Obra y se legalizó el Acta por parte de la Comisión. Se ha realizado el pago de la Planilla de liquidación del reajuste. Las fiscalizaciones a cargo de EDBRIDYC CONSTRUCTORA CIA. LTDA., se ha cancelado, mientras que MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, se encuentran en proceso de convenio de pago para su cierre. Mediante Memorando MTOP-DDT-94-ME, se emite el criterio jurídico correspondiente a la planilla de costo más porcentaje de la Fiscalización de MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, misma en la cual se menciona que legalmente el pago no es procedente El mantenimiento está a cargo de la Dirección Distrital de Tungurahua, mismo que se realiza con el apoyo de microempresas, personal y equipo de la Dirección</p>	Valencia Vasconez, Jairo David	04/08/2017 - 07:45 PM
<p>JUNIO 2017: El 23 de Febrero del 2016, se realizó la Recepción Definitiva de la Obra y se legalizó el Acta por parte de la Comisión. Se ha realizado el pago de la Planilla de liquidación del reajuste, el mantenimiento está a cargo de la Dirección Distrital de Tungurahua, mismo que se realiza con el apoyo de microempresas, personal y equipo de la Dirección, las fiscalizaciones a cargo de EDBRIDYC CONSTRUCTORA CIA. LTDA., se ha cancelado, mientras que MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, se encuentran en proceso de convenio de pago para su cierre. Mediante Memorando MTOP-DDT-94-ME, se emite el criterio jurídico correspondiente a la planilla de costo más porcentaje de la Fiscalización de MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, misma en la cual se menciona que legalmente el pago no es procedente.</p>	Gamboa López, Enma Katherine	05/07/2017 - 04:34 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO 2017: El 23 de Febrero del 2016, se realizó la Recepción Definitiva de la Obra y se legalizó el Acta por parte de la Comisión. Se ha realizado el pago de la Planilla de liquidación del reajuste, el mantenimiento está a cargo de la Dirección Distrital de Tungurahua, mismo que se realiza con el apoyo de microempresas, personal y equipo de la Dirección, las fiscalizaciones a cargo de EDBRIDYC CONSTRUCTORA CIA. LTDA., se ha cancelado, mientras que MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, se encuentran en proceso de convenio de pago para su cierre. Mediante Memorando MTOP-DDT-94-ME, se emite el criterio jurídico correspondiente a la planilla de costo más porcentaje de la Fiscalización de MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, misma en la cual se menciona que legalmente el pago no es procedente.</p>	Gamboa López, Enma Katherine	05/06/2017 - 03:00 PM
<p>ABRIL 2017: El 23 de Febrero del 2016, se realizó la Recepción Definitiva de la Obra y se legalizó el Acta por parte de la Comisión. Se ha realizado el pago de la Planilla de liquidación del reajuste, el mantenimiento está a cargo de la Dirección Distrital de Tungurahua, mismo que se realiza con el apoyo de microempresas, personal y equipo de la Dirección, las fiscalizaciones a cargo de EDBRIDYC CONSTRUCTORA CIA. LTDA., se ha cancelado, mientras que MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, se encuentran en proceso de convenio de pago para su cierre. Mediante Memorando MTOP-DDT-94-ME, se emite el criterio jurídico correspondiente a la planilla de costo más porcentaje de la Fiscalización de MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, misma en la cual se menciona que legalmente el pago no es procedente.</p>	Gamboa López, Enma Katherine	01/05/2017 - 09:01 PM
<p>MARZO 2017 Mediante Memorando MTOP-DDT-94-ME, se emite el criterio jurídico correspondiente a la planilla de costo más porcentaje de la Fiscalización de MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, misma en la cual se menciona que legalmente el pago no es procedente.</p>	Gamboa López, Enma Katherine	11/04/2017 - 10:54 AM
<p>MARZO 2017 El 23 de Febrero del 2016, se realizó la Recepción Definitiva de la Obra y se legalizó el Acta por parte de la Comisión. Se ha realizado el pago de la Planilla de liquidación del reajuste, el mantenimiento está a cargo de la Dirección Distrital de Tungurahua, mismo que se realiza con el apoyo de microempresas, personal y equipo de la Dirección, las fiscalizaciones a cargo de EDBRIDYC CONSTRUCTORA CIA. LTDA., se ha cancelado, mientras que MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, se encuentran en proceso de convenio de pago para su cierre.</p>	Gamboa López, Enma Katherine	05/04/2017 - 05:48 PM
<p>FEBRERO 2017 El 23 de Febrero del 2016, se realizó la Recepción Definitiva de la Obra y se legalizó el Acta por parte de la Comisión. Se ha realizado el pago de la Planilla de liquidación del reajuste, el mantenimiento está a cargo de la Dirección Distrital de Tungurahua, mismo que se realiza con el apoyo de microempresas, personal y equipo de la Dirección, las fiscalizaciones a cargo de EDBRIDYC CONSTRUCTORA CIA. LTDA., se ha cancela, mientras que MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, se encuentran en proceso de convenio de pago para su cierre.</p>	Gamboa López, Enma Katherine	02/03/2017 - 04:06 PM
<p>ENERO 2017 El 23 de Febrero del 2016, se realizó la Recepción Definitiva de la Obra y se legalizó el Acta por parte de la Comisión. Se ha realizado el pago de la Planilla de liquidación del reajuste, el mantenimiento está a cargo de la Dirección Distrital de Tungurahua, mismo que se realiza con el apoyo de microempresas, personal y equipo de la Dirección, las fiscalizaciones a cargo de EDBRIDYC CONSTRUCTORA CIA. LTDA., se ha cancela, mientras que MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, se encuentran en proceso de convenio de pago para su cierre.</p>	Gamboa López, Enma Katherine	06/02/2017 - 10:10 AM
<p>DICIEMBRE 2016 El 23 de Febrero del 2016, se realizó la Recepción Definitiva de la Obra y se legalizó el Acta por parte de la Comisión. Se ha realizado el pago de la Planilla de liquidación del reajuste, el mantenimiento está a cargo de la Dirección Distrital de Tungurahua, mismo que se realiza con el apoyo de microempresas, personal y equipo de la Dirección, las fiscalizaciones a cargo de EDBRIDYC CONSTRUCTORA CIA. LTDA., se encuentra en trámite de pago, mientras que MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, se encuentran en proceso de convenio de pago para su cierre.</p>	Gamboa López, Enma Katherine	04/01/2017 - 05:50 PM
<p>NOVIEMBRE 2016 El 23 de Febrero del 2016, se realizó la Recepción Definitiva de la Obra y se legalizó el Acta por parte de la Comisión. Se ha realizado el pago de la Planilla de liquidación del reajuste, el mantenimiento está a cargo de la Dirección Distrital de Tungurahua, mismo que se realiza con el apoyo de microempresas, personal y equipo de la Dirección, las fiscalizaciones a cargo de EDBRIDYC CONSTRUCTORA CIA. LTDA., y MASACHE ABAD JOSE DOMINGO, se encuentran en proceso de convenio de pago.</p>	Gamboa López, Enma Katherine	05/12/2016 - 06:45 PM
<p>OCTUBRE 2016 El 23 de Febrero del 2016, se realizó la Recepción Definitiva de la Obra y se legalizó el Acta por parte de la Comisión. Está pendiente el pago de la Planilla de liquidación del reajuste a la espera de asignación de recursos y el mantenimiento está a cargo de la Dirección Distrital de Tungurahua, mismo que se realiza con el apoyo de microempresas, personal y equipo de la Dirección</p>	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	05/11/2016 - 04:25 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2016 El 23 de Febrero del 2016, se realizó la Recepción Definitiva de la Obra y se legalizó el Acta por parte de la Comisión. Está pendiente el pago de la Planilla de liquidación del reajuste a la espera de asignación de recursos y el mantenimiento está a cargo de la Dirección Distrital de Tungurahua, mismo que se realiza con el apoyo de microempresas, personal y equipo de la Dirección</p>	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	01/10/2016 - 02:02 PM
<p>AGOSTO 2016 El 23 de Febrero del 2016, se realizó la Recepción Definitiva de la Obra y se legalizó el Acta por parte de la Comisión. Está pendiente el pago de la Planilla de liquidación del reajuste a la espera de asignación de recursos y el mantenimiento está a cargo de la Dirección Distrital de Tungurahua, mismo que se realiza con el apoyo de microempresas, personal y equipo de la Dirección</p>	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	04/09/2016 - 11:27 AM
<p>JULIO 2016 El 23 de Febrero del 2016, se realizó la Recepción Definitiva de la Obra y se legalizó el Acta por parte de la Comisión. Está pendiente el pago de la Planilla de liquidación del reajuste a la espera de asignación de recursos y el mantenimiento está a cargo de la Dirección Distrital de Tungurahua, mismo que se realiza con el apoyo de microempresas, personal y equipo de la Dirección</p>	Moya Medina, Dilon German	03/08/2016 - 04:06 PM
<p>JUNIO 2016 El 23 de Febrero del 2016, se realizó la Recepción Definitiva de la Obra y se legalizó el Acta por parte de la Comisión. Está pendiente el pago de la Planilla de liquidación del reajuste y el mantenimiento está a cargo de la Dirección Distrital de Tungurahua</p>	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	01/07/2016 - 06:49 PM
<p>MAYO 2016 El 23 de Febrero del 2016, se realizó la Recepción Definitiva de la Obra y se legalizó el Acta por parte de la Comisión. Está pendiente el pago de la Planilla de liquidación del reajuste y el mantenimiento está a cargo de la Dirección Distrital de Tungurahua</p>	Valencia Vasquez, Jairo David	05/06/2016 - 04:40 PM
<p>MAYO 2016 El 23 de Febrero del 2016, se realizó la Recepción Definitiva de la Obra y se legalizó el Acta por parte de la Comisión. Está pendiente el pago de la Planilla de liquidación del reajuste y el mantenimiento está a cargo de la Dirección Distrital de Tungurahua</p>	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	30/05/2016 - 12:17 PM
<p>ABRIL 2016 El 23 de Febrero del 2016, se realizó la Recepción Definitiva de la Obra y se legalizó el Acta por parte de la Comisión. Está pendiente el pago de la Planilla de liquidación del reajuste y el mantenimiento está a cargo de la Dirección Distrital de Tungurahua</p>	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	04/05/2016 - 04:11 PM
<p>MARZO 2016 El 23 de Febrero del 2016, se realizó la Recepción Definitiva de la Obra y se legalizó el Acta por parte de la Comisión. Está pendiente el pago de la Planilla de liquidación del reajuste</p>	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	03/04/2016 - 06:06 PM
<p>FEBRERO 2016: La empresa HIDALGO E HIDALGO, realizó el mantenimiento rutinario hasta el día 23-02-2016, fecha en que la Comisión realizó la RECEPCIÓN DEFINITIVA de la vía, la misma que pasó a cargo del MTOP de Tungurahua. El Acta está para legalización.</p>	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	04/03/2016 - 08:19 AM
<p>ENERO 2016: Se encuentra realizando el mantenimiento rutinario.</p>	Moya Medina, Dilon German	11/02/2016 - 03:31 PM
<p>DICIEMBRE 2015: Se encuentra realizando el mantenimiento rutinario.</p>	Moya Medina, Dilon German	11/02/2016 - 03:19 PM
<p>NOVIEMBRE 2015: El contratista realiza el mantenimiento rutinario de la vía, como desbroce, reposición de delineadores, chevrones, tachas reflectivas, limpieza de señalización horizontal por caída de ceniza volcánica del volcán Tungurahua, y limpieza de escombros.</p>	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	04/12/2015 - 11:44 AM
<p>OCTUBRE 2015: Se terminaron los trabajos el 26-Mayo-2015 La vía fue inaugurada por el Señor Presidente de la República del Ecuador. Econ. Rafael Correa Delgado y la Srta. Ministra Paola Carvajal el Jueves 18-06-2015 Se legalizó el Acta de Recepción Provisional el día 22-07-2015 y continúa en mantenimiento hasta el 22-01-2016 El contratista realiza el mantenimiento rutinario de la vía, como desbroce, reposición de delineadores, chevrones, tachas reflectivas y limpieza de escombros.</p>	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	06/11/2015 - 08:49 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2015: Se terminaron los trabajos el 26-Mayo-2015 La vía fue inaugurada por el Señor Presidente de la República del Ecuador. Econ. Rafael Correa Delgado y la Srta. Ministra Paola Carvajal el Jueves 18-06-2015 Se legalizó el Acta de Recepción Provisional el día 22-07-2015 y continúa en mantenimiento hasta el 22-01-2016 El contratista realiza el mantenimiento de la vía, principalmente la limpieza de derrumbos por el fuerte invierno</p>	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	05/10/2015 - 07:02 PM
<p>AGOSTO 2015: Se terminaron los trabajos el 26-Mayo-2015 La vía fue inaugurada por el Señor Presidente de la República del Ecuador. Econ. Rafael Correa Delgado y la Srta. Ministra Paola Carvajal el Jueves 18-06-2015 Se legalizó el Acta de Recepción Provisional el día 22-07-2015 y continúa en mantenimiento hasta el 22-01-2016 El contratista realiza el mantenimiento de la vía, principalmente la limpieza de derrumbos por el fuerte invierno</p>	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	05/09/2015 - 07:50 PM
<p>JULIO 2015: Se terminaron los trabajos el 26-05-2015. La vía fue inaugurada por el Señor Presidente de la República del Ecuador. Econ. Rafael Correa Delgado y la Srta. Ministra Paola Carvajal el Jueves 18-06-2015 Se legalizó el Acta de Recepción Provisional el día 22-07-2015 y continúa en mantenimiento hasta el 22-01-2016 El contratista realiza el mantenimiento de la vía, principalmente la limpieza de derrumbos por el fuerte invierno</p>	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	02/08/2015 - 04:29 PM
<p>JUNIO 2015: Se terminaron los trabajos el 26-05-2015. La vía fue inaugurada por el Señor Presidente de la República del Ecuador. Econ. Rafael Correa Delgado y la Srta. Ministra Paola Carvajal el Jueves 18-06-2015 El Contratista solicitó la Recepción Provisional, la misma que se dará trámite luego de que presnte la Planilla de Costo + Porcentaje Nro 2 y Liquidación El contratista realiza el mantenimiento de la vía, principalmente la limpieza de derrumbos por el fuerte invierno</p>	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	05/07/2015 - 11:16 AM
<p>MAYO 2015: Durante el presente mes se realizó la señalización horizontal y vertical. El Contratista solicitó la Recepción Provisional, la misma que se dará trámite luego de que presnte la Planilla de Costo + Porcentaje y Liquidación</p>	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	08/06/2015 - 04:27 PM
<p>ABRIL 2015: Se legalizó el Costo + %, por el valor de USD. 3'008.819,36, con fecha 8 de Abril del 2015 Se dió por terminado el Contrato de Fiscalización, por parte de la Subsecretaría Regional 3, con el Consultor: Ing. José Masache Abad y en su reemplazo designó al Ing. Roberto Carlos Ortiz Aldas, técnico de la misma Subsecretaría a partir de 27-04-2015. Se amplió el contrato por 1 mes adicional, lo que termina el 26-05-2015</p>	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	08/06/2015 - 04:27 PM
<p>MARZO 2015. Se terminó de colocar carpeta asfáltica desde el Km 19+000 hasta Km 24+020. Se concluyen trabajos en empate con la vía Pelileo-Baños. FALTA EL ACTO ADMINISTRATIVO PARA CUMPLIR LA APROBACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL 451, REUNIDA EL 9-02-2015, EN DONDE SE APROBÓ EL PRESUPUESTO PARA EL COSTO + %, POR EL VALOR DE: USD. 3'008.819,36. El Contratista, solicitó ampliación de plazo de 60 días a partir de la legalización del Acto anotado.</p>	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	02/04/2015 - 12:50 PM
<p>FEBRERO 2015. Se construyeron cunetas desde el Km:22+000 al Km:23+000. Se coloca carpeta asfáltica desde el Km 19+000 hasta Km 24+020. Se terminan trabajos en empate con la vía Pelileo-Baños</p>	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	05/03/2015 - 04:29 PM
<p>ENERO 2015. Se construyeron cunetas desde el Km:20+000 al Km:22+200. Se realiza la colocación de la sub- base clase 3 desde el Km 19+000 hasta Km 24+020. Se construye el cerramiento del Colegio de Cotaló. Se realizó el movimiento de tierras para el empate con la vía: Pelileo-Baños.</p>	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	11/02/2015 - 11:11 AM
<p>DICIEMBRE 2014. Se construyeron cunetas desde el Km:20+000 al Km:22+200. Se realiza la colocación de la sub- base clase 3 desde el Km 19+000 hasta Km 20+200. Se construye el cerramiento del Colegio de Cotaló, desde el 01 de Diciembre del 2014 entro la fiscalización contratada a cargo del Ing. José Masache, se realizo la aprobación de la ampliación de plazo hasta el 26 de Abril del 2015.</p>	Valencia Vasconez, Jairo David	07/01/2015 - 05:25 PM
<p>NOVIEMBRE 2014. Se construyeron cunetas desde el Km:16+000 al Km:19+000. Se realiza movimiento de tierras para el empate con la carretera Pelileo-Baños desde el km: 21+800 al 24+020. Se construye el cerramiento del Colegio de Cotaló. La Fiscalización EDBRIDYC,</p>	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	05/12/2014 - 04:14 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
concluyó el 16 de Septiembre del 2014 y se encuentran realizando las planillas para el cobro desde Octubre del 2013. El Contratista solicitó ampliación de plazo por 4 meses, debido al retraso en aprobar el rediseño de los últimos 3 kilómetros, reuniéndose el 20-11-2014, la Comisión Especial para el decreto 451 y se autorizó ampliar el plazo por 4 meses adicionales. La Fiscalización está a cargo del Ing. Mario Torres, funcionario del MTOP de Tungurahua		
OCTUBRE 2014. Se construyeron cunetas desde el Km:13+000 al Km:16+000. Se realiza movimiento de tierras para el empate con la carretera Pelileo-Baños desde el km: 21+800 al 24+020. Se construye el cerramiento del Colegio de Cotaló. El contrato de la Fiscalización EDBRIDYC, concluyó el 16 de Septiembre del 2014 y se encuentran realizando las planillas para el cobro desde Octubre del 2013. El Contratista solicitó ampliación de plazo por 4 meses, debido al retraso en aprobar el rediseño de los últimos 3 kilómetros. Desde el 17 de Septiembre del 2014, la Fiscalización está a cargo del Ing. Mario Torres, funcionario del MTOP de Tungurahua	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	07/11/2014 - 03:11 PM
SEPTIEMBRE 2014. Se construyeron cunetas desde el Km:13+000 al Km:16+000. Se realiza movimiento de tierras para el empate con la carretera Pelileo-Baños desde el km: 21+800 al 24+020. Se construye el cerramiento del Colegio de Cotaló. El contrato de la Fiscalización EDBRIDYC, concluyó el 16 de Septiembre del 2014 y se encuentran realizando el Informe final y planillas para el cobro desde desde Octubre del 2013. El Contratista solicitó ampliación de plazo por 4 meses, debido al retraso en aprobar el rediseño de los últimos 3 kilómetros. Desde el 17 de Septiembre del 2014, la Fiscalización está a cargo del Ing. Mario Torres, funcionario del MTOP de Tungurahua	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	06/10/2014 - 08:34 PM
AGOSTO 2014. Se construyeron cunetas desde el Km:10+000 al Km:12+000. Se aprobó el rediseño para el empate con la carretera Pelileo-Baños desde el km: 21+800 al 24+020. El contrato de la Fiscalización EDBRIDYC, concluye el 16 de Septiembre del 2014. Se solicitó legalizar un contrato complementario pero no se concretó. Se deben planillas desde Octubre del 2013. Se encuentran realizando el movimiento de tierras en el último tramo. El Contratista solicitó ampliación de plazo por 4 meses.	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	01/09/2014 - 07:42 PM
JULIO 2014. Se construyeron cunetas desde el Km:9+000 al Km:10+000. Se colocó asfalto desde el km: 8+000 al 19+000, con lo que se cumplió el 2do. HITO de asfaltar hasta el km: 16+000. Se realizó la descarga de la lacantarilla en el km: 7+600. Se espera la aprobación del rediseño para el empate con la carretera Pelileo-Baños desde el km: 20+000 al 24+020. Se espera la legalización del contrato complementario para la Fiscalización.	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	06/08/2014 - 08:36 AM
JUNIO 2014. Se construyeron cunetas desde el Km:8+000 al Km: 9+000. Se coloca base desde el km: 13+000 al 18+000.y que presente la Fiscalización el diseño para el empate con la carretera Pelileo-Baños desde el km: 22+500 al 26+120. Se realiza imprimación desde el km: 8+000 al 15+000. Se espera la legalización del contrato complementario para la Fiscalización.	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	08/07/2014 - 08:13 PM
MAYO 2014. Se construyeron cunetas desde el Km:6+000 al Km: 8+000. Se coloca base desde el km: 13+000 al 18+000.y que presente la Fiscalización el diseño para el empate con la carretera Pelileo-Baños desde el km: 22+500 al 26+120. Se realiza imprimación desde el km: 8+000 al 15+000. Se espera la legalización del contrato complementario para la Fiscalización	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	01/06/2014 - 08:51 PM
ABRIL 2014. Se construyeron cunetas desde el Km: 0+400 al Km: 6+000. Se coloca base desde el km: 11+000 al 19+000. Se realiza movimiento de tierras desde el km: 19+000 al 22+500 Falta acelerar el pago por parte del MTOP-T a los propietarios de los terrenos, por las expropiaciones y que presente la Fiscalización el diseño para el empate con la carretera Pelileo-Baños. Se espera la legalización del contrato complementario para la Fiscalización. Se realizó un recorrido trimestral con la Lcda. Marcia Vizuete, Directora ambiental del MTOP.	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	02/05/2014 - 12:50 PM
MARZO 2014. Se realiza movimiento de tierras entre el Km: 22+000 al 23+000. Se culminó de colocar carpeta desde el Km: 0+000 al Km: 8+000. Falta acelerar el pago por parte del MTOP-T a los propietarios de los terrenos, por las expropiaciones.	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	02/04/2014 - 11:33 AM
FEBRERO2014. Se cumplen las siguientes etapas del contrato: Inicio de la construcción de la alcantarilla de Santo Domingo, excavación en los diferentes estratos (suelo, roca y marginal). En el Km. 15+780 a 16+000, se continúa con movimiento de tierras desde el km 19+000 a 22+320, está colocada la base estabilizada de cemento en los Km 0+420 a 7+500 km9+000 a 11+000, desde la abscisa Km 0+420 a 7+500 - Km9+000 a 11+000 se ha culminado con la conformación de la estructura de la vía y se está realizando la imprimación con ligante para estar lista a la colocación de la capa de asfalto, Colocando hormigón estructural en el muro de ingreso a Pillate. Hormigón Estructural Clase "B" f'c= 280 kg/cm2 en las aletas de entrada y de salida, repoblación de vegetación en diferentes tramos de la vía, control ambiental en el trayecto del proyecto.	Dávila Cadena, Christian Roberto	10/03/2014 - 04:45 PM
ENERO 2014: En los aspectos se han cumplido con todas las especificaciones técnicas del Mtop; se han realizado las actividades de excavación marginal, acabado de obras básicas, mejoramiento de la capa de estructura de la vía, transporte de material excavado, soluciones de	Villacreses Medina, Silvia Lorena	13/02/2014 - 03:12 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>escombreras, colocación de su-base, Culminación de la alcantarilla Guilles tanro en Hormigon y las paredes de aletas de entrada y salida de la misma, muestras de densidades en la estrucutra de la via, toma de muestras de lasalcantarillas, limpieza de derrumbes , clasificación de los materiales de los deslizamientos en las abscisas 3+200 - 3+800, de la 4+000 - 4+180 y de la 6+500 - 6+580, superviiones y colocaciones de señaletica y rotulos inofrmativos ambientales . No se presenta el análisis económico del proyecto, hasta que se notifique el proceso del decreto ejecutivo 451 que el trámite se ha concluido. Las planillas 11,12,13 estan aprobadas y pendientes estan las planillas 14, 15,16,17 correspondientes a los meses de Junio, Julio, Agosto aprobadas y pendientes Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013 respectivamente, cuyos pagos no han sido realizados por cuanto no se dispone hasta la fecha de la aprobación del trámite administrativo correspondiente.</p>		
<p>DICIEMBRE 2013. Los trabajos realizados en este mes excavaciones marginales en las abscisas 0+150 a 0+200, 7+800a7850, 15+600 a 15+750; mejoramientos de la subrazantes 10+00a10+200; transporte de materail en varios sitios a escombreras, limpiezas de derrumbes, instalaciones de alcantarillas de agua lluvias, suministro e instalación de hierro y fundición de la alcantarilla Guilles, trabajos de impactos ambietales en diferentes partes del proyecto.</p>	<p>Villacreses Medina, Silvia Lorena</p>	<p>06/02/2014 - 11:43 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2013: Se esta trabajando en la infra-super estructura del puente sobre el Rio Chambo sector de Cahuji. Ejecutado el lanzamiento de las vigas de acero y se prevé iniciar el Encofrado a partir de la presente semana, el movimiento de tierras se desarrolla en varios frentes siendo el más incidente y peligroso el tramo del 3+000-6+000. Las pendientes en el tramo del km3+000-6+000 donde se construye el camino piloto al momento, presentan una viabilidad para poder recurrir al desalojo con volqueta, se solicitara a la Fiscalización emitir disposición correspondientes. Prosigue las gestiones para el acto administrativo que conlleve a la orden de cambio 01 y al contrato complementario</p>	<p>Guevara Rodriguez, Luis</p>	<p>03/01/2014 - 04:57 PM</p>
<p>Octubre 2013: Se continua con la excavacion en roca, marginal y suelo, transporte de materiales a las escombreras de Cahuaji y sobre la quebrada Santo Domingo, asi como la excavacion y ubicacion de las lcantarillas en la via. Debido al incremento de volúmenes en roca y excavacion marginal la Fiscalizacion ve la necesidad de generar una orden de cambio y un contrato complementario, ya que se justifico en planillas (1-14), el valor del contrato de los 27'935.612,24 equivalente al 100 % y se cuenta con un avance fisico del 66.15 %, de lo cual se ha justificado dichos incrementos para la terminacion del objeto del contrato.</p>	<p>Guevara Rodriguez, Luis</p>	<p>28/11/2013 - 08:55 AM</p>
<p>Septiembre 2013: a la fecha se reporta el avance en la construccion del Puente sobre el Rio Chambo, se a culminado el lanzamiento de vigas y se ha iniciado el proceso de encofrado de la Super estructura, tambien se realizo el proceso de participacion social del borrador de Estudio de Impacto ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto Construccion de la Carretera Cahuaji Pillate Cotalo, se continua con la excavacion en los siguientes frentes de trabajo, 3+000-6+000, 7+000-9+000, 13+000-15+000; se continua con la gestion del tramite de la orden de cambio 01</p>	<p>Guevara Rodriguez, Luis</p>	<p>03/10/2013 - 10:27 AM</p>
<p>Agosto 2013: Se ha ejecutado en la obra la limpieza y desbroce de los tramos comprendidos entre las abscisas 5+200 a 6+220 (Zona 4). Se ha concluido la adecuación mediante voladura de la mina situada entre las abscisas 6+320 a 6+420 (Zonas 1 y 2) y se sigue limpiando la zona manualmente y con gallineta.</p>	<p>Proaño Paredes, Marco Antonio</p>	<p>06/09/2013 - 01:12 PM</p>
<p>Julio 2013.- Para el periodo del mes de julio se han realizado los siguientes trabajos relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se ejecuta el lanzamiento de vigas metalicas para la super estructura del puente sobre el Rio Chambo - El movimiento de tierras continua en los diferentes frentes de trabajo, se ha dado una especial atencion al tramo de abscisas 3+000-6+000, sector en el cual por presentar una geologia rocosa la ejecucion del rubro excavacion en roca, incide en el incremento de volumen y economico resferente de las cantidades y valores contractuales, para lo que se preve gestionar una orden de cambio 01 , previo cumplimiento de requerimientos para tal efecto. - Las expropiaciones continuan con la gestion y tramite correspondiente, una vez que los afectados cumplen en debida forma los requisitos. - Conforme a observaciones y recomendaciones de la CAF, se esta dando atencion y cumplimiento de las mismas(observaciones y recomendaciones) 	<p>Guevara Rodriguez, Luis</p>	<p>01/08/2013 - 03:29 PM</p>
<p>Mayo 2013.- En actualidad se ejecutan trabajos de movimiento de tierras, a la altura del tramo de abscisas 3+000-6+000, la estratigrafia corresponde a un manto rocoso, msimo que por su composicion influye en el avance normal y programado de los trabajos.</p> <p>Para el caso del puente sobre el rio chambo se encuentra a nivel de estribos tanto izquierdo y derecho, para el trabajo de lanzamiento de vigas metalicas, se encontro la novedad que a la altura de la abscisa 0+600 existia un afloramiento de aguas subterranas, lo cual se esta procediendo a solvertar con alternativas de drenaje y mejoramiento de suelos</p> <p>Para el caso de expropiaciones las mismas continuan y se esta socializando las demas expropiaciones por donde se pretende cambiar el eje de la via en los sitios poblados, asi como tambien al final del tramo</p>	<p>Guevara Rodriguez, Luis</p>	<p>06/06/2013 - 11:38 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Abril 2013: Se continua con la excavación y transporte de materiales a las escombreras sobre la quebrada Santo Domingo, así como la excavación de las abscisas km 3+540 a 3+780, km 6+000 a 6+540, km 15+030 a 15+920, km 16+120 a 16+800. Se coordina con la entidad contratante sobre la licencia ambiental al igual que las expropiaciones.	Proaño Paredes, Marco Antonio	02/05/2013 - 11:38 AM
Marzo 2013: Se continua con la excavacion y transporte de materiales a las escombreras sobre la quebrada Santo Domingo, así como la excavacion de las abscisas km 3+540 a 3+780, km 6+000 a 6+540, km 15+030 a 15+920, km 16+120 a 16+800. Se coordina con la entidad contratante sobre la licencia ambiental al igual que las expropiaciones de este proyecto.	Proaño Paredes, Marco Antonio	08/04/2013 - 08:56 AM
FEBRERO 2013: Se continua con la excavacion y transporte de materiales a las escombreras sobre la quebrada Santo Domingo, así como la excavacion de las abscisas 7+860 al 12+900 lado izquierdo en el sector de Cotalo. Se realizara un tercer replanteo para realizar un análisis tecnico económico y socializar para realizar el tramite de la variante en de Laurelpamba , y esto solucionará el cruzar por las poblaciones.	Proaño Paredes, Marco Antonio	08/04/2013 - 08:55 AM
Enero 2013: Se realizara un replanteo para realizar un analisis tecnico economico y socializar para realizar el tramite de la variante en el sector del cementerio y la otra en el sector de las queseras para evitar el cruce por las poblaciones. Se continua con la excavacion y transporte de materiales a las escombreras sobre la quebrada Santo Domingo, así como la excavacion de las abscisas 7+860 al 12+900 lado izquierdo en el sector de Cotalo.	Proaño Paredes, Marco Antonio	08/02/2013 - 11:05 AM
Diciembre 2012: los trabajos realizados en la vía, comprenden: movimiento de tierras en 4 frentes, excavación y proceso de pilotaje en el estribo derecho del puente sobre el rio Chambo, inicio de Construcción de alcantarilla en la quebrada Guiles, se da continuidad al replanteo del eje de la vía, a los trabajos de topografía para el proceso de expropiaciones conforme a la socialización con la comunidad y movimiento de tierra. Se realiza una nueva variante en Cotalo en el sector del cementerio para evitar el paso de la vía por zonas pobladas.	Proaño Paredes, Marco Antonio	08/02/2013 - 11:04 AM
Noviembre 2012: los trabajos realizados en la vía, comprenden: movimiento de tierras en 4 frentes, excavación y proceso de pilotaje en el estribo derecho del puente sobre el rio Chambo, inicio de Construcción de alcantarilla en la quebrada Guiles, se da continuidad al replanteo del eje de la vía, a los trabajos de topografía para el proceso de expropiaciones conforme a la socialización con la comunidad.	Proaño Paredes, Marco Antonio	25/01/2013 - 08:39 AM
Octubre 2012: los trabajos realizados en la vía, comprenden: movimiento de tierras en 4 frentes, excavación y proceso de pilotaje en el estribo derecho del puente sobre el rio Chambo, inicio de Construcción de alcantarilla en la quebrada Guiles, se da continuidad al replanteo del eje de la vía, a los trabajos de topografía para el proceso de expropiaciones conforme a la socialización con la comunidad.	Proaño Paredes, Marco Antonio	10/12/2012 - 10:21 AM
Septiembre 2012: Actualmente se continúa con los movimientos de tierra en los siguientes frentes: abscisa 1+300, 2+200, 6+800, 7+600, 7+800; se inician los trabajos para la construccion de la alcantarilla en la Quebrada Guiles se realizó el replantéo de los estribos del puente sobre el Río Chambo, se continúa con las expropiaciones y socialización del proyecto, se encuentra en trámite planilla de trabajo (dividida en dos secciones, debido al trabajo realizado al inicio del proyecto por parte de la supervisión del MTOP, y la otra correspondiente a los trabajos realizados por la fiscalización contratada, el valor de las dos planillas en trámite corresponde a 1'200,000.00 USD)	Proaño Paredes, Marco Antonio	15/11/2012 - 11:07 AM
Agosto 2012: a partir del 27 de Julio arrancaron los trabajos de movimiento de tierras en los tramos comprendidos entre las abscisas 0+000-1+350; previo a esta actividad se construyo el campamento, se ha venido socializando las expropiaciones, trabajos de topografía en la via y en los predios afectados, gestión de los permisos ambientales, control de calidad de materiales a utilizarse en la construccion del puente sobre el rio Chambo, mediante ensayos, aun no se ha generado planilla, la Fiscalización Contratada no ha tomado funciones plenas por cuestiones propias de la empresa en cuanto a sus gestiones y tramites para el recibo de anticipo.		
Julio 2012: Inicaron los trabajos de movientos de tierras en los tramos comprendidos entre las abscisas 0+000 - 1+350; previo a esta activada se construyo el campamento, se ha venido socializando las expropiaciones, trabajos de topografía en la vía y en los predios de los afectados, gestión de los permisos ambientales, control de calidad de materiales a utilizarse en la construcción del puente sobre el Río Chambo, mediante ensayos.		
Junio 2012: Actualmente se tramita la licencia ambiental y se requiere de la actualización de los TDR por parte de la Institución contratante.		
Mayo 2012: El Campamento se encuentra terminado; la licencia ambiental requiere de la actualización de los TDR por parte de la Institución contratante.		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Abril 2012: La contratista espera que la entidad contratante le facilite la licencia ambiental para iniciar con los trabajos. Actualmente se instala el campamento.</p> <p>Marzo 2012: El 23 de marzo se firma el contrato y el 26 se procede a la entrega del anticipo para iniciar con los trabajos de construcción de la carretera.</p> <p>Febrero 2012: La constructora prepara la documentación necesaria para la firma del contrato.</p> <p>Diciembre 2011: La comisión técnica analiza ofertas presentadas por los diferentes oferentes y se adjudica el proyecto a las constructora Hidalgo & Hidalgo.</p> <p>Noviembre 2011: Se inicia el proceso de contratación por Licitación la construcción de la carretera Cahuaji - Pillate - Cótalo - Empate (Ambato- Baños) de 26.12 Km ubicadas en la Provincia de Tungurahua y Chimborazo.</p>		

Problemas cerrados: 8, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Penipe
2	Zona 3 - Centro > Tungurahua > San Pedro de Pelileo

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Idea del Proyecto planificado	1-Solicitud de Información	02/11/2011		02/11/2011		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN: Aprobación Interna realizada	1-Solicitud de Información	03/11/2011		03/11/2011		Sí	2.0
3	PLANEACIÓN: Proyecto en el portal compras publicado	3-Adjudicación	10/11/2011		10/11/2011		Sí	3.0
4	PLANEACIÓN: Contrato suscrito firmado	1-Solicitud de Información	23/03/2012		23/03/2012		Sí	5.0
5	EJECUCIÓN: Puente sobre el Rio Chambo Infraestructura realizado	5-Entregables Intermedios	12/11/2013		12/11/2013		Sí	6.0
6	EJECUCIÓN: Puentes sobre el Rio Chambo Superestructura realizado	5-Entregables Intermedios	12/11/2013		12/11/2013		Sí	6.0
7	EJECUCIÓN: Alcantarillado Qda. Guiles iniciado	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		31/12/2013		Sí	6.0
8	EJECUCION: Movimientos de tierras Km 0+000 a 15+000 culminado	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		28/02/2014		Sí	6.0
9	EJECUCION: Obras de Estabilización de taludes Km 4+000-m6+700 planificado	5-Entregables Intermedios	20/03/2014		20/03/2014		Sí	6.0
10	EJECUCIÓN: Impacto Ambiental realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	6.0
11	EJECUCIÓN: Alcantarillado Qda. Santo Domingo iniciado	5-Entregables Intermedios	10/05/2014		10/05/2014		Sí	6.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
12	EJECUCION: Movimientos de tierras Km 15+000 a 26+120 culminado	4-Inicio de Trabajo	31/07/2014		31/07/2014		Sí	7.0
13	EJECUCIÓN: Obras de arte menores iniciado	4-Inicio de Trabajo	29/08/2014		29/08/2014		Sí	7.0
14	EJECUCIÓN: Obras de calzada planificado	5-Entregables Intermedios	15/02/2015		31/03/2015		Sí	7.0
15	EJECUCIÓN: Señalización planificado	5-Entregables Intermedios	15/02/2015		26/05/2015		Sí	7.0
16	CIERRE: Recepción provisional firmado	9-Entregables Formales	26/04/2015		31/07/2015		Sí	1.0
17	CIERRE: Recepción definitiva legalizada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	23/02/2016		26/02/2016		Sí	1.0
18	CIERRE: Liquidación Económica, realizada (Fiscalización)	9-Entregables Formales	30/06/2022	30/11/2022			No	1.0
19	CIERRE: Formatos de cierre/baja según acuerdo 025, elaborados	5-Entregables Intermedios	31/07/2022	30/11/2022			No	1.0
20	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	9-Entregables Formales	15/08/2022	30/11/2022			No	1.0
21	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago, suscrito	9-Entregables Formales	18/08/2022	30/11/2022			No	1.0
22	CIERRE: Información del proyecto en los sistemas GPR, SIPeIP y SITOP actualizada	9-Entregables Formales	31/08/2022	30/11/2022			No	1.0
23	CIERRE: Documentos habilitantes para cierre/baja conforme Instructivo de Cierre/Baja, entregados a la Coordinación General de Planificación	9-Entregables Formales	15/09/2022	30/11/2022			No	1.0
24	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	20/09/2022	30/11/2022			No	0.5
25	CIERRE: Aprobación del Ministro de Obras Públicas, suscrita	9-Entregables Formales	30/09/2022	30/11/2022			No	0.5
26	CIERRE: Solicitud a Senplades para registro de cierre/baja, suscrita	9-Entregables Formales	31/10/2022	30/11/2022			No	0.5
27	CIERRE: Informe de Cierre de Proyectos (Senplades) aprobado	9-Entregables Formales	30/11/2022	30/11/2022			No	0.5

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Carretera Cahuaji- Pillate- Cotaló	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	17/12/2015
2	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	29/05/2015
3	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	29/04/2015
4	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	27/03/2015
5	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	24/02/2015
6	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	27/01/2015
7	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	19/12/2014
8	OBRA EN EJECUCION	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	30/11/2014
9	TRABAJO EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	29/10/2014
10	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	25/08/2014
11	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	29/07/2014
12	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	21/04/2014
13	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	24/03/2014
14	Lira Villalva	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	25/10/2013
15	LIRA VILLALVA	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	12/04/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Periodo	Meta	Resultado del Periodo	Fecha de Inicio	Último Periodo Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	8,380,683.67
Estimado Al Fin Del Proyecto:	61,464,906.59 **
Costo Total:	59,059,278.90
Total Devengado:	61,275,748.60
% Costo Total Devengado:	103.75 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 103.75 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	50,328,510.40	189,157.99	0.00	50,517,668.39
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	12,676,168.25	189,157.99	0.00	12,865,326.24
Ppto. Codificado	73,022,141.18	189,157.99	0.00	73,211,299.17
Ppto. Comprometido	72,924,328.04	0.00	0.00	72,924,328.04
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	56,929,863.80	189,157.99	0.00	57,119,021.79
Ppto. Devengado	61,275,748.60	0.00	0.00	61,275,748.60
Pagado Real	33,817,033.73	0.00	0.00	33,817,033.73
Estimado a fin de año	* 61,275,748.60	189,157.99	0.00	61,464,906.59
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-4,345,884.80	0.00	0.00	-4,345,884.80
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 107.63 %	0.00 %	0.00 %	107.28 %
Ppto. Codificado 998	7,360,915.36	0.00	0.00	7,360,915.36
Ppto. Devengado 998	7,343,501.40	0.00	0.00	7,343,501.40

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022

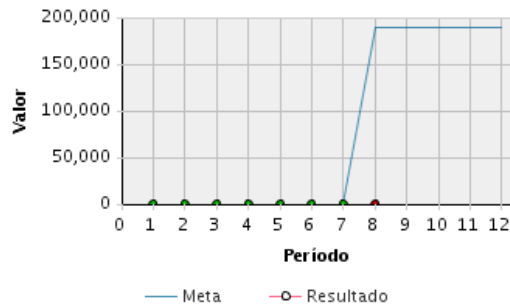

Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	189,157.99	0.00	189,157.99	0.00	0.00 %		0.00 %
Sep	0.00		189,157.99				
Oct	0.00		189,157.99				
Nov	0.00		189,157.99				
Dic	0.00		189,157.99				
Total	189,157.99	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
20	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		GestionReporteFN[1]_Copy.pdf	03/10/2013
2		C1_GestiónReporte_MAR_2014.pdf	10/07/2014
3	A1 Ampliación fecha fin 2022	AMPLIACION_FECHA_FIN_2022.rar	02/02/2022
4	A10 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE	octubre_informe.pdf	22/11/2012
5	A10 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2012	pillate_noviembre.pdf	10/12/2012
6	A11 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE	noviembre_informe.pdf	22/11/2012
7	A11 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2012	pillste-novipdf.pdf	07/12/2012
8	A12 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2012	INFORME_DICIEMBRE.pdf	25/01/2013
9	A2 CEDULA MES DE ENERO	CEDULA_ENERO(1).pdf	02/02/2022
10	A3 DESIGNACION DE LIDER DEL PROYECTO	A3_DESIGNACIÓN_DE_LIDER_DEL_PROYECTO.pdf	02/02/2022
11	A4 CEDULA MES DE FEBRERO	A4_CEDULA_MES_DE_FEBRERO.pdf	02/03/2022
12	A4 CEDULA MES DE MARZO	A5_CEDULA_MES_DE_MARZO.pdf	04/04/2022
13	A4 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2013	GestionReporteFN.pdf	06/06/2013
14	A5 INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	Informe_ejecutivo_CAHUAJI_mayo_2012.pdf	08/06/2012
15	A6 CEDULA MES DE MAYO	A7_CEDULA_MES_DE_MAYO.pdf	03/06/2022
16	A6 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	CAHUAJI-PILLATE_CITALO_JUNIO.pdf	09/07/2012
17	A8 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2013	GestionReporteFN(28).pdf	06/09/2013
18	A8 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	cahuajiPillateCotalo(Agosto).pdf	09/10/2012
19	A9 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2012	pillate-sep.pdf	11/10/2012
20	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	F1_ACTA_DE_RECEPCIÓN_DEFINITIVA.pdf	05/06/2016
21	Anexos para que se aprueben el Contrato Complementario	A.4_Anexos_contractuales_Cahuaji.pdf	11/03/2014
22	Anexos para que se aprueben el Contrato Complementario	Objetivos_Especificos_CGAF-Propuesta_2014.xls	11/03/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
23	B10 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2013	GestionReporteFN.pdf	05/11/2013
24	B2 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2013	pillate_febreo.pdf	28/02/2013
25	B3 INFORME EJECUTIVO MARZO 2013	INFORME_marzo_2013d.pdf	08/04/2013
26	B4 INFORME EJECUTIVO mes de Abril 2013	Informe_Ejecutivo_Abril_2013.pdf	14/05/2013
27	B5 INFORME EJECUTIVO PRESIDENCIA MAYO 2013	mayo_cahuaji.pdf	06/06/2013
28	B5 INFORME EJECUTIVO MAYO 2013	GestionReporteFN.pdf	06/06/2013
29	B6 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2013	pillate_2013.pdf	08/07/2013
30	B7 INFORME EJECUTIVO JULIO 2013	IE_Cahuaji_Julio_2013.pdf	07/08/2013
31	B8 INFORME EJECUTIVO ENE 2014	B8_GestiónReporte_ENE_2014.pdf	10/07/2014
32	B9 INFORME EJECUTIVO FEB 2014	B9_GestiónReporte_FEB_2014.pdf	10/07/2014
33	C1 INFORME EJECUTIVO MAR 2014	C1_GestiónReporte_MAR_2014.pdf	10/07/2014
34	C2 INFORME EJECUTIVO ABR 2014	C2_GestiónReporte_ABR_2014.pdf	10/07/2014
35	C3 INFORME EJECUTIVO MAY 2014	C3_GestiónReporte_MAY_2014.pdf	10/07/2014
36	C4 INFORME EJECUTIVO JUN 2014	C4_GestiónReporte_JUN_2014.pdf	10/07/2014
37	C5 INFORME EJECUTIVO JUL 2014	C5_GestionReporte_JUL_2014.pdf	06/08/2014
38	C6 INFORME EJECUTIVO AGO 2014	C6_GestionReporte_AGO_2014.pdf	04/09/2014
39	C7 informe ejecutivo de SEPTIEMBRE 2014	Inf_Ejecutivo_cahuaji.pdf	07/10/2014
40	C8 informe ejecutivo de OCTUBRE 2014.pdf	C8_informe_ejecutivo_de_OCTUBRE_2014.pdf	07/11/2014
41	C9 INFORME EJECUTIVO NOV 2014	C9_GestionReporte_NOV_2014.pdf	05/12/2014
42	Camino piloto	DSCN3575.JPG	08/06/2012
43	Contrato de Fiscalizacion empresa EDIBRIDYC	A.3_Contrato_de_Fiscalización_Cahuaji.pdf	11/03/2014
44	Contrato de la Orden de Cambio N° 1	A.5_Orden_de_cambio_N°1__Cahuaji.pdf	11/03/2014
45	CRITERIO JURIDICO MASACHE ABAD JOSE DOMINGO	CRITERIO JURÍDICO.pdf	11/04/2017
46	D1 INFORME EJECUTIVO DIC 2014	D1_GestionReporte_DIC_2014.pdf	11/02/2015
47	D2 INFORME EJECUTIVO ENE 2015	D2_GestionReporte_ENE_2015.pdf	11/02/2015
48	D3 INFORME EJECUTIVO FEB 2015	D3_GestionReporte_FEB_2015.pdf	10/03/2015
49	D4 INFORME EJECUTIVO MAR 2015	D4_GestionReporte_MAR_2015.pdf	08/04/2015
50	D5 INFORME EJECUTIVO ABR 2015	D5_GestionReporte_ABR_2015.pdf	29/05/2015
51	D6 INFORME EJECUTIVO MAY 2015	D6_GestionReporte_MAY_2015.pdf	05/07/2015
52	D7 INFORME EJECUTIVO JUN 2015	D7_GestionReporte_JUN_2015.pdf	05/07/2015
53	D8 INFORME EJECUTIVO JUL 2015	D8_GestionReporte_JUL_2015.pdf	02/08/2015
54	D9 INFORME EJECUTIVO AGO 2015	D9_GestionReporte_AGO_2015.pdf	05/09/2015
55	E1 INFORME EJECUTIVO SEP 2015	E1_GestionReporte_SEP_2015.pdf	05/10/2015
56	E2 INFORME EJECUTIVO OCT 2015	E2_GestionReporte_OCT_2015.pdf	06/11/2015
57	E3 INFORME EJECUTIVO NOV 2015	E3_GestionReporte_NOV_2015.pdf	04/12/2015
58	E4 INFORME EJECUTIVO DIC 2015	E4_GestionReporte_DIC_2015.pdf	11/02/2016
59	E5 INFORME EJECUTIVO ENE 2016	E5-GestionReporte_ENE_2016.pdf	11/02/2016
60	E6 INFORME EJECUTIVO FEB 2016	E6_GestionReporte_FEB_2016.pdf	04/03/2016
61	E7 INFORME EJECUTIVO MAR 2016	E7_GestionReporte_MAR_2016.pdf	03/04/2016
62	E8 INFORME EJECUTIVO ABR 2016	E8_GestionReporte_ABR_2016.pdf	04/05/2016
63	E9 INFORME EJECUTIVO MAY 2016	E9_GestionReporte_MAY_2016.pdf	01/06/2016
64	F1 INFORME EJECUTIVO JUN 2016	F1_GestionReporte_JUN_2016.pdf	01/07/2016
65	F2 INFORME EJECUTIVO JUL 2016	F2_GestionReporte_JUL_2016..pdf	03/08/2016
66	F3 INFORME EJECUTIVO AGO 2016	F3_GestionReporte_AGO_2016.pdf	04/09/2016
67	F4 INFORME EJECUTIVO SEP 2016	F4_GestionReporte_SEP_2016..pdf	05/10/2016
68	F5 INFORME EJECUTIVO OCT 2016	F5_GestionReporte_OCT_2016..pdf.pdf	05/11/2016
69	F6 INFORME EJECUTIVO NOV 2016	F6_GestionReporte_NOV_2016.pdf	05/12/2016
70	F7 INFORME EJECUTIVO DIC 2016	F7_GestionReporte_DIC_2016.pdf	04/01/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
71	F8 INFORME EJECUTIVO ENE 2017	F8_GestionReporte_ENE.2017.pdf	06/02/2017
72	F9 INFORME EJECUTIVO FEB 2017	F9_GestionReporte_FEB.2017.pdf	02/03/2017
73	G1 INFORME EJECUTIVO MARZ 2017	G1_GestionReporte_MARZ.2017..pdf	05/04/2017
74	G2 INFORME EJECUTIVO ABR 2017	G2_GestionReporte_ABR.2017.pdf	01/05/2017
75	G3 INFORME EJECUTIVO MAYO 2017	G3_GestionReporte_MAY.2017.pdf	05/06/2017
76	G4 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2017	G4_GestionReporte_JUN.2017.pdf	05/07/2017
77	INFORME EJECUTIVO SITOP 2019 FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN CAHUAJI PILLATE COTALO	FISCALIZACIÓN_CAHUAJI_PILLATE_COTALO_SITOP.pdf	05/08/2019
78	INFORME EJECUTIVO SITOP DICIEMBRE	INFORME_EJECUTIVO_DIC-CAHUAJI_PILLATE_COTALO.pdf	05/01/2018
79	INFORME EJECUTIVO SITOP NOVIMEBRE	Fiscalizacion_Cahuaji-Pillate-Cotalo_Masache_Jose.PDF	05/12/2017
80	SITOP INFORME EJECUTIVO JULIO 2017	9382.pdf	04/08/2017
81	SITOP SEPTIEMBRE 2017	CAHUAJI_PILLATE_COTALO.pdf	05/10/2017
82	Solicitud y Aprobación congelamiento y apertura fichas de proyectos PAC 2019	Solicitud_de_congelamiento_y_apertura_fichas_de_proyectos_PAC2019.pdf	27/02/2019

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Chavez Lopez, Guillermo Javier	Subsecretario Regional 3	Subsecretario Zonal 3	gchavez@mtop.gob.ec	
Gamboa López, Enma katherine	Lider técnico	Analista de Infraestructura distrital de Tungurahua	egamboa@mtop.gob.ec	
GONZALEZ CHAVEZ, ALEXANDRA DEL ROCIO	Director Distrital	Directora Distrital de Tungurahua (E)	argonzalez@mtop.gob.ec	0992949341

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
30404_1.jpg	01/07/2016
