

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría de Obras Públicas**  
**Dirección Nacional de Control y Fiscalización de Obras Públicas**

**PROYECTO: K005** MTOP: Proyecto Emergente de las Unidades Educativas del Milenio y Establecimientos Anexos

Líder del Proyecto:	Mangia Guacollantes, Christian Rolando (cmangia@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Santamaria Loor, Kiura Ninoska	Programas Relacionados:	
Titular:	Santamaria Loor, Kiura Ninoska	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	91400000.591.6097	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	117,186.64
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2010 - 31/12/2024
Fecha de última actualización:	07/12/2022	Fecha de Fin Base:	06/12/2022
Modificado por:	Mangia Guacollantes, Christian Rolando	Fecha del siguiente Hito:	30/06/2023

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

El proyecto "UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y ESTABLECIMIENTOS ANEXOS 2011" construirá 10 UEM nuevas al igual que intervendrá también 100 establecimientos anexos, en 10 provincias, 10 cantones y 10 parroquias del Ecuador.

**Beneficios Cualitativos**

Materializar la Política Pública del Gobierno Nacional para el Buen Vivir de las comunidades en las zonas de influencia de los proyectos emergentes de las unidades educativas del milenio, a través de la ejecución de programas integrales de desarrollo local, redistribuyendo equitativa y planificadamente los ingresos generados por el aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos naturales y operando bajo normativa vigente, con eficiencia, eficacia y transparencia.

**Tipo de Beneficiario**

Los ingresos incrementales que recibirán los beneficiarios directos (los 20 000 alumnos beneficiados del proyecto) cuando entren a formar parte de la fuerza laboral PEA.


**Restricciones**

El proyecto tendrá una duración de 3 años

Fase Actual:  Anteproyecto  Definición  Planeación  **Ejecución**  Cierre  Completado  Congelado  Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Fecha de Inicio: 01/01/2010      Fecha de Fin: 31/12/2024

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

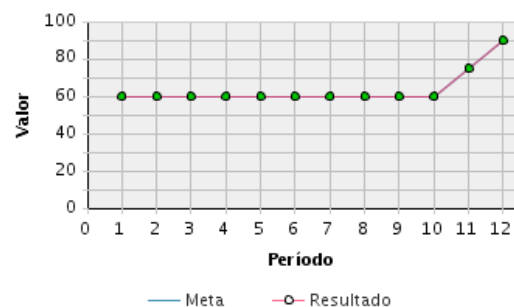

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	75 %	90 %
	Avance real acumulado											
	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	75 %	90 %
Estado												

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE 2022:</p> <p>1.- Mediante memorando No. MTOP-SOP-2022-1582-ME de 28 de noviembre de 2022, se designa como líder del proyecto para proyectos inversión Ex-SECOB, en la herramienta GPR, al Ing. Christian Mangia quien se hará cargo del proyecto de inversión, "Proyecto Emergente de las Unidades Educativas del Milenio y Establecimientos Anexos", a partir de la fecha de designación (Anexo 1).</p>	Mangia Guacollantes, Christian Rolando	06/12/2022 - 02:30 PM

### LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

### HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada.	1-Solicitud de Información	11/08/2010		11/08/2010		Sí	5.0
2	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto Ministerio de Educación DINSE.	1-Solicitud de Información	01/05/2011		01/05/2011		Sí	5.0
3	DEFINICIÓN: Dictamen de prioridad "Proyecto emergente de la unidades educativas del milenio y establecimientos anexos"	1-Solicitud de Información	06/05/2011		06/05/2011		Sí	10.0
4	PLANEACIÓN: Suscripción Convenio de Cooperación Interinstitucional	1-Solicitud de Información	27/05/2011		27/05/2011		Sí	10.0
5	EJECUCIÓN: Adjudicación realizada.	3-Adjudicación	04/01/2012		04/01/2012		Sí	10.0
6	EJECUCIÓN: Contrato Nro. LC-ICO-003-2011 suscrito.	5-Entregables Intermedios	04/01/2012		04/01/2012		Sí	10.0
7	EJECUCIÓN: Decreto Ejecutivo No. 1063 suscrito, todas las competencias de SECOB son asumidos por el MTOP.	5-Entregables Intermedios	19/05/2020		19/05/2020		Sí	10.0
8	EJECUCIÓN: Pago de Planilla por concepto de demanda del PROYECTO UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO BOSCO WISUM UBICADA EN LA PARROQUIA SEVILLA DON BOSCO, CANTON	1-Solicitud de Información	17/11/2022		17/11/2022		Sí	15.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	MORONA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.							
9	EJECUCIÓN: Pago de Proyecto Unidad Educativa del Milenio Tarqui del cantón Pastaza.	1-Solicitud de Información	02/12/2022		02/12/2022		Sí	15.0
10	CIERRE: Recursos presupuestarios asignados para el año 2023.	5-Entregables Intermedios	30/06/2023	30/06/2023			No	2.0
11	CIERRE: Actas de entrega recepción definitiva de los contratos de obra suscritos.	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	2.0
12	CIERRE: Actas de entrega recepción única de los contratos de fiscalización suscritas.	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	2.0
13	CIERRE: Cierre administrativo de los contratos de fiscalización realizado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2024	31/12/2024			No	2.0
14	CIERRE: Liquidación Económica de los contratos de fiscalización realizada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2024	31/12/2024			No	1.0
15	CIERRE: Liquidación Económica de los contratos de obra realizados.	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	1.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	117,186.64 **
Costo Total:	117,186.64
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	117,186.64	0.00	117,186.64
Ppto. Externo Planeado	0.00	117,186.64	0.00	117,186.64
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	117,186.64	0.00	117,186.64
Ppto. Codificado	0.00	117,186.64	0.00	117,186.64
Ppto. Comprometido	0.00	117,186.64	0.00	117,186.64
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	117,186.64	0.00	117,186.64
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	117,186.64	0.00	117,186.64
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	117,186.64	0.00	117,186.64
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022

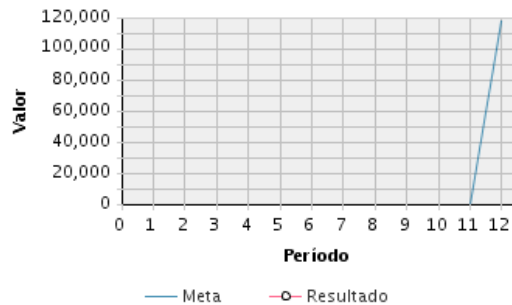

Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	117,186.64		117,186.64				
<b>Total</b>	<b>117,186.64</b>						

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la fiscalización de los planes y proyectos de obra pública, MEDIANTE la implementación de procesos de control del cumplimiento del marco legal, normativo y cláusulas del contrato.

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 - Hito 1 - Asignación de recursos - Dictamen SEMPLADES	dictamen_prioridad_Emergente_UEM.pdf	07/12/2022
2	A.2 - Hito 2 - Documento de Proyecto Ministerio de Educación DINSE	Proyecto_Emergente_de_las_unidades_educativas.pdf	07/12/2022
3	A.3 - Hito 3 - Dictamen de prioridad	O_SENPLADES_SIP_DAP_2011_627.pdf	07/12/2022
4	A.4 - Hito 4 - Convenio Interinstitucional	convenio_ICO-DINSE_infraestructura_nueva.pdf	07/12/2022
5	A.5 - Hito 5 - Adjudicación	Z3_-_Contrato_UEM_Tarqui.pdf	07/12/2022
6	A.6 - Hito 6 - Suscripción de contrato LC-ICO-003-2011	Z3_-_Contrato_UEM_Tarqui.pdf	07/12/2022
7	A.7 - Hito 7 - Decreto Ejecutivo No. 1063 suscrito, todas las competencias de SECOB son asumidos por el MTOP.	decreto_ejecutivo_no._1063_.pdf	07/12/2022
8	A.8 - Hito 8 - Pago de Planilla por concepto de demanda del PROYECTO UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO BOSCO WISUM UBICADA EN LA PARROQUIA SEVILLA DON BOSCO, CANTON MORONA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	cur_pago_bosco_wisum.pdf	07/12/2022
9	A.9 - Hito 9 - Pago de Proyecto Unidad Educativa del Milenio Tarqui del cantón Pastaza.	CUR_DE_PAGO_UEM_TARQUI.jpeg	07/12/2022
10	Anexo 1 - Designación líder de proyecto	MTOP-SOP-2022-1582-ME.pdf	07/12/2022
