

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Zonal 6**  
**Dirección de Transporte y Obras Públicas Distrital Azuay**

**PROYECTO: K039** MTOP - Estabilización - Mitigación del sitio crítico del Km 49 de la carretera E582 Cuenca - Molleturo - El Empalme Etapa 1, ubicado en la provincia del Azuay

Líder del Proyecto:	Vintimilla Rojas, Gustavo Enrique (gvintimilla@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Barsallo Chavez, Luis Mario	Programas Relacionados:	
Titular:		Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.387344	TIR:	14.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	940,709.36
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	8,151,355.93
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/11/2021 - 31/10/2023
Fecha de última actualización:	03/01/2023	Fecha de Fin Base:	31/12/2022
Modificado por:	Vintimilla Rojas, Gustavo Enrique	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2022

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La Red Vial Estatal E582, es la principal vía de conexión entre las provincias del Azuay y Guayas, con un Tráfico Promedio Diario Anual, TPDA de 4200, con el pasar de los años se han presentado una serie de inestabilidades producto de los fuertes temporales invernales y de las condiciones geomorfológicas existentes en la zona, lo que ha afectado la infraestructura vial, evidenciándose a lo largo de la vía una serie de sitios críticos, siendo el más latente la inestabilidad del talud del km 49, el cual a presentado constantes derrumbes de rocas, material coluvial y capa vegetal, razón por la cual es necesario una intervención de manera inmediata para precautelar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

PRODUCTO / SERVICIO: Garantizar la conectividad y seguridad de los usuarios de la provincia del Azuay y Guayas; permitiendo el desarrollo productivo y turístico de la región.

LÍNEA BASE:

Indicador	Línea Base
Año 2021	
km de carretera estabilizada	0 km de carretera estabilizada
Número de sitios críticos atendidos	0 sitios críticos atendidos
m de cunetas construidas	0 m de cunetas construidas

OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO: ESTABILIZAR / MITIGAR EL SITIO CRÍTICO DEL KM 49 DE LA CARRETERA E582 CUENCA - MOLLETURO - EL EMPALME ETAPA 1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ESTABILIZAR / MITIGAR EL SITIO CRÍTICO DEL KM 49 DE LA CARRETERA E582 CUENCA - MOLLETURO - EL EMPALME ETAPA 1
- MONITOREAR Y EVALUAR EL PROYECTO

**Beneficios Cualitativos**

Este proyecto tiene por finalidad mitigar y estabilizar el impacto presentado por las inestabilidades producto de los fuertes temporales invernales y de las condiciones geomorfológicas existentes en la zona, lo que conlleva a un beneficio social que garantizará la conectividad y seguridad de los usuarios de la provincia del Azuay y Guayas, y de esta manera continuar con el desarrollo productivo y turístico de la región.

Al finalizar el proyecto se habrá estabilizado/mitigado el sitio crítico del km 49 de la carretera E582 Cuenca-Molleturo-El Empalme Etapa 1.

**Tipo de Beneficiario**

La población efectiva la constituyen las personas que utilizan el eje vial E582 específicamente en el tramo Cuenca-Molleturo-El Empalme, en sus diferentes tipos de vehículos tomando como referencia el Tráfico Promedio Diario Anual proyectado para el año 2021, se tiene un promedio de 16.621 vehículos circulando diariamente, por tanto, si se considera que en cada vehículo viajan alrededor de 4 personas tenemos que diariamente por la vía circulan aproximadamente 66.484 personas.

**Restricciones**

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 14 meses  
 COSTO: El proyecto tendrá un valor de US\$ 7.972.027,93 financiados con recursos fiscales


**Restricciones**

ALCANCE: Al finalizar el proyecto se habrá estabilizado/mitigado el sitio crítico del km 49 de la carretera E582 Cuenca-Molleturo-EI Empalme Etapa 1  
 RECURSOS: Asignación oportuna de los recursos presupuestarios necesarios en los años 2021 y 2022 para ejecutar de manera eficiente el proyecto en los tiempos establecidos

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 58.63 %  
 Fecha de Inicio: 01/11/2021      Fecha de Fin: 31/10/2023

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

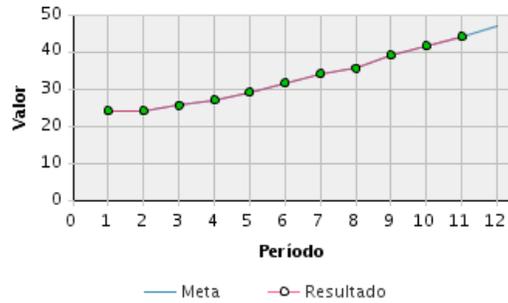

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	24 %	24 %	26 %	27 %	29 %	32 %	34 %	36 %	39 %	42 %	44 %	47 %
	Avance real acumulado											
	24 %	24 %	26 %	27 %	29 %	32 %	34 %	36 %	39 %	42 %	44 %	
	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>NOVIEMBRE 2022:</b></p> <p>Hito 33: Se realizan charlas de capacitación al personal previo a los trabajos. Se realizan comunicaciones escritas y radiales con informando acerca del proyecto.</p> <p>Hito 34: Se realizaron actividades de colocación y compactación de base en el Tramo 2 de la vía alterna, construcción de muro de retención de caídos para protección de usuarios de la vía alterna.</p> <p>Hito 35. Se realiza enrocado de protección en la vía alterna.</p> <p>Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2022-645-ME, de fecha 13 de mayo de 2022, el Subsecretario Z6 dispone la suspensión de trabajos en el talud y el inicio de los trabajos en el acceso a la escombrera a partir del 16 de mayo de 2022</p> <p>A través de la Orden de Cambio N° 1 se amplía el plazo por 99 días, es decir hasta el 21 de noviembre de 2022.</p> <p>El 28 de septiembre se legaliza la Orden de Trabajo N° 1 para la ejecución de 6 rubros nuevos por un monto de USD\$ 130.387,99.</p> <p>El 28 de septiembre de 2022 se suscribe el Contrato Complementario con un monto de USD\$ 521.552,08 y plazo de 308 días, es decir, se amplía el plazo hasta el 02 de agosto de 2023.</p> <p>El 18 de septiembre de 2022 se firmó el Contrato "Fiscalización de la Terminación de la Estabilización / mitigación del sitio crítico del km 49 y construcción de la variante provisional de la carretera E582 Cuenca-Molleturo-EI Empalme, ubicado en la provincia del Azuay (Etapa 1)", con un plazo de 3.4 meses (104 días) , es decir, hasta el 31 de diciembre de 2022.</p> <p>Las planillas No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4 de la Contratista están aprobadas por la Administración del Contrato de Obra y pagadas; las planillas No. 5, 6, 7 y la planilla CC1 01 están aprobadas por la Administración del Contrato de Obra. La Planilla No. 8 y CC 02 se encuentra en revisión.</p> <p>En la planilla No. 6 de la Contratista se devengó el antipo del Contrato Principal en su totalidad, sin embargo, no se registran, pues como se mencionó las planillas 5 y 6 no están pagadas.</p>	Vintimilla Rojas, Gustavo Enrique	03/01/2023 - 11:01 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Los montos planillados, el avance físico y el avance económico corresponden al Contrato Principal más el Contrato Complementario No. 1</p> <p>En el mes de octubre se realizaron entre otras las siguientes actividades: Colocación de base del Tramo 2 de la variante por la parte baja, compactación de base del Tramo 2 de la variante por la parte baja, control de compactación de material base en Tramo 2, construcción de muro de retención de caídos para protección de usuarios de la variante, cargado de explosivos para excavación en roca en Talud Superior</p>		
<p>Resúmenes Ejecutivos (Más recientes) Modificado por Fecha de última actualización</p> <p>OCTUBRE 2022: Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2022-645-ME, de fecha 13 de mayo de 2022, el Subsecretario Z6 dispone la suspensión de trabajos en el talud y el inicio de los trabajos en el acceso a la escombrera a partir del 16 de mayo de 2022</p> <p>A través de la Orden de Cambio N° 1 se amplía el plazo por 99 días, es decir hasta el 21 de noviembre de 2022.</p> <p>El 28 de septiembre se legaliza la Orden de Trabajo N° 1 para la ejecución de 6 rubros nuevos por un monto de USD\$ 130.387,99.</p> <p>El 28 de septiembre de 2022 se suscribe el Contrato Complementario con un monto de USD\$ 521.552,08 y plazo de 308 días, es decir, se amplía el plazo hasta el 02 de agosto de 2023.</p> <p>El 18 de septiembre de 2022 se firmó el Contrato "Fiscalización de la Terminación de la Estabilización / mitigación del sitio crítico del km 49 y construcción de la variante provisional de la carretera E582 Cuenca-Molleturo-El Empalme, ubicado en la provincia del Azuay (Etapa 1)", con un plazo de 3.4 meses (104 días) , es decir, hasta el 31 de diciembre de 2022.</p> <p>Las planillas No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4 de la Contratista están aprobadas por la Administración del Contrato de Obra y pagadas; las planillas 5 y 6 s están aprobadas por la Administración del Contrato de Obra y la Planilla No. 7 se encuentra en corrección por parte de la Contratista.</p> <p>El la planilla No. 6 de la Contratista se devengó el antipo del Contrato Principal en su totalidad, sin embargo, no se registran, pues como se mencionó las planillas 5 y 6 no están pagadas.</p> <p>Los montos planillados, el avance físico y el avance económico corresponden al Contrato Principal más el Contrato Complementario No. 1</p> <p>En el mes de octubre se realizaron entre otras las siguientes actividades: Colocación de base del Tramo 1 de la variante por la parte baja, Colocación de sub base del Tramo 2 de la variante por la parte baja, Muro de gaviones en el Tramo 2, Movimiento de tierras en el talud superior, Carga de explosivos para voladura en el talud superior</p>	<p>Mendieta Flores, Sara Alejandra</p>	<p>01/11/2022 - 03:21 PM</p>
<p>Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2022-645-ME, de fecha 13 de mayo de 2022, el Subsecretario Z6 dispone la suspensión de trabajos en el talud y el inicio de los trabajos en el acceso a la escombrera a partir del 16 de mayo de 2022</p> <p>A través de la Orden de Cambio N° 1 se amplía el plazo por 99 días, es decir hasta el 21 de noviembre de 2022.</p> <p>El 28 de septiembre se legaliza la Orden de Trabajo N° 1 para la ejecución de 6 rubros nuevos por un monto de USD\$ 130.387,99.</p> <p>El 28 de septiembre de 2022 se suscribe el Contrato Complementario con un monto de USD\$ 521.552,08 y plazo de 308 días, es decir, se amplía el plazo hasta el 02 de agosto de 2023.</p> <p>El 18 de septiembre de 2022 se firmó el Contrato "Fiscalización de la Terminación de la Estabilización / mitigación del sitio crítico del km 49 y construcción de la variante provisional de la carretera E582 Cuenca-Molleturo-El Empalme, ubicado en la provincia del Azuay (Etapa 1)", con un plazo de 3.4 meses (104 días) , es decir, hasta el 31 de diciembre de 2022.</p> <p>Las planillas No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4 de la Contratista están aprobadas por la Administración del Contrato de Obra y pagadas; las planillas 5 y 6 s están aprobadas por la Administración del Contrato de Obra y la Planilla No. 7 se encuentra en corrección por parte de la Contratista.</p> <p>El la planilla No. 6 de la Contratista se devengó el antipo del Contrato Principal en su totalidad, sin embargo, no se registran, pues como se mencionó las planillas 5 y 6 no están pagadas.</p> <p>Los montos planillados, el avance físico y el avance económico corresponden al Contrato Principal más el Contrato Complementario No. 1</p> <p>En el mes de octubre se realizaron entre otras las siguientes actividades: Colocación de base del Tramo 1 de la variante por la parte baja, Colocación de sub base del Tramo 2 de la variante por la parte baja, Muro de gaviones en el Tramo 2, Movimiento de tierras en el talud superior, Carga de explosivos para voladura en el talud superior</p>	<p>Mendieta Flores, Sara Alejandra</p>	<p>01/11/2022 - 03:13 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2022: Mediante oficio Nro. MTOP-SUBZ6-22-29-OF, de fecha 31 de enero de 2022, el Ing. Luis Mario Barsallo Chávez, Subsecretario Zonal 6, acogiendo la recomendación de la Administradora del Contrato de Obra, realizada mediante memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2022-54-ME, de fecha, 24 de enero de 2022, comunica al Contratista la suspensión de los trabajos hasta nueva orden, indicando que dicha suspensión corre desde el martes 25 de enero de 2022.</p> <p>El viernes 11 de febrero de 2022, un grupo de pobladores de Molleturo, luego de una manifestación en la gobernación del Azuay, llega al campamento de SUDINCO indicando que no permitirán que se ejecuten los trabajos, por lo que el día 14 de febrero de 2022 un grupo de 30</p>	<p>Mendieta Flores, Sara Alejandra</p>	<p>05/10/2022 - 02:47 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>policías y 2 oficiales militares se presentan en el proyecto para resguardar al personal que labora en el proyecto, acompañados de 20 moradores de las comunidades que auxiliarán el control en el campo, reiniciando las labores de mantenimiento de la vía alterna Migüir - Rio Blanco - Cochapamba. El viernes 18 de febrero de 2022, un grupo de pobladores de Molleturo retienen una plataforma (cama baja) y una motoniveladora propiedad de SUDINCO, se ha hecho varios intentos por recuperar la maquinaria pero a la fecha no se lo ha conseguido.</p> <p>El 22 de febrero de 2022, el Subsecretario Z6 y el Director de la Fiscalización se reunieron con las Autoridades de Molleturo y acordaron suscribir un acta con la cual se pudo recuperar la maquinaria.</p> <p>No ha sido posible iniciar la ejecución los trabajos programada para el día 2 de marzo de 2022 debido a fuerte oposición de los moradores de la parroquia Molleturo pese a la presencia y el resguardo tanto policial como militar, que han puesto en peligro la integridad del personal como de la maquinaria.</p> <p>El miércoles 16 de marzo de 2022, las fuerzas del orden armaron un cerco de seguridad y tomaron posición en el área de influencia del proyecto, lo que permitió que la Contratista pueda ingresar con su maquinaria al sitio de intervención en el km 49 y ejecutar trabajos preliminares. Mediante oficio Nro. MTOP-SUBZ6-22-88-OF, de fecha 23 de marzo de 2022, el Ing. Luis Mario Barsallo Chávez, Subsecretario Zonal 6, acogiendo la recomendación de la Fiscalización, Supervisión y Administradora del Contrato de Obra, notifica el levantamiento de la suspensión del plazo contractual, indicando que dicho levantamiento de suspensión reanuda el plazo a partir del lunes 21 de marzo de 2022, así como todas las obligaciones y responsabilidades que se derivan de la relación contractual.</p> <p>Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2022-645-ME, de fecha 13 de mayo de 2022, el Subsecretario Z6 dispone la suspensión de trabajos en el talud y el inicio de los trabajos en el acceso a la escombrera a partir del 16 de mayo de 2022</p> <p>A través de la Orden de Cambio N° 1 se amplía el plazo por 99 días, es decir hasta el 21 de noviembre de 2022. El 28 de septiembre se legaliza la Orden de Trabajo N° 1 para la ejecución de 6 rubros nuevos por un monto de USD\$ 130.387,99.</p> <p>El 28 de septiembre de 2022 se suscribe el Contrato Complementario con un monto de USD\$ 521.552,08 y plazo de 308 días, es decir, se amplía el plazo hasta el 02 de agosto de 2023.</p>		
<p>AGOSTO 2022: Las actividades mas relevantes dentro de este mes son: Excavación en el talud superior (roca mediante voladura y con matillo hidráulico; marginal y suelo), Colocación de subbase en el acceso a la escombrera 0+000 - 0+914, Encauzamientos de entrada y salida de las alcantarillas 0+419 y 0+914, Suministro y reparto de instructivos o trípticos, Comunicados radiales y Comunicados de prensa escrita. En el ambito ambiental: El proyecto cumple con las obligaciones de la Licencia Ambiental, su reporte semestral y validación de planillas en esta actividad, A la presente fecha, se cumple con los Informes Ambientales y Monitoreo, Suministro y reparto de instructivos o trípticos, Comunicados radiales y Comunicados de prensa escrita, La contratista debe obtener el certificado de Registro de generadores de desechos peligrosos. Actos administrativos: Las planillas No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4 de la Contratista están aprobadas por la Administración del Contrato de Obra y pagadas; y la Planilla No. 5 se encuentra en revisión por parte de la Fiscalización, Las planillas No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Fiscalización están pagadas y la planilla 7 aprobada por la Administración del Contrato de Fiscalización y se encuentra en el departamento Financiero. FISCALIZACION: El 17 de agosto se firmó el Contrato Complementario N° 1, sin incremento de monto, con el que se amplía el plazo en 30 días, es decir, hasta el 17 de septiembre de 2022.</p>	<p>Mendieta Flores, Sara Alejandra</p>	<p>05/09/2022 - 11:02 AM</p>
<p>JULIO 2022: Con fecha 02 de junio de 2022 se suscribe la Orden de Cambio No. 1, con la que se amplía el plazo contractual en 99 días, siendo la fecha de terminación vigente el 21 de noviembre de 2022. Las garantías del contrato se encuentran actualizadas y vigentes: FCC 18/02/2022 y BUA 10/12/2022. Las planillas de obra se encuentran tramitadas y acreditadas hasta la planilla Nro. 4 (JUNIO 2022), con un monto acumulado de 1,611.332,62. las actividades relevantes durante este periodo son: MOVIMIENTO DE TIERRAS.- excavación en roca, en marginal, en suelo y transporte de material de excavación a escombreras (Transporte libre 500 mts), OBRAS DE PROTECCIÓN Y RETENCIÓN: excavación y relleno para estructuras, geotextil para subdren NT 2000 o similar, OBRAS DE ACCESO A ESCOMBRERA: excavación en marginal, en suelo, tubería de acero corrugado d=1.50m, e=2.50m, incluye accesorios, transporte de material de excavación a escombreras (Transporte libre 500 mts), IMPACTO AMBIENTAL: Escombrera reconformación con material excedente, incluye obras complementarias, charlas de concientización, suministro y reparto de instructivos o trípticos, comunicados radiales (1/2min), comunicados de prensa escrita, agua para control de polvo.</p>	<p>Manuel Edmundo, Bedoya Naula</p>	<p>05/09/2022 - 09:54 AM</p>
<p>JUNIO 2022: No han sido aprobados los recursos para este año 2022 para este proyecto. Se anexa el Memorando MTOP-CGP-2022-74-ME donde se aprueba el POA 2022. Mediante Oficio Nro. MTOP-SUBZ6-22-88-OF del 23 de marzo de 2022 el Ing. Luis Mario Barsallo Chavez, SUBSECRETARIO/A DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ZONAL 6 comunica al Ing. César Enrique Torres Mesias Gerente General SUDINCO S.A. "(...)que se reanuda el plazo a partir del lunes 21 de marzo de 2022", por tanto se han reiniciado los</p>	<p>Plaza Quintuña, Galo Patricio</p>	<p>22/06/2022 - 12:14 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>trabajos respectivos. Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2022-520-ME del 22 de abril de 2022 el Ing. Luis Mario Barsallo Chavez, SUBSECRETARIO/A DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ZONAL 6 solicita a la Sra. Mgs. Carolina Oliva Ormazza Saldaña, Viceministro/a de la Infraestructura del Transporte y Obras Publicas, la Inclusión al PAI.</p> <p>Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2022-449-ME del 24 de mayo de 2022 la administradora del contrato comunica aprobación respecto a la ampliación de plazo por 99 días, solicita la reprogramación y la suscripción de la Orden de cambio N°1</p> <p>Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2022-562-ME del 21 de junio de 2022 la supervisión remite a la administradora del contrato la reprogramación y la metodología de trabajos debidamente legalizadas</p> <p>Se inician los trámites para la creación de la subactividad del contratista y la fiscalización para la asignación de recursos para pago de planillas</p>		
<p>MAYO 2022: No han sido aprobados los recursos para este año 2022 para este proyecto. Se anexa el Memorando MTOP-CGP-2022-74-ME donde se aprueba el POA 2022.</p> <p>Mediante Oficio Nro. MTOP-SUBZ6-22-88-OF del 23 de marzo de 2022 el Ing. Luis Mario Barsallo Chavez, SUBSECRETARIO/A DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ZONAL 6 comunica al Ing. César Enrique Torres Mesias Gerente General SUDINCO S.A. "(...)que se reanuda el plazo a partir del lunes 21 de marzo de 2022", por tanto se han reiniciado los trabajos respectivos. Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2022-520-ME del 22 de abril de 2022 el Ing. Luis Mario Barsallo Chavez, SUBSECRETARIO/A DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ZONAL 6 solicita a la Sra. Mgs. Carolina Oliva Ormazza Saldaña, Viceministro/a de la Infraestructura del Transporte y Obras Publicas, la Inclusión al PAI.</p> <p>Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2022-449-ME del 24 de mayo de 2022 la administradora del contrato comunica aprobación respecto a la ampliación de plazo por 99 días, solicita la reprogramación y la suscripción de la Orden de cambio N°1</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	22/06/2022 - 12:03 PM
<p>ABRIL 2022: No han sido aprobados los recursos para este año 2022 para este proyecto. Se anexa el Memorando MTOP-CGP-2022-74-ME donde se aprueba el POA 2022.</p> <p>Mediante Oficio Nro. MTOP-SUBZ6-22-88-OF del 23 de marzo de 2022 el Ing. Luis Mario Barsallo Chavez, SUBSECRETARIO/A DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ZONAL 6 comunica al Ing. César Enrique Torres Mesias Gerente General SUDINCO S.A. "(...)que se reanuda el plazo a partir del lunes 21 de marzo de 2022", por tanto se han reiniciado los trabajos respectivos. Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2022-520-ME del 22 de abril de 2022 el Ing. Luis Mario Barsallo Chavez, SUBSECRETARIO/A DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ZONAL 6 solicita a la Sra. Mgs. Carolina Oliva Ormazza Saldaña, Viceministro/a de la Infraestructura del Transporte y Obras Publicas, la Inclusión al PAI.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	06/05/2022 - 07:50 AM
<p>MARZO 2022: No han sido aprobados los recursos para este año 2022 para este proyecto. Se anexa el Memorando MTOP-CGP-2022-74-ME donde se aprueba el POA 2022.</p> <p>Mediante Oficio Nro. MTOP-SUBZ6-22-88-OF del 23 de marzo de 2022 el Ing. Luis Mario Barsallo Chavez, SUBSECRETARIO/A DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ZONAL 6 comunica al Ing. César Enrique Torres Mesias Gerente General SUDINCO S.A. "(...)que se reanuda el plazo a partir del lunes 21 de marzo de 2022", por tanto se han reiniciado los trabajos respectivos.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	06/04/2022 - 12:37 PM
<p>FEBRERO 2022: No han sido aprobados los recursos para este año 2022 para este proyecto. Se anexa el Memorando MTOP-CGP-2022-74-ME donde se aprueba el POA 2022.</p> <p>Al momento los trabajos se encuentran suspendidos en vista del grave problema social existente, se anexa el Oficio Nro. MTOP-SUBZ6-22-29-OF del 31 de enero de 2022 con el cual se comunica al Ingeniero César Enrique Torres Mesias, Gerente General SUDINCO S.A., referente a la suspensión de los trabajos hasta nueva orden, suspensión que corre desde el martes 25 de enero de 2022. Con Oficio Nro. MTOP-SUBZ6-22-61-OF del 03 de marzo de 2022 el Ing. Luis Mario Barsallo Chavez, SUBSECRETARIO/A ZONAL 6 procede a levantar la suspensión, la contratista traslada la maquinaria al sitio pero nuevamente los moradores proceden a cerrar la vía sin permitir que se inicien los trabajos, ni siquiera permitieron que la maquinaria ingrese, por tanto mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2022-327-ME del 04 de marzo de 2022 el Ing. Luis Mario Barsallo Chavez, SUBSECRETARIO/A ZONAL 6 deja sin efecto el levantamiento de la suspensión solicitada, al momento continúan suspendidas las labores por oposición de los moradores, sin que exista solución al respecto.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	08/03/2022 - 12:13 PM
<p>ENERO 2022: No han sido aprobados los recursos para este año 2022 para este proyecto. Se anexa el Memorando MTOP-CGP-2022-74-ME donde se aprueba el POA 2022.</p> <p>Al momento los trabajos se encuentran suspendidos en vista del grave problema social existente, se anexa el Oficio Nro. MTOP-SUBZ6-22-29-OF del 31 de enero de 2022 con el cual se comunica al Ingeniero César Enrique Torres Mesias, Gerente General SUDINCO S.A., referente a la suspensión de los trabajos hasta nueva orden, suspensión que corre desde el martes 25 de enero de 2022.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	04/02/2022 - 03:10 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2021: Con fecha 17 de diciembre se adjudican los contratos de obra y fiscalización para la "Estabilización y Mitigación del sitio crítico km 49 de la Carretera Cuenca-Molleturo-EI Empalme". A la espera de la acreditación del anticipo a la contratista de la obra.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	18/01/2022 - 04:09 PM
NOVIEMBRE 2021: Se realizan los trámites pertinentes para obtención del dictamen de prioridad, inclusión al PAI 2021 y certificación plurianual 2021-2022	Plaza Quintuña, Galo Patricio	18/01/2022 - 04:07 PM

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Azuay > Cuenca

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Aprobación integral de los Estudios de Estabilización del sitio crítico del Km 49 Cuenca Molleturo por parte de la Subsecretaría Zonal 6 del MTOP	9-Entregables Formales	12/11/2021		12/11/2021		Sí	2.0
2	DEFINICIÓN: Solicitud de elaboración del formato de la SNP al departamento de Planificación de la Subsecretaría Zonal 6 del MTOP para presentación a la Secretaría Nacional de Planificación	1-Solicitud de Información	12/11/2021		12/11/2021		Sí	2.0
3	DEFINICIÓN: Aprobación del Dictamen de Prioridad por parte de la Secretaría Nacional de Planificación	9-Entregables Formales	24/11/2021		24/11/2021		Sí	2.0
4	DEFINICIÓN: Aprobación de la Inclusión al PAI 2021 por parte de la Secretaría Nacional de Planificación	5-Entregables Intermedios	03/12/2021		03/12/2021		Sí	2.0
5	DEFINICIÓN: Aprobación de la Certificación Presupuestaria Plurianual por parte de la Secretaría Nacional de Planificación	5-Entregables Intermedios	08/12/2021		08/12/2021		Sí	2.0
6	PLANEACIÓN: Certificación de planificación y autorización de Aval para el contrato de FISCALIZACIÓN de Estabilización del sitio crítico del Km 49 Cuenca Molleturo	5-Entregables Intermedios	08/12/2021		08/12/2021		Sí	3.0
7	PLANEACIÓN: Solicitud de Certificación de Aval para el contrato de OBRA de Estabilización del sitio crítico del Km 49 Cuenca Molleturo	1-Solicitud de Información	08/12/2021		08/12/2021		Sí	3.0
8	PLANEACIÓN: Disposición de publicación del proceso	2-Publicación de Pliegos	09/12/2021		09/12/2021		Sí	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de "Estabilización / Mitigación del sitio crítico del Km 49 de la carretera E582 Cuenca-Molleturo-El Empalme, ubicado en la provincia del Azuay, (Etapa 1)" en el Portal de Compras Públicas							
9	EJECUCIÓN: Adjudicación del contrato de "Estabilización / Mitigación del sitio crítico del Km 49 de la carretera E582 Cuenca-Molleturo-El Empalme, ubicado en la provincia del Azuay, (Etapa 1)"	3-Adjudicación	17/12/2021		17/12/2021		Sí	2.0
10	EJECUCIÓN: Adjudicación del Contrato de Prestación de Servicios para la "Fiscalización de la Estabilización / Mitigación del sitio crítico del Km 49 de la carretera E582 Cuenca-Molleturo-El Empalme, ubicado en la provincia del Azuay, (Etapa 1)"	3-Adjudicación	17/12/2021		17/12/2021		Sí	2.0
11	EJECUCIÓN: IMPACTO AMBIENTAL (Escombrera reconformación-Suministro y reparto de instructivos-Comunicados radiales-Comunicados de prensa escrita-Agua para control de polvo-Batería sanitaria+fosa séptica-Trampa de grasas)	4-Inicio de Trabajo	31/03/2022		31/03/2022		Sí	0.5
12	EJECUCIÓN: MOVIMIENTOS DE TIERRAS/34777 metros cúbicos (Limpieza de derrumbe-Desbroce, Desbosque y Limpieza-Excavación en roca-Excavación en marginal-Excavación en suelo-Transporte de material)	4-Inicio de Trabajo	31/03/2022		31/03/2022		Sí	1.0
13	EJECUCIÓN: IMPACTO AMBIENTAL (Escombrera reconformación con material excedente-Suministro y reparto de instructivos o trípticos-Comunicados radiales (rotativas 1/2 min)-Comunicados de prensa escrita-Agua para control de polvo)	4-Inicio de Trabajo	30/04/2022		30/04/2022		Sí	0.5
14	EJECUCIÓN: MOVIMIENTOS DE TIERRAS/34777 metros cúbicos (Limpieza de derrumbe-Desbroce, Desbosque y Limpieza-Excavación en roca-Excavación en marginal-Excavación en suelo-Transporte de material)	4-Inicio de Trabajo	30/04/2022		30/04/2022		Sí	1.0
15	EJECUCIÓN: IMPACTO AMBIENTAL (Escombrera reconformación-Charlas de concientización-Comunicados	4-Inicio de Trabajo	31/05/2022		31/05/2022		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	radiales-Comunicados de prensa escrita-Monitoreo de calidad de agua-Monit de la calidad de suelo-Monitoreo de la calidad del aire ambiente-Monitoreo de ruido)							
16	EJECUCIÓN: MOVIMIENTOS DE TIERRAS/34777 metros cúbicos (Limpieza de derrumbe-Desbroce, Desbosque y Limpieza-Excavación en roca-Excavación en marginal-Excavación en suelo-Transporte de material)	4-Inicio de Trabajo	31/05/2022		31/05/2022		Sí	1.0
17	EJECUCIÓN: OBRAS DE ACCESO A ESCOMBRERA (Desbroce, Desbosque y Limpieza-Acabado de la obra básica existente-Excavación en marginal-Excavación en suelo-Tubería de acero corrug-Hormigón de cemento-Hormigón estructural de cemento-Acero de refuerzo en barras)	4-Inicio de Trabajo	31/05/2022		31/05/2022		Sí	0.5
18	EJECUCIÓN: IMPACTO AMBIENTAL (Escombrera reconformació-Agua para control de polvo-Monitoreos aire, suelo, ruido)	4-Inicio de Trabajo	30/06/2022		30/06/2022		Sí	0.5
19	EJECUCIÓN: MOVIMIENTOS DE TIERRAS/34777 metros cúbicos (Excavación en roca-Excavación en marginal-Transporte de material)	4-Inicio de Trabajo	30/06/2022		30/06/2022		Sí	1.0
20	EJECUCIÓN: OBRAS DE ACCESO A ESCOMBRERA (Desbroce, Desbosque y Limpieza-Acabado de la obra básica existente-Excavación en marginal-Tubería de acero corrug)	4-Inicio de Trabajo	30/06/2022		30/06/2022		Sí	1.0
21	EJECUCIÓN: IMPACTO AMBIENTAL (Escombrera reconformación con material excedente-Suministro y reparto de instructivos o trípticos-Comunicados radiales (rotativas 1/2 min)-Comunicados de prensa escrita-Agua para control de polvo)	4-Inicio de Trabajo	31/07/2022		31/07/2022		Sí	0.5
22	EJECUCIÓN: MOVIMIENTOS DE TIERRAS/34777 metros cúbicos (Excavación en roca-Excavación en marginal-Transporte de material)	4-Inicio de Trabajo	31/07/2022		31/07/2022		Sí	1.0
23	EJECUCIÓN: OBRAS DE DRENAJE (Hormigón de cemento Portland Clase D-Excavación manual para cunetas y encauzamientos-Transporte de material)	4-Inicio de Trabajo	31/07/2022		31/07/2022		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
24	EJECUCIÓN: IMPACTO AMBIENTAL (Charlas de concientización-Charlas de capacitación al personal-Suministro y reparto de instructivos o trípticos-Comunicados radiales (rotativas 1/2 min)-Comunicados de prensa escrita-Área sembrada - (Revegetación))	4-Inicio de Trabajo	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.5
25	EJECUCIÓN: MOVIMIENTOS DE TIERRAS/34777 metros cúbicos (Limpieza de derrumbe-Excavación en roca-Excavación en marginal-Excavación en suelo-Transporte de material)	4-Inicio de Trabajo	31/08/2022		31/08/2022		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: IMPACTO AMBIENTAL (Charlas de concientización-Charlas de capacitación al personal-Suministro y reparto de instructivos o trípticos-Comunicados radiales (rotativas 1/2 min)-Comunicados de prensa escrita-Área sembrada - (Revegetación))	4-Inicio de Trabajo	30/09/2022		30/09/2022		Sí	0.5
27	EJECUCIÓN: MOVIMIENTOS DE TIERRAS/34777 metros cúbicos (Limpieza de derrumbe-Excavación en roca-Excavación en marginal-Excavación en suelo-Transporte de material)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2022		30/09/2022		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: OBRAS VIA ALTERNA (Limpieza de derrumbe-Desbroce-Excavación en roca-Excavación en marginal-Excavación en suelo-Transporte de material)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2022		30/09/2022		Sí	1.0
29	RUBROS NUEVOS: (Contrato Complementario 1) Estabilizacion con material petreo - Material de prestamo Importado- Enrocado de proteccion - Transporte de materiales	4-Inicio de Trabajo	30/09/2022		30/09/2022		Sí	1.0
30	EJECUCIÓN: IMPACTO AMBIENTAL (Charlas de concientización-Charlas de capacitación al personal-Suministro y reparto de instructivos o trípticos-Comunicados radiales (rotativas 1/2 min)-Comunicados de prensa escrita-Área sembrada - (Revegetación))	4-Inicio de Trabajo	31/10/2022		31/10/2022		Sí	0.5
31	EJECUCIÓN: OBRAS VIA ALTERNA (Limpieza de derrumbe-Desbroce-	4-Inicio de Trabajo	31/10/2022		31/10/2022		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Excavación en roca- Excavación en marginal- Excavación en suelo- Transporte de material)							
32	RUBROS NUEVOS: (Contrato Complementario 1) Estabilizacion con material petreo - Material de prestamo Importado- Enrocado de proteccion - Transporte de materiales	4-Inicio de Trabajo	31/10/2022		31/10/2022		Sí	1.0
33	EJECUCIÓN: IMPACTO AMBIENTAL (Charlas de concientización- Charlas de capacitación al personal-Suministro y reparto de instructivos o trípticos-Comunicados radiales (rotativas 1/2 min)- Comunicados de prensa escrita-Área sembrada - (Revegetación))	4-Inicio de Trabajo	30/11/2022		30/11/2022		Sí	0.5
34	EJECUCIÓN: OBRAS VIA ALTERNA (Limpieza de derrumbe-Desbroce- Excavación en roca- Excavación en marginal- Excavación en suelo- Transporte de material)	4-Inicio de Trabajo	30/11/2022		30/11/2022		Sí	1.0
35	RUBROS NUEVOS: (Contrato Complementario 1) Estabilizacion con material petreo - Material de prestamo Importado- Enrocado de proteccion - Transporte de materiales	4-Inicio de Trabajo	30/11/2022		30/11/2022		Sí	1.0
36	EJECUCIÓN: IMPACTO AMBIENTAL (Charlas de concientización- Charlas de capacitación al personal-Suministro y reparto de instructivos o trípticos-Comunicados radiales (rotativas 1/2 min)- Comunicados de prensa escrita-Área sembrada - (Revegetación))	4-Inicio de Trabajo	31/12/2022	31/12/2022			No	1.0
37	EJECUCIÓN: OBRAS VIA ALTERNA (Limpieza de derrumbe-Desbroce- Excavación en roca- Excavación en marginal- Excavación en suelo- Homigon de Cemento Portland, Acero de refuerzo, Material filtrante, Sub Base, Base, Transporte de material)	4-Inicio de Trabajo	31/12/2022	31/12/2022			No	1.0
38	RUBROS NUEVOS: (Contrato Complementario 1) Estabilizacion con material petreo - Material de prestamo Importado- Enrocado de proteccion - Transporte de materiales	4-Inicio de Trabajo	31/12/2022	31/12/2022			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
39	EJECUCIÓN: IMPACTO AMBIENTAL (Charlas de concientización-Charlas de capacitación al personal-Suministro y reparto de instructivos o trípticos-Comunicados radiales (rotativas 1/2 min)-Comunicados de prensa escrita-Área sembrada - (Revegetación))	4-Inicio de Trabajo	31/01/2023	31/01/2023			No	1.0
40	EJECUCIÓN: MOVIMIENTOS DE TIERRAS/34777 metros cúbicos (Limpieza de derrumbe-Excavación en roca-Excavación en marginal-Excavación en suelo-Transporte de material)	5-Entregables Intermedios	31/01/2023	31/01/2023			No	1.0
41	EJECUCIÓN: OBRAS DE DRENAJE (Hormigón de cemento Portland Clase D-Excavación manual para cunetas y encauzamientos-Transporte de material)	5-Entregables Intermedios	31/01/2023	31/01/2023			No	1.0
42	EJECUCIÓN: OBRAS DE PROTECCIÓN Y RETENCIÓN (Sist de estabil-Bar contra caída de rocas y detritos-Geomanto para control de erosión-Excav y relleno para estruct-Tubería de acero corrugado-Acero de ref en barras-Hormigón de cement-Hormigón estruc de cement)	5-Entregables Intermedios	31/01/2023	31/01/2023			No	1.0
43	EJECUCIÓN: IMPACTO AMBIENTAL (Charlas de concientización-Charlas de capacitación al personal-Suministro y reparto de instructivos o trípticos-Comunicados radiales (rotativas 1/2 min)-Comunicados de prensa escrita-Área sembrada - (Revegetación))	4-Inicio de Trabajo	28/02/2023	28/02/2023			No	1.0
44	EJECUCIÓN: MOVIMIENTOS DE TIERRAS/34777 metros cúbicos (Limpieza de derrumbe-Excavación en roca-Excavación en marginal-Excavación en suelo-Transporte de material)	4-Inicio de Trabajo	28/02/2023	28/02/2023			No	1.0
45	EJECUCIÓN: OBRAS DE DRENAJE (Hormigón de cemento Portland Clase D-Excavación manual para cunetas y encauzamientos-Transporte de material)	4-Inicio de Trabajo	28/02/2023	28/02/2023			No	1.0
46	EJECUCIÓN: OBRAS DE PROTECCIÓN Y RETENCIÓN (Sist de estabil-Bar contra caída de rocas y detritos-Geomanto para control de erosión-Excav y relleno para	4-Inicio de Trabajo	28/02/2023	28/02/2023			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	estruct-Tubería de acero corrugado-Acero de ref en barras-Hormigón de cement-Hormigón estruc de cement)							
47	EJECUCIÓN: IMPACTO AMBIENTAL (Charlas de concientización-Charlas de capacitación al personal-Suministro y reparto de instructivos o trípticos-Comunicados radiales (rotativas 1/2 min)-Comunicados de prensa escrita-Área sembrada - (Revegetación))	4-Inicio de Trabajo	31/03/2023	31/03/2023			No	1.0
48	EJECUCIÓN: MOVIMIENTOS DE TIERRAS/34777 metros cúbicos (Limpieza de derrumbe-Excavación en roca-Excavación en marginal-Excavación en suelo-Transporte de material)	4-Inicio de Trabajo	31/03/2023	31/03/2023			No	2.0
49	EJECUCIÓN: OBRAS DE DRENAJE (Hormigón de cemento Portland Clase D-Excavación manual para cunetas y encauzamientos-Transporte de material)	4-Inicio de Trabajo	31/03/2023	31/03/2023			No	2.0
50	EJECUCIÓN: OBRAS DE PROTECCIÓN Y RETENCIÓN (Sist de estabil-Bar contra caída de rocas y detritos-Geomanto para control de erosión-Excav y relleno para estruct-Tubería de acero corrugado-Acero de ref en barras-Hormigón de cement-Hormigón estruc de cement)	5-Entregables Intermedios	31/03/2023	31/03/2023			No	2.0
51	EJECUCIÓN: IMPACTO AMBIENTAL (Charlas de concientización-Charlas de capacitación al personal-Suministro y reparto de instructivos o trípticos-Comunicados radiales (rotativas 1/2 min)-Comunicados de prensa escrita-Área sembrada - (Revegetación))	4-Inicio de Trabajo	30/04/2023	30/04/2023			No	1.0
52	EJECUCIÓN: MOVIMIENTOS DE TIERRAS/34777 metros cúbicos (Limpieza de derrumbe-Excavación en roca-Excavación en marginal-Excavación en suelo-Transporte de material)	4-Inicio de Trabajo	30/04/2023	30/04/2023			No	2.0
53	EJECUCIÓN: OBRAS DE DRENAJE (Hormigón de cemento Portland Clase D-Excavación manual para cunetas y encauzamientos-Transporte de material)	4-Inicio de Trabajo	30/04/2023	30/04/2023			No	2.0
54	EJECUCIÓN: OBRAS DE PROTECCIÓN Y RETENCIÓN	4-Inicio de Trabajo	30/04/2023	30/04/2023			No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	(Sist de estabil-Bar contra caída de rocas y detritos-Geomanto para control de erosión-Excav y relleno para estruct-Tubería de acero corrugado-Acero de ref en barras-Hormigón de cement-Hormigón estruc de cement)							
55	EJECUCIÓN: IMPACTO AMBIENTAL (Charlas de concientización-Charlas de capacitación al personal-Suministro y reparto de instructivos o trípticos-Comunicados radiales (rotativas 1/2 min)-Comunicados de prensa escrita-Área sembrada - (Revegetación))	4-Inicio de Trabajo	31/05/2023	31/05/2023			No	1.0
56	EJECUCIÓN: MOVIMIENTOS DE TIERRAS/34777 metros cúbicos (Limpieza de derrumbe-Excavación en roca-Excavación en marginal-Excavación en suelo-Transporte de material)	5-Entregables Intermedios	31/05/2023	31/05/2023			No	2.0
57	EJECUCIÓN: OBRAS DE DRENAJE (Hormigón de cemento Portland Clase D-Excavación manual para cunetas y encauzamientos-Transporte de material)	4-Inicio de Trabajo	31/05/2023	31/05/2023			No	2.0
58	EJECUCIÓN: OBRAS DE PROTECCIÓN Y RETENCIÓN (Sist de estabil-Bar contra caída de rocas y detritos-Geomanto para control de erosión-Excav y relleno para estruct-Tubería de acero corrugado-Acero de ref en barras-Hormigón de cement-Hormigón estruc de cement)	4-Inicio de Trabajo	31/05/2023	31/05/2023			No	2.0
59	EJECUCIÓN: IMPACTO AMBIENTAL (Charlas de concientización-Charlas de capacitación al personal-Suministro y reparto de instructivos o trípticos-Comunicados radiales (rotativas 1/2 min)-Comunicados de prensa escrita-Área sembrada - (Revegetación))	4-Inicio de Trabajo	30/06/2023	30/06/2023			No	1.0
60	EJECUCIÓN: OBRAS DE DRENAJE (Hormigón de cemento Portland Clase D-Excavación manual para cunetas y encauzamientos-Transporte de material)	4-Inicio de Trabajo	30/06/2023	30/06/2023			No	2.0
61	EJECUCIÓN: OBRAS DE PROTECCIÓN Y RETENCIÓN (Sist de estabil-Bar contra caída de rocas y detritos-Geomanto para control de	4-Inicio de Trabajo	30/06/2023	30/06/2023			No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	erosión-Excav y relleno para estruct-Tubería de acero corrugado-Acero de ref en barras-Hormigón de cement-Hormigón estruc de cement)							
62	EJECUCIÓN: CALZADA (Excavación en suelo-Remoción de hormigón-Sub-base Clase 1-Base Clase 1-Geomalla-Capa de rodadura de hormigón asfáltico-Asfalto MC para imprimación-Asfalto RC para riego de adherencia-Transporte de material)	5-Entregables Intermedios	31/07/2023	31/07/2023			No	3.0
63	EJECUCIÓN: IMPACTO AMBIENTAL (Charlas de concientización-Charlas de capacitación al personal-Suministro y reparto de instructivos o trípticos-Comunicados radiales (rotativas 1/2 min)-Comunicados de prensa escrita-Área sembrada - (Revegetación))	4-Inicio de Trabajo	31/07/2023	31/07/2023			No	1.0
64	EJECUCIÓN: OBRAS DE PROTECCIÓN Y RETENCIÓN (Sist de estabil-Bar contra caída de rocas y detritos-Geomanto para control de erosión-Excav y relleno para estruct-Tubería de acero corrugado-Acero de ref en barras-Hormigón de cement-Hormigón estruc de cement)	4-Inicio de Trabajo	31/07/2023	31/07/2023			No	2.0
65	EJECUCIÓN: SEÑALIZACIÓN (Marcas de pavimento-Señales-Marcas sobresalidas en el pavimento-Guardavías doble metálico)	5-Entregables Intermedios	31/07/2023	31/07/2023			No	2.5
66	EJECUCIÓN: SEÑALIZACIÓN (Marcas de pavimento-Señales-Marcas sobresalidas en el pavimento-Guardavías doble metálico)	9-Entregables Formales	02/08/2023	02/08/2023			No	0.5
67	CIERRE: Informes de Fiscalización-aprobada	4-Inicio de Trabajo	31/08/2023	31/08/2023			No	1.0
68	CIERRE: Liquidación Económica-aprobada	4-Inicio de Trabajo	11/09/2023	11/09/2023			No	1.0
69	CIERRE: Acta de Recepción Provisional-suscrita	9-Entregables Formales	30/09/2023	30/09/2023			No	1.25
70	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva-suscrita	5-Entregables Intermedios	09/10/2023	09/10/2023			No	1.25
71	CIERRE: Cierre proyecto según formato de la SNP-aprobada	5-Entregables Intermedios	12/10/2023	12/10/2023			No	1.5
72	CIERRE: Certificación de la Coordinación Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno-suscrita	9-Entregables Formales	14/10/2023	14/10/2023			No	1.0
73	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera	9-Entregables Formales	19/10/2023	19/10/2023			No	1.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago-suscrita							
74	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar-suscrito MEF	5-Entregables Intermedios	26/10/2023	26/10/2023			No	1.0
75	CIERRE: Solicitud de cierre del proyecto a la Máxima Autoridad	5-Entregables Intermedios	31/10/2023	31/10/2023			No	1.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de Rehabilitación de 0,6 km de carretera en óptimas condiciones de servicio		100.00 %	0.2272	0.2272	01/03/2022	Jul-Sep


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	233,698.92
Estimado Al Fin Del Proyecto:	8,151,355.93 **
Costo Total:	7,972,027.93
Total Devengado:	2,088,764.25
% Costo Total Devengado:	26.20 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 26.20 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	525,245.02	8,151,355.93	0.00	8,676,600.95
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	525,245.02	0.00	0.00	525,245.02
Ppto. Codificado	525,245.02	8,151,355.93	0.00	8,676,600.95
Ppto. Comprometido	525,245.02	890,277.13	0.00	1,415,522.15
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	525,245.02	8,151,355.93	0.00	8,676,600.95
Ppto. Devengado	0.00	2,088,764.25	0.00	2,088,764.25
Pagado Real	0.00	2,088,764.25	0.00	2,088,764.25
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	525,245.02	8,151,355.93	0.00	8,676,600.95
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	25.62 %	0.00 %	24.07 %
Ppto. Codificado 998	0.00	494,474.96	0.00	494,474.96
Ppto. Devengado 998	0.00	2,088,764.25	0.00	2,088,764.25

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.00 %

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	1,128,607.52	890,277.13	1,128,607.52	890,277.13	78.88 %		10.92 %
Jul	1,604,308.61	715,235.23	2,732,916.13	1,605,512.36	58.75 %		19.70 %
Ago	876,988.99	277,804.82	3,609,905.12	1,883,317.18	52.17 %		23.10 %
Sep	891,951.16	0.00	4,501,856.28	1,883,317.18	41.83 %		23.10 %
Oct	1,084,518.86	205,447.07	5,586,375.14	2,088,764.25	37.39 %		25.62 %
Nov	1,270,602.90	0.00	6,856,978.04	2,088,764.25	30.46 %		25.62 %
Dic	1,294,377.89		8,151,355.93				
<b>Total</b>	<b>8,151,355.93</b>	<b>2,088,764.25</b>					

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
17	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1_DECLARATORIA DE EMERGENCIA_CUENCA MOLLETURO_No 056-2021	No-056-2021_declarar-emergencia-cuenca_molleturo_naranjal.pdf	14/01/2022
2	A2_HITO 1_MTOP-SUBZ6-2021-2372-ME_APROBACIÓN INTEGRAL ESTUDIOS SITIO CRÍTICO KM 49 CUENCA MOLLETURO	MTOP-SUBZ6-2021-2372-ME_APROBACIÓN_INTEGRAL_ESTUDIOS_SITIO_CRÍTICO_KM_49_CUENCA_MOLLETURO	14/01/2022
3	A3_HITO 1_INFORME FINAL DE INGENIERÍA_ESTUDIOS SITIO CRÍTICO KM 49 CUENCA MOLLETURO_PART 1	2021-11-12_11-25-52_INFORMEFINALDEINGENIERIA-SIGNED-1-20.pdf	13/01/2022
4	A4_HITO 1_INFORME FINAL DE INGENIERÍA_ESTUDIOS SITIO CRÍTICO KM 49 CUENCA MOLLETURO_PART 2	2021-11-12_11-26-10_INFORMEFINALDEINGENIERIA-SIGNED-21-50.PDF	13/01/2022
5	A5_HITO 1_INFORME FINAL DE INGENIERÍA_ESTUDIOS SITIO CRÍTICO KM 49 CUENCA MOLLETURO_PART 3	2021-11-12_11-26-29_INFORMEFINALDEINGENIERIA-SIGNED-51-86.PDF	13/01/2022
6	A6_HITO 2_MTOP-SUBZ6-2021-2374-ME_SOLICITUD ELAB-PROYECTO EN FORMATO DE LA "SNP" SITIO CRÍTICO KM 49 CUENCA MOLLETURO	MTOP-SUBZ6-2021-2374-ME_SOLICITUD_ELAB-PROYECTO_SITIO_CRÍTICO_KM_49_CUENCA_MOLLETURO.pdf	14/01/2022
7	A7_HITO 3_DICTAMEN DE PRIORIDAD DEL SITIO CRÍTICO DEL KM 49 CUENCA MOLLETURO	4.1_Oficio_Nro._SNP-SPN-2021-0900-OF_DICTAMEN_DE_PRIORIDAD.pdf	13/01/2022
8	A8_HITO 3_FORMATO DE LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN_SITIO CRÍTICO DEL KM 49 CUENCA MOLLETURO	2021-11-12_11-48-44_FORMATOSNP.pdf	13/01/2022
9	A9_HITO 4_DICTAMEN FAVORABLE DE INCLUSIÓN AL PAI 2021_SITIO CRÍTICO DEL KM 49 CUENCA MOLLETURO	7.1_snp-snp-2021-1002-of_DICTAMEN_FAVORABLE.pdf	13/01/2022
10	B1_HITO 5_PLURIANUAL DEL SITIO CRÍTICO DEL KM 49 CUENCA MOLLETURO	11._Oficio_Nro._SNP-SPN-2021-1052-OF_PLURIANUAL.pdf	13/01/2022

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
11	B2_HITO 6_MTOP-SUBZ6-2021-2533-ME_SOLICITUD CERTIFIC_AVAL_OBRA_SITIO CRÍTICO KM 49	MTOP-SUBZ6-2021-2533-ME_SOLICITUD_CERTIFIC_AVAL_OBRA_SITIO_CRÍTICO_KM_49.pdf	14/01/2022
12	B3_HITO 7_MTOP-SUBZ6-2021-2537-ME_CERTIF-PLANIF_AVAL_FISC_SITIO CRÍTICO KM 49	MTOP-SUBZ6-2021-2537-ME_CERTIF-PLANIF_AVAL_FISC_SITIO_CRÍTICO_KM_49.pdf	14/01/2022
13	B4_HITO 8_MTOP-SUBZ6-2021-2558-ME_DISP_PUBLICACIÓN_PROCESO_PORTAL_SITIO CRÍTICO KM 49	MTOP-SUBZ6-2021-2558-ME_DISP_PUBLICACIÓN_PROCESO_PORTAL_SITIO_CRÍTICO_KM_49.pdf	14/01/2022
14	B5_HITO 9_CONTRATO_OBRA_KM 49 CUENCA MOLLETURO_17-12-2021	CONTRATO_OBRA_KM_49_CUENCA_MOLLETURO_17-12-2021.pdf	14/01/2022
15	B6_HITO 9_NOTIFICACIÓN ACREDITACIÓN ANTICIPO_OBRA SITIO CRÍTICO KM 49_12-01-2022	NOTIFICACIÓN_ACREDITACIÓN_ANTICIPO_OBRA_SITIO_CRÍTICO_KM_49_12-01-2022.pdf	14/01/2022
16	B7_HITO 10_CONTRATO_FISCALIZACIÓN_KM 49 CUENCA MOLLETURO_17-12-2021	CONTRATO_FISCALIZACIÓN_KM_49_CUENCA_MOLLETURO_17-12-2021.pdf	14/01/2022
17	B8_HITO 10_NOTIFICACIÓN ACREDITACIÓN ANTICIPO_FISCALIZACIÓN SITIO CRÍTICO KM 49_30-12-2021	NOTIFICACIÓN_ACREDITACIÓN_ANTICIPO_FISCALIZACIÓN_SITIO_CRÍTICO_KM_49_30-12-2021.pdf	14/01/2022
18	B9_CÉDULA PRESUPUESTARIA_DICIEMBRE 2021_SITIO CRÍTICO KM 49	CÉDULA_PRESUPUESTARIA_DICIEMBRE_2021_SITIO_CRÍTICO_KM_49.pdf	14/01/2022
19	C1_DESIGNACIÓN LÍDER DE PROYECTO_SITIO CRÍTICO KM 49 CUENCA MOLLETURO_14-01-2022	MTOP-DDAZ-2022-91-ME_LIDER_K49_CUENCA_MOLLETURO.pdf	17/01/2022
20	C2_Administrador solicita suspensión trabajos_24 enero 2022	MTOP-CONS_AZU-2022-54-ME_adm.solicita_suspensión_trabajos_24_enero_2022.pdf	04/02/2022
21	C3_Comunicación respecto a la aprobación del POA 2022_25 enero 2022	MTOP-CGP-2022-74-ME_POA_APROBADO_2022_25_enero_2022.pdf	04/02/2022
22	C4_Comunicación suspensión trabajos a contratista_31 enero 2022	MTOP-SUBZ6-22-29-OF_subsec.comunica_suspensión_trabajos_SUDINCO_desde_25_enero_31_enero_2022.pdf	04/02/2022
23	C5_Pronunciamiento administrador respecto suspensión trabajos_24 enero 2022	MTOP-CONS_AZU-2022-54-ME_adm.solicita_suspensión_trabajos_24_enero_2022.pdf	04/02/2022
24	C5_Subsecretario indica levantamiento suspensión del plazo a contratista	MTOP-SUBZ6-22-61-OF_levantam.susp.plazo_3_marzo_2022.pdf	08/03/2022
25	C6_Subsecretario deja sin efecto levantamiento suspensión	MTOP-SUBZ6-2022-327-ME_subsec.deja_sin_efecto_levant.susp._4_marzo_2022.pdf	08/03/2022
26	C7_Oficio de subsecretario a contratista levantamiento del plazo a partir del 21 de marzo 2022	MTOP-SUBZ6-22-88-OF_subsec.procede_a_levantar_suspensión_plazo_23_marzo_2022.pdf	06/04/2022
27	C8_Subsecretario solicita a viceministro inclusión al PAI del proyecto	MTOP-DDAZ-2022-578-ME_solicitud_inclusión_al_PAI_2022_20_abril_2022.pdf	06/05/2022
28	C9_Administradora del contrato comunica ampliación de plazo por 99 días	MTOP-CONS_AZU-2022-449-ME_adm.comunica_ampliación_de_plazo_24_mayo_2022.pdf	22/06/2022
29	Contrato Complementario No. 1	Contrato_complementario_No._1.pdf	02/12/2022
30	D1_Supervisor remite reprogramación 1 y metodología de trabajos a la administradora del contrato	MTOP-CONS_AZU-2022-562-ME_sup.a_adm.cont.remite_reprog.01__metod.trab._21_junio_2022.pdf	22/06/2022
31	D2_Designación de Líder de proyecto 15 agosto 2022	MTOP-SUBZ6-2022-1154-ME.pdf	16/08/2022
32	D3_DESIGNACIÓN LÍDER	MTOP-SUBZ6-2022-1154-ME.pdf	05/09/2022
33	D4_Ayuda memoria AGOSTO 2022	ayuda_memoria_km_49_02092022-signed.pdf	05/09/2022
34	D5_Ayuda memoria septiembre 2022	ayuda_memoria_km49_sep-signed.pdf	05/10/2022
35	D6_Contrato complementario No. 1 SEPTIEMBRE 2022	OBRA-28082022_CONTRATO_COMPLEMENTARIO_Nro._005872022.pdf	05/10/2022
36	D7_Orden de trabajo No. 1 SEPTIEMBRE 2022	ORDEN_DE_TRABAJO_Nro._01_28sep2022.pdf	05/10/2022
37	D8_Riesgo 1. Informe. Eventos climáticos extremos	Informe_Riesgo_1_KM_49_acción_1-signed.pdf	02/12/2022

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Barsallo Chavez, Luis Mario	SUBSECRETARIO ZONAL 6	Subsecretario/a Zonal 6	lbarsallo@mtop.gob.ec	

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	(PATROCINADOR EJECUTIVO)			
Molina Villavicencio, Veronica Alexandra	DIRECTOR DISTRITAL DEL AZUAY	Directora de Transporte y Obras Públicas Distrital de Azuay	vmolinav@mtop.gob.ec	
Vintimilla Rojas, Gustavo Enrique	LÍDER DE PROYECTO	Analista de Infraestructura Distrital 2	gvintimilla@mtop.gob.e c	023974798

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
146237_1.jpg	05/12/2022
