

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Zonal 5**  
**Dirección de Transporte y Obras Públicas Distrital Bolívar**

**PROYECTO: K025 MTOP - Construcción y fiscalización del paso lateral de Guaranda Ambato**

Líder del Proyecto:	Pungaña Zaruma, Sergio Washington (spungana@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	Programas Relacionados:	
Titular:	Flores Solano, Antonio Guillermo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	1.13
CUP:	175200000.0000.375906	TIR:	13.83 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	6,503,016.26
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,916,575.33
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Inversionista internacional	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/08/2018 - 31/12/2026
Fecha de última actualización:	03/07/2023	Fecha de Fin Base:	31/12/2022
Modificado por:	Becerra Albuja, Carlos Javier	Fecha del siguiente Hito:	30/06/2023

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**LINEA BASE DEL PROYECTO**

El Ministerio de Transporte de Obras Públicas, por medio de la Dirección Distrital de Bolívar, supervisará frecuentemente la CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PASO LATERAL DE GUARANDA Y AMBATO, localizado al Nor-Este de la Provincia de Bolívar. El Paso Lateral de Guaranda es la apertura de un tramo de 13,2 km de longitud, una vía de dos carriles que toma o inicia antes de Guanujo, se desplaza hacia el este de Guaranda pasando por el sector Vinchoa para luego tomar hacia el oeste y terminar en Santa Fe, empatando con la vía Chimbo - San Miguel - Babahoyo, cerca de la gasolinera en el sector Conventillo.

Este proyecto es de gran importancia para la población de estos sectores, ya que en la ciudad de Guaranda el parque automotor está en constante crecimiento, por consecuencia, la vía existente empieza a no ser suficiente para abastecer los grandes volúmenes de tráfico, entonces en estas instancias es indispensable realizar la CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE GUARANDA, para permitan dar soluciones técnicas y viables.

El beneficio que se espera con la construcción del Paso Lateral de Guaranda es para ofrecer facilidades al tráfico que se concentra en la Ciudad de Guaranda, siendo esta vía la única de acceso a las diferentes provincias, cantones, y parroquias, esta vía se encuentra ya saturada, generando congestión vehicular y colapso en la Ciudad de Guaranda, por estas razones que se da una solución práctica antes estos problemas y estas facilidades se cuantifican en ahorros en los costos de los usuarios, es decir, disminución en costos de operación vehicular y disminución en costos por tiempo de viaje.

En conclusión podemos decir que el proyecto está orientada a la necesidad de dar una solución más viable tanto para el transporte de pasajeros como para el transporte de productos de la zona hacia los lugares de expendio así como disminuir el tiempo de viaje y costos de operación, mejorando la calidad de vida de las personas, disminuyendo la contaminación que producen los vehículos.

**OBJETIVO GENERAL**

Complementar el desarrollo vial, fortalecer la economía y bienestar de la comunidad mediante la construcción del Paso Lateral de Guaranda

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Realizar procesos preliminares a la obra los cuales permitirán su ejecución (Expropiaciones).
- Construcción de obra de infraestructura.
- Fiscalización de la obra.

**Beneficios Cualitativos**

Descongestinar el tránsito vehicular de la zona poblada de la Ciudad de Guaranda, brindando comodidad y seguridad al transportista.

**Tipo de Beneficiario**

- Comercio
- Turístico
- Social
- Industrial

**Tipo de Beneficiario**

Agropecuario


**Restricciones**

Tiempo: Al no recurrir a algún tipo de suspensión de plazo, el proyecto se desarrollará en el plazo de contrato estipulado, 36 meses.  
 Costo: El valor del proyecto está sujeto conforme a los estudios aprobados.  
 Recursos: El flujo económico normal del proyecto y con buenas condiciones climatológicas permitirán que la obra se ejecute durante el plazo previsto.  
 Alcance: Construir el Paso Lateral de Guaranda de 13.36 km con carpeta asfáltica a 2 carriles.  
 Riesgo: La no liberación de predios expropiados CAUSARÍA retraso en el plazo del proyecto.  
 Calidad: Se cumplirá con las normas de calidad vigentes en los materiales de construcción, el proyecto cuenta también con fiscalización externa.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 58.44 %  
 Fecha de Inicio: 01/08/2018      Fecha de Fin: 31/12/2026

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

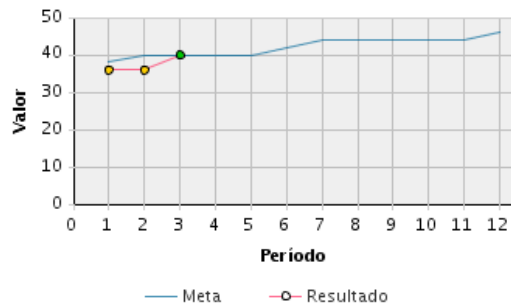

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2023	Avance programado acumulado											
	38 %	40 %	40 %	40 %	40 %	42 %	44 %	44 %	44 %	44 %	44 %	46 %
	Avance real acumulado											
	36 %	36 %	40 %									
Estado												
	▼	▼	●									

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avanzan los trabajos en este frente: Sector Laguacoto Km 11+340 al 12+320 excavación y 4+500 trabajos de relleno, además continúa los trabajos de movimientos de tierra, transporte de material de excavación, conformación de escombreras, transporte de material de préstamo importado, en ejecución en el tramo 11+340 al 12+320 sector Laguacoto, predios de la Universidad Estatal de Bolívar.</li> <li>- Se continúa con la legalización de las Declaratorias de Utilidad Pública y Resolución de Ocupación inmediata por parte del SIT.</li> </ul>	Flores Solano, Antonio Guillermo	05/06/2023 - 04:35 PM
<p>ABRIL 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se continúa con los trabajos en este frente: Sector Laguacoto Km 11+340 al 12+320 excavación y 4+500 trabajos de relleno.</li> <li>- Se continúa con los trabajos de movimientos de tierra, transporte de material de excavación, conformación de escombreras, transporte de material de préstamo importado, en ejecución en el tramo 11+340 al 12+320 sector Laguacoto, predios de la Universidad Estatal de Bolívar.</li> </ul>	Flores Solano, Antonio Guillermo	05/05/2023 - 08:05 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- Se continúa con la legalización de las Declaratorias de Utilidad Pública y Resolución de Ocupación inmediata por parte del SIT.		
<p>MARZO 2023:</p> <p>- Trabajos de excavación en los tramos Km 11+340 al 12+320 sector Laguacoto y 4+500 trabajos de relleno</p> <p>- Se continúa con los trabajos de movimientos de tierra, transporte de material de excavación, conformación de escombreras, transporte de material de préstamo importado, en ejecución en el tramo 11+340 al 12+320 sector Laguacoto, predios de la Universidad Estatal de Bolívar.</p> <p>- Se continúa con la legalización de las Declaratorias de Utilidad Pública y Resolución de Ocupación inmediata por parte del SIT.</p>	Flores Solano, Antonio Guillermo	05/04/2023 - 03:02 PM
<p>FEBRERO 2023:</p> <p>- Se continúa con los trabajos de movimientos de tierra, transporte de material de excavación, conformación de escombreras, transporte de material de préstamo importado, en ejecución en el tramo 11+340 al 12+320 sector Laguacoto, predios de la Universidad Estatal de Bolívar.</p> <p>- Se continúa con la legalización de las Declaratorias de Utilidad Pública y Resolución de Ocupación inmediata por parte del SIT.</p>	Flores Solano, Antonio Guillermo	03/03/2023 - 09:28 AM
<p>ENERO 2023:</p> <p>- Continúa los trabajos de movimientos de tierra, transporte de material de excavación, conformación de escombreras, transporte de material de préstamo importado, en ejecución en el tramo 11+340 al 12+320 sector Laguacoto, predios de la Universidad Estatal de Bolívar.</p> <p>- Se continúa con la legalización de las Declaratorias de Utilidad Pública y Resolución de Ocupación inmediata por parte del SIT.</p>	Flores Solano, Antonio Guillermo	03/02/2023 - 04:19 PM
<p>DICIEMBRE 2022:</p> <p>- Se continúa con los trabajos de movimientos de tierra, transporte de material de excavación, conformación de escombreras, transporte de material de préstamo importado, en ejecución en el tramo 11+340 al 12+320 sector Laguacoto, predios de la Universidad Estatal de Bolívar.</p> <p>- Se continúa con la legalización de las Declaratorias de Utilidad Pública y Resolución de Ocupación inmediata por parte del SIT.</p>	Flores Solano, Antonio Guillermo	03/01/2023 - 02:25 PM
<p>NOVIEMBRE 2022</p> <p>Se continúa con los trabajos de movimientos de tierra, transporte de material de excavación, conformación de escombreras, transporte de material de préstamo importado, en ejecución en el tramo 11+340 al 12+320 sector Laguacoto, predios de la Universidad Estatal de Bolívar.</p> <p>Según informe técnico presentado por la Contratista, se informa que luego de realizado el replanteo total del proyecto se ha determinado que en el rubro de movimiento de tierras existe incrementos en relación a las cantidades contractuales. Informe que esta en conocimiento del Consultor de los Estudios para su análisis y pronunciamiento.</p> <p>Con fecha 05 de octubre se notifica el inicio de los servicios de Fiscalización Externa a la Asociación Lateral Guaranda</p>	Flores Solano, Antonio Guillermo	02/12/2022 - 05:03 PM
<p>OCTUBRE 2022:</p> <p>TRABAJOS EJECUTADOS EN LOS TRAMOS LIBERADOS: El proyecto tiene un avance físico del 8.50%.</p> <p>TRAMO KM 0+000 AL 0+550, TRAMO DEL KM. 1+750 AL 2+600, TRAMO DEL KM. 3+250 AL 3+520</p> <p>En estos tramos se han ejecutado trabajos de movimiento de tierras, transporte de y desalojo de material de excavación, conformación de rellenos, conformación de escombreras, colocación de material de préstamo importado y mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado, trabajos que se encuentran ejecutados en un 99%.</p> <p>TRAMO KM 11+340 AL 12+320</p> <p>En este tramo el trazado vial afectaba a la infraestructura de la Universidad Estatal de Bolívar, principalmente el Laboratorio de Biotecnología donde se realizan pruebas de Covid PCR. La Universidad Estatal de Bolívar indicó que existe una inversión USD 1.983.947,86 que será</p>	Flores Solano, Antonio Guillermo	02/11/2022 - 02:37 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>afectada, sin considerar los de Convenios Nacionales e Internacionales a los que presta el servicio el Laboratorio razón por la cual solicitó realizar una variante dentro de sus mismos predios sin que afecta la Infraestructura del Laboratorio. Ante este pedido en la evaluación que se encuentra en trámite de aprobación, la Consultora de los Estudios realizó ajustes al diseño horizontal y vertical con el fin de lograr desplazar la lateral del proyecto de manera que no afecte a las instalaciones de UEB, estos ajustes fueron presentados por el Consultor y puestos en conocimiento del Director de Estudios de la Infraestructura del Transporte mediante memorando Nro., MTOP-SUBZ5-2022-102-ME, de fecha 11 de enero del 2022, a la presente fecha se cuenta con la viabilidad Técnica y aprobación de los especialistas, Vial, Hidráulico y Geotécnico del MTOP. Está pendiente que el Consultor complemente la información con el diseño de los anclajes en la estabilización de taludes.</p> <p>Mediante memorando Nro., MTOP-DNEIT-2022-563-ME de fecha 01 de agosto del 2022, el Ing. Iván Fernando Zurita Gallardo, DIRECTOR NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, informa al Ing. Carlos Eduardo Sotomayor Rada, SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS ZONAL 5, ENCARGADO, respuesta a solicitud de revisión componente geotécnico, del tramo donde la consultora ha realizado los ajustes Km 5+810 al Km 13+287 dentro del cual se encuentra el tramo 11+340 al 12+320 sector Laguacoto, predios de la Universidad Estatal de Bolívar, del proyecto Paso Lateral de Guaranda, donde solventa su solicitud de revisión del informe de estabilidad de taludes y conforme el Acta de Levantamiento de Suspensión se reinicia los trabajos en el tramo Km 11+340 ala 12+320, predios de la Universidad Estatal de Bolívar, partir del 02 de agosto de 2022. En este tramo se ejecuta trabajos de movimiento de tierras, transporte y desalojo de material de excavación en suelo y marginal, conformación de rellenos, y conformación de escombreras. El proyecto tiene un avance físico del 8.50%.</p> <p>ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE EXPROPIACIONES:                      Acuerdo de anuncio y aprobación del proyecto: Nro. 0036-2018 de fecha 21 de diciembre de 2018.                      Monto asignado total para indemnizaciones: USD. 5.941.822,25.                      Monto asignando para el año 2022: USD 2,448,612.23                      Número de predios afectados: 549 predios                      Número de construcciones afectadas: 122 viviendas.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2022:</p> <p>- Se continúa con los trabajos de movimiento de tierras, en el sector Aguacoto Bajo predios de Universidad Estatal de Bolívar.</p> <p>-</p>	<p>Barzallo Romero, Rafael Marcelo</p>	<p>03/10/2022 - 03:58 PM</p>
<p>AGOSTO 2022:</p> <p>Con fecha 2 de agosto del 2022 se levanta la suspensión temporal de trabajos Nro. 2, se reinician los mismos en el tramo km 11+340 al 12+320 sector Laguacoto, predios de la Universidad Estatal de Bolívar.</p> <p>Se realizan movimiento de tierras, excavación en marginal, transporte de material de excavación, y conformación de escombreras.</p>	<p>Barzallo Romero, Rafael Marcelo</p>	<p>01/09/2022 - 08:55 AM</p>
<p>JULIO 2022:</p> <p>- Se levanta la suspensión de la obra y actualmente se encuentra trabajando en el predio liberado de la Universidad Estatal de Bolívar, Sector Aguacoto Bajo se desarrollan trabajos preliminares y movimiento de tierras.</p> <p>- Hasta la fecha se han elaborado 417 expedientes, total de expedientes entregados por la fiscalización a la gestión interna nacional de caminos y expropiaciones 417, Total de expedientes aprobados por la GINCE 106, Total de expedientes consignados o pagados 62, total de expedientes legalizados y en trámite de pago en el área financiera 20, total de expedientes para elaboración de minutas en el área Jurídica 15, y total de expedientes para resolución de ocupación inmediata en el área Jurídica 9.</p>	<p>Barzallo Romero, Rafael Marcelo</p>	<p>31/08/2022 - 02:56 PM</p>
<p>JUNIO 2022:</p> <p>- Se encuentra trabajando en el predio liberado de la Universidad Estatal de Bolívar, Sector Aguacoto Bajo se desarrollan trabajos preliminares y movimiento de tierras.</p> <p>- Hasta la fecha se han elaborado 417 expedientes, total de expedientes entregados por la fiscalización a la gestión interna nacional de caminos y expropiaciones 417, Total de expedientes aprobados por la GINCE 106, Total de expedientes consignados o pagados 62, total de expedientes legalizados y en trámite de pago en el área financiera 20, total de expedientes</p>	<p>Barzallo Romero, Rafael Marcelo</p>	<p>05/07/2022 - 03:37 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>para elaboración de minutas en el área Jurídica 15, y total de expedientes para resolución de ocupación inmediata en el área Jurídica 9.</p>		
<p>MAYO 2022</p> <p>- Se encuentra suspendido los trabajos a partir del 17 de marzo del 2022, por falta de predios liberados.</p> <p>- Hasta la fecha se han elaborado 417 expedientes, total de expedientes entregados por la fiscalización a la gestión interna nacional de caminos y expropiaciones 417, Total de expedientes aprobados por la GINCE 106, Total de expedientes consignados o pagados 62, total de expedientes legalizados y en trámite de pago en el área financiera 20, total de expedientes para elaboración de minutas en el área Jurídica 15, y total de expedientes para resolución de ocupación inmediata en el área Jurídica 9.</p>	<p>Barzallo Romero, Rafael Marcelo</p>	<p>03/06/2022 - 02:34 PM</p>
<p>ABRIL 2022</p> <p>- Es necesario la asignación de recursos económicos para el pago de expropiaciones y costas judiciales. Se realizan trabajos preliminares (movimiento de tierras, material préstamo importado y mejoramiento de la subrazante). Tramos km 0+000 - 0+550, 1+750 - 2+600 y 2+250-3520 con un avance del 97%, Tranajos por concluir , por lo que es indispensable los recursos económicos para el pago y liberación de nuevos predios, que permitan la continuidad de los trabajos.</p> <p>- Hasta la fecha se han elaborado 417 expedientes, total de expedientes entregados por la fiscalización a la gestión interna nacional de caminos y expropiaciones 417, Total de expedientes aprobados por la GINCE 106, Total de expedientes consignados o pagados 62, total de expedientes legalizados y en trámite de pago en el área financiera 20, total de expedientes para elaboración de minutas en el área Jurídica 15, y total de expedientes para resolución de ocupación inmediata en el área Jurídica 9.</p>	<p>Barzallo Romero, Rafael Marcelo</p>	<p>13/05/2022 - 09:49 AM</p>
<p>MAYO 2022</p> <p>- Es necesario la asignación de recursos económicos para el pago de expropiaciones y costas judiciales. Se realizan trabajos preliminares (movimiento de tierras, material préstamo importado y mejoramiento de la subrazante). Tramos km 0+000 - 0+550, 1+750 - 2+600 y 2+250-3520 con un avance del 97%, Tranajos por concluir , por lo que es indispensable los recursos económicos para el pago y liberación de nuevos predios, que permitan la continuidad de los trabajos.</p> <p>- Hasta la fecha se han elaborado 417 expedientes, total de expedientes entregados por la fiscalización a la gestión interna nacional de caminos y expropiaciones 417, Total de expedientes aprobados por la GINCE 106, Total de expedientes consignados o pagados 62, total de expedientes legalizados y en trámite de pago en el área financiera 20, total de expedientes para elaboración de minutas en el área Jurídica 15, y total de expedientes para resolución de ocupación inmediata en el área Jurídica 9.</p>	<p>Barzallo Romero, Rafael Marcelo</p>	<p>05/05/2022 - 02:01 PM</p>
<p>MARZO 2022</p> <p>- Es necesario la asignación de recursos económicos para el pago de expropiaciones y costas judiciales. Se realizan trabajos preliminares (movimiento de tierras, material préstamo importado y mejoramiento de la subrazante). Tramos km 0+000 - 0+550, 1+750 - 2+600 y 2+250-3520 con un avance del 97%, Tranajos por concluir , por lo que es indispensable los recursos económicos para el pago y liberación de nuevos predios, que permitan la continuidad de los trabajos.</p> <p>- Hasta la fecha se han elaborado 417 expedientes, total de expedientes entregados por la fiscalización a la gestión interna nacional de caminos y expropiaciones 417, Total de expedientes aprobados por la GINCE 106, Total de expedientes consignados o pagados 62, total de expedientes legalizados y en trámite de pago en el área financiera 20, total de expedientes para elaboración de minutas en el área Jurídica 15, y total de expedientes para resolución de ocupación inmediata en el área Jurídica 9.</p>	<p>Barzallo Romero, Rafael Marcelo</p>	<p>06/04/2022 - 11:35 AM</p>
<p>Febrero 2022</p> <p>- Es necesario priorizar los procesos de los pagos de expropiaciones, se realizan trabajos preliminares en tres tramos, se encuentra a la espera de las asignaciones presupuestarias del año 2022, para continuar con los pagos de expropiaciones.</p> <p>- Hasta la fecha se han elaborado 265 expedientes de los cuales han sido entregados a la Unidad de Caminos y Expropiaciones. Dentro de los 118 expedientes están en etapa de revisión técnica por parte de la Unidad de Caminos y Expropiaciones, 25 Expedientes están en etapa de correcciones por parte del Contratista, 17 En Procesos de Elaboración de Declaratoria de Utilidad Pública, 21 en Elaboración de Resolución de Ocupación Inmediata, 5 están listos para</p>	<p>Barzallo Romero, Rafael Marcelo</p>	<p>04/03/2022 - 03:45 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>firma de la Declaratoria de Utilidad Pública, 14 expedientes están para la firma de Resolución de Ocupación Inmediata por parte del SIT, 22 están en el Registro de Propiedad para inscripción de Declaratoria de Utilidad Pública, 11 Escrituras a favor del MTOP, y 11 expedientes están en inscripción de la Resolución de Ocupación Inmediata en el Registro del Trazado Paso Lateral de Guaranda.</p>		
<p>Enero 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizan trabajos preliminares en tres tramos, se encuentra a la espera de las asignaciones presupuestarias del año 2022, para continuar con los pagos de expropiaciones.</li> <li>- Hasta la fecha se han elaborado 265 expedientes de los cuales han sido entregados a la Unidad de Caminos y Expropiaciones. Dentro de los 118 expedientes están en etapa de revisión técnica por parte de la Unidad de Caminos y Expropiaciones, 25 Expedientes están en etapa de correcciones por parte del Contratista, 17 En Procesos de Elaboración de Declaratoria de Utilidad Pública, 21 en Elaboración de Resolución de Ocupación Inmediata, 5 están listos para firma de la Declaratoria de Utilidad Pública, 14 expedientes están para la firma de Resolución de Ocupación Inmediata por parte del SIT, 22 están en el Registro de Propiedad para inscripción de Declaratoria de Utilidad Pública, 11 Escrituras a favor del MTOP, y 11 expedientes están en inscripción de la Resolución de Ocupación Inmediata en el Registro del Trazado Paso Lateral de Guaranda.</li> </ul>	<p>Barzallo Romero, Rafael Marcelo</p>	<p>04/02/2022 - 03:36 PM</p>
<p>Diciembre 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Avanzamos con la elaboración de los expedientes de expropiación para proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública y su respectivo pago.</li> <li>- Hasta la fecha se han elaborado 265 expedientes de los cuales han sido entregados a la Unidad de Caminos y Expropiaciones. Dentro de los 118 expedientes están en etapa de revisión técnica por parte de la Unidad de Caminos y Expropiaciones, 25 Expedientes están en etapa de correcciones por parte del Contratista, 17 En Procesos de Elaboración de Declaratoria de Utilidad Pública, 21 en Elaboración de Resolución de Ocupación Inmediata, 5 están listos para firma de la Declaratoria de Utilidad Pública, 14 expedientes están para la firma de Resolución de Ocupación Inmediata por parte del SIT, 22 están en el Registro de Propiedad para inscripción de Declaratoria de Utilidad Pública, 11 Escrituras a favor del MTOP, y 11 expedientes están en inscripción de la Resolución de Ocupación Inmediata en el Registro del Trazado Paso Lateral de Guaranda.</li> <li>- El Contrato de Obra se suscribió el 05 de diciembre de 2019, el anticipo de la obra se entrego el 25 de septiembre de 2020, el plazo del proyecto se encuentra suspendido desde el 26 de septiembre de 2020 hasta que se disponga de los terrenos debidamente expropiados. Se han realizado trabajos preliminares como el replanteo del proyecto y la implementación del campamento.</li> <li>- La Contratación de la Fiscalización se encuentra en proceso de suscripción del Contrato una vez se disponga de la aprobación de la Certificación Presupuestaria Plurianual por parte del Ministerio de Economía y Finanzas</li> </ul>	<p>Barzallo Romero, Rafael Marcelo</p>	<p>04/01/2022 - 04:39 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Se continúa con la elaboración de los expedientes de expropiación para proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública y su respectivo pago. Hasta la fecha se han elaborado 265 expedientes de los cuales han sido entregados a la Unidad de Caminos y Expropiaciones. Dentro de los 118 expedientes están en etapa de revisión técnica por parte de la Unidad de Caminos y Expropiaciones, 25 Expedientes están en etapa de correcciones por parte del Contratista, 17 En Procesos de Elaboración de Declaratoria de Utilidad Pública, 21 en Elaboración de Resolución de Ocupación Inmediata, 5 están listos para firma de la Declaratoria de Utilidad Pública, 14 expedientes están para la firma de Resolución de Ocupación Inmediata por parte del SIT, 22 están en el Registro de Propiedad para inscripción de Declaratoria de Utilidad Pública, 11 Escrituras a favor del MTOP, y 11 expedientes están en inscripción de la Resolución de Ocupación Inmediata en el Registro del Trazado Paso Lateral de Guaranda.</li> <li>- El Contrato de Obra se suscribió el 05 de diciembre de 2019, el anticipo de la obra se entrego el 25 de septiembre de 2020, el plazo del proyecto se encuentra suspendido desde el 26 de septiembre de 2020 hasta que se disponga de los terrenos debidamente expropiados. Se han realizado trabajos preliminares como el replanteo del proyecto y la implementación del campamento.</li> <li>- La Contratación de la Fiscalización se encuentra en proceso de suscripción del Contrato una vez se disponga de la aprobación de la Certificación Presupuestaria Plurianual por parte del Ministerio de Economía y Finanzas</li> </ul>	<p>Yacchirema Chimbo, Juan Carlos</p>	<p>03/12/2021 - 10:04 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2021</p> <p>-Se continúa con la elaboración de los expedientes de expropiación para proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública y su respectivo pago. Hasta la fecha se han elaborado 265 expedientes de los cuales han sido entregados a la Unidad de Caminos y Expropiaciones. Dentro de los 118 expedientes están en etapa de revisión técnica por parte de la Unidad de Caminos y Expropiaciones, 25 Expedientes están en etapa de correcciones por parte del Contratista, 17 En Procesos de Elaboración de Declaratoria de Utilidad Pública, 21 en Elaboración de Resolución de Ocupación Inmediata, 5 están listos para firma de la Declaratoria de Utilidad Pública, 14 expedientes están para la firma de Resolución de Ocupación Inmediata por parte del SIT, 22 están en el Registro de Propiedad para inscripción de Declaratoria de Utilidad Pública, 11 Escrituras a favor del MTOP, y 11 expedientes están en inscripción de la Resolución de Ocupación Inmediata en el Registro del Trazado Paso Lateral de Guaranda.</p> <p>- El Contrato de Obra se suscribió el 05 de diciembre de 2019, el anticipo de la obra se entrego el 25 de septiembre de 2020, el plazo del proyecto se encuentra suspendido desde el 26 de septiembre de 2020 hasta que se disponga de los terrenos debidamente expropiados. Se han realizado trabajos preliminares como el replanteo del proyecto y la implementación del campamento.</p> <p>- La Contratación de la Fiscalización se encuentra en proceso de suscripción del Contrato una vez se disponga de la aprobación de la Certificación Presupuestaria Plurianual por parte del Ministerio de Economía y Finanzas..</p>	<p>Yacchirema Chimbo, Juan Carlos</p>	<p>04/11/2021 - 04:24 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2021</p> <p>-Se continúa con la elaboración de los expedientes de expropiación para proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública y su respectivo pago. Hasta la fecha se han elaborado 265 expedientes de los cuales han sido entregados a la Unidad de Caminos y Expropiaciones. Dentro de los 118 expedientes están en etapa de revisión técnica por parte de la Unidad de Caminos y Expropiaciones, 25 Expedientes están en etapa de correcciones por parte del Contratista, 17 En Procesos de Elaboración de Declaratoria de Utilidad Pública, 21 en Elaboración de Resolución de Ocupación Inmediata, 5 están listos para firma de la Declaratoria de Utilidad Pública, 14 expedientes están para la firma de Resolución de Ocupación Inmediata por parte del SIT, 22 están en el Registro de Propiedad para inscripción de Declaratoria de Utilidad Pública, 11 Escrituras a favor del MTOP, y 11 expedientes están en inscripción de la Resolución de Ocupación Inmediata en el Registro del Trazado Paso Lateral de Guaranda.</p> <p>- El Contrato de Obra se suscribió el 05 de diciembre de 2019, el anticipo de la obra se entrego el 25 de septiembre de 2020, el plazo del proyecto se encuentra suspendido desde el 26 de septiembre de 2020 hasta que se disponga de los terrenos debidamente expropiados. Se han realizado trabajos preliminares como el replanteo del proyecto y la implementación del campamento.</p> <p>- La Contratación de la Fiscalización se encuentra en proceso de suscripción del Contrato una vez se disponga de la aprobación de la Certificación Presupuestaria Plurianual por parte del Ministerio de Economía y Finanzas..</p>	<p>Yacchirema Chimbo, Juan Carlos</p>	<p>04/10/2021 - 02:28 PM</p>
<p>AGOSTO 2021</p> <p>-Se continúa con la complementación de los expedientes de expropiación para proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública y su respectivo pago. Hasta la fecha se han elaborado 252 expedientes de los cuales han sido entregados a la Unidad de Caminos y Expropiaciones. Dentro de los 131 expedientes están en etapa de revisión técnica por parte de la Unidad de Caminos y Expropiaciones, 23 Expedientes están en etapa de correcciones por parte del Contratista, 23 En Procesos de Elaboración de Declaratoria de Utilidad Pública, 4 en Elaboración de Resolución de Ocupación Inmediata, 5 están listos para firma de la Declaratoria de Utilidad Pública, 14 expedientes están para la firma de Resolución de Ocupación Inmediata por parte del SIT, 22 están en el Registro de Propiedad para inscripción de Declaratoria de Utilidad Pública, 10 Escrituras a favor del MTOP y 11 expedientes están listos para la inscripción de la Resolución de Ocupación Inmediata en el Registro del Trazado Paso Lateral de Guaranda.</p> <p>- El Contrato de Obra se suscribió el 05 de diciembre de 2019, el anticipo de la obra se entrego el 25 de septiembre de 2020, el plazo del proyecto se encuentra suspendido desde el 26 de septiembre de 2020 hasta que se disponga de los terrenos debidamente expropiados. Se han realizado trabajos preliminares como el replanteo del proyecto y la implementación del campamento.</p>	<p>Yacchirema Chimbo, Juan Carlos</p>	<p>01/09/2021 - 03:25 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>- La Contratación de la Fiscalización se encuentra en proceso de suscripción del Contrato una vez se disponga de la aprobación de la Certificación Presupuestaria Plurianual por parte del Ministerio de Economía y Finanzas..</p>		
<p>AGOSTO 2021</p> <p>- El Contrato de Obra se suscribió el 05 de diciembre de 2019, el anticipo de la obra se entregó el 25 de septiembre de 2020, el plazo del proyecto se encuentra suspendido desde el 26 de septiembre de 2020 hasta que se disponga de los terrenos debidamente expropiados. Se han realizado trabajos preliminares como el replanteo del proyecto y la implementación del campamento.</p> <p>- La Contratación de la Fiscalización se encuentra en proceso de suscripción del Contrato una vez se disponga de la aprobación de la Certificación Presupuestaria Plurianual por parte del Ministerio de Economía y Finanzas..</p> <p>-Se continúa con la implementación de los expedientes de expropiación para proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública y su respectivo pago. Hasta la fecha se han elaborado 252 expedientes de los cuales han sido entregados a la Unidad de Caminos y Expropiaciones. Dentro de los 131 expedientes están en etapa de revisión técnica por parte de la Unidad de Caminos y Expropiaciones, 23 Expedientes están en etapa de correcciones por parte del Contratista, 23 En Procesos de Elaboración de Declaratoria de Utilidad Pública, 4 en Elaboración de Resolución de Ocupación Inmediata, 5 están listos para firma de la Declaratoria de Utilidad Pública, 14 expedientes están para la firma de Resolución de Ocupación Inmediata por parte del SIT, 22 están en el Registro de Propiedad para inscripción de Declaratoria de Utilidad Pública, 10 Escrituras a favor del MTOP y 11 expedientes están listos para la inscripción de la Resolución de Ocupación Inmediata en el Registro del Trazado Paso Lateral de Guaranda.</p>	<p>Yacchirema Chimbo, Juan Carlos</p>	<p>05/08/2021 - 07:01 PM</p>
<p>JULIO</p> <p>- El Contrato de Obra se suscribió el 05 de diciembre de 2019, el anticipo de la obra se entregó el 25 de septiembre de 2020, el plazo del proyecto se encuentra suspendido desde el 26 de septiembre de 2020 hasta que se disponga de los terrenos debidamente expropiados. Se han realizado trabajos preliminares como el replanteo del proyecto e implementación del campamento.</p> <p>- La Contratación de la Fiscalización se encuentra en proceso de suscripción del Contrato una vez se disponga de la aprobación de la Certificación Presupuestaria Plurianual por parte de Planifica Ecuador.</p> <p>-Se continúa con la implementación de los expedientes de expropiación para proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública y su respectivo pago. Hasta la fecha se han elaborado 247 expedientes de los cuales; 247 expedientes han sido entregados a la Unidad de Caminos y Expropiaciones. Dentro de los 131 expedientes están en etapa de revisión técnica por parte de la Unidad de Caminos y Expropiaciones, 23 Expedientes están en etapa de correcciones por parte del Contratista, 23 En Procesos de Elaboración de Declaratoria de Utilidad Pública, 4 en Elaboración de Resolución de Ocupación Inmediata, 5 están listos para firma de la Declaratoria de Utilidad Pública, 14 expedientes están para la firma de Resolución de Ocupación Inmediata por parte del SIT, 22 están en el Registro de Propiedad para inscripción de Declaratoria de Utilidad Pública, 4 Escrituras a favor del MTOP están en proceso de inscripción en el registro de propiedad, 9 expedientes están en proceso de elaboración de minutas en la Notaría y 12 expedientes están listos para la protocolización de la Resolución de Ocupación Inmediata</p>	<p>Yacchirema Chimbo, Juan Carlos</p>	<p>30/07/2021 - 11:51 AM</p>
<p>JUNIO 2021</p> <p>-Aun falta por complementar 339 expedientes, de los cuales 122 expedientes corresponden a viviendas que no se encuentran catastradas y 217 corresponden que no propietarios que no tienen escritura y son herederos.</p> <p>- La Contratación de la Fiscalización se encuentra en proceso de suscripción del Contrato una vez se disponga de la aprobación de la Certificación Presupuestaria Plurianual por parte de Planifica Ecuador.</p> <p>- Una vez realizado el pago de los primeros predios expropiados se iniciara la obra.</p> <p>- El Contrato de Obra se suscribió el 05 de diciembre de 2019, el anticipo de la obra se entregó el 25 de septiembre de 2020, el plazo del proyecto se encuentra suspendido desde el 26 de septiembre de 2020 hasta que se disponga de los terrenos debidamente expropiados. Se han realizado trabajos preliminares como el replanteo del proyecto e implementación del campamento.</p>	<p>Yacchirema Chimbo, Juan Carlos</p>	<p>02/07/2021 - 08:58 AM</p>



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Se continúa con la implementación de los expedientes de expropiación para proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública y su respectivo pago. Hasta la fecha se han elaborado 226 expedientes de los cuales; 188 expedientes han sido entregados a la Unidad de Caminos y Expropiaciones; y, 38 expedientes estan en revisión por parte de la Fiscalización. Dentro de los 188 expedientes existen: 40 expedientes con Declaratoria de Utiidad Pública de los cuales 8 tienen Acuerdo de Negociación dentro de los cuales 4 expedientes se encuentran en la Notaría para la Protocolización de la Escritura, 12 expedientes están para firma de Resolución de Ocupación Inmediata por el SIT, se están elaborando la resolución de ocupación inmediata de 14 expedientes, tambien está en elaboración el Acuerdo de Negociacion de 2 expedientes y 4 cuadro expedientes están listos para firma de Acuerdo de Negociación. Además 51 expedientes están en corrección por parte del Contratista, 27 expedientes en elaboración de Utilidad Publica y 70 están en revisión técnica en la Unidad de Caminos y Expropiaciones.</p>		
<p>MAYO 2021</p> <p>- El Contrato de Obra se suscribio el 05 de diciembre de 2019, el anticipo de la obra se entrego el 25 de septiembre de 2020, el plazo del proyecto se encuentra suspendido desde el 26 de septiembre de 2020 hasta que se disponga de los terrenos debidamente expropiados. Se han realizado trabajos preliminares como el replanteo del proyecto e implementación del campamento.</p> <p>-Se continúa con la implementación de los expedientes de expropiación para proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública y su respectivo pago. Hasta la fecha se han elaborado 226 expedientes de los cuales; 188 expedientes han sido entregados a la Unidad de Caminos y Expropiaciones; y, 38 expedientes estan en revisión por parte de la Fiscalización. Dentro de los 188 expedientes existen: 40 expedientes con Declaratoria de Utiidad Pública de los cuales 8 tienen Acuerdo de Negociación dentro de los cuales 4 expedientes se encuentran en la Notaría para la Protocolización de la Escritura, 12 expedientes están para firma de Resolución de Ocupación Inmediata por el SIT, se están elaborando la resolución de ocupación inmediata de 14 expedientes, tambien está en elaboración el Acuerdo de Negociacion de 2 expedientes y 4 cuadro expedientes están listos para firma de Acuerdo de Negociación. Además 51 expedientes están en corrección por parte del Contratista, 27 expedientes en elaboración de Utilidad Publica y 70 están en revisión técnica en la Unidad de Caminos y Expropiaciones.</p> <p>-Aun falta por complementar 339 expedientes, de los cuales 122 expedientes corresponden a viviendas que no se encuentran catastradas y 217 corresponden que no propietarios que no tienen escritura y son herederos.</p> <p>- La Contratación de la Fiscalización se encuentra en proceso de suscripción del Contrato una vez se disponga de la aprobación de la Certificación Presupuestaria Plurianual por parte de Planifica Ecuador.</p> <p>- Una vez realizado el pago de los primeros predios expropiados se iniciara la obra.</p>	<p>Pulecio Montalvo, Roger Alberto</p>	<p>04/06/2021 - 04:51 PM</p>
<p>ABRIL 2021</p> <p>- Se entrego un anticipo de la obra el 25 de septiembre de 2020, el plazo del proyecto se encuentra suspendido desde el 26 de septiembre de 2020 hasta que se disponga de los terrenos debidamente expropiados para lo cual se ha realizado las Declaratorias de Utilidad Pública de 50 propiedades, la Contratista realiza los expedientes de expropiación en base a la información que proporcionados por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda. Una vez que se disponga de los predios expropiados se realizará los trabajos de movimiento de tierras. Para el pago de la expropiacion está pendiente la aprobación de la Actualización de la Certificación Presupuestaria Plurianual. por parte de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador. La Contratación de la Fiscalización se encuentra en proceso de suscripción del Contrato una vez se disponga de la Partida Presupuestaria.</p>	<p>Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier</p>	<p>04/06/2021 - 04:29 PM</p>
<p>MARZO 2021</p> <p>- Se entrego un anticipo de la obra el 25 de septiembre de 2020, el plazo del proyecto se encuentra suspendido desde el 26 de septiembre de 2020 hasta que se disponga de los terrenos debidamente expropiados para lo cual se ha realizado las Declaratorias de Utilidad Pública de 50 propiedades, la Contratista realiza los expedientes de expropiación en base a la información que proporcionados por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda. Una vez que se disponga de los predios expropiados se realizará los trabajos de movimiento de tierras. La Contratación de la Fiscalización se encuentra en proceso de suscripción del Contrato.</p>	<p>Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier</p>	<p>08/03/2021 - 12:49 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>FEBRERO 2021</b></p> <p>- Se entrego un anticipo de la obra el 25 de septiembre de 2020, el plazo del proyecto se encuentra suspendido desde el 26 de septiembre de 2020 hasta que se disponga de los terrenos debidamente expropiados para lo cual se ha realizado las Declaratorias de Utilidad Pública de 40 propiedades, la Contratista realiza los expedientes de expropiación en base a la información que proporcionados por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda. Una vez que se disponga de los predios expropiados se realizará los trabajos de movimiento de tierras.</p>	<p>Pulecio Montalvo, Roger Alberto</p>	<p>05/03/2021 - 03:39 PM</p>
<p><b>ENERO 2021</b></p> <p>- Se entrego un anticipo de la obra el 25 de septiembre de 2020, el plazo del proyecto se encuentra suspendido desde el 26 de septiembre de 2020 hasta que se disponga de los terrenos debidamente expropiados para lo cual se ha realizado las Declaratorias de Utilidad Pública de 40 propiedades, la Contratista realiza los expedientes de expropiación en base a la información que proporcionados por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda. Una vez que se disponga de los predios expropiados se realizará los trabajos de movimiento de tierras.</p>	<p>Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier</p>	<p>07/01/2021 - 02:24 PM</p>
<p><b>DICIEMBRE 2020</b></p> <p>- Está entregado el anticipo del 19.30% con fecha 25 de septiembre , se encuentra en tramite de suspensión parcial debido a que no se tiene predios liberados, ya que la entidad correspondiente del GAD GUARANDA remite el informe de lote mínimo con fecha 19 de octubre ,la resolución de la reforma de ordenanza. Actualmente se ha enviado a Planta Central 30 expedientes para la debida expropiación</p>	<p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p>	<p>07/01/2021 - 11:36 AM</p>
<p><b>NOVIEMBRE 2020</b></p> <p>- Está entregado el anticipo del 19.30% con fecha 25 de septiembre , se encuentra en tramite de suspensión parcial debido a que no se tiene predios liberados, ya que la entidad correspondiente del GAD GUARANDA remite el informe de lote mínimo con fecha 19 de octubre ,la resolución de la reforma de ordenanza. Actualmente se ha enviado a Planta Central 30 expedientes para la debida expropiación.</p>	<p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p>	<p>02/12/2020 - 11:36 AM</p>
<p><b>OCTUBRE 2020</b></p> <p>- Está entregado el anticipo del 19.30% con fecha 25 de septiembre , se encuentra en tramite de suspensión parcial debido a que no se tiene predios liberados, ya que la entidad correspondiente del GAD GUARANDA remite el informe de lote mínimo con fecha 19 de octubre ,la resolución de la reforma de ordenanza. Actualmente se ha enviado a Planta Central 30 expedientes para la debida expropiación.</p>	<p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p>	<p>04/11/2020 - 01:30 PM</p>
<p><b>SEPTIEMBRE 2020:</b></p> <p>- El contrato del Paso Lateral de Guaranda fue suscrito el 5 de diciembre de 2019, entre el MTOP y la empresa de la República Popular de China CRCC 14TH Bureau Group Ecuador Co. Ltd.; posteriormente se suscribe un Contrato Modificadorio de fecha 13 de marzo de 2020, en el cual se realiza una aclaración a la forma de pago del contrato original. El plazo de ejecución de la obra, inicia a la entrega del anticipo, sin embargo no inicia la ejecución de la obra por cuanto no se acredita el anticipo. Continúa en trámite la aprobación de la Reforma por cambio correlativo y fuente de financiamiento del IVA</p>	<p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p>	<p>05/10/2020 - 12:57 PM</p>
<p><b>JULIO 2020:</b></p> <p>- El contrato del Paso Lateral de Guaranda fue suscrito el 5 de diciembre de 2019, entre el MTOP y la empresa de la República Popular de China CRCC 14TH Bureau Group Ecuador Co. Ltd.; posteriormente se suscribe un Contrato Modificadorio de fecha 13 de marzo de 2020, en el cual se realiza una aclaración a la forma de pago del contrato original. El plazo de ejecución de la obra, inicia a la entrega del anticipo, sin embargo no inicia la ejecución de la obra por cuanto no se acredita el anticipo. Continúa en trámite la aprobación de la Reforma por cambio correlativo y fuente de financiamiento del IVA</p>	<p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p>	<p>04/09/2020 - 01:54 PM</p>
<p><b>JULIO 2020:</b></p> <p>- El contrato del Paso Lateral de Guaranda fue suscrito el 5 de diciembre de 2019, entre el MTOP y la empresa de la República Popular de China CRCC 14TH Bureau Group Ecuador Co. Ltd.; posteriormente se suscribe un Contrato Modificadorio de fecha 13 de marzo de 2020, en el cual se realiza una aclaración a la forma de pago del contrato original. El plazo de ejecución de la obra, inicia a la entrega del anticipo, sin embargo no inicia la ejecución de la obra por cuanto no se acredita el anticipo. Continúa en trámite la aprobación de la Reforma por cambio correlativo y fuente de financiamiento del IVA</p>	<p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p>	<p>04/08/2020 - 11:00 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>JUNIO 2020:</b></p> <p>- El contrato del Paso Lateral de Guaranda fue suscrito el 5 de diciembre de 2019, entre el MTOP y la empresa de la República Popular de China CRCC 14TH Bureau Group Ecuador Co. Ltd.; posteriormente se suscribe un Contrato Modificatorio de fecha 13 de marzo de 2020, en el cual se realiza una aclaración a la forma de pago del contrato original. El plazo de ejecución de la obra, inicia a la entrega del anticipo, sin embargo no inicia la ejecución de la obra por cuanto no se acredita el anticipo. Continúa en trámite la aprobación de la Reforma por cambio correlativo y fuente de financiamiento del IVA.</p>	<p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p>	<p>05/07/2020 - 03:42 PM</p>
<p><b>MAYO 2020:</b></p> <p>- El contrato del Paso Lateral de Guaranda fue suscrito el 5 de diciembre de 2019, entre el MTOP y la empresa de la República Popular de China CRCC 14TH Bureau Group Ecuador Co. Ltd.; posteriormente se suscribe un Contrato Modificatorio de fecha 13 de marzo de 2020, en el cual se realiza una aclaración a la forma de pago del contrato original. El plazo de ejecución de la obra, inicia a la entrega del anticipo, sin embargo no inicia la ejecución de la obra por cuanto no se ha acreditado el anticipo. Se está tramitando la aprobación de la Reforma por cambio correlativo y fuente de financiamiento del IVA.</p>	<p>Lara Villacis, Ligia Elena</p>	<p>05/07/2020 - 11:44 AM</p>
<p><b>ABRIL 2020:</b></p> <p>- El contrato del Paso Lateral de Guaranda fue suscrito el 5 de diciembre de 2019, entre el MTOP y la empresa de la República Popular de China CRCC 14TH Bureau Group Ecuador Co. Ltd.; posteriormente se suscribe un Contrato Modificatorio de fecha 13 de marzo de 2020, en el cual se realiza una aclaración a la forma de pago del contrato original.</p>	<p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p>	<p>05/05/2020 - 12:01 PM</p>
<p><b>MARZO 2020:</b></p> <p>- El contrato del Paso Lateral de Guaranda fue suscrito el 5 de diciembre de 2019, entre el MTOP y la empresa de la República Popular de China CRCC 14TH Bureau Group Ecuador Co. Ltd.; posteriormente se suscribe un Contrato Modificatorio de fecha 13 de marzo de 2020, en el cual se realiza una aclaración a la forma de pago del contrato original.</p> <p>El plazo del contrato No inicia, pues el plazo arranca a la fecha de notificación de la entrega del anticipo en la cuenta del contratista, siendo que ha la fecha 18 de marzo de 2020, no se ha acreditado el anticipo, por consiguiente el avance físico y económico es del 0%</p>	<p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p>	<p>03/04/2020 - 07:08 PM</p>
<p><b>Febrero 2020:</b></p> <p>- El plazo del contrato de obra Paso Lateral de Guaranda inicia a la fecha de la entrega del anticipo. A la fecha del presente resumen ejecutivo, no se ha efectivizado el pago del anticipo a la contratista.</p>	<p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p>	<p>04/03/2020 - 03:01 PM</p>
<p><b>Enero 2020:</b></p> <p>- El plazo del contrato de obra Paso Lateral de Guaranda inicia a la fecha de la entrega del anticipo. A la fecha del presente resumen ejecutivo 15/01/2020, no se ha efectivizado el pago del anticipo a la contratista.</p>	<p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p>	<p>06/02/2020 - 09:42 AM</p>
<p><b>Diciembre 2019:</b></p> <p>1.- Se realizó la actualización de claves catastrales de los predios afectados por la construcción del nuevo proyecto Paso Lateral de Guaranda, obteniendo un registro total del 60% de predios afectados, sin embargo nos resta por recopilar información de la parte afectada, con el fin de proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública, lo que faculta al MTOP liberar los predios afectados y arrancar con el inicio con el proceso de contratación de obra del paso lateral de Guaranda.</p>	<p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p>	<p>08/01/2020 - 09:13 AM</p>
<p><b>Diciembre 2019:</b></p> <p>1.- Se realizó la actualización de claves catastrales de los predios afectados por la construcción del nuevo proyecto Paso Lateral de Guaranda, obteniendo un registro total del 60% de predios afectados, sin embargo nos resta por recopilar información de la parte afectada, con el fin de proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública, lo que faculta al MTOP liberar los predios afectados y arrancar con el inicio con el proceso de contratación de obra del paso lateral de Guaranda.</p> <p>2.- Proyecto con acta de recepción definitiva , en espera que se asigne presupuesto para la liquidación económica final.</p>	<p>Agualongo Amangandi, Mercy Maribel</p>	<p>08/01/2020 - 09:12 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>NOVIEMBRE 2019:</b></p> <p>1.- Se realizó la actualización de claves catastrales de los predios afectados por la construcción del nuevo proyecto Paso Lateral de Guaranda, obteniendo un registro total del 60% de predios afectados, sin embargo nos resta por recopilar información de la parte afectada, con el fin de proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública, lo que faculta al MTOP liberar los predios afectados y arrancar con el inicio con el proceso de contratación de obra del paso lateral de Guaranda.</p> <p>2.- Proyecto con acta de recepción definitiva , en espera que se asigne presupuesto para la liquidación económica final.</p>	<p>Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier</p>	<p>05/11/2019 - 03:51 PM</p>
<p><b>SEPTIEMBRE 2019:</b></p> <p>1.- Se realizó la actualización de claves catastrales de los predios afectados por la construcción del nuevo proyecto Paso Lateral de Guaranda, obteniendo un registro total del 60% de predios afectados, sin embargo nos resta por recopilar información de la parte afectada, con el fin de proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública, lo que faculta al MTOP liberar los predios afectados y arrancar con el inicio con el proceso de contratación de obra del paso lateral de Guaranda.</p> <p>2.- Proyecto con acta de recepción definitiva , en espera que se asigne presupuesto para la liquidación económica final.</p>	<p>Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier</p>	<p>02/10/2019 - 09:17 AM</p>
<p><b>AGOSTO 2019:</b></p> <p>1.- Se realizó la actualización de claves catastrales de los predios afectados por la construcción del nuevo proyecto Paso Lateral de Guaranda, obteniendo un registro total del 60% de predios afectados, sin embargo nos resta por recopilar información de la parte afectada, con el fin de proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública, lo que faculta al MTOP liberar los predios afectados y arrancar con el inicio con el proceso de contratación de obra del paso lateral de Guaranda.</p> <p>2.- Proyecto con acta de recepción definitiva , en espera que se asigne presupuesto para la liquidación económica final.</p>	<p>Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier</p>	<p>12/09/2019 - 04:35 PM</p>
<p><b>JULIO 2019:</b></p> <p>1.- Se realizó la actualización de claves catastrales de los predios afectados por la construcción del nuevo proyecto Paso Lateral de Guaranda, obteniendo un registro total del 60% de predios afectados, sin embargo nos resta por recopilar información de la parte afectada, con el fin de proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública, lo que faculta al MTOP liberar los predios afectados y arrancar con el inicio con el proceso de contratación de obra</p>	<p>Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier</p>	<p>06/08/2019 - 09:52 AM</p>
<p><b>JUNIO 2019:</b></p> <p>1.- Se realizó la actualización de claves catastrales de los predios afectados por la construcción del nuevo proyecto Paso Lateral de Guaranda, obteniendo un registro total del 60% de predios afectados, sin embargo nos resta por recopilar información de la parte afectada, con el fin de proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública, lo que faculta al MTOP liberar los predios afectados y arrancar con el inicio con el proceso de contratación de obra.</p>	<p>Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier</p>	<p>04/07/2019 - 08:40 AM</p>
<p><b>MAYO 2019</b></p> <p>1.- Se realizó la actualización de claves catastrales de los predios afectados por la construcción del nuevo proyecto Paso Lateral de Guaranda, obteniendo un registro total del 60% de predios afectados, sin embargo nos resta por recopilar información de la parte afectada, con el fin de proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública, lo que faculta al MTOP liberar los predios afectados y arrancar con el inicio con el proceso de contratación de obra.</p>	<p>Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier</p>	<p>04/06/2019 - 10:10 AM</p>
<p><b>ABRIL 2019</b></p> <p>1.- Se realizó la actualización de claves catastrales de los predios afectados por la construcción del nuevo proyecto Paso Lateral de Guaranda, obteniendo un registro total del 60% de predios afectados, sin embargo nos resta por recopilar información de la parte afectada, con el fin de proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública, lo que faculta al MTOP liberar los predios afectados y arrancar con el inicio con el proceso de contratación de obra.</p>	<p>Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier</p>	<p>09/05/2019 - 04:17 PM</p>
<p><b>MARZO 2019</b></p>	<p>Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier</p>	<p>05/04/2019 - 12:20 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
1.- Se realizó la actualización de claves catastrales de los predios afectados por la construcción del nuevo proyecto Paso Lateral de Guaranda, obteniendo un registro total del 60% de predios afectados, sin embargo nos resta por recopilar información de la parte afectada, con el fin de proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública, lo que faculta al MTOP liberar los predios afectados y arrancar con el inicio con el proceso de contratación de obra.		
FEBRERO 2019 1.- Se realizó la actualización de claves catastrales de los predios afectados por la construcción del nuevo proyecto Paso Lateral de Guaranda, obteniendo un registro total del 60% de predios afectados, sin embargo nos resta por recopilar información de la parte afectada, con el fin de proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública, lo que faculta al MTOP liberar los predios afectados y arrancar con el inicio con el proceso de contratación de obra.	Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier	01/03/2019 - 02:21 PM
ENERO 2019 1.- Se realizó la actualización de claves catastrales de los predios afectados por la construcción del nuevo proyecto Paso Lateral de Guaranda, obteniendo un registro total del 60% de predios afectados, sin embargo nos resta por recopilar información de la parte afectada, con el fin de proceder con la Declaratoria de Utilidad Pública, lo que faculta al MTOP liberar los predios afectados y arrancar con el inicio con el proceso de contratación de obra.	Lara Villacis, Ligia Elena	05/02/2019 - 09:44 AM

**PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Liberación de predios	05/05/2023	Sergio Washington Pungaña Zaruma	10	30	3	0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. Tiempo.</b> La no liberación de propiedades mediante expropiación CAUSARÍA retraso en el plazo de entrega de la obra.	05/05/2023	Antonio Guillermo Flores Solano	20 %	10	2	0/1

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Chimbo
2	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Guaranda
3	Zona 5 - Litoral > Bolívar > San Miguel

**HITOS**

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1 DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	1-Solicitud de Información	01/08/2018		01/08/2018		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
2	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado	1-Solicitud de Información	16/08/2018		16/08/2018		Sí	5.0
3	PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida	1-Solicitud de Información	20/08/2018		20/08/2018		Sí	2.0
4	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	1-Solicitud de Información	11/01/2019		11/01/2019		Sí	2.0
5	PLANEACIÓN: Programación presupuestaria aprobada (Patrocinador Ejecutivo)	1-Solicitud de Información	29/01/2019		29/01/2019		Sí	2.0
6	PLANEACIÓN: Acta de constitución del proyecto aprobada	1-Solicitud de Información	30/05/2019		30/05/2019		Sí	2.0
7	PLANEACIÓN: Aval aprobado	1-Solicitud de Información	30/05/2019		30/05/2019		Sí	2.0
8	EJECUCIÓN: Contrato Principal y/o Complementario suscrito/Anticipo Entregado	3-Adjudicación	25/09/2020		25/09/2020		Sí	1.0
9	EJECUCIÓN: SUSPENSIÓN PARCIAL I	4-Inicio de Trabajo	08/11/2021		08/11/2021		Sí	1.0
10	EJECUCIÓN:TRÁMITE Y PAGO DE EXPROPIACIONES I	4-Inicio de Trabajo	20/11/2021		20/11/2021		Sí	1.0
11	EJECUCIÓN: MOVIMIENTO DE TIERRAS TRAMO I GUANUJO 0+000-0+540	4-Inicio de Trabajo	31/12/2021		31/12/2021		Sí	2.0
12	EJECUCIÓN:TRÁMITE Y PAGO DE EXPROPIACIONES II	4-Inicio de Trabajo	15/03/2022		15/03/2022		Sí	2.0
13	EJECUCIÓN: MOVIMIENTO DE TIERRAS TRAMO II ENTRADA LAS COCHAS 1+750-2+600	4-Inicio de Trabajo	16/03/2022		16/03/2022		Sí	2.0
14	EJECUCIÓN: SUSPENSIÓN TEMPORAL	4-Inicio de Trabajo	17/03/2022		17/03/2022		Sí	1.0
15	EJECUCIÓN: LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN	4-Inicio de Trabajo	01/08/2022		01/08/2022		Sí	1.0
16	EJECUCIÓN:TRÁMITE Y PAGO DE EXPROPIACIONES III	4-Inicio de Trabajo	30/09/2022		30/09/2022		Sí	1.0
17	MOVIMIENTO DE TIERRAS TRAMO III CHALATA 3+250-3+520	4-Inicio de Trabajo	30/11/2022		30/11/2022		Sí	2.0
18	MOVIMIENTO DE TIERRAS TRAMO IV UNIVERSIDAD 11+340-12+320	4-Inicio de Trabajo	31/12/2022		31/12/2022		Sí	2.0
19	MOVIMIENTO DE TIERRAS MOVIMIENTO DE TIERRAS TRAMO IV UNIVERSIDAD 11+340-12+320 FASE II	4-Inicio de Trabajo	30/01/2023		31/03/2023		Sí	2.0
20	MOVIMIENTO DE TIERRAS TRAMO III CHALATA 3+250-3+520 FASE II	4-Inicio de Trabajo	28/02/2023		24/03/2023		Sí	2.0
21	EJECUCIÓN: MOVIMIENTO DE TIERRAS MARZO-JUNIO 2023	4-Inicio de Trabajo	30/06/2023	30/06/2023			No	2.0
22	EJECUCIÓN: INICIO CONSTRUCCIÓN PASO	4-Inicio de Trabajo	29/07/2023	29/07/2023			No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	SUPERIOR SAN MIGUELITO 0+566							
23	EJECUCIÓN: MOVIMIENTO DE TIERRAS JULIO-DICIEMBRE 2023	4-Inicio de Trabajo	31/12/2023	31/12/2023			No	2.0
24	EJECUCIÓN: MOVIMIENTO DE TIERRAS ENERO-MARZO 2024	4-Inicio de Trabajo	30/03/2024	30/03/2024			No	2.0
25	EJECUCIÓN: DRENAJE (OBRAS DE ARTE MENOR) ABRIL-JUNIO 2024	4-Inicio de Trabajo	28/06/2024	28/06/2024			No	2.0
26	EJECUCIÓN: INICIO PAVIMENTO	4-Inicio de Trabajo	24/07/2024	24/07/2024			No	2.0
27	EJECUCIÓN: INICIO OBRAS COMPLEMENTARIAS	4-Inicio de Trabajo	05/08/2024	05/08/2024			No	2.0
28	EJECUCIÓN: INICIO PUENTE GUARANDA	4-Inicio de Trabajo	20/08/2024	20/08/2024			No	3.0
29	EJECUCIÓN: INICIO PUENTE SALINAS	5-Entregables Intermedios	30/08/2024	30/08/2024			No	3.0
30	EJECUCIÓN: MOVIMIENTO DE TIERRAS SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2024	5-Entregables Intermedios	20/11/2024	20/11/2024			No	3.0
31	EJECUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES TERMINADO	5-Entregables Intermedios	20/04/2025	20/04/2025			No	5.0
32	EJECUCIÓN: FINALIZA OBRAS COMPLEMENTARIAS	5-Entregables Intermedios	20/06/2025	20/06/2025			No	6.0
33	EJECUCIÓN: FINALIZA PAVIMENTO	5-Entregables Intermedios	25/06/2025	25/06/2025			No	6.0
34	EJECUCIÓN: SEÑALIZACION PASO LATERAL GUARANDA	5-Entregables Intermedios	30/07/2025	30/07/2025			No	5.0
35	EJECUCIÓN: ILUMINACIÓN PASO LATERAL GUARANDA	5-Entregables Intermedios	24/08/2025	24/08/2025			No	5.0
36	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	5-Entregables Intermedios	19/09/2025	19/09/2025			No	1.0
37	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	5-Entregables Intermedios	20/09/2025	20/09/2025			No	1.0
38	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	21/09/2025	21/09/2025			No	2.0
39	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/03/2026	30/03/2026			No	2.0
40	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	31/07/2026	31/07/2026			No	2.0
41	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	Z - Compromiso Ministerial	31/12/2026	31/12/2026			No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance físico de la obra.		100.00 %	0.0382	0.0382	01/04/2020	Ene-Mar


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	8,199,674.96
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,916,575.33 **
Costo Total:	55,460,277.01
Total Devengado:	7,603,808.66
% Costo Total Devengado:	13.71 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 13.71 %

Perfil Económico 2023

	Años Previos	Año Actual (2023)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	51,476,603.15	28,478,019.70	0.00	79,954,622.85
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	52,110,400.04	28,478,019.70	0.00	80,588,419.74
Ppto. Codificado	32,078,080.67	29,135,504.05	0.00	61,213,584.72
Ppto. Comprometido	2,372,519.11	0.00	0.00	2,372,519.11
Planeado - Codificado (2023)		-657,484.35		
Programado a Devengar	32,078,080.67	0.00	0.00	32,078,080.67
Ppto. Devengado	1,916,575.33	5,687,233.33	0.00	7,603,808.66
Pagado Real	1,549,987.76	0.00	0.00	1,549,987.76
Estimado a fin de año	* 1,916,575.33	0.00	0.00	1,916,575.33
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	30,161,505.34	0.00	0.00	30,161,505.34
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 5.97 %	-	0.00 %	23.70 %
Ppto. Codificado 998	230,958.67	657,484.35	0.00	888,443.02
Ppto. Devengado 998	215,117.91	0.00	0.00	215,117.91

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2023

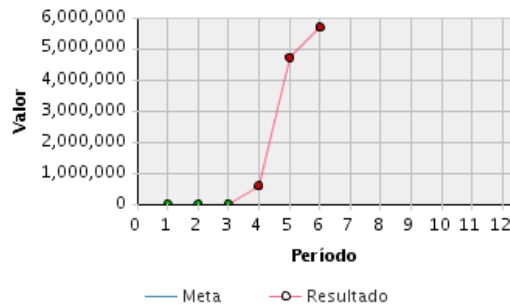

Presupuesto Mensual 2023

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	100.00 %



Presupuesto Mensual 2023							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	576,692.11	0.00	576,692.11	115.00 %		115.00 %
May	0.00	4,130,292.27	0.00	4,706,984.38	115.00 %		115.00 %
Jun	0.00	980,248.95	0.00	5,687,233.33	115.00 %		115.00 %
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>5,687,233.33</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
18	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada,

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A0. INFORME DE VIABILIDAD SNP	INFORME_DE_VIABILIDAD_PASO_LATERAL_DE_GUARANDA_2020.pdf	12/12/2020
2	A1. SOLICITUD DE GESTION PARA OBTENER LA AUTORIZACION DE INICIO DE ETAPA PRECONTRACTUAL PARA LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA PASO LATERAL DE GUARANDA.	A1._mtop-ddb-2019-1569-me_fase_precontractual.pdf	18/03/2020
3	A10. CONTRATO MODIFICATORIO PASO LATERAL GUARANDA	Contrato_Modificadorio_Paso_Lateral.pdf	27/05/2020
4	A2. APROBACIÓN DE INICIO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA PASO LATERAL DE GUARANDA	A2._MTOPE-SUBZ5-2019-1407-ME_Aprobación_Fase_Preparatoria.pdf	18/03/2020
5	A2.1. DOCUMENTOS HABILITANTES PARA LA CONTRATACIÓN DE L PASO LATERAL DE GUARANDA.	A2.1._Memorandos_habilitantes.PDF	18/03/2020
6	A3. Aprobación de Especificaciones Técnicas	Aprobación_Especificaciones_Técnicas.PDF	06/02/2020
7	A4. Certificación Presupuestaria Plurianual	Anexo_9._Certificación_Presupuestaria.PDF	06/02/2020
8	A5. Certificación de Inclusión al PAI 2019	Anexo_8._Certificación_Inclusion_PAI_2019.PDF	06/02/2020
9	A6. Contrato Paso Lateral de Guaranda	Contrato_Paso_Lateral_de_Guaranda.PDF	06/02/2020
10	A7. Cédula Presupuestaria del Proyecto al año 2020	cedula_presupuestaria.pdf	06/02/2020
11	A8. Dictamen de Prioridad SENPLADES	Anexo_3._Dictamen_Prioridad_Senplades.PDF	06/02/2020
12	A9. Resolución de Adjudicación	Resolucion_Adjudicación__Nro._242-2019.PDF	06/02/2020
13	B1. Solicitud de AVAL	Anexo_7._Solicitud_de_Aval.PDF	06/02/2020
14	B2. PROYECTO EN FORMATO SENPLADES	Marco_lógico_Paso_Lateral_de_Guaranda.doc	03/04/2020
15	B3. CRPONOGRAMA VALORADO DEL PROYECTO	Anexo_5._formato_cronograma_valorado._Paso_L._Guaranda.pdf	03/04/2020
16	B4. CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2020	enero_paso_lateral.pdf	09/05/2020
17	B5. CEDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2020	febrero_paso_lateral.pdf	09/05/2020

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
18	B6. CEDULA PRESUPUESTARIA MARZO 2020	marzo_paso_lateral.pdf	09/05/2020
19	B7. CEDULA PRESUPUESTARIA ABRIL 2020	abril_paso_lateral.pdf	09/05/2020
20	B8. Cédula Presupuestaria Año 2018	CEDULA_PRESUPUESTARIA_DEL_PASO_LARERAL_GUARANDA-2018.pdf	09/05/2020
21	B9. Cédula Presupuestaria Año 2019	CEDULA_PRESUPUESTARIA_DEL_PASO_LARERAL_GUARANDA-2019.pdf	09/05/2020
22	C1. REPORTE ENTREGA DE ANTICIPO DEL PASO LATERAL DE GUARANDA	Anticipo_Paso_Lateral.pdf	03/12/2020
23	C2. CEDULA PRESUPUESTARIA PAGO JUNIO	PASO_LATERAL_JUNIO.pdf	05/08/2021
24	C3. CEDULA PRESUPUESTARIA PAGO JULIO 2021	PASO_LATERAL_JULIO.pdf	05/08/2021
25	C4. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZO, COMUNICACION DE PAGOS DE EXPROPIACIÓN MTOP-CONS_BOL-2021-434-ME	PASO_LATERAL_MTOP-CONS_BOL-2021-434-ME.pdf	05/08/2021
26	C5. CÉDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2021	PASO_LATERAL.PDF	01/09/2021
27	C6. Cedula Presupuestaria Septiembre 2021	cedula_presupuestaria_septiembre.pdf	05/10/2021
28	C7. CEDULA PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2021	Cedula_Presupuestaria_Octubre_2021.pdf	04/11/2021
29	C8. CEDULA PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 2021	REPORTE_PASO_LATERAL_DE_NOVIEMBRE.pdf	03/12/2021
30	C9. Documento respaldo cierre de riegos del Proyecto Paso Lateral de Guaranda.	MTOP-DDB-21-291-OF.pdf	28/12/2021
31	D1. CEDULA PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2021	cedula_presupuestaria_diciembre_2021.pdf	05/01/2022
32	D2. CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO A ABRIL 2022	Cedula_presupuestaria_Enero_a_Abril_2022.pdf	03/06/2022
33	D3. CEDULA PRESUPUESTARIA MAYO 2022	Cedula_Presupuestaria_Mayo_2022.pdf	03/06/2022
34	D4. CEDULA PRESUPUESTARIA JUNIO 2022	reporte_paso_lateral_guaranda_mes_junio.pdf	05/07/2022
35	D5. Acta de levantamiento de suspensión temporal Nro. 2	ACTA_DE_LEVANTAMIENTO_DE_SUSPENSION.pdf	01/09/2022
36	D6. Informe ejecutivo estado actual Paso Lateral de Guaranda Agosto 2022	Informe_ejecutivo_Paso_Lateral_30-Agosto-2022-signed.pdf	01/09/2022
37	D7. Cédula presupuestaria Paso Lateral Julio 2022	Reporte_Presupuestario_Paso_Lateral_Guaranda_julio.pdf	28/09/2022
38	D8. Cédula presupuestaria Paso Lateral Agosto 2022	Reporte_Presupuestario_Paso_Lateral_Guaranda_agosto.pdf	28/09/2022
39	D9. MEMORANDO MTOP-DDB-2022-2593-ME SUSTENTO PARA CIERRE DE RIESGOS	Documento_para_cerrar_riesgos.pdf	02/12/2022
40	E1. CEDULA PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2022	REPORTE_GASTO_DE_INVERSIÓN_MES_OCTUBRE.pdf	02/12/2022
41	E2. CEDULA PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 2022	REPORTE_GASTO_DE_INVERSIÓN_MES_NOVIEMBRE.pdf	02/12/2022
42	E3. CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO 2023	cedula_presupuestaria_paso_lateral_enero.pdf	09/03/2023
43	E4. CEDULA PRESUPUESTARIA FEBRERO 2023	CEDULA_PRESUPUESTARIA_PASO_LATERAL_FEBRERO2023.pdf	09/03/2023
44	E5. Informe técnico Paso Lateral Marzo 2023	INFORME_TECNICO_PASO_LATERAL_(SIOPE_30-03-2023)-signed-signed-signed-signed.pdf	05/04/2023
45	E6. CEDULA PRESUPUESTARIA PLG MARZO 2023	marzo_plg.pdf	05/05/2023
46	E7. CEDULA PRESUPUESTARIA PLG ABRIL 2023	abril_plg.pdf	05/05/2023

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Flores Solano, Antonio Guillermo	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Bolívar	Director de Transporte y Obras Públicas Distrital de Bolivar - Encargado	aflores@mtop.gob.ec	023974600
Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	Subsecretario de Transporte y Obras Públicas Zonal 5 (E)	Subsecretario de Transporte y Obras Públicas Zonal 5 - Encargado	mmayorga@mtop.gob.ec	023974600
Pungaña Zaruma, Sergio Washington	Supervisor	Supervisor de Conservación Vial de Bolívar	spungana@mtop.gob.ec	023974600

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
131264_1.jpg	05/06/2023
