

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Producción de Obras Públicas

PROYECTO: K115 MTOP - Proyecto de Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Física en las Zonas Afectadas por el Terremoto

Líder del Proyecto:	Briceño Sarmiento, Maria Veronica (mbriceno@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Santamaría Loor, Kiura Ninoska	Programas Relacionados:	
Titular:	Prado Leverone, Juan Carlos	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	123200000.0000.381243	TIR:	42.72 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	200,967,514.32
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	46,261,942.49
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	03/08/2012 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	01/08/2023	Fecha de Fin Base:	31/12/2025
Modificado por:	Briceño Sarmiento, Maria Veronica	Fecha del siguiente Hito:	31/07/2023

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Reconstrucción, rehabilitación y construcción de obras de infraestructura de salud pública en las zonas afectadas por el terremoto.

PRODUCTO: Infraestructura hospitalaria para las zonas afectadas por el terremoto

LINEA BASE: Reconstrucción, rehabilitación y construcción de hospitales en las zonas afectadas por el terremoto.

OBJETIVO GENERAL: Ejecución de estudios, obras y fiscalización de los hospitales en las zonas afectadas por el terremoto.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Financiar la contratación de obras, estudios y fiscalización para infraestructura hospitalaria para las zonas afectadas por el terremoto.

Beneficios Cualitativos

Atender las necesidades de la población afectada por el evento telúrico de gran impacto ocurrido el 16 de abril de 2016, en las provincias de Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo.

Contribuir en la reconstrucción, rehabilitación y construcción de obras de infraestructura de salud pública.

Modernización, eficiencia y calidad del servicio hospitalario en las instituciones públicas, adecuada funcionalidad espacial, confort ambiental y dotación de equipamiento, mobiliario y equipos que dignifiquen las condiciones de trabajo tanto de los funcionarios públicos como de los pacientes.

Mejoramiento de las unidades hospitalarias, enmarcando una nueva imagen institucional, estandarizando materiales y mejorando la calidad de atención a sus habitantes.

Aumentar la cobertura en los territorios que cuentan con déficit de atención en el ámbito de la salud y alcanzar a nivel nacional.

Tipo de Beneficiario

DIRECTOS: 2.229.026 habitantes de las zonas afectadas por el terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas

INDIRECTOS: habitantes de las zonas cercanas a las provincias de Manabí y Esmeraldas, turistas, comerciantes.

Restricciones

TIEMPO: El plazo de ejecución del proyecto será aproximadamente de 13 años

COSTO: Presupuesto asignado por la Entidad Requirente hasta la finalización de las obras.

CALIDAD: Garantizar la calidad de los servicios de salud, por lo que el proyecto se encuentra constituido por 2 componentes fundamentales: 1. Dotación de infraestructura física (adecentamiento intermedio, repotenciación y nueva construcción); a las unidades de

Restricciones

salud de primer y segundo nivel y sedes distritales de las zonas que fueron afectadas por el terremoto, de acuerdo al levantamiento de necesidades con las unidades operativas beneficiarias; y, 2. Equipamiento de unidades de salud de primer y segundo nivel de acuerdo al levantamiento de necesidades con las unidades operativas beneficiarias.


RECURSOS: Humanos (técnicos, obreros), materiales (materia prima, material constructivo, mobiliario hospitalario), equipos (equipo constructivo, equipamiento médico).

ALCANCE: Los habitantes de las zonas afectadas por el terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 82.02 %
 Fecha de Inicio: 03/08/2012 Fecha de Fin: 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2023	Avance programado acumulado											
	90 %	90 %	90 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	98 %	98 %	98 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2023</p> <p>1. El proyecto de inversión denominado "Proyecto de Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Física en las Zonas Afectadas por el Terremoto" con CUP: 123200000.0000.381243; co - ejecutado entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio de Salud Pública, en el mes de julio 2023 devengó valores para financiar planillas de los contratos de obra y fiscalización de los Hospitales de Manta, y Pedernales, por un monto de USD. 1,108,605.57. (Anexo 31).</p> <p>2. El 31 de julio de 2023 se suscribió el Acta de Recepción Provisional del Hospital Básico de Pedernales. (Anexo 32).</p>	Briceño Sarmiento, Maria Veronica	01/08/2023 - 01:06 PM
<p>JUNIO 2023</p> <p>Una vez reactivada el proyecto de inversión denominado "Proyecto de Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Física en las Zonas Afectadas por el Terremoto" con CUP: 123200000.0000.381243; mismo que es un proyecto co - ejecutado entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio de Salud Pública, en el mes de junio 2023 se devengaron valores para financiar planillas de los contratos de obra y fiscalización de los Hospitales de Manta, y Pedernales, por un monto de USD. 50.739,54. (Anexo 30).</p>	Briceño Sarmiento, Maria Veronica	04/07/2023 - 11:44 AM
<p>MAYO 2023</p> <p>En tal virtud, luego de las gestiones correspondientes para la asignación de recursos al proyecto de inversión denominado "Proyecto de Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Física</p>	Prado Leverone, Juan Carlos	05/06/2023 - 10:37 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>en las Zonas Afectadas por el Terremoto" con CUP: 123200000.0000.381243; mismo que es un proyecto co - ejecutado entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio de Salud Pública, se obtuvo un monto codificado de \$14.983.729,57, de los cuales en el mes de mayo 2023 se devengaron valores para financiar planillas de los contratos de obra y fiscalización de los Hospitales de Manta, Bahía de Caráquez y Pedernales, por un monto de \$14,561.55. (Anexo 29).</p>		
<p>ABRIL 2023</p> <p>Mediante Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2023-0118-OF de 09 de febrero de 2023, el Subsecretario de Planificación Nacional de la Secretaría Nacional de Planificación remitió al Ministro de Economía y Finanzas el dictamen favorable a la modificación presupuestaria de inclusión y transferencia de recursos, condicionados a la disponibilidad presupuestaria y asignación de fuente de financiamiento por parte del ente rector de las finanzas públicas, conforme a la ley. (Anexo 25).</p> <p>En tal virtud, luego de las gestiones correspondientes para la asignación de recursos al proyecto de inversión denominado "Proyecto de Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Física en las Zonas Afectadas por el Terremoto" con CUP: 123200000.0000.381243; mismo que es un proyecto co - ejecutado entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio de Salud Pública, se obtuvo un monto codificado de \$14.983.729,57, de los cuales en el mes de abril 2023 se devengaron valores para financiar planillas de los contratos de obra y fiscalización de los Hospitales de Manta, Bahía de Caráquez y Pedernales, por un monto de \$3.679.136,19. (Anexo 28).</p> <p>Mediante Oficio Nro. MTOP-DDM-Z4-2023-148-OF de 03 de mayo de 2023, el Administrador del Contrato, convocó a un recorrido en el Hospital de Bahía de Caráquez, con la finalidad de constatar el estado del mismo, previa suscripción del Acta de Recepción Definitiva. (Anexo 27).</p>	<p>Prado Leverone, Juan Carlos</p>	<p>05/05/2023 - 02:59 PM</p>
<p>MARZO 2023</p> <p>Mediante Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2023-0118-OF de 09 de febrero de 2023, el Subsecretario de Planificación Nacional de la Secretaría Nacional de Planificación remitió al Ministro de Economía y Finanzas el dictamen favorable a la modificación presupuestaria de inclusión y transferencia de recursos, condicionados a la disponibilidad presupuestaria y asignación de fuente de financiamiento por parte del ente rector de las finanzas públicas, conforme a la ley. (Anexo 25).</p> <p>En tal virtud, luego de las gestiones correspondientes para la asignación de recursos al proyecto de inversión denominado "Proyecto de Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Física en las Zonas Afectadas por el Terremoto" con CUP: 123200000.0000.381243; mismo que es un proyecto co - ejecutado entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio de Salud Pública, se obtuvo un monto codificado de \$14.983.729,57, de los cuales en el mes de marzo 2023 se devengaron valores para financiar planillas de los contratos de obra y fiscalización de los Hospitales de Manta, Bahía de Caráquez y Pedernales, por un monto de \$2.501.281,75.</p>	<p>Prado Leverone, Juan Carlos</p>	<p>03/04/2023 - 12:26 PM</p>
<p>FEBRERO 2023</p> <p>En este periodo se realizó seguimiento a la ejecución del "Proyecto de Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Física en las Zonas Afectadas por el Terremoto" con CUP: 123200000.0000.381243; por la cual, me permito indicar que, en el mes de enero 2023 no se realizó ejecución presupuestaria en el proyecto, puesto que, al ser un proyecto co - ejecutado entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio de Salud Pública, Entidad Requiriente responsable de la programación y financiamiento económico anual y plurianual de las obras; y, responsable de realizar el trámite ante la Secretaría Nacional de Planificación y Ministerio de Finanzas, con la finalidad de financiar el monto total de cada obra y proyecto; así como, también es quien debe certificar la disponibilidad presupuestaria y tramitar ante dichas entidades la transferencia de recursos, transferencia que a la presente fecha no ha sido realizada, por tal razón, se ha solicitado el cambio de fase de EJECUCIÓN A CONGELADO, conforme el informe justificativo adjunto. (Anexo 24).</p>	<p>Prado Leverone, Juan Carlos</p>	<p>03/04/2023 - 12:19 PM</p>
<p>ENERO 2023</p> <p>En este periodo se realizó seguimiento a la ejecución del "Proyecto de Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Física en las Zonas Afectadas por el Terremoto" con CUP: 123200000.0000.381243; por la cual, me permito indicar que, en el mes de enero 2023 no se realizó ejecución presupuestaria en el proyecto, puesto que, al ser un proyecto co - ejecutado entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio de Salud Pública, Entidad Requiriente responsable de la programación y financiamiento económico anual y plurianual de las obras; y, responsable de realizar el trámite ante la Secretaría Nacional de Planificación y Ministerio de Finanzas, con la finalidad de financiar el monto total de cada obra y proyecto;</p>	<p>Castillo Elizalde, Eddy Patricio</p>	<p>02/02/2023 - 08:54 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>así como, también es quien debe certificar la disponibilidad presupuestaria y tramitar ante dichas entidades la transferencia de recursos, transferencia que a la presente fecha no ha sido realizada, por tal razón, se ha solicitado el cambio de fase de EJECUCIÓN A CONGELADO, conforme el informe justificativo adjunto. (Anexo 24).</p>		
<p>DICIEMBRE 2022</p> <p>En este periodo se realizó seguimiento a la ejecución del "Proyecto de Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Física en las Zonas Afectadas por el Terremoto" con CUP: 123200000.0000.381243; estados de obra, estados de contratos de ejecución de obra y fiscalización de obra; así como, también el estado económico de cada uno de los contratos atados a dicho proyecto, que para un mejor detalle se anexan los siguientes informes ejecutivos:</p> <p>Informe Ejecutivo GPR Hospital de Chone Diciembre_2022 (Anexo 19) Informe Ejecutivo GPR Hospital de Bahía Diciembre 2022 (Anexo 20) Informe Ejecutivo GPR Hospital de Manta Diciembre 2022 (Anexo 21) Informe Ejecutivo GPR Hospital de Pedernales Diciembre 2022 (Anexo 22)</p> <p>Así mismo, me permito indicar que, en el mes de diciembre 2022 se realizó una ejecución presupuestaria en el proyecto por un valor de USD. 7.804.230,99 conforme se registra en la cédula presupuestaria (Anexo 23) de acuerdo con el siguiente detalle:</p> <p>Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de Manta</p> <p>Obra: Contrato principal: Planilla Nro. 28 USD. 1.943.265,77 Contrato principal: Planilla Nro. 29 USD. 1.290.151,05 Orden de Cambio Nro. 03: Planilla Nro. 06 USD. 12.407,26 Orden de Trabajo Nro. 01: Planilla Nro. 02 USD. 407.778,19 Contrato Complementario Nro. 02: Planilla Nro. 05 USD. 225.953,61 Contrato Complementario Nro. 03: Planilla Nro. 01 USD. 390.313,17</p> <p>Fiscalización: Contrato Principal: Planilla Nro. 10 USD. 64.568,23</p> <p>Hospital Básico Miguel Alcívar de Bahía</p> <p>Obra: Contrato principal: Planilla Nro. 25 USD. 647.441,62</p> <p>Fiscalización: Contrato principal: Planilla Nro. 23 USD. 32.201,32 Contrato principal: Planilla Nro. 24 USD. 25.640,53 Contrato Complementario Nro. 02: Planilla Nro. 09 USD. 8.168,38 Contrato Complementario Nro. 02: Planilla Nro. 10 USD. 10.408,80</p> <p>Hospital Básico de Pedernales</p> <p>Fiscalización: Contrato principal: Planilla Nro. 07 USD. 102.405,27 Contrato principal: Planilla Nro. 08 USD. 9.440,47</p> <p>Hospital Napoleón Dávila Córdova de Chone</p> <p>Obra: Contrato principal: Planilla Nro. 28 USD. 188.914,97 Contrato principal: Planilla Nro. 29 USD. 198.743,49 Contrato principal: Planilla Nro. 30 USD. 1.747.939,39</p> <p>Fiscalización: Contrato principal: Planilla Nro. 20 USD. 54.902,35 Contrato principal: Planilla Nro. 21 USD. 134.211,76 Contrato principal: Planilla Nro. 22 USD. 164.631,19 Contrato principal: Planilla Nro. 23 USD. 37.747,25 Contrato principal: Planilla Nro. 24 USD. 23.806,86 Contrato principal: Planilla Nro. 25 USD. 26.115,09 Contrato principal: Planilla Nro. 26 USD. 12.038,08 Contrato principal: Planilla Nro. 27 USD. 31.468,85</p>	<p>Castillo Elizalde, Eddy Patricio</p>	<p>04/01/2023 - 06:25 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización															
<p>Contrato principal: Planilla Nro. 28 USD. 6.612,02 Contrato principal: Planilla Nro. 29 USD. 6.956,02</p> <p>Total, presupuesto devengado diciembre 2022: USD. 7.804.230,99</p> <p>Es importante indicar que, para el mes de diciembre 2022 se tenía comprometido cumplir con el Hito 9 - EJECUCIÓN: Contratos de obra firmado; sin embargo, este ya se cumplió el 31 de octubre de 2022 conforme se evidencia en los archivos anexos.</p>																	
<p>NOVIEMBRE 2022</p> <p>En este periodo se realizó seguimiento a la ejecución del "Proyecto de Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Física en las Zonas Afectadas por el Terremoto" con CUP: 123200000.0000.381243; estados de obra, estados de contratos de ejecución de obra y fiscalización de obra; así como, también el estado económico de cada uno de los contratos atados a dicho proyecto, que para un mejor detalle se anexan los siguientes informes ejecutivos:</p> <p>Informe Ejecutivo GPR Hospital de Chone Noviembre_2022 (Anexo 14) Informe Ejecutivo GPR Hospital de Bahía Noviembre 2022 (Anexo 15) Informe Ejecutivo GPR Hospital de Manta Noviembre 2022 (Anexo 16) Informe Ejecutivo GPR Hospital de Pedernales Noviembre 2022 (Anexo 17)</p> <p>Así mismo, me permito indicar que, en el mes de noviembre 2022 se realizó una ejecución presupuestaria en el proyecto por un valor de USD. 559.411,47 conforme se registra en la cédula presupuestaria (Anexo 18) de acuerdo con el siguiente detalle:</p> <p>Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de Manta</p> <p>Obra:</p> <table border="0"> <tr> <td>Orden de Cambio Nro. 03:</td> <td>Planilla Nro. 04</td> <td>USD. 208.205,73</td> </tr> <tr> <td>Orden de Cambio Nro. 03:</td> <td>Planilla Nro. 05</td> <td>USD. 16.813,60</td> </tr> <tr> <td>Contrato Complementario Nro. 02:</td> <td>Planilla Nro. 03</td> <td>USD. 98.292,46</td> </tr> <tr> <td>Contrato Complementario Nro. 02:</td> <td>Planilla Nro. 04</td> <td>USD. 194.343,51</td> </tr> </table> <p>Fiscalización:</p> <table border="0"> <tr> <td>Contrato Principal:</td> <td>Planilla Nro. 09</td> <td>USD. 41.756,17</td> </tr> </table> <p>Total: USD. 559.411,47</p> <p>Por otro lado, se actualizó la fotografía de las obras atadas al proyecto de inversión, en donde se puede apreciar el estado actual de ejecución de las mismas.</p> <p>Es importante indicar que, para el mes de noviembre 2022 se tenía comprometido cumplir con el Hito 8 - EJECUCIÓN: Contratos de fiscalización firmado; sin embargo, este ya se cumplió el 31 de octubre de 2022 conforme se evidencia en los archivos anexos.</p>	Orden de Cambio Nro. 03:	Planilla Nro. 04	USD. 208.205,73	Orden de Cambio Nro. 03:	Planilla Nro. 05	USD. 16.813,60	Contrato Complementario Nro. 02:	Planilla Nro. 03	USD. 98.292,46	Contrato Complementario Nro. 02:	Planilla Nro. 04	USD. 194.343,51	Contrato Principal:	Planilla Nro. 09	USD. 41.756,17	<p>Castillo Elizalde, Eddy Patricio</p>	<p>02/12/2022 - 11:40 AM</p>
Orden de Cambio Nro. 03:	Planilla Nro. 04	USD. 208.205,73															
Orden de Cambio Nro. 03:	Planilla Nro. 05	USD. 16.813,60															
Contrato Complementario Nro. 02:	Planilla Nro. 03	USD. 98.292,46															
Contrato Complementario Nro. 02:	Planilla Nro. 04	USD. 194.343,51															
Contrato Principal:	Planilla Nro. 09	USD. 41.756,17															
<p>OCTUBRE 2022</p> <p>Mediante Memorando Nro. MTOP-DNPOP-2022-0592-ME de 26 de septiembre de 2022, la Dirección Nacional de Producción de Obras Públicas, solicitó a la Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas y a los analistas de seguimiento de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización de Obras Públicas, la información relacionada a contratos de varios proyectos de inversión entre los cuales los contratos de estudios, consultoría y fiscalización atados al "Proyecto de Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Física en las Zonas Afectadas por el Terremoto" con CUP: 123200000.0000.381243. (Anexo 9), requerimiento atendido mediante Memorandos Nro. MTOP-DNEOP-2022-2045-ME y Nro. MTOP-DNCFOP-2022-0476-ME de 04 y 19 de octubre de 2022; remitidos por la Directora Nacional de Estudios de Obras Públicas y analista de seguimiento de los contratos de fiscalización de obra de la provincia de Esmeraldas; respectivamente, señalando lo siguiente; en el primero "(" me permito informar que una vez analizada, la información de la que se dispone dentro de la Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas, y revisada la matriz de contratos de estudios no se encuentra proceso alguno vinculado al proyecto con Código K115 correspondiente "Reconstrucción y Rehabilitación De Infraestructura Física en las Zonas Afectadas por el Terremoto", y que tiene como número de CUP: 123200000.0000.381243"; y, en el segundo "ZONA 1: NO CUENTA CON CONTRATOS EN ESTE PROYECTO DE INVERSIÓN". Así mismo, mediante Memorando Nro. MTOP-DNCFOP-2022-0475-ME de 17 de octubre de 2022, el analista de seguimiento a cargo de los contratos de fiscalización de obra de la provincia de Manabí, remitió la documentación de contratos de fiscalización de obra en relación con el proyecto de inversión. (Anexo 10)</p>	<p>Castillo Elizalde, Eddy Patricio</p>	<p>31/10/2022 - 12:34 PM</p>															

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Mediante Memorando Nro. MTOP-DNPOP-2022-0626-ME de 07 de octubre de 2022, como Líder del Proyecto, se solicitó a la Subsecretarías de Obras; para que, a través de su intermedio se solicite a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica y/o Dirección de Planificación e Inversión del Ministerio de Salud Pública, los insumos básicos como son: Dictamen de Prioridad emitido por la Secretaría Nacional de Planificación, el documento del Proyecto aprobado por la Secretaría Nacional de Planificación y Guía de Marco Lógico del proyecto referido. (Anexo 11), requerimiento atendido mediante Memorando Nro. MTOP-DNPOP-2022-0638-ME de 17 de octubre de 2022, por el Director Nacional de Producción de Obras Públicas, el cual remitió en adjunto lo siguiente: "(") el Documento del "PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO" elaborado por la Subsecretaría Nacional de Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública, mismo que contiene el Marco Lógico correspondiente y de la misma manera el Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-0060-O de 13 de julio de 2022, referente al Dictamen favorable de Arrastre del proyecto de inversión en mención, emitido por la Secretaría Nacional de Planificación.". El dictamen favorable ya fue adjuntado en el (Anexo 7 y Anexo 8) los cuales ayudaron a solventar la fecha comprometida para el Problema 1 y Riesgo 1; y, el documento del Proyecto aprobado por la Secretaría Nacional de Planificación y Guía de Marco Lógico se adjunta en (Anexo 13)</p> <p>Conforme lo señalado en los párrafos que preceden, una vez que se ha recopilado la información se ha dado cumplimiento al HITO 5: EJECUCIÓN: Recopilación de información generada; así mismo, se ha dado cumplimiento a los siguientes hitos de acuerdo con el siguiente detalle:</p> <p>HITO 6: CIERRE: Terminaciones de Mutuo Acuerdo y Anticipada y Unilateral de Contrato HITO 7: EJECUCIÓN: Contratos de estudio firmado HITO 8: EJECUCIÓN: Contratos de fiscalización firmado HITO 9: EJECUCIÓN: Contratos de obra firmado</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2022</p> <p>Mediante Memorando Nro. MTOP-SOP-2022-1211-ME de 06 de septiembre de 2022, se realizó la designación como Líder de Proyecto, para actualización y registro de información en la ficha de Proyecto de Inversión K115 en la herramienta Gobierno por Resultados - GPR, relacionada al "Proyecto de Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Física en las Zonas Afectadas por el Terremoto". (Anexo 1).</p> <p>En consideración a la designación como Líder de Proyecto, se realizaron las siguientes actividades para cumplimiento del Hito 4 - "Solicitud de información generada", para el Proyecto de Inversión, de acuerdo con el siguiente detalle:</p> <p>. Mediante Memorando Nro. MTOP-DNPOP-2022-0580-ME de 20 de septiembre de 2022, se solicitó a la Dirección de Seguimiento de Planes Programas y Proyectos, capacitación en la herramienta de Gobierno por Resultados - GPR y remisión de insumos básicos necesaria para la actualización y registro de información en la Ficha de Proyecto de Inversión (Anexo 2), requerimiento que fue atendido por dicha dirección mediante Memorando Nro. MTOP-DSPPP-22-0216-ME de 21 de septiembre de 2022, indicando que la delegada para la capacitación es la Ing. Azucena del Rocío Suarez Procel, la cual fue efectuada el 22 de septiembre de 2022; así mismo, se manifestó que la información debe ser solicitada a las unidades administrativas correspondientes. (Anexo 3)</p> <p>. Mediante Memorando Nro. MTOP-DNPOP-2022-0582-ME de 21 de septiembre de 2022, sobre la base de lo manifestado por la Dirección de Seguimiento de Planes Programas y Proyectos, se solicitó a la Dirección de Planificación e Inversión y a la Dirección Financiera, los insumos básicos y cédulas presupuestarias, para registro y actualización de la ficha de Proyecto de Inversión (Anexo 4), requerimiento que fue atendido solamente por la Dirección Financiera, mediante Memorando Nro. MTOP-DF-2022-1698-ME de 23 de septiembre de 2022, entregando las cédulas presupuestarias por Subactividad e ITEM, documentación que sirvió de base para Editar Presupuesto y Perfil Económico (Anexo 5), con respecto a la entrega de insumos básicos: Dictamen de Prioridad emitido por la Secretaría Nacional de Planificación, el documento del proyecto por dicha secretaría y la Guía de Marco Lógico, estos no han sido atendidos por la Dirección de Planificación e Inversión, hasta la presente fecha.</p> <p>. Mediante Memorando Nro. MTOP-DNPOP-2022-0588-ME de 26 de septiembre de 2022, se solicito al Director Nacional de Producción de Obras Públicas, para que, por su intermedio se solicite a las Direcciones Nacionales de Estudios, Control y Fiscalización de Obras Públicas, conforme a sus competencia, se registre los contratos de estudios, consultoría y fiscalización atados al "Proyecto de Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Física en las Zonas</p>	<p>Castillo Elizalde, Eddy Patricio</p>	<p>05/10/2022 - 02:14 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Afectadas por el Terremoto" con CUP: 123200000.0000.381243; así como, se remita la documentación digital de respaldo como son contratos de estudios, consultoría y fiscalización, actas de entrega recepción, provisional, definitiva, presunta, terminaciones por mutuo acuerdo y anticipada y unilateral de contrato. (Anexo 6)		

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Convenio Interinstitucional suscrito	1-Solicitud de Información	03/08/2012		03/08/2012		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN: Recursos económicos asignados	1-Solicitud de Información	03/08/2012		03/08/2012		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN: Contrato LICO-SECOB-002-2019 suscrito	4-Inicio de Trabajo	14/06/2019		14/06/2019		Sí	20.0
4	EJECUCIÓN: Solicitud de información generada	5-Entregables Intermedios	26/09/2022		26/09/2022		Sí	15.0
5	EJECUCIÓN: Recopilación de información generada	5-Entregables Intermedios	28/10/2022		28/10/2022		Sí	15.0
6	CIERRE: Terminaciones de Mutuo Acuerdo y Anticipada y Unilateral de Contrato	9-Entregables Formales	31/10/2022		31/10/2022		Sí	2.0
7	EJECUCIÓN: Contratos de estudio firmado	5-Entregables Intermedios	31/10/2022		31/10/2022		Sí	4.0
8	EJECUCIÓN: Contratos de fiscalización firmado	5-Entregables Intermedios	30/11/2022		31/10/2022		Sí	7.0
9	EJECUCIÓN: Contratos de obra firmado	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/10/2022		Sí	7.0
10	CIERRE: Actas Entrega Recepción Provisional firmada	9-Entregables Formales	30/04/2023	31/07/2023			No	4.0
11	CIERRE: Actas Entrega Recepción Definitiva firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/10/2023	31/10/2023			No	4.0
12	CIERRE: Informe final de proyecto de inversión ejecutado	9-Entregables Formales	30/06/2024	30/06/2024			No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de informes de monitoreo y control de los procesos de ejecución de contratos de obras públicas conforme las cláusulas contractuales.	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/10/2022	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	46,261,942.49 **
Costo Total:	50,775,297.78
Total Devengado:	38,632,534.52
% Costo Total Devengado:	76.09 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 76.09 %

Perfil Económico 2023

	Años Previos	Año Actual (2023)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	39,404,463.66	14,983,729.57	0.00	54,388,193.23
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	50,775,297.78	0.00	0.00	50,775,297.78
Ppto. Codificado	39,404,463.66	14,983,729.57	0.00	54,388,193.23
Ppto. Comprometido	32,558,162.62	4,188,392.37	0.00	36,746,554.99
Planeado - Codificado (2023)		0.00		
Programado a Devengar	39,404,463.66	14,983,729.57	0.00	54,388,193.23
Ppto. Devengado	31,278,212.92	7,354,321.60	0.00	38,632,534.52
Pagado Real	31,278,212.92	6,245,719.03	0.00	37,523,931.95
Estimado a fin de año	* 31,278,212.92	14,983,729.57	0.00	46,261,942.49
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	8,126,250.74	0.00	0.00	8,126,250.74
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 79.38 %	49.08 %	0.00 %	71.03 %
Ppto. Codificado 998	12,560,710.52	4,462,826.51	0.00	17,023,537.03
Ppto. Devengado 998	12,005,450.50	817,858.49	0.00	12,823,308.99

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2023

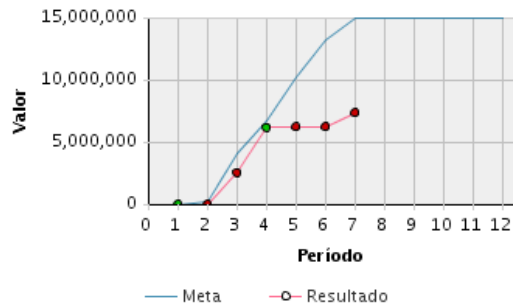

Presupuesto Mensual 2023

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2023							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	150,374.61	0.00	150,374.61	0.00	0.00 %		0.00 %
Mar	3,961,632.88	2,501,281.75	4,112,007.49	2,501,281.75	60.83 %		16.69 %
Abr	2,529,220.63	3,679,136.19	6,641,228.12	6,180,417.94	93.06 %		41.25 %
May	3,501,662.69	14,561.55	10,142,890.81	6,194,979.49	61.08 %		41.34 %
Jun	3,024,824.78	50,736.54	13,167,715.59	6,245,716.03	47.43 %		41.68 %
Jul	1,816,013.98	1,108,605.57	14,983,729.57	7,354,321.60	49.08 %		49.08 %
Ago	0.00		14,983,729.57				
Sep	0.00		14,983,729.57				
Oct	0.00		14,983,729.57				
Nov	0.00		14,983,729.57				
Dic	0.00		14,983,729.57				
Total	14,983,729.57	7,354,321.60					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar procesos de ejecución y entrega de obras de infraestructura pública a nivel nacional, MEDIANTE el desarrollo de herramientas de supervisión y control de proyectos de conformidad con la normativa legal vigente aplicable a los procesos de contratación de obra pública.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 - Hito 1 - Convenio Interinstitucional suscrito	convenio_interinstitucional_ico_ministerio_de_salud.pdf	08/09/2022
2	A.2 - Hito 2 - Recursos económicos asignados	2._dict._arrastre_-_oficio_nro._snp-spn-2021-0987-of.pdf	08/09/2022
3	A.3 - Hito 3 - Contrato LICO-SECOB-002-2019 suscrito	CONTRATO_No._LICO-SECOB-002-2019_(3).pdf	08/09/2022
4	A.4 - Anexo 1 - Designación líder de proyecto	MTOP-SOP-2022-1211-ME.pdf	08/09/2022
5	A.5 - Hito 4 - Solicitud de información generada	Hito_4_Solicitud_información_generada.pdf	28/09/2022
6	A.6 - Anexo 2 - Solicitud de capacitación en GPR, insumos básicos y cédulas presupuestarias para actualización y registro de Ficha de Proyecto de Inversión	MTOP-DNPOP-2022-0580-ME_20092022.pdf	28/09/2022
7	A.7 - Anexo 3 - Respuesta a solicitud de capacitación en GPR, insumos básicos y cédulas presupuestarias para actualización y registro de Ficha de Proyecto de Inversión	MTOP-DSPPP-22-0216-ME_21092022.pdf	28/09/2022
8	A.8 - Anexo 4 - Solicitud de insumos básicos y cédulas presupuestarias para actualización y registro de Ficha de Proyecto de Inversión	MTOP-DNPOP-2022-0582-ME_21092022.pdf	28/09/2022
9	A.9 - Anexo 5 - Respuesta a solicitud de insumos básicos y cédulas presupuestarias para actualización y registro de Ficha de Proyecto de Inversión	MTOP-DF-2022-1698-ME_23092022.pdf	28/09/2022
10	B.1 - Anexo 6 - Solicitud de contratos de estudios, consultoría y fiscalización atados al Proyecto de Inversión e información documental digital de respaldo	MTOP-DNPOP-2022-0588-ME_26092022.pdf	28/09/2022
11	B.2 - Anexo 7 - Problema 1 - Acción 1: Dictamen Favorable - Transferencia de Recursos - MSP - MTOP	Dictamen_Favorable_Transferencia_Recursos_MSP-MTOP.pdf	21/10/2022
12	B.3 - Anexo 8 - Riesgo 1 - Acción 1: Dictamen Favorable - Transferencia de Recursos - MSP - MTOP	Dictamen_Favorable_Transferencia_Recursos_MSP-MTOP.pdf	21/10/2022
13	B.4 - Anexo 9 - Solicitud de contratos de estudios, consultoría y fiscalización atados al Proyecto de	MTOP-DNPOP-2022-0592-ME_26092022.pdf	31/10/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	Inversión e información documental digital de respaldo realizado por la Dirección Nacional de Producción de Obras Públicas		
14	B.5 - Anexo 10 -Respuesta - Solicitud de contratos de estudios, consultoría y fiscalización atados al Proyecto de Inversión e información documental digital de respaldo realizado por la Dirección Nacional de Producción de Obras Públicas	Respuesta_solicitud_información_contratos_atados_al_proyecto_001102022r.pdf	31/10/2022
15	B.6 - Anexo 11 - Solicitud de insumos básicos como son: Dictamen de Prioridad emitido por la Secretaría Nacional de Planificación, el documento del Proyecto aprobado por la Secretaría Nacional de Planificación y Guía de Marco Lógico	MTOP-DNPOP-2022-0626-ME_07102022.pdf	31/10/2022
16	B.7 - Anexo 12 - Respuesta - Solicitud de insumos básicos como son: Dictamen de Prioridad emitido por la Secretaría Nacional de Planificación, el documento del Proyecto aprobado por la Secretaría Nacional de Planificación y Guía de Marco Lógico	MTOP-DNPOP-2022-0638-ME.pdf	31/10/2022
17	B.8 - Anexo 13 - Documento del Proyecto aprobado por la Secretaría Nacional de Planificación y Guía de Marco Lógico	proyecto_de_reconstrucción0808683001666029828.pdf	31/10/2022
18	B.9 - Hito 6 - Terminaciones de Mutuo Acuerdo y Anticipada y Unilateral de Contrato	Terminaciones_de_Mutuo_Acuerdo_y_Anticipada_y_Unilateral_01102022rato.pdf	31/10/2022
19	C.1 - Hito 7 - Contratos de estudio firmado	MTOP-DNEOP-2022-2045-ME.pdf	31/10/2022
20	C.2 - Hito 8 - Contratos de fiscalización firmado	Contratos_de_fiscalización_firmado.pdf	31/10/2022
21	C.3 - Hito 9.1 - Contratos de fiscalización firmado	01.0_Hospital_Chone_C.O._RE-SECOB-049-2017.pdf	31/10/2022
22	C.4 - Hito 9.2 - Contratos de fiscalización firmado	01.0_Hospital_Manta_C.O._LICO-SECOB-002-2019.pdf	31/10/2022
23	C.5 - Hito 9.3 - Contratos de fiscalización firmado	01.0_Hospital_Pedernales_I_II_III_compressed.pdf	31/10/2022
24	C.6 - Hito 9.4 - Contratos de fiscalización firmado	01.0_Hospital_Bahía_C.O._LICO-SECOB-003-2019.pdf	31/10/2022
25	C.7 - Anexo 14 - Riesgo 1 - Acción 2: Informe Ejecutivo GPR Hospital de Chone Noviembre 2022	Informe_Ejecutivo_GPR_Hospital_Chone_Noviembre_2022-signed-signed.pdf	02/12/2022
26	C.8 - Anexo 15 - Informe Ejecutivo GPR Hospital de Bahía Noviembre 2022	Informe_Ejecutivo_GPR_Hospital_Bahía_Noviembre_2022-signed-signed.pdf	02/12/2022
27	C.9 - Anexo 16 - Informe Ejecutivo GPR Hospital de Manta Noviembre 2022	Informe_Ejecutivo_GPR_Hospital_Manta_Noviembre_2022-signed-signed.pdf	02/12/2022
28	D.1 - Anexo 17 - Informe Ejecutivo GPR Hospital de Pedernales Noviembre 2022	Informe_Ejecutivo_GPR_Hospital_Pedernales_Noviembre_2022-signed-signed.pdf	02/12/2022
29	D.2 - Anexo 18 - Cedula presupuestario mes de noviembre 2022	Proyecto_Terremoto_-_Noviembre.pdf	02/12/2022
30	D.3 - Anexo 19 - Informe Ejecutivo GPR Hospital de Chone Diciembre 2022	Informe_Ejecutivo_GPR_Hospital_Chone_Diciembre_2022-signed-signed.pdf	04/01/2023
31	D.4 - Anexo 20 - Informe Ejecutivo GPR Hospital de Bahía Diciembre 2022	Informe_Ejecutivo_GPR_Hospital_Bahía_Diciembre_2022-signed-signed.pdf	04/01/2023
32	D.5 - Anexo 21 - Informe Ejecutivo GPR Hospital de Manta Diciembre 2022	Informe_Ejecutivo_GPR_Hospital_Manta_Diciembre_2022-signed-signed.pdf	04/01/2023
33	D.6 - Anexo 22 - Informe Ejecutivo GPR Hospital de Pedernales Diciembre 2022	Informe_Ejecutivo_GPR_Hospital_Pedernales_Diciembre_2022-signed-signed.pdf	04/01/2023
34	D.7 - Anexo 23 - Cedula presupuestario mes de diciembre 2022	Proyecto_Terremoto_-_Diciembre.pdf	04/01/2023
35	D.8 - Anexo 24 - Informe Justificativo para cambio de fase de Ficha GPR de EJECUCIÓN A CONGELADO	Informe_Técnico_Cambio_Fase_Proyecto_Reconstrucción-signed-signed.pdf	31/01/2023
36	D.9 - Anexo 25 - Dictamen de Inclusión al PAI SNP	SNP-SGP-SPN-2023-0118-OF.pdf	03/04/2023
37	Designación de Líder	MTOP-SOP-2023-0486-ME_(1).pdf	21/06/2023
38	E.1 - Anexo 26 - Solicitud de cambio de estado	MTOP-SOP-2023-0313-ME.pdf	14/04/2023
39	E.2 - Anexo 27 - Convocatoria recorrido Hospital de Bahía de Caráquez para Recepción Definitiva	MTOP-DDM-Z4-2023-148-OF.pdf	05/05/2023
40	E.3 - Anexo 28 - Cédula Presupuestaria Abril 2023	381243.pdf	05/05/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
41	E.4 - Anexo 29 - Cédula Presupuestaria Mayo 2023	Terremoto_Ex_Secob_Mayo-mayo_2023.pdf	05/06/2023
42	E.5 - Anexo 30 - Cédula Presupuestaria Junio 2023	123200000.0000.381243_Solo_Junio_2023_vf(1).pdf	04/07/2023
43	E.6 - Anexo 31 - Cédula Presupuestaria Julio 2023	123200000.0000.381243_julio_2023(1).pdf	01/08/2023
44	E.7 - Anexo 32 - Acta de Recepción Provisional de Hospital Pedernales	ACTA_DE_RECEPCION_PROVISIONAL_PEDERNALES2_firmado signed-signed-signed-signed-signed.pdf	01/08/2023

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Castillo Elizalde, Eddy Patricio	Líder del Proyecto	Analista de Seguridad Vial 2	ecastillo@mtop.gob.ec	
Prado Leverone, Juan Carlos	Titular	Director Nacional de Producción de Obras Públicas	jprado@mtop.gob.ec	
Santamaría Loor, Kiura Ninoska	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretaria de Obras Públicas	ksantamaria@mtop.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
150611_1.jpg	24/11/2022
