

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 6
Dirección Provincial Cañar

PROYECTO: K020 MTOP-Reconstrucción Vía Rápida Cuenca-Azogues-Biblián, incluido ampliación Tramo El Descanso-Azogues-Biblián

Líder del Proyecto:	Soto Romero, José Gerardo (jsoto@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Quezada Jara, Mónica Fabiola	Programas Relacionados:	Provincia - Azuay, Provincia - Cañar, RECONSTRUCCIONVIA RAPIDA CUENCA- AZOGUES-BIBLIAN INCLUIDO AMPLIACION TRAMOEL DESCANSO- AZOGUES-BIBLIAN, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	104,225,734.57
CUP:	175200000.000.0.374212	TIR:	15.99 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	104,225,734.57
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	136,285,047.60
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/08/2013 - 31/12/2022
Fecha de última actualización:	04/05/2018	Fecha de Fin Base:	30/04/2019
Modificado por:	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	Fecha del siguiente Hito:	30/06/2018

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCION:

en el contrato consta como: Reconstruccion Vía Rapida Cuenca-Azogues-Biblian, incluido ampliacion del Tramo Descanso-Azogues

Este proyecto comprende la Reconstruccion de la via Rapida Cuenca-Azogues-Biblian de 42 Km de longitud, tambien esta incluido la ampliacion de la Vía en el Tramo Descanso-Azogues.

PROPOSITO: Permitir un mayor y mejor desarrollo socio - económico de las poblaciones involucradas al contar con una vía que permite mejorar la capacidad de circulación vehicular, imagen y seguridad, de la población.

LINEA BASE:

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda (2010) realizado por el INEC, el total de la población de la zona de estudio es de 596466 habitantes de los cuales 280778 son hombres que representa el 47,07 %; y 315688 son mujeres que representa el 52,92 de la población, de igual manera el 61,9% está en el área urbana y el 38,09 en el área rural.

Étnicamente la zona de influencia cuenta con un predominio de población mestiza, pues existen 536454 habitantes auto identificados como tales y representan el 89,93%, estos por lo general hablan el idioma español popular. En pocos de ellos se puede evidenciar también que tienen un grado de comprensión quichua, inclusive muchas personas de la tercera edad llevan un grado de bilingüismo funcional a nivel oral, luego está la población auto identificada como blanca con 32327 personas que representa el 5,41% con características castellano hablantes, con un porcentaje menor pero significativo están los indígenas y los afroecuatorianos.

De conformidad con los datos del INEC del censo de 2010 apreciamos que en el área de estudio existe un predominio de edad de los grupos comprendidos entre los 0 y 24 años, lo que deja ver que existe una población joven, esto debido básicamente a que la población de adultos ha salido del país y ha dejado a sus hijos bajo el cuidado de algún familiar.

OBJETIVO GENERAL:

Proveer de una vía de comunicación y transporte eficiente y segura para los habitantes del sector y usuarios en general.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:


DATOS GENERALES

Descripción	
1.1 OBRA BÁSICA y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA 1.2 TRANSPORTE DE MATERIALES 1.3 CALZADA REALIZADA 1.4 OBRAS DE SOSTENIMIENTO Y ESTABILIDAD EFECTUADOS 1.5 OBRAS ESPECIALES - PUENTES CONSTRUIDAS 1.6 DRENAJE REALIZADO 1.7 SEÑALIZACIÓN DE LA VIA TERMINADA 1.8 OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL REALIZADAS	
MONTO CONTRACTUAL : 72`167.266,52	
CONTRATO COMPLEMENTARIO : 2`891.870,94	
ORDEN DE CAMBIO 1:	15`290.951,47
COSTO + %:	2`708.602,65
IVA 12%	11`167.042,98
MONTO TOTAL =	104`225.734,57
CONTRATISTA: HIDALGO & HIDALGO	
Beneficios Cualitativos	
Mejorar el nivel de servicio de la vía. Incrementar la seguridad en la vía. Reducir los costos de transporte.	
Tipo de Beneficiario	
Sectores: Industrial, agropecuario, comercial, turístico.	
Restricciones	
Tiempo: la fecha de termino contractual para la Construcción es el 22 de Octubre de 2017 y el mantenimiento se realizará por 4 años. Costo: El valor de la Construcción y mantenimiento de la vía es de 107.953.507,45 Alcance: Se espera contar con una vía de 6 carriles y parterre central en una longitud de 43.6 km y a nivel de pavimento flexible. Recursos: Equipo Caminera para obras civiles y personal calificado de la Empresa Hidalgo e Hidalgo S. A, los mismos que serán controlados mediante ensayos realizados con equipo de laboratorio de suelos, y personal especializado del Consorcio Austrovías. Los materiales se extraen del cerro tamuga y de la Mina Cochancay 1, 2 y 3.	

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 51.31 %
 Fecha de Inicio: 01/08/2013 Fecha de Fin: 31/12/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Año	Porcentaje de Avance											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	78 %	83 %	83 %	86 %	89 %	89 %	89 %	89 %	89 %	89 %	89 %	89 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2018</p> <p>Con fecha 23 de abril de 2018, se firma el acta de levantamiento de Suspensión de Plazo Temporal del contrato "Reconstrucción de la vía rápida: Cuenca - Azogues - Biblián" con la cual se resuelve reanudar los trabajos del proyecto indicado. Además se ha firmado un nuevo contrato complementario para la terminación del contrato.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	04/05/2018 - 12:38 PM
<p>MARZO 2018</p> <p>El proyecto se encuentra suspendido desde el 16 de febrero de 2018, se encuentra en trámite la aprobación del AVAL para la obtención de recursos para el nuevo contrato complementario.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/04/2018 - 12:23 PM
<p>FEBRERO 2018</p> <p>El proyecto se encuentra suspendido desde el 16 de febrero de 2018, previo a la fecha de suspensión se realizó la colocación de carpeta asfáltica en los caminos de acceso, construcción del puente Ayancay, y pasos peatonales.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	23/03/2018 - 10:14 AM
<p>ENERO 2018</p> <p>El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista HIDALGO E HIDALGO, se interviene en la construcción del puente Ayancay, colocación de carpeta asfáltica en el distribuidor del Valle y construcción de pasos peatonales. El proyecto no ha sido incluido en el PAI 2018, se ha solicitado un contrato complementario Nro. 3, el mismo que ésta en trámite para su aprobación.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	23/03/2018 - 10:12 AM
<p>DICIEMBRE 2017</p> <p>El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista HIDALGO E HIDALGO, se interviene en la colocación de guardavías, hormigón lanzado para estabilización de taludes, construcción del puente Ayancay, colocación de carpeta asfáltica en el distribuidor del Valle y construcción de pasos peatonales. Se ha solicitado un contrato complementario Nro. 3, el mismo que ésta en trámite para su aprobación.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/01/2018 - 04:26 PM
<p>NOVIEMBRE 2017</p> <p>El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista HIDALGO E HIDALGO, se interviene en la colocación de guardavías, hormigón lanzado para estabilización de taludes, construcción del puente Ayancay, colocación de carpeta asfáltica en el distribuidor del Valle y construcción de pasos peatonales. Se ha solicitado un contrato complementario Nro. 3, el mismo que cuenta con el AVAL respectivo y ésta en trámite para su aprobación.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/12/2017 - 03:28 PM
<p>OCTUBRE 2017</p> <p>Mediante reunión de la Comisión Especial 451 se amplía el plazo en 120 días a partir del 28 de octubre de 2017 para la construcción del puente Ayancay, para terminar la obra del Contrato complementario 2 que se retrasó debido a la terminación del convenio de la extracción de materiales del cerro Tamuga, restricciones de libre circulación por deslizamientos del cerro Tahaal.</p> <p>El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista HIDALGO E HIDALGO, se interviene en la colocación de guardavías, fundición de cunetas, y hormigón lanzado para estabilización de taludes, construcción de zapatas izquierda y derecha puente Ayancay, y construcción de pasos peatonales.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	01/11/2017 - 08:39 PM
<p>SEPTIEMBRE 2017</p> <p>Mediante reunión de la Comisión Especial 451 se amplía el plazo en 120 días a partir del 28 de octubre de 2017 para la construcción del puente Ayancay, para terminar la obra del Contrato complementario 2 que se retrasó debido a la terminación del convenio de la extracción de materiales del cerro Tamuga, restricciones de libre circulación por deslizamientos del cerro Tahaal.</p> <p>El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista HIDALGO E HIDALGO, se interviene en la colocación de guardavías, fundición de cunetas, y hormigón lanzado para estabilización de taludes, construcción de zapatas izquierda y derecha puente Ayancay, y construcción de pasos peatonales.</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	01/11/2017 - 10:33 AM
<p>SEPTIEMBRE 2017</p> <p>Mediante reunión de la Comisión Especial 451 se amplía el plazo en 120 días a partir del 28 de octubre de 2017 para la construcción del puente Ayancay, para terminar la obra del Contrato</p>	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/10/2017 - 12:17 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>complementario 2 que se retraso debido a la terminación del convenio de la extracción de materiales del cerro Tamuga, restricciones de libre circulación por deslizamientos del cerro Tahaal.</p> <p>El proyecto se encuentra en ejecucion a cargo de la compania contratista HIDALGO E HIDALGO, se interviene en la colocación de guardavías, fundición de cunetas, y hormigón lanzado para estabilización de taludes, y conformación de cajera del intercambiador del Valle, construcción de pasos peatonales.</p>		
<p>AGOSTO 2017</p> <p>El proyecto se encuentra en ejecucion a cargo de la compania contratista HIDALGO E HIDALGO, Los trabajos avanzan con normalidad</p> <p>Se interviene en la conformación de la estructura de pavimento en cajeras, tendido de base y carpeta asfáltica en ampliación de la calzada, fundición de beredas, además se realiza señalización horizontal y construcción de los pasos peatonales.</p>	<p>Chaca Álvarez, Ivan Patricio</p>	<p>05/09/2017 - 05:39 PM</p>
<p>JULIO 2017</p> <p>El proyecto se encuentra en ejecucion a cargo de la compania contratista HIDALGO E HIDALGO, Los trabajos avanzan con normalidad</p> <p>Se interviene en la estabilización del tramo Turi Chico y Turi Totoras; Conformación de la estructura de pavimento en cajeras, tendido de base y carpeta asfáltica en ampliación de la calzada, además se realiza señalización horizontal y construcción de los pasos peatonales. Los trabajos se estan ejecutando dentro del cronograma valorado.</p>	<p>García González, Mariana Alexandra</p>	<p>05/08/2017 - 08:42 AM</p>
<p>JUNIO 2017</p> <p>El proyecto se encuentra en ejecucion a cargo de la compania contratista HIDALGO E HIDALGO, Los trabajos avanzan con normalidad</p> <p>Se interviene en la estabilización del tramo Turi Chico y Turi Totoras; Colocación de Hormigón lanzado en el km 10+800-11+200; En el tramo 2 se ejecutar rubros de fresado, colocación de base asfáltica y carpeta asfáltica y señalización horizontal y construcción de los pasos peatonales. Los trabajos se estan ejecutando dentro del cronograma valorado.</p>	<p>García González, Mariana Alexandra</p>	<p>04/07/2017 - 03:28 PM</p>
<p>MAYO 2017</p> <p>El proyecto se encuentra en ejecucion a cargo de la compania contratista, Los trabajos avanzan con normalidad</p> <p>Se interviene en el sitio crítico turi Chico, se coloca material de base y carpeta asfáltica en el Tramo 2 del proyecto, se realizan trabajos de señalización horizontal en el tramo 2, construcción de pasos peatonales. Los trabajos se estan ejecutando dentro del cronograma valorado.</p>	<p>Guillen Luna, Andrés Ismael</p>	<p>01/06/2017 - 11:14 AM</p>
<p>ABRIL 2017</p> <p>El proyecto se encuentra en ejecucion a cargo de la compania contratista, Los trabajos avanzan con normalidad</p> <p>Se interviene en el sitio crítico turi Chico, se coloca material de base y carpeta asfáltica en el Tramo 2 del proyecto, se realizan trabajos de señalización horizontal en el tramo 2, construcción de pasos peatonales. Los trabajos se estan ejecutando dentro del cronograma valorado.</p>	<p>García González, Mariana Alexandra</p>	<p>05/05/2017 - 12:05 PM</p>
<p>MARZO 2017</p> <p>El proyecto se encuentra en ejecucion a cargo de la compania contratista, Los trabajos avanzan con normalidad</p> <p>Se encuantrantendiendo carpeta asfaltica en el tramo II, señalizacion vertical en el tramo II</p> <p>Los trabajos se estan ejecutando dentro del cronograma valorado</p> <p>Esperando la aprobación para que se legalice el acto administrativo.</p>	<p>Guillen Luna, Andrés Ismael</p>	<p>04/04/2017 - 12:13 PM</p>
<p>FEBRERO 2017</p> <p>El proyecto se encuentra en ejecucion a cargo de la compania contratista, Los trabajos avanzan con normalidad</p> <p>Se encuantrantendiendo carpeta asfaltica en el tramo II</p> <p>Los trabajos se estan ejecutando dentro del cronograma valorado</p> <p>Esperando la aprobación para que se legalice el acto administrativo.</p>	<p>Guillen Luna, Andrés Ismael</p>	<p>03/03/2017 - 12:19 PM</p>
<p>ENERO 2017</p> <p>El proyecto se encuentra en ejecucion a cargo de la compania contratista</p>	<p>Guillen Luna, Andrés Ismael</p>	<p>03/02/2017 - 11:31 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>los trabajos se reiniciaron desde el mes de agosto Se encuentran realizando carpeta asfáltica en quimandel en el km 2+300 del tramo III Los trabajos se están ejecutando dentro del cronograma valorado Esperando la aprobación para que se legalice el acto administrativo.</p>		
<p>DICIEMBRE 2016</p> <p>El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista los trabajos se reiniciaron desde el mes de agosto Se encuentran realizando trabajos de estabilización en la falla de quimandel en el km 2+300 del tramo III Los trabajos se están ejecutando dentro del cronograma valorado Esperando la aprobación para que se legalice el acto administrativo.</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/01/2017 - 06:58 PM
<p>NOVIEMBRE 2016</p> <p>El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista los trabajos se reiniciaron desde el mes de agosto Se encuentran realizando trabajos de estabilización en la falla de quimandel en el km 2+300 del tramo III Los trabajos se están ejecutando dentro del cronograma valorado Esperando la aprobación para que se legalice el acto administrativo.</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/12/2016 - 02:20 PM
<p>OCTUBRE 2016</p> <p>El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista los trabajos se reiniciaron desde el mes de agosto</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/11/2016 - 06:13 PM
<p>SEPTIEMBRE 2016</p> <p>El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista los trabajos se reiniciaron desde el mes de agosto</p>	Guillen Luna, Andrés Ismael	04/10/2016 - 07:33 PM
<p>AGOSTO 2016 :</p> <p>El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista los trabajos se reiniciaron desde el mes de agosto</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/09/2016 - 06:54 PM
<p>JULIO 2016:</p> <p>La obra se encuentra suspendida desde el 1 de enero del 2016.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/08/2016 - 01:47 PM
<p>JUNIO 2016:</p> <p>La obra se encuentra suspendida desde el 1 de enero del 2016.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/07/2016 - 12:25 PM
<p>MAYO 2016:</p> <p>La obra se encuentra suspendida desde el 1 de enero por falta de recursos económicos. la compañía está realizando el mantenimiento de la vía, con la limpieza de derrumbes.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/06/2016 - 07:41 PM
<p>ABRIL 2016:</p> <p>La obra se encuentra suspendida desde el 1 de enero por falta de recursos económicos. la compañía está realizando el mantenimiento de la vía.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	02/05/2016 - 03:17 PM
<p>MARZO 2016:</p> <p>La obra se encuentra suspendida desde el 1 de enero por falta de recursos económicos. la compañía está realizando el mantenimiento de la vía.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/04/2016 - 08:50 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>FEBRERO 2016:</p> <p>La obra se encuentra suspendida desde el 1 de enero por falta de recursos economicos. la compañía esta realizando el mantenimiento de la via.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/03/2016 - 05:10 PM
<p>ENERO 2016:</p> <p>La obra se encuentra suspendida desde el 1 de enero por falta de recursos economicos. la compañía esta realizando el mantenimiento de la via.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	11/02/2016 - 08:53 PM
<p>DICIEMBRE 2015:</p> <p>Se continua construyendo cunetas y bordillos en el tramo 2, del Km 22+000 al 34+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/01/2016 - 07:27 AM
<p>NOVIEMBRE 2015:</p> <p>Se continua construyendo cunetas y bordillos en el tramo 2, del Km 22+000 al 34+000. y la construccion de los redondeles en el tramo 2.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/12/2015 - 10:13 AM
<p>OCTUBRE 2015:</p> <p>Se esta construyendo cunetas y bordillos en el tramo 2, del Km 22+000 al 34+000. y continua la construccion de los redondeles en el tramo 2.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/11/2015 - 10:14 PM
<p>SEPTIEMBRE 2015</p> <p>Se esta construyendo cunetas y bordillos del Km 22+000 al 34+000. y continua la construccion de los redondeles en estas abscisas.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/10/2015 - 04:15 PM
<p>AGOSTO 2015</p> <p>Se estan realizando trabajos de estabilizacion del sitio critico en el sector del Guzho Km 1+000.</p> <p>Se esta construyendo cunetas y bordillos del Km 22+000 al 34+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/09/2015 - 11:49 AM
<p>JULIO 2015</p> <p>Se continua con la estabilizacion del sitio critico en el sector del Guzho Km 1+000.</p> <p>En el Km 4+3000 se esta tendiendo asfalto.</p> <p>Se esta construyendo cunetas y bordillos del Km 22+000 al 34+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/08/2015 - 01:58 PM
<p>JUNIO 2015</p> <p>Se continua con el tendido de carpeta asfaltica en las abscisas 20 + 000 a 35 + 000. Construccion de bordillos entre las abscisas entre 20+000 a 30+000. Estabilizacion del talud en el sector de Molinohuico.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/07/2015 - 03:31 PM
<p>MAYO 2015</p> <p>Tendido de carpeta asfaltica en las abscisas 20 + 000 a 35 + 000. Construccion de bordillos entre las abscisas entre 20+000 a 30+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	08/06/2015 - 01:45 PM
<p>ABRIL 22 DEL 2015</p> <p>Tendido de carpeta asfaltica en las abscisas 8+000 a 9+000, 20 + 000 a 35 + 000. Construccion de aceras en las abscisas 1+700 a 1 + 900. Construccion de bordillos entre las abscisas 4+000 a 5+000, y entre 20+000 a 30+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	22/05/2015 - 11:21 AM
<p>ABRIL 2015</p> <p>Se continua realizando la estructura de la via desde el Km 22+000 al 34+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/05/2015 - 02:59 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2015</p> <p>Se continua realizando la estructura de la via desde el Km 22+000 al 34+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/04/2015 - 03:27 PM
<p>FEBRERO 2015</p> <p>Se continua realizando el movimiento de tierras y realizando la estructura de la via desde el Km 22+000 al 34+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	09/03/2015 - 09:32 AM
<p>ENERO 2015</p> <p>Se esta realizando el movimiento de tierras y realizando la estructura de la via desde el Km 22+000 al 34+000. Se termino la construcción de los puentes.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/02/2015 - 03:08 PM
<p>DICIEMBRE 2014</p> <p>Se esta terminando la estabilización de taludes en el Km 5+000 al 20+000 Tambien se continua con la colocacion de estructura de la via en la ampliacion en el Km 25+000 al Km 38+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/01/2015 - 11:10 AM
<p>NOVIEMBRE 2014</p> <p>Se continua con la estabilización de taludes en el Km 5+000 al 20+000 Tambien se continua con la colocacion de estructura de la via en la ampliacion en el Km 25+000 al Km 38+000</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/12/2014 - 03:04 PM
<p>OCTUBRE 2014</p> <p>Se continua con la estabilización de taludes. Tambien se continua con la colocacion de estructura de la via en la ampliacion en el Km 25+000 al Km 38+000-</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	10/11/2014 - 08:58 AM
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>Se continua realizando la estabilizacion de Taludes a lo largo de la via se esta comenzando a colocar asfalto en la ampliacion entre el Km 22+000 al 30+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/10/2014 - 12:15 PM
<p>AGOSTO 2014</p> <p>Se continua realizando la estabilizacion de Taludes a lo largo de la via se aprobo la orden de trabajo para la reubicacion de las lineas de subtrasmisión y distribución del tramo 2.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/09/2014 - 08:29 PM
<p>JULIO 2014</p> <p>Se continua realizando la estabilizacion del Talud desde el Km 13+320 hasta el 13+750 Se esta realizando la estabilizacion de los taludes del Km 30+000 al 40+000. Se esta colocando carpeta asfaltica desde la ciudad de Biblian a la ciudad de Azogues.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/08/2014 - 10:20 PM
<p>JUNIO 2014</p> <p>Se continua realizando la estabilizacion del Talud desde el Km 13+320 hasta el 13+750 Se esta realizando la estabilizacion de los taludes del Km 30+000 al 40+000. Continua el fresado de pavimento existente desde el Km 40+000 hasta el 44+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	10/07/2014 - 07:49 AM
<p>MAYO 2014</p> <p>Se continua realizando la estabilizacion del Talud desde el Km 13+320 hasta el 13+750 Excavacion de cajoneras para conformacion de obra basica desde el Km 20+000 al 35+000 Continua el fresado de pavimento existente desde el Km 40+000 hasta el 44+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/06/2014 - 04:23 PM
<p>ABRIL 2014</p> <p>Se esta realizando la estabilizacion del Talud desde el Km 13+320 hasta el 13+750 Excavacion de cajoneras para conformacion de obra basica desde el Km 20+000 al 35+000 Fresado de pavimento existente desde el Km 40+000 hasta el 44+000.</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/05/2014 - 02:52 PM
<p>MARZO 2014</p>	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/04/2014 - 10:52 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se esta terminando el movimiento de tierras entre la Ciudad de Azogues y el Descanso Se esta realizando la estabilizacion del talud antre el km 13+320 hasta el Km 13+750.		
FEBRERO 2014 En el tramo 1(El Salado-Guanguarcucho), se continua con la colocacion de la capa de nivelacion, construccion de subdrenes, estabilizacion de taludes, movimiento de tierras para completar el ancho de via; los trabajos se ejecutan de manera normal. En el tramo 2 (Guanguarcucho-Azogues), se continua con el movimiento de tierras, construccion de subdrenes,ampliacion de puente sobre los rios Cuenca y Deleg, asi como la ampliacion del puente en el distribuidor No 2(acceso al nuevo terminal terrestre Azogues). En el tramo 3 (Azogues-Biblian), construccion de subdrenes en el lado izquierdo de la via Rapida.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/03/2014 - 10:39 AM
ENERO 2014 En el tramo 1(El Salado-Guanguarcucho), se continua con la colocacion de la capa de nivelacion, construccion de subdrenes, estabilizacion de taludes, movimiento de tierras para completar el ancho de via; los trabajos se ejecutan de manera normal. En el tramo 2 (Guanguarcucho-Azogues), se continua con el movimiento de tierras, construccion de subdrenes,ampliacion de puente sobre los rios Cuenca y Deleg, asi como la ampliacion del puente en el distribuidor No 2(acceso al nuevo terminal terrestre Azogues). En el tramo 3 (Azogues-Biblian), construccion de subdrenes en el lado izquierdo de la via Rapida. Ademas, se encuentra en tramite el libre aprovechamiento de las minas Biblicay y Curiurcu.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/02/2014 - 02:31 PM
DICIEMBRE 2013 Se continua con la colocacion de la capa de nivelacion, construccion de subdrenes, estabilizacion de taludes, movimiento de tierras para completar el ancho de via; los trabajos se ejecutan de manera normal. Se encuentra en tramite el libre aprovechamiento de las minas Biblicay y Curiurcu.	Calle Bravo, Oscar Leonardo	06/01/2014 - 01:11 PM
NOVIEMBRE 2013 Se esta colocando la capa de nivelacion, construccion de subdrenes, estabilizacion de taludes, movimiento de tierras para completar el ancho de via; los trabajos se ejecutan de manera normal. Se encuentra en tramite el libre aprovechamiento de las minas Bibircay y Curiurcu.	Calle Bravo, Oscar Leonardo	06/12/2013 - 09:03 AM
OCTUBRE 2013: Se esta colocando la capa de nivelacion, construccion de subdrenes, estabilizacion de taludes, movimiento de tierras para completar el ancho de via; los trabajos se ejecutan de manera normal.	Calle Bravo, Oscar Leonardo	19/11/2013 - 01:43 PM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Tiempo. Demora en las expropiaciones de terrenos CAUSARIA retraso en la obra	04/05/2018	Ivan Patricio Chaca Álvarez	30 %	30	9	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Azuay > Cuenca
2	Zona 6 - Austro > Cañar > Azogues

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
3	Zona 6 - Austro > Cañar > Biblian

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACION: Firma del contrato realizada.	3-Adjudicación	01/08/2013		01/08/2013		Sí	2.0
2	PLANEACION: Entrega del anticipo efectuado.	9-Entregables Formales	30/09/2013		30/09/2013		Sí	2.0
3	EJECUCION: Obras preliminares en un 50%, realizadas	5-Entregables Intermedios	30/12/2013		30/12/2013		Sí	4.0
4	EJECUCION: Estabilizacion de Taludes en un 50%, realizadas	5-Entregables Intermedios	30/03/2014		15/05/2014		Sí	4.0
5	EJECUCION: Movimiento de Tierras en un 30%, realizado	5-Entregables Intermedios	30/03/2014		07/03/2014		Sí	4.0
6	EJECUCION: Muros de Suelo Armado y Gaviones en un 50%, realizados	5-Entregables Intermedios	30/03/2014		29/08/2014		Sí	5.0
7	EJECUCION: Obras preliminares en un 100%, concluida	5-Entregables Intermedios	30/03/2014		30/03/2014		Sí	4.0
8	EJECUCION: Puentes en un 75%, realizados	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		29/08/2014		Sí	8.0
9	EJECUCION: Estabilizacion de Taludes en un 50%, realizado	5-Entregables Intermedios	19/09/2014		19/09/2014		Sí	2.0
10	EJECUCION: Muros de Suelo Armado y Gaviones en un 75%, realizados	5-Entregables Intermedios	20/10/2014		20/10/2014		Sí	2.0
11	EJECUCION: Pavimento flexible en un 50%, realizado	5-Entregables Intermedios	20/10/2014		20/10/2014		Sí	8.0
12	EJECUCION: Estructura de pavimento existente en un 50%, realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	4.0
13	EJECUCION: Movimiento de Tierras realizado en un 60%, realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	4.0
14	EJECUCION: Muros de Suelo Armado y Gaviones en un 100%, realizados	5-Entregables Intermedios	20/01/2015		20/02/2015		Sí	2.0
15	EJECUCION: Movimiento de Tierras en un 100%, realizado	5-Entregables Intermedios	25/02/2015		25/02/2015		Sí	4.0
16	EJECUCION: Puentes en un 100%, realizados	5-Entregables Intermedios	20/04/2015	30/06/2018			No	4.0
17	EJECUCION: Señalización en un 25%, realizada	5-Entregables Intermedios	29/06/2015		29/06/2015		Sí	1.0
18	EJECUCION: Estructura de pavimento existente en un 75%, realizado	5-Entregables Intermedios	29/07/2015		29/07/2015		Sí	2.0
19	EJECUCION: Estructura del pavimento realizado en un 100% en el tramo 1 , el Salado el descanso realizado	5-Entregables Intermedios	04/08/2015		04/08/2015		Sí	2.0
20	EJECUCION: Estructura del pavimento realizado en un 100% en el tramo 3 , Azogues - Biblian realizado	5-Entregables Intermedios	04/08/2015		04/08/2015		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
21	EJECUCION: Señalización en un 50%, realizada	5-Entregables Intermedios	29/09/2015		29/09/2015		Sí	1.0
22	EJECUCION: Señalización en un 75%, realizada	5-Entregables Intermedios	29/12/2015		30/03/2017		Sí	1.0
23	EJECUCION: Pavimento flexible en un 75%, realizado	5-Entregables Intermedios	29/01/2016		15/03/2017		Sí	3.0
24	EJECUCION: Estructura de pavimento existente en un 100%, realizado en los tres tramos.	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		13/11/2017		Sí	3.0
25	EJECUCION: Pavimento flexible en un 100%, realizado	5-Entregables Intermedios	22/02/2018	30/06/2018			No	3.0
26	EJECUCION: Señalización en un 100%, realizada	5-Entregables Intermedios	22/02/2018	30/06/2018			No	2.0
27	CIERRE: Recepcion provisional de la obra realizada.	9-Entregables Formales	01/04/2018	07/07/2018			No	3.0
28	EJECUCION: Mantenimiento de la carretera desde Mayo del 2018 a mayo del 2020 a satisfaccion del MTOP,	9-Entregables Formales	01/05/2018	31/07/2018			No	3.0
29	EJECUCION: Mantenimiento de la carretera desde mayo 2020 a mayo del 2022 a satisfaccion del MTOP.	9-Entregables Formales	01/05/2020	31/07/2020			No	3.0
30	CIERRE: Liquidación economica de la obra realizada.	5-Entregables Intermedios	30/06/2022	31/07/2022			No	4.0
31	COMPLETADO: Recepcion Definitiva de la obra incluida la etapa de mantenimiento, legalizada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/07/2022	31/10/2022			No	4.0


SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	ING. XAVIER M. ENDERICA SALGADO	Enderica Salgado, Xavier Mauricio	{PR} - Provincia - AZUAY	30/10/2017
2	Supervisión Ejecutiva Negativa	Enderica Salgado, Xavier Mauricio	{PR} - Provincia - AZUAY	29/09/2017
3	Supervisión Positiva: Estabilización de taludes, colocación de base asfáltica	Quishpi Vélez, Luis Manuel	{PR} - Provincia - CAÑAR	26/07/2017
4	Supervisión Seguimiento	Muñoz Zhunio, Maria Augusta	{PR} - Provincia - AZUAY	24/06/2017
5	Supervisión Positiva: Trabajos de limpieza y estabilización de taludes	Padrón Saeteros, Gladys Paulina	{PR} - Provincia - CAÑAR	30/04/2017
6	Supervisión avance negativa	Muñoz Zhunio, Maria Augusta	{PR} - Provincia - AZUAY	18/03/2017
7	Supervisión Positiva - Colocación de asfalto	Padrón Saeteros, Gladys Paulina	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/02/2017
8	Supervisión negativa referente al avance	Muñoz Zhunio, Maria Augusta	{PR} - Provincia - AZUAY	30/01/2017
9	Supervisión de avance	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	29/12/2016
10	Supervisión Positiva - Colocación de carpeta asfáltica y construcción de aceras y bordillos.	Padrón Saeteros, Gladys Paulina	{PR} - Provincia - CAÑAR	29/12/2016
11	Supervisión Positiva - Colocación de carpeta asfáltica y construcción de aceras y bordillos.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/11/2016

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
12	Supervisión Positiva - Colocación de carpeta asfáltica y construcción de aceras y bordillos.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/10/2016
13	Supervisión Positiva - Colocación de carpeta asfáltica y señalética.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/08/2016
14	Supervisión Negativa - Obra paralizada falta de presupuesto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	20/07/2016
15	Verificación de estado de la obra.	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	29/07/2016
16	Supervisión Negativa - Obra paralizada falta de presupuesto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/04/2016
17	Supervisión Negativa - Obra paralizada.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/01/2016
18	Supervisión Positiva- colocación de carpeta asfáltica	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	23/12/2015
19	Supervisión Positiva- colocación de carpeta asfáltica	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/11/2015
20	Supervisión Positiva - trabajos de colocación de pavimento rígido.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	23/09/2015
21	Supervisión positiva al Tramo 1 El Salado - Guangarcucho en la reconstrucción de la Autopista Cuenca- Azogues - Biblian	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	29/09/2015
22	Supervisión Satisfactoria a la reconstrucción de la vía	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	31/07/2015
23	Aplicación de los puentes, colocación de carpeta asfáltica.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	21/05/2015
24	Supervisión positiva al proyecto en su ejecución; en los Hitos GPR existen demoras en avances	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	30/04/2015
25	Colocación de la carpeta asfáltica	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/03/2015
26	SUPERVISION SATISFACTORIA AL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS Y A LOS AVANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	13/02/2015
27	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/01/2015
28	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/01/2015
29	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	14/11/2014
30	Supervisión al avances del proyecto	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	23/10/2014
31	Supervisión Estado de Proyecto	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	29/08/2014
32	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	23/08/2014
33	Movimiento de tierras y ampliación de la Vía	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	21/07/2014
34	Avance de obras en lo que corresponde a Azuay.	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	14/04/2014
35	Movimiento de Tierras	González Zhinin, Víctor Stalin	{PR} - Provincia - CAÑAR	21/04/2014
36	Trabajos de desalojo de material y compactación	González Zhinin, Víctor Stalin	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/01/2014
37	Supervisión del Proyecto	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	24/02/2014
38	Supervisión de Proyecto.	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	22/01/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance de Obra		100.00 %	99.06	99.06	01/08/2013	Abril


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	28,866,906.61
Estimado Al Fin Del Proyecto:	136,285,047.60 **
Costo Total:	104,225,734.57
Total Devengado:	129,432,709.57
% Costo Total Devengado:	124.18 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 124.18 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	111,157,397.11	6,852,338.03	0.00	118,009,735.14
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	140,212,456.75	0.00	0.00	140,212,456.75
Ppto. Codificado	134,713,510.37	0.00	0.00	134,713,510.37
Ppto. Comprometido	123,911,485.70	0.00	0.00	123,911,485.70
Planeado - Codificado (2018)		6,852,338.03		
Programado a Devengar	133,570,848.41	6,852,338.03	85,908.84	140,509,095.28
Ppto. Devengado	129,432,709.57	0.00	0.00	129,432,709.57
Pagado Real	115,406,927.75	0.00	0.00	115,406,927.75
Estimado a fin de año	* 129,432,709.57	0.00	0.00	129,432,709.57
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	4,138,138.84	6,852,338.03	85,908.84	11,076,385.71
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 96.90 %	0.00 %	0.00 %	92.12 %
Ppto. Codificado 998	28,742,699.64	0.00	0.00	28,742,699.64
Ppto. Devengado 998	28,044,919.93	0.00	0.00	28,044,919.93

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

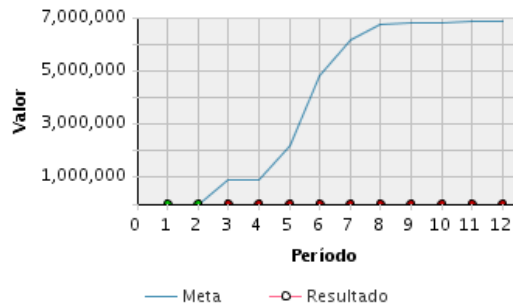

Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	894,358.38	0.00	894,358.38	0.00	0.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	894,358.38	0.00	0.00 %		0.00 %
May	1,269,958.37	0.00	2,164,316.75	0.00	0.00 %		0.00 %
Jun	2,658,325.40	0.00	4,822,642.15	0.00	0.00 %		0.00 %
Jul	1,310,985.32	0.00	6,133,627.47	0.00	0.00 %		0.00 %
Ago	632,801.72	0.00	6,766,429.19	0.00	0.00 %		0.00 %
Sep	21,477.21	0.00	6,787,906.40	0.00	0.00 %		0.00 %
Oct	21,477.21	0.00	6,809,383.61	0.00	0.00 %		0.00 %
Nov	21,477.21	0.00	6,830,860.82	0.00	0.00 %		0.00 %
Dic	21,477.21	0.00	6,852,338.03	0.00	0.00 %		0.00 %
Total	6,852,338.03	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
12	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
13	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos. (Mejorar e incrementar la señalización horizontal y vertical en toda RVE. Identificando puntos críticos)
14	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
15	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1-Informe sitop Julio 2014	B3-Inf-sitop-julio-04.pdf	05/08/2014
2	A2-Informe Sitop agosto 2014	B4-Inf-sitop-agosto-04.pdf	07/09/2014
3	A3-Informe-sitop-septiembre-2014	B5-Inf-sitop-septiembre-04.pdf	06/10/2014
4	A4- Informe sitop octubre 2014	B6-Inf-sitop-octubre-04.pdf	10/11/2014
5	A5-inf-sitop-noviembre-04	B7-Inf-sitop-noviembre-04.pdf	05/12/2014
6	A6-Inf-sitop-dic-04	B8-Inf-sitop-dic-04.pdf	06/01/2015
7	A7-Inf-sitop-ene-05	B9-Inf-sitop-ene-05.pdf	06/02/2015
8	A8-Informe-sitop-febrero-2015	C1-Inf-sitop-feb-05-VR-DAB.pdf	09/03/2015
9	A9-Inf-sitop-marzo	C1-Inf-sitop-marzo_C-A-B.pdf	07/04/2015
10	Acta 451 Ampliación de plazo	Acta_451_Ampliacion_de_plazo.pdf	28/12/2016
11	Acta de suspensión de plazo	Acta_de_suspension_de_plazo.pdf	28/12/2016
12	Acta levantamiento de suspensión de plazo	Acta_levantamiento_de_suspension_de_plazo.pdf	28/12/2016
13	Actualización de Dictamen de Prioridad Septiembre 2014	ACT_DICT_SENPLADES-SZ6A-2014-0439-OF.pdf	18/05/2017
14	Actualización de Dictamen de Prioridad Septiembre 2014 anexo	ANEXO_SENPLADES-SZ6A-2014-0439-OF.pdf	18/05/2017
15	Actualización de prioridad proyecto	ACT_DIC_SENPLADES-SZ6A-2014-0065-OF.pdf	18/05/2017
16	B1-Informe sitop Abril 2015	C1-Inf-sitop-abr-05.pdf	08/05/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
17	B10 Orden de Cambio Nro. 3	orden_de_cambio_3.pdf	19/05/2017
18	B11 Contrato Complementario Nro. 2	contrato_complementario_2.pdf	19/05/2017
19	B12 Orden de Cambio 4	orden_de_cambio_4.pdf	19/05/2017
20	B2-Contrato Complementario-Via-Rapida	Contrato_Complementario-Via-Rapida.pdf	22/05/2015
21	B3-Orden de cambio 1 -Via-Rapida	Orden_de_Cambio_1-Via_Rapida.pdf	22/05/2015
22	B4-Orden de cambio 2-Via Rapida	ORDEN_DE_CAMBIO_2_VIA_RAPIDA.pdf	22/05/2015
23	B5 Informe Sitop mayo 05	Inf-sitop-mayo-05-VR-C-A-B.pdf	08/06/2015
24	B6 Informe sitop junio.05 Via rapida	Informe-sitop-junio-05-Via_Rapida.pdf	07/07/2015
25	B7 CONTRATO ORIGINAL	Contrato_original.pdf	08/07/2015
26	B8-Informe-sitop-julio-2015-VR-CAB	B8-Inf-sitop-jul-05-VR-C-A-B.pdf	07/08/2015
27	B9-OFICIO-DICTAMEN-PRIORIDAD-SEMPLADES	ACT_DICT_SENPLADES-SZ6A-2014-0439-OF-DICTAMEN-PRIORIDAD-VIA_RAPIDA.pdf	08/08/2015
28	C1-Informe-sitop-agosto-2015	Inf-sitop-Via-Rapida-C-A-B-agos-05.pdf	07/09/2015
29	C1-Informe-sitop-mar-VR-D-A-B	C7-Inf-sitop-mar-VR-D-A.B.pdf	04/04/2016
30	C2-Informe-sitop-septiembre-Via-R-B-A-C	C2-Informe-sitop-septiembre-Via-R-B-A-C.pdf	07/10/2015
31	C3-Informe-sitop-octubre-VR-B-A-C	C3-Inf-sitop-oct-05-VR-B-A-C.pdf	05/11/2015
32	C4-Inf-sitop-Nov-VR-C-A-B	via_rapida_C-A-B.pdf	07/12/2015
33	C5-Inf-sitop-dic-VR-C-A-B	C5-Inf-sitop-dic-VR-C-A-B.pdf	06/01/2016
34	C6-Inf-sitop-feb-06-VR-C-A-B	C6-Inf-sitop-feb-06VR-C-A-B.pdf	07/03/2016
35	C7_Inf-sitop-marzo-06-VR-D-A-B	C7-Inf-sitop-mar-VR-D-A.B.pdf	05/04/2016
36	C8-Inf-sitop-mayo-06-VR-C-A-B	C8-Inf-sitop-mayo-06-VR-C-A-B.pdf	05/06/2016
37	C9-Inf-sitop-junio-06-Vr-C-A_B	C9_Inf-sitop-junio-06-Vr-C-A_B.pdf	04/07/2016
38	CEDULA-REPORTE 2013	REPORTE_2013.pdf	30/12/2016
39	CEDULA-REPORTE 2014	REPORTE_2014.pdf	30/12/2016
40	CEDULA-REPORTE 2015	REPORTE_2015.pdf	30/12/2016
41	CEDULA-REPORTE 2016	REPORTE_2016.pdf	30/12/2016
42	Contrato complementario Nro. 3	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_Nro_3.pdf	04/05/2018
43	Costo mas Porcentaje	Costo_mas_Porcentaje.pdf	28/12/2016
44	Costo mas Porcentaje 01	Costo_mas_Porcentaje_01.pdf	28/12/2016
45	Costo mas Porcentaje 02	Costo_mas_Porcentaje_02.pdf	28/12/2016
46	Cédula presupuestaria mes de Julio 2017	CEDULA_VIA_RAPIDA_JULIO_2017.pdf	05/08/2017
47	D1-Inf.sitop.julio-06-VR-C-A-B	D1-Inf-sitop-julio-06-VR-C-A-B.pdf	04/08/2016
48	D10 INFORME SITOP VIA RAPIDA ABRIL 2017	Informe_ejecutivo_vía_rápida_abril_2017.pdf	05/05/2017
49	D2 informe ejecutivo sitop agosto	via_rapida_cuenca_azogues_biblian.pdf	05/09/2016
50	D3 informe sitop via rapida septiembre 2016	Via_rapida_C-A-B.pdf	04/10/2016
51	D4 Informe sitop octubre via rapida	VIA_RAPIDA_C-A-B.pdf	05/11/2016
52	D5 Informe sitop via rapida noviembre 2016	via_rapida_cuenca_azogues_biblian.pdf	05/12/2016
53	D6_informe_sitop_Dic_2016_Via_rapida_cuenca_azogues	via_rapida_cuenca_azogues_biblian.pdf	06/01/2017
54	D7 Informe sitop via rapida cuenca azogues biblian	Vía_Rapida_cuenca_azogues_biblian.pdf	03/02/2017
55	D8_INFORME_SITOP_FEBRERO_2017_VIA_RAPIDA	Via_Rapida_Cuenca_Azogues_Biblian.pdf	03/03/2017
56	D9 INFORME SITOP VIA RAPIDA MARZO 2017	VIA_RAPIDA_CUENCA_AZOGUES_BIBLIAN.pdf	05/04/2017
57	Dictamen de prioridad Reconstrucción Via Rápida Septiembre 2012	DICT_SENPLADES-SZ6A-2012-0429-OF.pdf	18/05/2017
58	Dictamen Favorable febrero 2013	DIC_FAV_SENPLADES-SGPBV-2013-0141-OF.pdf	18/05/2017
59	E1 Informe de Fiscalización Nro. 1	In505FISQuin1-0.pdf	18/05/2017
60	E10 Informe de Fiscalización Nro. 10	In505FISQuin10-0.pdf	18/05/2017
61	E11 Informe de Fiscalización Nro. 11	In505FISQuin11-0.pdf	18/05/2017
62	E12 Informe de Fiscalización Nro. 12	In505FISQuin12-0.pdf	18/05/2017
63	E13 Informe de Fiscalización Nro. 13	In505FISQuin13-0.pdf	18/05/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
64	E14 Informe de Fiscalización Nro. 14	In505FISQuin14-0.pdf	18/05/2017
65	E15 Informe de Fiscalización Nro. 15	In505FISQuin15-0.pdf	18/05/2017
66	E16 Informe de Fiscalización Nro. 16	In505FISQuin16-0.pdf	18/05/2017
67	E17 Informe de Fiscalización Nro. 17	In505FISQuin17-0.pdf	18/05/2017
68	E18 Informe de Fiscalización Nro. 18	In505FISQuin18-0.pdf	18/05/2017
69	E19 Informe de Fiscalización Nro. 19	In505FISQuin19-0.pdf	18/05/2017
70	E2 Informe de Fiscalización Nro. 2	In505FISQuin2-0.pdf	18/05/2017
71	E20 Informe de Fiscalización Nro. 20	In505FISQuin20-0.pdf	18/05/2017
72	E21 Informe de Fiscalización Nro. 21	In505FISQuin21-0.pdf	18/05/2017
73	E22 Informe de Fiscalización Nro. 22	In505FISQuin22-0.pdf	18/05/2017
74	E23 Informe de Fiscalización Nro.23	In505FISQuin23-0.pdf	18/05/2017
75	E24 Informe de Fiscalización Nro. 24	In505FISQuin24-0.pdf	18/05/2017
76	E25 Informe de Fiscalización Nro. 25	In505FISQuin25-0.pdf	18/05/2017
77	E26 Informe de Fiscalización Nro. 26	In505FISQuin26-0.pdf	18/05/2017
78	E27 Informe de Fiscalización Nro. 27	In505FISQuin27-0.pdf	18/05/2017
79	E28 Informe de Fiscalización Nro. 28	In505FISQuin28-0.pdf	18/05/2017
80	E29 Informe de Fiscalización Nro. 29	In505FISQuin29-0.pdf	18/05/2017
81	E3 Informe de Fiscalización Nro. 3	In505FISQuin3-0.pdf	18/05/2017
82	E30 Informe de Fiscalización Nro. 30	In505FISQuin30-0.pdf	18/05/2017
83	E31 Informe de Fiscalización Nro. 31	In505FISQuin31-0.pdf	18/05/2017
84	E32 Informe de Fiscalización Nro. 32	In505FISQuin32-0.pdf	18/05/2017
85	E33 Informe de Fiscalización Nro. 33	In505FISQuin33-0.pdf	18/05/2017
86	E34 Informe de Fiscalización Nro. 34	In505FISQuin34-0.pdf	18/05/2017
87	E35 Informe de Fiscalización Nro. 35	In505FISQuin35-0.pdf	18/05/2017
88	E36 Informe de Fiscalización Nro. 36	In505FISQuin36-0.pdf	18/05/2017
89	E37 Informe de Fiscalización Nro. 37	In505FISQuin37-0.pdf	18/05/2017
90	E38 Informe de Fiscalización Nro. 38	In505FISQuin38-0.pdf	18/05/2017
91	E39 Informe de Fiscalización Nro. 39	In505FISQuin39-0.pdf	18/05/2017
92	E4 Informe de Fiscalización Nro. 4	In505FISQuin4-0.pdf	18/05/2017
93	E40 Informe de Fiscalización Nro. 40	In505FISQuin40-0.pdf	18/05/2017
94	E41 Informe de Fiscalización Nro. 41	In505FISQuin41-0.pdf	18/05/2017
95	E42 Informe de Fiscalización Nro. 42	In505FISQuin42-0.pdf	18/05/2017
96	E43 Informe de Fiscalización Nro. 43	In505FISQuin43-0.pdf	18/05/2017
97	E44 Informe de Fiscalización Nro. 44	In505FISQuin44-0.pdf	18/05/2017
98	E45 Informe de Fiscalización Nro. 45	In505FISQuin45-0.pdf	18/05/2017
99	E46 Informe de Fiscalización Nro. 46	In505FISQuin46-0.pdf	18/05/2017
100	E47 Informe de Fiscalización Nro. 47	In505FISQuin47-0.pdf	18/05/2017
101	E48 Informe de Fiscalización Nro. 48	In505FISQuin48-0.pdf	18/05/2017
102	E49 Informe de Fiscalización Nro. 49	In505FISQuin49-0.pdf	18/05/2017
103	E5 Informe de Fiscalización Nro. 5	In505FISQuin5-0.pdf	18/05/2017
104	E50 Informe de Fiscalización Nro. 50	In505FISQuin50-0.pdf	18/05/2017
105	E51 Informe de Fiscalización Nro. 51	In505FISQuin51-0.pdf	18/05/2017
106	E52 Informe de Fiscalización Nro. 52	In505FISQuin52-0.pdf	18/05/2017
107	E53 Informe de Fiscalización Nro. 53	In505FISQuin53-0.pdf	18/05/2017
108	E54 Informe de Fiscalización Nro. 54	In505FISQuin54-0.pdf	18/05/2017
109	E55 Informe de Fiscalización Nro. 55	In505FISQuin55-0.pdf	18/05/2017
110	E56 Informe de Fiscalización Nro. 56	In505FISQuin56-0.pdf	18/05/2017
111	E57 Informe de Fiscalización Nro. 57	In505FISQuin57-0.pdf	18/05/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
112	E58 Informe de Fiscalización Nro. 58	In505FISQuin58-0.pdf	05/07/2017
113	E59 Informe de Fiscalización Nro. 59	In505FISQuin59-0.pdf	05/07/2017
114	E6 Informe de Fiscalización Nro. 6	In505FISQuin6-0.pdf	18/05/2017
115	E60 Informe de Fiscalización Nro. 60	In505FISQuin60-0.pdf	05/07/2017
116	E68 Informe de Fiscalización Nro. 68	In505FISQuin68-0.pdf	05/12/2017
117	E69 Informe de Fiscalización Nro. 69	informe_quincenal_69.pdf	01/11/2017
118	E69 Informe de Fiscalización Nro. 72	In505FISQuin72-0.pdf	05/01/2018
119	E7 Informe de Fiscalización Nro. 7	In505FISQuin7-0.pdf	18/05/2017
120	E70 Informe de Fiscalización Nro. 70	In505FISQuin70-0.pdf	05/12/2017
121	E72 Informe de Fiscalización Nro. 72	In505FISQuin72-0.pdf	05/04/2018
122	E73 Informe de Fiscalización Nro. 73	In505FISQuin73-0.pdf	05/04/2018
123	E74 Informe de Fiscalización Nro. 74	In505FISQuin74-0.pdf	05/04/2018
124	E75 Informe de Fiscalización Nro. 75	In505FISQuin75-0.pdf	05/04/2018
125	E76 Informe de Fiscalización Nro. 76	In505FISQuin76-0.pdf	05/04/2018
126	E77 Informe de Fiscalización Nro. 77	In505FISQuin77-0.pdf	05/04/2018
127	E78 Informe de Fiscalización Nro. 78	In505FISQuin78-0.pdf	05/04/2018
128	E78 Informe de Fiscalización Nro. 78	In505FISQuin78-0.pdf	05/04/2018
129	E79 Informe de Fiscalización Nro. 79	In505FISQuin79-0.pdf	05/04/2018
130	E8 Informe de Fiscalización Nro. 8	In505FISQuin8-0.pdf	18/05/2017
131	E9 Informe de Fiscalización Nro. 9	In505FISQuin9-0.pdf	18/05/2017
132	Informe ejecutivo mes de agosto 2017	Informe_ejecutivo_VIA_RAPIDA_CONST.pdf	05/09/2017
133	Informe ejecutivo mes de Enero 2014	A6.pdf	05/03/2014
134	Informe ejecutivo mes de Febrero 2014	A7.pdf	05/03/2014
135	Informe Ejecutivo Sitop Diciembre 2013	A5.pdf	06/01/2014
136	Informe ejecutivo Sitop Marzo 2014	A8.pdf	07/04/2014
137	Informe ejecutivo Sitop Octubre 2013	A2.pdf	19/11/2013
138	Informe ejecutivo Sitop Septiembre 2013	A1.pdf	19/11/2013
139	Informe Fiscalización Nro. 67 septiembre de 2017	In505FISQuin67-0.pdf	05/10/2017
140	Informe Qincenal de Fiscalización	In505FISQuin63-0.pdf	05/08/2017
141	Informe Qincenal de Fiscalización agosto 2017	In505FISQuin65-0.pdf	05/09/2017
142	Informe Sitop Abril 2014	A9-Inf-sitop-abr-04.pdf	06/06/2014
143	Informe sitop junio 2014	B2-Inf-sitop-junio-04.pdf	10/07/2014
144	Informe Sitop mayo 2014	B1-Inf-sitop-mayo-04.pdf	06/06/2014
145	INFORME SITOP MAYO VIA RAPIDA CUENCA AZOGUES	VIA_RAPIDA_CUENCA_AZOGUES.pdf	02/06/2017
146	Informe Sitop mes de Noviembre 2013	A3.pdf	26/12/2013
147	Levantamiento suspensión de plazo	ACTA_LEVANTAMIENTO.pdf	04/05/2018
148	Oficio autorización de AVAL	MTOP-CGP-2017-1387-ME.pdf	05/12/2017
149	PLANILLA CC01 14	PLANILLA_CC01_14.pdf	30/12/2016
150	Planilla 12 contrato Complementario 1	P12_2016_08_AGOSTO_C._COMP_1.pdf	19/05/2017
151	Planilla 13 contrato Complementario 1	P13_2016_09_SEPTIEMBRE_C._COMP_1.pdf	19/05/2017
152	Planilla 14 contrato Complementario 1	P14_2016_10_OCTUBRE_C._COMP_1.pdf	19/05/2017
153	Planilla 15 contrato Complementario 1	P15_2016_11_NOVIEMBRE_C._COMP_1.pdf	19/05/2017
154	Planilla 16 contrato Complementario 1	P16_2016_12_DICIEMBRE_C._COMP_1.pdf	19/05/2017
155	Planilla 2 - Sábana - Reajuste de Precios	Planilla_2_-Sábana_-_Reajuste_de_Precios.pdf	30/12/2016
156	Planilla 29 Contrato Original	P29_2016_08_AGOSTO_C._ORIG.pdf	19/05/2017
157	Planilla 3 - Contrato Complementario N° 1 - Sábana (1)	Planilla_3_-_Contrato_Complementario_N°_1_-_Sábana_(1).pdf	30/12/2016
158	Planilla 30 Contrato Original	P30_2016_09_SEPTIEMBRE_C._ORIG.pdf	19/05/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
159	Planilla 31 Contrato Original	P31_2016_10_OCTUBRE_C._ORIG.pdf	19/05/2017
160	Planilla 32 Contrato Original	P32_2016_11_NOVIEMBRE_C._ORIG.pdf	19/05/2017
161	Planilla 33 Contrato Original y Orden de Cambio Diciembre 2016	P33_2016_12_DICIEMBRE_C._ORIG.pdf	19/05/2017
162	Planilla 34 Contrato Original y Orden de Cambio Enero 2017	P34_2017_01_ENERO_C._ORIG.pdf	19/05/2017
163	Planilla 35 Contrato Original y Orden de Cambio Febrero 2017	P35_2017_02_FEBRERO_C._ORIG.pdf	19/05/2017
164	Planilla 36 Contrato Original y Orden de Cambio Marzo 2017	P36_2017_03_MARZO_C._ORIG.pdf	19/05/2017
165	Planilla 37 Contrato Original y Orden de Cambio Abril 2017	Planilla_37.pdf	05/07/2017
166	Planilla 38 Contrato Original y Orden de Cambio Abril 2017	Planilla_38.pdf	05/07/2017
167	Planilla 4 - Contrato Complementario N° 1 - Sábana	Planilla_4_-_Contrato_Complementario_N°_1_-_Sábana.pdf	30/12/2016
168	PLANILLA 4 CONTRATO COMPLEMENTARIO	Planilla_4_-_Contrato_Complementario_N°_1_-_Sábana.pdf	30/12/2016
169	Planilla 6	Planilla_6.pdf	30/12/2016
170	PLANILLA 7 CONTRATO COMPLEMENTARIO	Planilla_7_CC_N°_1_-_Sábana_-_Resumen_de_Reajuste_de_Precios.pdf	30/12/2016
171	Planilla 8 CC N° 1 - Sábana - Resumen de Reajuste de Precios	Planilla_8_CC_N°_1_-_Sábana_-_Resumen_de_Reajuste_de_Precios.pdf	30/12/2016
172	Planilla Nro 10 Contrato Compl. Nro. 2	PLANILLA_N°_.10.pdf	05/04/2018
173	Planilla Nro 2 Contrato Compl. Nro. 2	P02_2017_06_JUNIO_C._COMP_2.pdf	05/09/2017
174	Planilla Nro 4 Contrato Compl. Nro. 2	Planilla_4_CC2.pdf	05/10/2017
175	Planilla Nro 5 Contrato Compl. Nro. 2	Sabana+_Reajuste_PI_-_05.pdf	01/11/2017
176	Planilla Nro 6 Contrato Compl. Nro. 2	P06_2017_09_OCTUBRE_C._COMP_2.pdf	05/12/2017
177	Planilla Nro 7 Contrato Compl. Nro. 2	Planilla_7_hh.pdf	05/01/2018
178	Planilla Nro 8 Contrato Compl. Nro. 2	PLANILLA_N°_.08.pdf	05/04/2018
179	Planilla Nro 9 Contrato Compl. Nro. 2	PLANILLA_N°_.09.pdf	05/04/2018
180	Planilla Nro. 3 del Contratao Compl 5 Fiscalización	SABANA_AUSTROVIAS_VIA_RAPIDA.pdf	05/08/2017
181	Planilla Nro. 39 Contrato Original	P39_2017_06_JUNIO_C.ORIG.pdf	05/09/2017
182	Planilla Nro. 39 Contrato Original y Orden de Cambio	SABANA_HeH_VIA_RAPIDA.pdf	05/08/2017
183	Planilla Nro. 41 Contrato Original y Orden de Cambio	Planilla_41.pdf	05/10/2017
184	Planilla Nro. 42 Contrato Original y Orden de Cambio	Sabana+_Reajuste_PI_-_42.pdf	01/11/2017
185	Planilla Nro. 43 Contrato Original y Orden de Cambio	P43_2017_09_OCTUBRE_C.ORIG..pdf	05/12/2017
186	Planilla Nro. 44 Contrato Original y Orden de Cambio	Planilla_44_hh.pdf	05/01/2018
187	Planilla Nro. 45 Contrato Original y Orden de Cambio	PLANILLA_N°_.45.pdf	05/04/2018
188	Planilla Nro. 46 Contrato Original y Orden de Cambio	PLANILLA_N°_.46.pdf	05/04/2018
189	Planilla Nro. 47 Contrato Original y Orden de Cambio	PLANILLA_N°_.47.pdf	05/04/2018
190	Planilla Nro. 5 del Contratao Compl 5 Fiscalización	Planilla_05_CC5_y_Reajuste.pdf	05/10/2017
191	Planilla Nro. 6 del Contratao Compl 5 Fiscalización	P06_2017__08_AGOSTO_C._COMP_5_Fiscalización.pdf	05/12/2017
192	Planilla Nro. 7 del Contratao Compl 5 Fiscalización	Planilla_Fiscalización_Via_Rápida.pdf	05/01/2018
193	PLANILLAS H&H	PLANILLA_VIA_RAPIDA_CUENCA_AZOGUES.rar	30/12/2016
194	PROYECTO DE SEMPLADES	A4.docx	26/12/2013

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Chaca Álvarez, Ivan Patricio	Titular	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Cañar	ichaca@mtop.gob.ec	023974600
Quezada Jara, Mónica Fabiola	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretaria Zonal 6	mquezada@mtop.gob.ec	023974600
Soto Romero, José Gerardo	Lider de Proyecto	Analista de Infraestructura Provincial 2	jsoto@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
73104_1.jpg	05/04/2018
