

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 6
Dirección Provincial Azuay

PROYECTO: K034 MTOP- AMPLIACIÓN DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO, COMPRENDIDA ENTRE LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y PAVIMENTO EXISTENTE (SAYAUSÍ DE LA CIUDAD DE CUENCA)

Líder del Proyecto:	Guamán Vicuña, Juan Carlos (jguaman@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Quezada Jara, Mónica Fabiola	Programas Relacionados:	AMPLIACION DE LA AV. ORDONEZ LAZO COMPRENDIDA ENTRE LA AV. DE LAS AMERICAS Y PAVIMENTO EXISTENTE - SAYAUSI D
Titular:	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.372208	TIR:	67.00 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	16,322.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	20,000,122.90
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	20/07/2012 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	25/06/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2015
Modificado por:	Guamán Vicuña, Juan Carlos	Fecha del siguiente Hito:	14/09/2018

DATOS GENERALES

Descripción

Reconstrucción y Ampliación de la Av. Ordoñez Lazo, la cual ha cumplido su vida útil, lo que permitirá un acceso fluido hacia la ciudad de Cuenca desde la carretera Cuenca - Molleturo - Naranjal.
 La población demandante efectiva es de 536.134 habitantes.
 6.25 km de vía rehabilitada y ampliada en pavimento rígido.
 Línea Base del Proyecto
 6.25 km de la Av. Ordoñez Lazo comprendidos entre la Av. Las Américas y Sayausi en mal estado en donde 20.100 vehículos diarios sufren problemas de congestión vehicular.
 Objetivo General o Propósito: Rehabilitar la vía de entrada a la ciudad de Cuenca, mejorando la superficie de rodadura y dándole mayor vida útil a la vía con la colocación de hormigón hidráulico en un espesor de 25 cm. con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.
 Objetivos Específicos o Componentes: El proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA AV. ORDOÑEZ LASSO, contempla:
 - Recuperar para la ciudad la entrada Oeste desde las provincias de Guayas y EL Oro.
 - Ordenar el tráfico en su ingreso y salida de la Ciudad.

Beneficios Cualitativos

Optimizar la circulación vial en la Av. Ordoñez Lazo, creando una obra con características adecuadas que permita disminuir el tiempo de paso por este punto, la obra además esta encaminada a alcanzar los objetivos y metas del Plan Nacional del Buen Vivir

Tipo de Beneficiario

Población referencia: 4'458.692
 Población demandante potencial 1'694.778
 Población demandante efectiva 536.134


Restricciones

El plazo de ejecución del proyecto es de 12 meses
 El costo del proyecto es de: 20.065.341,71
 El proyecto se ubica se en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, tiene un área de influencia directa de 150 ha aproximadamente.
 El proyecto contempla una calzada de 6.25 km de longitud en pavimento rígido, con un espesor de 24 cm, contempla la construcción de veredas y ciclovías y tiene una sección transversal variable.
 La DPA a través de la Supervisión del Proyecto, vigilará que la Fiscalización haga cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en los documentos contractuales, así como el personal técnico requerido.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 92.23 %
Fecha de Inicio: 20/07/2012 **Fecha de Fin:** 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO 2018</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. 17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 4 PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017. EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES., CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL NECESARIOS PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES Y COMPRA E IMPORTACION DE CABLES Y EQUIPOS ELECTRICOS.</p> <p>EN EL MES DE MARZO SE VENCÍÓ EL CONVENIO DE CREDITO CHINO, ES NECESARIO QUE AUTORIDADES GESTIONEN NUEVOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CANCELAR LO PLANILLAS PENDIENTES Y CULMINAR EL PROYECTO Guamán Vicuña, Juan Carlos 02/05/2018 - 04:06 PM.</p> <p>Con Oficio Nro. MTOP-DDAZ-2018-000261-OF de fecha 24 de mayo de 2018, señor Director Distrital suspende las obras, por falta de financiamiento y falta de pago de planillas.</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	04/06/2018 - 11:57 AM
<p>ABRIL 2018</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. 17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 4 PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017. EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES., CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL NECESARIOS PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES COMPRA E IMPORTACION DE CABLES Y EQUIPOS ELECTRICOS.</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	02/05/2018 - 04:06 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
EN EL MES DE MARZO SE VENCIÓ EL CONVENIO DE CREDITO CHINO, ES NECESARIO QUE AUTORIDADES GESTIONEN NUEVOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CANCELAR LO PLANILLAS PENDIENTES Y CULMINAR EL PROYECTO		
<p>MARZO 2018</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. 17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO nO. 4 PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017. EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA NUEVO CONTRATO COMPLEMENTARIO, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES., CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL NECESARIOS PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES COMPRA E IMPORTACION DE CABLES Y EQUIPOS ELECTRICOS.</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	03/04/2018 - 03:11 PM
<p>FEBRERO 2018</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. 17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO nO. 4 PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017. CON ORDEN DE CAMBIO NRO. 3. FIRMADA EL 30 DE JUNIO DE 2017 SE LEGALIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018 (POR LLUVIAS). EL 15 DE FEBRERO DE 2017 SE FIRMA NUEVO CONTRATO COMPLEMENTARIO, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES., CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL NECESARIOS PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	05/03/2018 - 12:48 PM
<p>ENERO 2018</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. 17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO nO. 4 PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017. CON ORDEN DE CAMBIO NRO. 3. FIRMADA EL 30 DE JUNIO SE LEGALIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018. EN TRAMITE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA FIRMA DE UN NUEVO CONTRATO COMPLEMENTARIO, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.. EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REALIZA REUNION DE LA COMISION ESPECIAL 451, DONDE DE AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018, SUPEDITADA A LA FIMRA DEL CC5. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL NECESARIOS PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	02/02/2018 - 02:54 PM
<p>DICEMBRE DE 2017</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. 17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO nO. 4 PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017. CON ORDEN DE CAMBIO NRO. 3. FIRMADA EL 30 DE JUNIO SE LEGALIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018. EN TRAMITE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA FIRMA DE UN NUEVO CONTRATO COMPLEMENTARIO, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.. EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REALIZA REUNION DE LA COMISION ESPECIAL 451, DONDE DE AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018, SUPEDITADA A LA FIMRA DEL CC5. EN ESTE MES SE HAN INICIADO CON LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL NECESARIOS PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	02/01/2018 - 02:36 PM
<p>NOVIEMBRE DE 2017</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	01/12/2017 - 12:35 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO nO. 4 PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.</p> <p>CON ORDEN DE CAMBIO NRO. 3. FIRMADA EL 30 DE JUNIO SE LEGALIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.</p> <p>AL MOMENTO SE REALIZA OBRAS MENORES Y LIMPIEZA DE OBRA EN LA CALLE DULCAMARA.</p> <p>EN TRAMITE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA FIRMA DE UN NUEVO CONTRATO COMPLEMENTARIO, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES..</p> <p>EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REALIZA REUNION DE LA COMISION ESPECIAL 451, DONDE DE AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018, SUPEDITADA A LA FIMRA DEL CC5.</p>		
<p>OCTUBRE DE 2017</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. 17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO nO. 4 PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.</p> <p>CON ORDEN DE CAMBIO NRO. 3. FIRMADA EL 30 DE JUNIO SE LEGALIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.</p> <p>AL MOMENTO SE REALIZA OBRAS MENORES Y LIMPIEZA DE OBRA EN LA CALLE DULCAMARA.</p> <p>CON MEMORANDO Nro. MTOP-DDAZ-2017-2042-ME DE FECHA SE ENTREGA EVALUACION DE INCREMENTO DE CANTIDADES Y HOMOLOGACION DE TECNOLOGIA DE LOS RUBORS ELECTRICOS PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, PARA LA FIRMA DE UN NUEVO CONTRATO COMPLEMENTARIO</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	01/11/2017 - 02:34 PM
<p>SEPTIEMBRE DE 2017</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. 17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO nO. 4 PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.</p> <p>EL 28 DE JUNIO DE 2017 SE REUNE LA COMISION ESPECIAL 451, DONDE SE APRUEBA AMPLIACION DEL PLAZO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO NRO. 3.</p> <p>AL MOMENTO SE REALIZA OBRAS MENORES Y LIMPIEZA DE OBRA EN LA CALLE DULCAMARA.</p> <p>SE EVALUA INCREMENTO DE CANTIDADES Y HOMOLOGACION DE TECNOLOGIA DE LOS RUBORS ELECTRICOS PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, PARA LA FIRMA DE UN NUEVO CONTRATO COMPLEMENTARIO</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	02/10/2017 - 04:49 PM
<p>AGOSTO DE 2017</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. 17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO nO. 4 PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.</p> <p>EL 28 DE JUNIO DE 2017 SE REUNE LA COMISION ESPECIAL 451, DONDE SE APRUEBA AMPLIACION DEL PLAZO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018, AL MOMENTO SE REALIZA EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE AVALICE ESTA AMPLIACION DE PLAZO.</p> <p>AL MOMENTO SE REALIZA LAS VEREDAS EN LA CALLE DULCAMARA</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	05/09/2017 - 02:21 PM
<p>JULIO DE 2017</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	01/08/2017 - 11:30 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>EL 28 DE JUNIO DE 2017 SE REUNE LA COMISION ESPECIAL 451, DONDE SE APRUEBA AMPLIACION DEL PLAZO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018, AL MOMENTO SE REALIZA EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE AVALICE ESTA AMPLIACION DE PLAZO.</p> <p>AL MOMENTO SE REALIZA LA PAVIEMENTACION DE LA CALLE DULCAMARA PAVIMENTO RIGIDO DEL CARRIL IZQUIERDO).</p> <p>17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.</p>		
<p>JUNIO DE 2017</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.</p> <p>17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.</p> <p>AL MOMENTO SE REALIZA, SE REALIZA MUROS DE CONTECCION Y FUNDICION DE PAVIMENTO RIGIDO DEL CARRIL DERECHO</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	03/07/2017 - 05:20 PM
<p>MAYO DE 2017</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.</p> <p>17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.</p> <p>AL MOMENTO SE REALIZA MOVIMIENTO DE TIERRA COLOCACION DE MEJORAMIENTO Y SUBBASE, SE REALIZA MUROS DE CONTECCION</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	05/06/2017 - 02:53 PM
<p>ABRIL DE 2017</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.</p> <p>17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.</p> <p>AL MOMENTO SE REALIZA MOVIMIENTO DE TIERRA Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE DULCARA</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	04/05/2017 - 04:30 PM
<p>MARZO DE 2017</p> <p>OBRA 100% TERMINADA.</p> <p>SE ENCUENTRO EN TRAMITE LA FIRMA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES AL MOMENTO SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LA OBRA (LIMPIEZA DE POZOS Y SUMIDEROS)</p> <p>SE ENCUENTRA APROBADA HASTA LA PLANILLA 19 QUE CORRESPONDE A LOS TRABAJOS DE ENERO DE 2017</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	04/04/2017 - 09:33 AM
<p>FEBRERO DE 2017</p> <p>OBRA 100% TERMINADA.</p> <p>27 DE ENERO SE SUSPENDE LOS TRABAJOS, HASTA FIMRA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES MANTENIMIENTO DE LA OBRA (LIMPIEZA DE POZOS Y SUMIDEROS)</p> <p>SE HA CANCELADO HASTA LA PLANILLA 16 (OCTUBRE DE 2016), LA PLANILLAS 17 DE NOVIEMBRE Y LA 18 DE DICIEMBRE APROBADAS Y EN TRAMITE PARA LA CANCELACION</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	01/03/2017 - 03:49 PM
<p>ENERO DE 2017</p> <p>COLOCACIÓN DE ADOCRETOS EN PARTES APROCHES LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	05/02/2017 - 11:49 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SE HA CANCELADO HASTA LA PLANILLA 16 (OCTUBRE DE 2016), LA PLANILLAS 17 DE NOVIEMBRE APROBADA Y LA 18 DE DICIEMBRE DE 2016 EN TRAMITE		
<p>DICIEMBRE 2016:</p> <p>FUNDICIÓN DE VEREDAS 3+400 A LA 5+200 LD Y LII COLOCACIÓN DE ADOCRETOS 2+500 A LA 3+100 LD Y LI Y DE LA 4+400 A LA 5+200 LD Y LI</p> <p>SE HA CANCELADO HASTA LA PLANILLA 16 (OCTUBRE DE 2016), LA PLANILLAS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 EN TRAMITE</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	03/01/2017 - 03:30 PM
<p>NOVIEMBRE 2016:</p> <p>FUNDICIÓN DE VEREDAS 1+500 A LA 2+042 LD, 2+800 A LA 3+100 LD Y LI Y 3+900 A LA 4+600 LD Y LI EJECUCIÓN DE DUCTOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS DE 4+700 A LA 5+800 LI Y 5+200 A LA 5+800 LDI FUNDICIÓN DE PAVIMENTOS 0+3+800 A LA 4+500 LD CUARTO CARRIL, 5+000 A LA 5+200, 4+600 A LA 4+800 UN CARRIL (REDONDEL DE LA CALLE DULCAMARA). COLOCACIÓN DE ADOCRETOS 2+600 A LA 3+000 LD Y LI Y 3+400 A LA 4+400 LD Y LI</p> <p>PENDIENTE EL PAGO DE PLANILLAS 15 Y 16 (PERIODOS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016)</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	02/12/2016 - 09:38 PM
<p>OCTUBRE 2016:</p> <p>FUNDICION DE VEREDAS 0+000 A LA 1+800, 2+200 A LA 2+600, 3+200 A LA 3+800 Y 5+700 A LA 6+170 LD Y LI EJECUCION DE DUCTOS ELECTRICOS Y TELEFONICOS DE 2+800 A LA 2+900 LD Y LI FUNDICION DE PAVIMENTOS APROCHES 0+000 A LA 1+100 LD Y LI. COLOCACION DE ADOCRETOS 0+000 A LA 1+400, 2+200 A LA 2+600 Y 3+200 A LA 3+400 LD Y LI</p> <p>PENDIENTE EL PAGO DE PLANILAS 11, 12, 13 Y 14 (PERIODOS MAYO/16 A AGOSTO/16)</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	01/11/2016 - 04:45 PM
<p>SEPTIEMBRE 2016:</p> <p>SE COLOCA PAVIMENTO RIGIDO EN LAS ABSCISAS 4+700 A LA 5+200. YA SE TIENE COLOCADO. EN UNA EXTENCION DE 5 KM. EJECUCION DE DUCTOS ELECTRICOS Y TELEFONICOS DE 0+000 A 0+500 Y 2+500 A LA 2+800 LI FUNDICION DE VEREDAS DE 0+500 A LA 1+100 LD Y LI Y 2+300 HASTA 2+600 LI</p> <p>SE CANCELAN LAS DIEZ PRIMERAS PLANILLAS (JUNIO15 A ABRIL16), PENDIENTES DESDE MAYO A AGOSTO DE 2016.</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	05/10/2016 - 10:49 AM
<p>AGOSTO 2016:</p> <p>SE COLOCA PAVIMENTO RIGIDO EN LAS ABSCISAS 0+000 A LA 0+400 Y 000. YA SE TIENE COLOCADO. EN UNA EXTENCION DE 5 KM. EJECUCION DE DUCTOS ELECTRICOS Y TELEFONICOS DE 0+500 A 0+600 Y 2+500 A LA 2+800 LD</p> <p>ACABADO DE OBRA BASICA 4+400 A 5+200.</p> <p>NO SE CANCELA NINGUNA DE LAS 13 PLANILLAS YA APROBADAS</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	03/09/2016 - 09:57 PM
<p>JULIO 2016:</p> <p>SE COLOCA PAVIMENTO RIGIDO EN LAS ABSCISAS 0+400 A LA 0+660 Y 5+400 A LA 6+000. YA SE TIENE COLOCADO. EN UNA EXTENCION DE 4 KM. EJECUCION DE DUCTOS ELECTRICOS Y TELEFONICOS DE 0+600 A LA 1+180 Y 2+500 A LA 3+200</p> <p>ACABADO DE OBRA BASICA 0+400 A LA 0+660.</p> <p>NO SE CANCELA NINGUNA DE LAS 11 PLANILLAS YA APROBADAS</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	03/08/2016 - 09:15 AM
<p>JUNIO 2016:</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	04/07/2016 - 01:04 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SE COLOCA PAVIMENTO RIGIDO EN LAS ABCISAS 0+660 A LA 0+770 , YA SE TIENE COLOCADO. EN UNA EXTENCION DE 4 KM. INICIA CON LA EJECUCION DE DUCTOS ELECTRICOS Y TELEFONICOS DE 1+180 A LA 2+500 LD Y LI SE REALIZAN BORIDILLOS DE LADO DERECHO Y PARTERRE CENTRAL DESDE 1+180 HASTA 4+600</p> <p>ACABADO DE OBRA BASICA 0+400 A LA 0+660.</p> <p>NO SE CANCELA NINGUNA DE LAS 11 PLANILLAS YA APROBADAS</p>		
<p>MAYO 2016:</p> <p>SE COLOCA PAVIMENTO RIGIDO EN LAS ABCISAS 0+770 A LA 1+140 Y 6+000 A LA 6+250, YA SE TIENE COLOCADO EN UNA EXTENCION DE 4 KM. SE REALIZAN BORIDILLOS DE LADO DERECHO Y PARTERRE CENTRAL DESDE 1+180 HASTA 4+600</p> <p>EL 4 DE MAYO DE 2016 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO, PARA LA EJECUCION DE RUBROS NUEVOS YA QUE EN LOS DISEÑOS ORIGINALES NO CONTENPLAN RUBROS DE OBRA FISICA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE INCLUYE UN INCREMENTO DE PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2016. SE REALIZA UNA NUEVA REPROGRAMACION</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>06/06/2016 - 10:04 PM</p>
<p>ABRIL 2016:</p> <p>En este mes se ha reanudado los trabajos se ha colocado pavimento rígido en el tramo 1 entre las abscisas 1+140 a IA 1+340 , tramo 2 entre las abscisas 3+200 a la 3+400 cuarto carril, ductos telefonicos, bordillos y parterre central</p> <p>PARA ESTE MES YA SE PRESENTA RETRAZO EN EL PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA, NO SE PUEDEN EJECUTAR RUBROS PUES ESTA PENDIENTE LA FIRMA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO Y ORDEN DE CABIO QUE INCLUYE UN INCREMENTO DE PLAZO. YA QUE DISEÑOS ORIGINALES NO CONTENPLAN RUBROS DE OBRA FISICA PARA EL SOTERRAIENTO DE CABLES.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>04/05/2016 - 11:53 PM</p>
<p>MARZO 2016:</p> <p>En este mes se ha reanudado los trabajos se ha colocado pavimento rígido en el tramo 1 entre las abscisas 2+700 a IA 2+900 (DOS carriles de 3,25 m), pues la Empresa Contratista argumenta que no se cancela aun el total del anticipo y OCHO planillas aprobadas, que son provenientes del Crédito Chino, PARA ESTE MES YA SE PRESENTA RETRAZO EN EL PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA, LO CUAL SE JUSTIFICA CON EL TRAMITE QUE ESTA PENDIENTE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO Y ORDEN DE CABIO QUE INCLUYE UN INCREMENTO DE PLAZO.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>04/04/2016 - 02:14 PM</p>
<p>FEBRERO 2016:</p> <p>En este mes se ha reanudado los trabajos parcialmente se ha colocado pavimento rígido en el tramo 2 entre las abscisas 4+180 a lq 4+700 (tres carriles de 3,25 m), pues la Empresa Contratista argumenta que no se cancela aun el total del anticipo y SIETE planillas aprobadas, que son provenientes del Crédito Chino, PARA ESTE MES YA SE PRESENTA RETRAZO EN EL PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA.</p> <p>ES NECESARIO QUE SE CONCRETE EL TRAMITE DE LA ORDEN DE CAMBIO Y CONTRATO COMPLEMENTARIO, CON LO CUAL SE REALIZARA UNA NUEVA REPROGRAMACION .</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>01/03/2016 - 04:30 PM</p>
<p>ENERO 2016:</p> <p>En el último mes practicamente no hay un avance significativo, pues la Empresa Contratista argumenta que no se cancela aun el total del anticipo y SEIS planillas aprobadas, que son provenientes del Crédito Chino, sin embargo nos encontramos dentro del cronograma Vigente</p> <p>Unicamente se hace reconformacion de subrazante y control de polvo</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>03/02/2016 - 02:37 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2015:</p> <p>Colocación de pavimento rígido, en tramos inconclusos para habilitar el transito a los residente del sector. Se trabaja unicamente con equipos de afirmados, y el avence en minimi (menos 1%) la contratista aduce falta de pago del anticipo y planillas ya aprobadas, pues de no concreta el Credito Chino de este proyecto.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>04/01/2016 - 02:45 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se solicitado la contratación de la fiscalización debido a que el MTOP de la Dirección Provincial del Azuay no cuenta los equipos y personal especializado para dichos trabajos.</p> <p>Se han mantenido reunidos de coordinación con el GAD Municipal de Cuenca a fin de solventar varias inquietudes con respecto a los diseños originales del proyecto Y demolición de casas patrimoniales.</p> <p>Realiza evaluación de rubros nuevos e incremento de cantidades para el trámite administrativo de contrato complementario y orden de cambio.</p>		
<p>NOVIEMBRE 2015:</p> <p>Se han realizado movimiento de tierras en los dos frentes de trabajo T1 2+800 AL 3+000 y el T2 4+180-5+000, en donde se han realizado actividades cajoneras, demolición de hormigón, acabado de obra básica, excavación para obras hidrosanitarias, trabajos de alcantarillada, Agua Potable, se colocada de sub-base desde la abscisa 2+100-2+700 y 2+600-4+100 y colocación de pavimento rígido en tres paños de 3.25 metros de ancho desde la abscisa 2+100 - 2+700 Y 3+600 - 4+000.</p> <p>Se solicitado la contratación de la fiscalización debido a que el MTOP de la Dirección Provincial del Azuay no cuenta los equipos y personal especializado para dichos trabajos.</p> <p>Reunión de coordinación con la empresa pública de la Universidad de Cuenca, a fin concretar la contratación de la fiscalización</p> <p>Se han mantenido reunidos de coordinación con el GAD Municipal de Cuenca a fin de solventar varias inquietudes con respecto a los diseños originales del proyecto Y demolición de casas patrimoniales .</p> <p>Se ha solicitado mediante oficios al Consorcio CCCECC que cumpla con lo estipulado en el contrato en lo referente a personal, maquinaria y especificaciones técnicas</p> <p>Realiza evaluación de rubros nuevos e incremento de cantidades para el trámite administrativo de contrato complementario y orden de cambio.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>02/12/2015 - 03:31 PM</p>
<p>OCTUBRE 2015:</p> <p>Se han realizado movimiento de tierras en los dos frentes de trabajo T1 2+100-3+000 y el T2 4+180-5+000, en donde se han realizado actividades cajoneras, demolición de hormigón, acabado de obra básica, excavación para obras hidrosanitarias, trabajos de alcantarillada, Agua Potable, se colocada de sub-base desde la abscisa 2+100-2+700 y 2+600-4+000 y colocación de pavimento rígido en tres paños de 3.25 metros de ancho desde la abscisa 2+100 - 2+700 Y 3+600 - 4+000.</p> <p>Se solicitado la contratación de la fiscalización debido a que el MTOP de la Dirección Provincial del Azuay no cuenta los equipos y personal especializado para dichos trabajos.</p> <p>Reunión de coordinación con la empresa pública de la Universidad de Cuenca, a fin concretar la contratación de la fiscalización</p> <p>Se han mantenido reunidos de coordinación con el GAD Municipal de Cuenca a fin de solventar varias inquietudes con respecto a los diseños originales del proyecto.</p> <p>Se ha solicitado mediante oficios al Consorcio CCCECC que cumpla con lo estipulado en el contrato en lo referente a personal, maquinaria y especificaciones técnicas</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>04/11/2015 - 02:16 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2015:</p> <p>Se han realizado movimiento de tierras en los dos frentes de trabajo T1 1+140-2+100 y el T2 3+200-4+180, en donde se han realizado actividades cajoneras, demolición de hormigón, acabado de obra básica, excavación para obras hidrosanitarias, trabajos de alcantarillada, Agua Potable, se colocada de subbase desde la abscisa 1+980 - 2+100 y 2+300-2+600 y colocación de pavimento rígido en tres paños de 3.25 metros de ancho desde la abscisa 3+200 - 3+500.</p> <p>Se solicitado la contratación de la fiscalización debido a que el MTOP de la Dirección Provincial del Azuay no cuenta los equipos y personal especializado para dichos trabajos.</p> <p>Reunión de coordinación con la empresa pública de la Universidad de Cuenca, a fin concretar la contratación de la fiscalización</p> <p>Se han mantenido reunidos de coordinación con el GAD Municipal de Cuenca a fin de solventar varias inquietudes con respecto a los diseños originales del proyecto.</p> <p>Se ha solicitado mediante oficios al Consorcio CCCECC que cumpla con lo estipulado en el contrato en lo referente a personal, maquinaria y especificaciones técnicas</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>07/10/2015 - 01:52 PM</p>
<p>AGOSTO 2015:</p> <p>Se han realizado movimiento de tierras en los dos frentes de trabajo T1 1+140-2+100 y el T2 3+200-4+080, en donde se han realizado actividades referentes a demolición de estructuras, excavación para obras hidrosanitarias y estructura de la vía, construcción de muros, y colocación y compactado de material de relleno terminando la obra básica para proceder al colocación de subbase desde la abscisa 1+140-1+980 y colocación de pavimento rígido en un paño de 3.25 metros de ancho desde la abscisa 1+180-1+984.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>07/09/2015 - 03:43 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se solicitado la contratación de la fiscalización debido a que el MTOP de la Dirección Provincial del Azuay no cuenta con el personal especializado para dichos trabajos. Se han mantenido reunidos de coordinación con el GAD Municipal de Cuenca a fin de solventar varias inquietudes con respecto a los diseños originales del proyecto. Se ha solicitado mediante oficios al Consorcio CCECC que cumpla con lo estipulado en el contrato en lo referente a personal, maquinaria y especificaciones técnicas		
JULIO 2015: Con fecha 15 de julio de 2015, se entrega el anticipo al Consorcio CCECC. El Consorcio se encuentra realizando trabajos preliminares.	Alvarez Ordoñez, Cecilia	07/08/2015 - 02:41 PM
JUNIO 2015: El Consorcio se encuentra realizando trabajos preliminares, previo a la entrega del anticipo.	Alvarez Ordoñez, Cecilia	07/08/2015 - 02:41 PM
MAYO 2015: Se firmó el contrato con el Consorcio CCECC conformado por la comapanía pública China Civil Engineering Construccion Corporation y la Compañía Verdu S.A, se está a la espera de la entrega del anticipo por parte de Administración Central. El Consorcio se encuentra realizando trabajos preliminares	Alvarez Ordoñez, Cecilia	24/06/2015 - 11:05 AM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS	04/06/2018	Juan Carlos Guamán Vicuña	100	100	100	0/0

Problemas cerrados: 6, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1- INTERNACIONAL.Económico. FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS	05/06/2018	Leonardo Bolívar Albán Tinoco	100 %	100	100	0/1

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Azuay > Cuenca

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANIFICACIÓN: Dictamen de prioridad SENPLADES	9-Entregables Formales	20/07/2012		20/07/2012		Sí	5.0
2	PLANIFICACIÓN: Programación presupuestaria original	9-Entregables Formales	18/06/2015		18/06/2015		Sí	5.0
3	Ejecución: Obras Hidrosanitarias T1 1+140-3+000	4-Inicio de Trabajo	31/07/2015		31/07/2015		Sí	2.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
4	Ejecución: Pavimento Rígido f'c=300kg/cm2 T1 1+140-3+000	4-Inicio de Trabajo	31/08/2015		31/08/2015		Sí	2.5
5	Ejecución: Obras Hidrosanitarias T2 3+200-6+250	4-Inicio de Trabajo	30/11/2015		30/11/2015		Sí	7.5
6	EJECUCIÓN: Movimiento de Tierras T1 1+140-3+000	4-Inicio de Trabajo	31/12/2015		31/12/2015		Sí	7.5
7	EJECUCIÓN: Movimiento de Tierras T2 3+200-6+250	4-Inicio de Trabajo	31/12/2015		31/12/2015		Sí	5.0
8	EJECUCIÓN: Muros T1 1+140-3+000	4-Inicio de Trabajo	28/02/2016		30/04/2016		Sí	5.0
9	Ejecución: Rubros Telefónicos T1 1+140-3+000	4-Inicio de Trabajo	30/04/2016		30/04/2016		Sí	10.0
10	Ejecución: Rubros Telefónicos T2 3+200-6+250	4-Inicio de Trabajo	30/04/2016		30/04/2016		Sí	5.0
11	Ejecución: Pavimento Rígido f'c=300kg/cm2 T2 3+200-6+250	4-Inicio de Trabajo	31/05/2016		31/05/2016		Sí	5.0
12	Ejecución: Impactos Ambientales y Señalización	4-Inicio de Trabajo	30/06/2016		31/12/2016		Sí	5.0
13	Ejecución: Muros T2 3+200-6+250	4-Inicio de Trabajo	30/06/2016		31/12/2016		Sí	5.0
14	Ejecución: Rubros Eléctricos T1 1+140-3+000	4-Inicio de Trabajo	30/06/2016		30/11/2016		Sí	5.0
15	Ejecución: Rubros Eléctricos T2 3+200-6+250	4-Inicio de Trabajo	30/06/2016		30/11/2016		Sí	5.0
16	Ejecución: Veredas y Arborización	4-Inicio de Trabajo	30/06/2016		31/01/2017		Sí	5.0
17	Cierre: Acta Recepción Provisional de Obra	5-Entregables Intermedios	30/11/2016	14/09/2018			No	5.0
18	Cierre: Liquidación Económica	5-Entregables Intermedios	30/12/2016	29/11/2018			No	5.0
19	Completado: Acta de Recepción Definitiva	5-Entregables Intermedios	31/12/2016	31/12/2018			No	5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance físico de obra		16.98 %	6.83	1.16	01/01/2015	Mayo


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	6,019,602.51
Estimado Al Fin Del Proyecto:	20,000,122.90 **
Costo Total:	31,924,625.54
Total Devengado:	20,605,256.82
% Costo Total Devengado:	64.54 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 64.54 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	26,467,107.46	0.00	0.00	26,467,107.46
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	13,251,823.37	5,839,431.57	0.00	19,091,254.94
Ppto. Codificado	23,436,784.67	7,450,826.51	0.00	30,887,611.18
Ppto. Comprometido	20,331,297.96	605,133.92	0.00	20,936,431.88
Planeado - Codificado (2018)		-7,450,826.51		
Programado a Devengar	28,240,382.46	0.00	0.00	28,240,382.46
Ppto. Devengado	20,000,122.90	605,133.92	0.00	20,605,256.82
Pagado Real	15,955,132.10	594,580.37	0.00	16,549,712.47
Estimado a fin de año	* 20,000,122.90	0.00	0.00	20,000,122.90
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	8,240,259.56	0.00	0.00	8,240,259.56
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 70.82 %	-	0.00 %	72.96 %
Ppto. Codificado 998	3,314,833.46	1,611,394.94	0.00	4,926,228.40
Ppto. Devengado 998	2,999,711.63	220,819.79	0.00	3,220,531.42

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

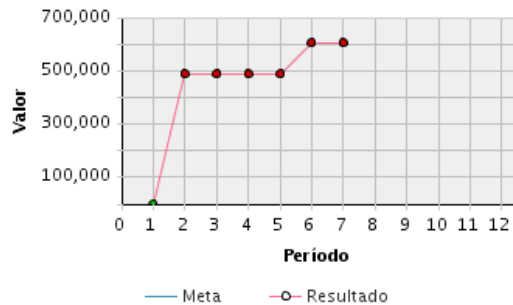

Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	100.00 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	489,233.97	0.00	489,233.97	115.00 %		115.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	489,233.97	115.00 %		115.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	489,233.97	115.00 %		115.00 %
May	0.00	0.00	0.00	489,233.97	115.00 %		115.00 %
Jun	0.00	115,899.95	0.00	605,133.92	115.00 %		115.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	605,133.92	115.00 %		115.00 %
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00	605,133.92					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
13	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
14	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
16	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ACTA DE LA COMISIO ESPECIAL 451(28 JUNIO DE 2017)	ACTA_451_(28_DE_JUNIO_DE_2017).pdf	05/09/2017
2	ACTA DE LA COMISIO ESPECIAL 451(7 FEBRERO DE 2017)	ACTA_COMISION_451_C.C.E.C.C(7_FEBRERO_DE_2017).pdf	05/09/2017
3	ACTA DE LA COMISION ESPECIAL 451 (20 NOVIEMBRE 2017)	ACTA_451_(20_NOVIEMBRE_2017).pdf	02/01/2018
4	ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIORIDAD - INCREMENTO TECHO PRESUPUESTARIO	2012-SENPLADES-SGPBV-2016-0340-OF_02_JUL_2016.pdf	05/08/2016
5	ANEXO 1 - Actualización Prioridad	anexo_1_oficio_nro_mcpec-desp-2016-1453-o_vf.pdf	05/08/2016
6	ANEXO 2 - Actualización Prioridad	anexo_2_correo_electrónico_vf.pdf	05/08/2016
7	ANEXO 3 - Actualización Prioridad	anexo_3_matriz_resumen_de_contrato_vf.pdf	05/08/2016
8	ANEXO 4 - Actualización Prioridad	anexo_4_matriz_programación_de_desembolso_vf.pdf	05/08/2016
9	ANEXO 5 - Actualización Prioridad	anexo_5_dictamen_de_prioridad_vf.pdf	05/08/2016
10	ANEXO 6 - Actualización Prioridad	anexo_6_informe_dpip-2016-061_vf.pdf	05/08/2016
11	ANEXO 7 - Actualización Prioridad	anexo_7_informe_dpi-it-0387-2016_vf.pdf	05/08/2016
12	ANEXO 8 - Actualización Prioridad	anexo_8_cuadro_dictamen_favorable_vf.pdf	05/08/2016
13	Aprobación Reprogramación Proyectos	Aprobación_Reprogramacion_Proyecto.xlsx	05/08/2016
14	Contrato Complementario	contrato_compl_02-06-2015.pdf	12/08/2015
15	CONTRATO COMPLEMENTARIO 4(17 marzo de 2017)	CONTRATO_CC4(17_de_marzo_de_2017).pdf	05/06/2017
16	CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 5	Contrato_Complementario_No_5(15_de_febrero_de_2018).pdf	05/03/2018
17	Contrato Complementario Nro. 2 (2015-05-04)	contrato_complementario_Nro_2(4_de_mayo_de_2016).pdf	16/05/2016
18	CONTRATO COMPLEMENTARIO NRO. 3 (15/09/2016)	CONTRATO_COMPLEMENTARIOS_3_(donde_se_incluye_fo211022016linomicas).pdf	02/10/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
19	contrato modificatorio-16-10-2015	Contrato_Modificatorio_1._16-10-2015.pdf	04/11/2015
20	Contrato Original	CONTRATO_ORIGINAL.pdf	24/06/2015
21	Convenio GAD Cuenca - Respaldos Transferencias realizadas para pago de indemnizaciones	CONVENIO_GAD_CUENCA_O.LASSO.pdf	13/08/2015
22	Cronograma	CRONOGRAMA_VALORADO_SENPLADES.XLSX	24/06/2015
23	Cronograma de Obra	Cronogramas_de_oferta_Av._Ordoñez_Lazo.xlsx	07/09/2015
24	DICTAMEN DE PRIORIDAD	DICTAMEN_PRIORIDAD.pdf	24/06/2015
25	Ficha de Proyecto	Ficha_Proyecto_SENPLADES.pdf	24/06/2015
26	Formato SENPLADES	FORMATO_SENPLADES.DOCX	24/06/2015
27	INFORME DE FISCALIZACION 20 (FEB2017)	Informe_de_Fiscalizacion_FEB_2017.pdf	05/06/2017
28	INFORME DE FISCALIZACION 21 (MARZO2017)	Informe_de_Fiscalizacion_MAR_2017.pdf	05/06/2017
29	INFORME DE FISCALIZACION 22 ABRIL DE 2017	Informe_de_Fiscalizacion_ABRIL_2017.pdf	05/06/2017
30	INFORME DE FISCALIZACION 23 (MAYO2017)	Informe_de_Fiscalizacion_MAYO_2017_signed.pdf	03/07/2017
31	INFORME DE FISCALIZACION 24 (JUNIO 2017)	Informe_Fiscalización_No._24(JUNIO_2017).pdf	01/08/2017
32	INFORME DE FISCALIZACION 28 (OCTUBRE 2017)	INF_FISCALIZACION_No._28_O.LASSO..pdf	30/11/2017
33	INFORME DE FISCALIZACION 29 (NOVIEMBRE 2017)	INFORME_DE_FISCALIZACION_NOVIEMBRE.pdf	02/01/2018
34	INFORME DE FISCALIZACION 30 (DICIEMBRE 2017)	Informe_de_Fiscalizacion_DICIEMBRE_2017(firmas).pdf	02/02/2018
35	INFORME DE FISCALIZACION 31 (ENERO 2018)	INF_FISCALIZACION_No._31_O.LASSO..pdf	05/03/2018
36	INFORME DE FISCALIZACION 32 (FEBRERO 2018)	INF_FISCALIZACION_No._32_O.LASSO..pdf	22/03/2018
37	INFORME DE FISCALIZACION 33 (MARZO 2018)	Informe_de_Fiscalizacion_MARZO_-2018_FIRMAS.pdf	02/05/2018
38	INFORME DE FISCALIZACION 34 (ABRIL 2018)	INFORME_DE_FISCALIZACION_ABRIL_2018.pdf	04/06/2018
39	INFORME DE FISCALIZACIÓN 10 ABRIL 2016	INF_FISCALIZACION_No_10_O.LASSO.pdf	03/12/2016
40	INFORME DE FISCALIZACIÓN 11 MAYOL 2016	INF_FISCALIZACION_No_11_O.LASSO.pdf	03/12/2016
41	INFORME DE FISCALIZACIÓN 12 JUNIO 2016	INF_FISCALIZACION_No_12_O.LASSO.pdf	03/12/2016
42	INFORME DE FISCALIZACIÓN 13 JULIO 2016	INF_FISCALIZACION_No_13_O.LASSO.pdf	03/12/2016
43	INFORME DE FISCALIZACIÓN 14 AGOSTO 2016	INF_FISCALIZACION_No_14_O.LASSO.pdf	03/12/2016
44	INFORME DE FISCALIZACIÓN 15 SEPTIEMBRE 2016	INF_FISCALIZACION_No_15_O.LASSO.pdf	03/12/2016
45	INFORME DE FISCALIZACIÓN 16 OCTUBRE 2016	INF_FISCALIZACION_No_16_O.LASSO.pdf	03/12/2016
46	INFORME DE FISCALIZACIÓN 17 NOVIEMBRE 2016	Informe_de_Fiscalizacion_NOV2016.pdf	16/02/2017
47	INFORME DE FISCALIZACIÓN 18 DICIEMBRE 2016	Informe_de_Fiscalizacion_DIC_2016.pdf	16/02/2017
48	INFORME DE FISCALIZACIÓN 19 ENERO 2017	Informe_de_Fiscalizacion_ENE_2017.pdf	04/04/2017
49	INFORME DE FISCALIZACIÓN 2 AGOSTO 2015	INF_FISCALIZACION_No_02_O.LASSO.pdf	02/12/2016
50	INFORME DE FISCALIZACIÓN 3 SEPTIEMBRE 2015	INF_FISCALIZACION_No_03_O.LASSO.pdf	02/12/2016
51	INFORME DE FISCALIZACIÓN 4 OCTUBRE 2015	INF_FISCALIZACION_No_04_O.LASSO.pdf	02/12/2016
52	INFORME DE FISCALIZACIÓN 5 NOVIEMBRE 2015	INF_FISCALIZACION_No_05_O.LASSO.pdf	02/12/2016
53	INFORME DE FISCALIZACIÓN 6 DICIEMBRE 2015	INF_FISCALIZACION_No_06_O.LASSO.pdf	02/12/2016
54	INFORME DE FISCALIZACIÓN 7 ENERO 2016	INF_FISCALIZACION_No_07_O.LASSO.pdf	02/12/2016
55	INFORME DE FISCALIZACIÓN 8 FEBRERO 2016	INF_FISCALIZACION_No_08_O.LASSO.pdf	03/12/2016
56	INFORME DE FISCALIZACIÓN 9 MARZO 2016	INF_FISCALIZACION_No_09_O.LASSO.pdf	03/12/2016
57	Informe ejecutivo sitop mayo2016	Informe_Ejecutivo_mayo2016.pdf	06/06/2016
58	Informe ejecutivo abril2017	Informe_ejecutivo_abril2017.pdf	04/05/2017
59	Informe Ejecutivo Agosto 2015	Informe_SITOP_Agosto_2015_- Av._Ordoñez_Lazo.pdf	07/09/2015
60	Informe ejecutivo agosto 2017	SITOP_Informe_Ejecutivo_agosto_2017_(Av._Ordoñez_Lazo).pdf	05/09/2017
61	Informe ejecutivo agosto2016	Informe_Ejecutivo_agosto2016.pdf	05/09/2016
62	INFORME EJECUTIVO DE AV. O LASSO NOVIEMBRE-2015	informejecutivoNoviembre-2015.pdf	02/12/2015
63	Informe Ejecutivo del mes septiembre_2015	INFORME._E_SEPTIEMBRE_O.L.pdf	07/10/2015
64	Informe Ejecutivo enero2017	Informe_ejecutivo_enero2017.pdf	06/02/2017
65	Informe ejecutivo febrero2017	Informe_ejecutivo_febrero2017.pdf	01/03/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
66	INFORME EJECUTIVO JULIO 2017	SITOP_Informe_Ejecutivo_Julio_2017_(Av._Ordoñez_Lasso).pdf	03/08/2017
67	Informe ejecutivo julio2016	Informe_Ejecutivo_julio2016.pdf	03/08/2016
68	Informe ejecutivo junio2017	Informe_ejecutivo_junio2017.pdf	03/07/2017
69	Informe ejecutivo mayo2017	Informe_ejecutivo_mayo2017.pdf	05/06/2017
70	Informe ejecutivo noviembre 2016	Informe_Ejecutivo_noviembre_16.pdf	03/12/2016
71	Informe ejecutivo octubre2016	Informe_Ejecutivo_octubre16.pdf	01/11/2016
72	Informe ejecutivo octubre2017	InformeEjecOctubre2017.pdf	01/11/2017
73	Informe ejecutivo septiembre 2017	InformeEjecSeptiembre2017.pdf	03/10/2017
74	Informe ejecutivo septiembre2016	Informe_Ejecutivo_septiembre16.pdf	01/11/2016
75	INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2018	InformeEjecAbril2018.pdf	02/05/2018
76	Informe Ejecutivo Sitop abril2016	Informe_Ejecutivo_abril2016.pdf	05/05/2016
77	Informe Ejecutivo Sitop diciembre 2016	Informe_Ejecutivo_diciembre_16.pdf	03/01/2017
78	INFORME EJECUTIVO SITOP DICIEMBRE 2017	InformeEjecDiciembre2017.pdf	02/01/2018
79	Informe ejecutivo Sitop Diciembre2015	Informe_Ejecutivo_diciembre2015.pdf	11/01/2016
80	INFORME EJECUTIVO SITOP ENERO 2018	InformeEjecEnero2018.pdf	02/02/2018
81	INFORME EJECUTIVO SITOP FEBRERO 2018	InformeEjecFebrero2018.pdf	05/03/2018
82	Informe Ejecutivo Sitop Febrero2016	Informe_Ejecutivo_febrero2016.pdf	01/03/2016
83	Informe Ejecutivo Sitop marzo 2017	Informe_ejecutivo_marzo2017.pdf	04/04/2017
84	INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2018	InformeEjecMarzo2018.pdf	03/04/2018
85	Informe Ejecutivo Sitop marzo2016	Informe_Ejecutivo_marzo2016.pdf	04/04/2016
86	INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2018	InformeEjecMayo2018.pdf	04/06/2018
87	INFORME EJECUTIVO SITOP NOVIEMBRE2017	InformeEjecNoviembre2017.pdf	01/12/2017
88	Informe ejecutivo sitop, Julio 2015	Informe_Ejecutivo_Sitop_julio2015.pdf	04/11/2015
89	Informe ejecutivo sitop, Junio 2015	Informe_Ejecutivo_Sitop_junio2015.pdf	04/11/2015
90	Informe ejecutivo sitop, Octubre 2015	Informe_Ejecutivo_Sitop_octubre2015.pdf	04/11/2015
91	INFORME FISCALIZACION No.25 (JULIO 2017)	INF_FISCALIZACION_No_25_O.LASSO..pdf	05/09/2017
92	INFORME FISCALIZACION No.26 (AGOSTO 2017)	Informe_de_Fiscalizacion_AGOSTO-2017(firmas).pdf	03/10/2017
93	INFORME FISCALIZACION No.27 (SEPTIEMBRE 2017)	INFORME_DE_FISCALIZACION_No_27_SEPTIEMBRE_2017.pdf	03/11/2017
94	informe sitop enero2016	Informe_Ejecutivo_enero2016.pdf	03/02/2016
95	InformeEjecutivo_junio2016	Informe_Ejecutivo_junio2016.pdf	04/07/2016
96	Oficio Aprobación Reprogramación	2016_06_13_MTOP-DDAZ-2016-000190-OF.pdf	05/08/2016
97	ORDEN DE CAMBIO 3 (amplia el plazo hasta 28 de febrero de 2018)	ORDEN_DE_CAMBIO_No._3.pdf	03/10/2017
98	Orden de Cambio Nro. 1 (ampliación de plazo hasta el 31 de diciembre de 2016)	ORDEN_DE_CAMBIO_No._1_CCECC.pdf	03/12/2016
99	ORDEN DE CAMBIO Nro. 2 (amplia el plazo hasta 30 enero de 2017)	ORDEN_DE_CAMBIO_NO.02.pdf	16/02/2017
100	PLANILLA 1	SABANA_PLANILLA_1.pdf	02/12/2016
101	PLANILLA 1 CC1	PLANILLA_No1_CC_1(1).pdf	02/12/2016
102	PLANILLA 10	SABANA_PLANILLA_10_.pdf	02/12/2016
103	PLANILLA 11	SABANA_PLANILLA_11.pdf	02/12/2016
104	PLANILLA 12	SABANA_PLANILLA_12.pdf	02/12/2016
105	PLANILLA 13	SABANA_PLANILLA_13.pdf	02/12/2016
106	PLANILLA 14	SABANA_PLANILLA_14.pdf	02/12/2016
107	PLANILLA 15	SABANA_PLANILLA_15.pdf	02/12/2016
108	PLANILLA 16	SABANA_PLANILLA_16.pdf	02/12/2016
109	PLANILLA 17	SABANA_PLANILLA_17.pdf	16/02/2017
110	PLANILLA 18	SABANA_PLANILLA_18.pdf	28/03/2017
111	PLANILLA 19	SABANA_PLANILLA_19.pdf	28/03/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
112	PLANILLA 2	SABANA_PLANILLA_2.pdf	02/12/2016
113	PLANILLA 20	SABANA_PLANILLA_20.pdf	05/06/2017
114	PLANILLA 21	SABANA_PLANILLA_21.pdf	05/06/2017
115	PLANILLA 22	SABANA_PLANILLA_22.pdf	01/08/2017
116	PLANILLA 22A	SABANA_PLANILLA_22A.pdf	01/08/2017
117	PLANILLA 23	SABANA_PLANILLA_23.pdf	05/09/2017
118	PLANILLA 24	SABANA_PLANILLA_24.pdf	03/10/2017
119	PLANILLA 25	SABANA_PLANILLA_25.pdf	01/11/2017
120	PLANILLA 26	SABANA_PLANILLA_26.pdf	14/11/2017
121	PLANILLA 27	SABANA_PLANILLA_27.pdf	30/11/2017
122	PLANILLA 28	SABANA_PLANILLA_28.pdf	05/03/2018
123	PLANILLA 29	SABANA_PLANILLA_29.pdf	22/03/2018
124	PLANILLA 3	SABANA_PLANILLA_3.pdf	02/12/2016
125	PLANILLA 30	SABANA_PLANILLA_30.pdf	27/03/2018
126	PLANILLA 31	SABANA_PLANILLA_31.pdf	04/05/2018
127	PLANILLA 32	SABANA_PLANILLA_32.pdf	04/06/2018
128	PLANILLA 33	SABANA_PLANILLA_33.pdf	25/06/2018
129	PLANILLA 4	SABANA_PLANILLA_4.pdf	02/12/2016
130	PLANILLA 5	SABANA_PLANILLA_5.pdf	02/12/2016
131	PLANILLA 6	SABANA_PLANILLA_6.pdf	02/12/2016
132	PLANILLA 7	SABANA_PLANILLA_7.pdf	02/12/2016
133	PLANILLA 8	SABANA_PLANILLA_8.pdf	02/12/2016
134	PLANILLA 9	SABANA_PLANILLA_9.pdf	02/12/2016
135	reprogramacion 1	Reprogramacion_definitiva.xlsx	03/02/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	Administrador	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Azuay	lalban@mtop.gob.ec	
Guamán Vicuña, Juan Carlos	Lider del proyecto	Experto en Infraestructura Provincial	jguaman@mtop.gob.ec	023974600
Quezada Jara, Mónica Fabiola	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretaria Zonal 6	mquezada@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
97440_1.jpg	04/06/2018
