

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 4
Dirección Provincial Manabí

PROYECTO: K072 MTOP- Reconstrucción y Rehabilitación en Pavimento Rígido de varias calles del cantón Portoviejo, Provincia de Manabí (Grupo 8)

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Líder del Proyecto: | Vera Vera, José Ricardo (jrvera@mtop.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Herrera Falcones, José Ricardo | Programas Relacionados: | Provincia - Manabí, RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO UBICADO EN LA PROVINCIA DE, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD |
| Titular: | Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 175200000.0000.372597 | TIR: | 7.04 % |
| Objetivos Operativos: | 4 | VAN: | 334,196.59 |
| Viabilidad Técnica: | Alta | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 2,348,504.93 |
| Localidad de Gestión: | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 06/06/2013 - 30/12/2017 |
| Fecha de última actualización: | 12/10/2017 | Fecha de Fin Base: | 27/09/2014 |
| Modificado por: | Molina Ormaza, Carlos Ignacio | Fecha del siguiente Hito: | |

DATOS GENERALES

Descripción

Monto incluye fiscalización: \$ 1'577,702.51 USD (Incluye incremento de obra).
 Contratista: Compañía CUCED S.A., representante legal Econ. Ligia Maribel Cuadro Loor.
 Fiscalizador: Ing. Gabriel Choez, Fiscalización contratada.

DESCRIPCIÓN: "Reconstrucción y rehabilitación en pavimento rígido de varias calles del cantón Portoviejo, Provincia de Manabí: Coronel Sabando entre Francisco de P. Moreira y César Chavez, longitud=300m, calle 12 de Marzo desde puente Jaime Roldos Hasta avenida Guayaquil, longitud 585m. (Grupo 8).

LINEA BASE: Las calles y avenidas del Cantón Portoviejo; la mayoría de estas forman parte de la ciudad de Portoviejo y se conectan con las otras parroquias urbanas como son la 12 de Marzo, Andrés de Vera y Picoaza; parroquias que son el eje productivo del Cantón Portoviejo.
 Siendo la ciudad de Portoviejo la Capital de la Provincia de Manabí el sector económico y burocrático gira en su entorno.
 Los diferentes aspectos demográficos de la población de influencia directa del proyecto se resumen en los siguientes contenidos, cuyos datos fueron tomados del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el INEC.

PRODUCTO: Reconstrucción y Rehabilitación en Pavimento Rígido de varias calles del Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, (grupo 8)

OBJETIVO GENERAL: El Objetivo central del presente proyecto consiste en ejecutar la Reconstrucción, Rehabilitación y Fiscalización de varias calles del Cantón Portoviejo, ubicado en la Provincia de Manabí, mejorando con esto la movilidad, fluidez y seguridad del tráfico vehicular y peatonal, el ornato y entorno de las zonas intervenidas, contribuyendo de esta forma a incrementar la calidad de vida de sus habitantes y transeúntes de las zonas servidas por la nueva infraestructura.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Ejecutar el sub programa de rehabilitación y reconstrucción de algunas calles y avenidas con estructura con pavimento rígido y flexible con carpeta asfáltica de 3" en la ciudad de Portoviejo, mejorando con esto la movilidad, fluidez y seguridad del tráfico vehicular y peatonal, el ornato y entorno de las zonas intervenidas.

Beneficios Cualitativos


Mejora en el flujo vehicular.
 Incrementa el comercio

| |
|--|
| Tipo de Beneficiario |
| Moradores del sector, usuarios de la via en general. |
| Restricciones |
| Tiempo.- La obra debe culminar en 150 dias contados a partir de la entrega del anticipo (30/09/2013 hasta 27/02/2014) Costo.- El monto para la ejecución de la obra es de 957337.71 dolares. Calidad.- Los materiales empleados por el contratista deben cumplir con las normas y especificaciones establecidas. |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--------|-------------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--------|-------------------|-----------|-----------|

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 06/06/2013 Fecha de Fin: 30/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2017 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------|-------------------------------|
| ENERO - DICIEMBRE 2016.- Terminado con recepción definitiva. | Vera Vera, José Ricardo | 17/05/2017 - 10:12 AM |
| ENERO - ABRIL 2017.- Terminado con recepción definitiva. | | |
| Septiembre de 2015.- El proyecto está terminado al 100%, recibida con acta de recepción definitiva el 03 de agosto de 2015. | Vera Vera, José Ricardo | 06/10/2015 - 03:22 PM |
| Agosto de 2015.- El proyecto está terminado al 100%, recibida con acta de recepción definitiva el 03 de agosto de 2015. | Vera Vera, José Ricardo | 07/09/2015 - 12:29 PM |
| Julio de 2015.- El proyecto está terminado al 100%, recibida con acta de recepción provisional el 26 de junio de 2014, en tramite recepción definitiva. | Vera Vera, José Ricardo | 05/08/2015 - 10:32 AM |
| Junio de 2015.- El proyecto está terminado al 100%, recibida con acta de recepción provisional el 26 de junio de 2014, en tramite recepción definitiva. | Vera Vera, José Ricardo | 07/07/2015 - 09:06 AM |
| Mayo de 2015.- El proyecto está terminado al 100%, recibida con acta de recepción provisional el 26 de junio de 2014, en tramite recepción definitiva. | Vera Vera, José Ricardo | 02/06/2015 - 09:44 AM |
| Abril de 2015.- El proyecto está terminado al 100%, recibida con acta de recepción provisional el 26 de junio de 2014, el contratista solicita la recepción definitiva de los trabajos una vez que se cumplió el periodo de prueba, en tramite planilla de liquidación de reajuste. | Vera Vera, José Ricardo | 07/05/2015 - 10:33 AM |
| Marzo de 2015.- El proyecto está terminado al 100%, recibida con acta de recepción provisional el 26 de junio de 2014, el contratista solicita la recepción definitiva de los trabajos una vez que se cumplió el periodo de prueba, en tramite planilla de liquidación de reajuste. | Vera Vera, José Ricardo | 06/04/2015 - 10:32 AM |
| Febrero de 2015.- El proyecto está terminado al 100%, recibida con acta de recepción provisional el 26 de junio de 2014, el contratista solicita la recepción definitiva de los trabajos una vez que | Vera Vera, José Ricardo | 28/02/2015 - 08:37 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------|-------------------------------|
| se cumplió el periodo de prueba, en base a lo informado por la fiscalización este pedido fue rechazado hasta que el contratista resuelva los inconvenientes indicados por la fiscalización, se espera recibir los trabajos previo informe favorable de la fiscalización contratada. | | |
| Enero de 2015.- El proyecto está terminado al 100%, recibida con acta de recepción provisional el 26 de junio de 2014, el contratista solicita la recepción definitiva de los trabajos una vez que se cumplió el periodo de prueba, en base a lo informado por la fiscalización este pedido fue rechazado hasta que el contratista resuelva los inconvenientes indicados por la fiscalización, se espera recibir los trabajos previo informe favorable de la fiscalización contratada. | Vera Vera, José Ricardo | 30/01/2015 - 11:22 AM |
| Diciembre de 2014.- El proyecto está terminado al 100%, recibida con acta de recepción provisional el 26 de junio de 2014, el contratista solicita la recepción definitiva de los trabajos una vez que se cumplió el periodo de prueba, en base a lo informado por la fiscalización este pedido fue rechazado hasta que el contratista resuelva los inconvenientes indicados por la fiscalización, se espera recibir los trabajos previo informe favorable de la fiscalización contratada. | Vera Vera, José Ricardo | 30/01/2015 - 11:21 AM |
| Diciembre de 2014.- El proyecto está terminado al 100%, recibida con acta de recepción provisional el 26 de junio de 2014, el contratista solicita la recepción definitiva de los trabajos una vez que se cumplió el periodo de prueba, en base a lo informado por la fiscalización este pedido fue rechazado hasta que el contratista resuelva los inconvenientes indicados por la fiscalización, se espera recibir los trabajos el 31 de enero de 2015. | Vera Vera, José Ricardo | 07/01/2015 - 08:52 AM |
| Diciembre de 2014.- El proyecto está terminado al 100%, recibida con acta de recepción provisional el 26 de junio de 2014, el contratista solicita la recepción definitiva de los trabajos una vez que se cumplió el periodo de prueba, en base a lo informado por la fiscalización este pedido fue rechazado hasta que el contratista resuelva los inconvenientes indicados por la fiscalización. | Vera Vera, José Ricardo | 07/01/2015 - 08:13 AM |
| Noviembre de 2014.- El proyecto está terminado al 100%, recibida con acta de recepción provisional el 26 de junio de 2014, actualmente en periodo de prueba previo a la recepción definitiva estimada para enero de 2015. | Vera Vera, José Ricardo | 01/12/2014 - 09:00 AM |
| Octubre de 2014.- El proyecto está terminado al 100%, recibida con acta de recepción provisional el 26 de junio de 2014, actualmente en periodo de prueba previo a la recepción definitiva estimada para enero de 2015. | Vera Vera, José Ricardo | 05/11/2014 - 11:34 AM |
| Septiembre 2014.- Obra culminada, recepción provisional en trámite. | Vera Vera, José Ricardo | 06/10/2014 - 02:30 PM |
| Agosto 2014.- Obra culminada, recepción provisional en trámite. | Vera Vera, José Ricardo | 02/09/2014 - 10:15 AM |
| Julio 2014.- Obra culminada, recepción provisional en trámite. | Vera Vera, José Ricardo | 07/08/2014 - 10:00 AM |
| Junio 2014.- Obra culminada, existen planillas en trámite. Se aprueba orden de cambio con un monto de 151,425.04 \$ y contrato complementario de 312,566.27 \$ incluye ampliación de plazo por 60 días hasta el 28/04/2014. | Vera Vera, José Ricardo | 02/07/2014 - 03:18 PM |
| Mayo 2014.- Obra culminada, existen planillas en trámite. Se aprueba orden de cambio con un monto de 151,425.04 \$ y contrato complementario de 312,566.27 \$ incluye ampliación de plazo por 60 días(28/04/2014). | Vera Vera, José Ricardo | 05/06/2014 - 04:30 PM |
| Abril 2014.- Se realizan trabajos para instalar las tuberías para el futuro soterramiento de los cables eléctricos y telefónicos, se funde aceras y bordillos, señalización horizontal y vertical. Obra terminada. Se aprueba orden de cambio con un monto de 151,425.04 \$ y contrato complementario de 312,566.27 \$ incluye ampliación de plazo por 60 días(28/04/2014). | Vera Vera, José Ricardo | 05/05/2014 - 10:49 AM |
| Marzo 2014.- En ambas calles se realiza la fundición de la calzada de Pavimento Rígido, los trabajos incluyen la preparación de la superficie del pavimento y la conformación de las juntas simuladas y la colocación del antisol o curador superficial, fundición de bordillos cintagotera en ambas calles. Con fecha del 10 de Enero del 2014 con la contratista Cuced SA solicita a la fiscalización del Proyecto una Orden de Cambio por incrementos de cantidades y un Contrato Complementario para la ejecución de Rubros nuevos con un plazo de 60 días adicionales, los mismos que están en proceso de revisión y aprobación. | Vera Vera, José Ricardo | 14/04/2014 - 02:08 PM |
| Febrero 2014.- En ambas calles se realiza la fundición de la calzada de Pavimento Rígido, los trabajos incluyen la preparación de la superficie del pavimento y la conformación de las juntas simuladas y la colocación del antisol o curador superficial, fundición de bordillos cintagotera en ambas calles. Con fecha del 10 de Enero del 2014 con la contratista Cuced SA solicita a la fiscalización del Proyecto una Orden de Cambio por incrementos de cantidades y un Contrato Complementario para la ejecución de Rubros nuevos con un plazo de 60 días adicionales, los mismos que están en proceso de revisión y aprobación. | Vera Vera, José Ricardo | 28/02/2014 - 02:55 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------|-------------------------------|
| Enero 2014.- En ambas calles se realiza la fundición de la calzada de Pavimento Rígido, los trabajos incluyen la preparación de la superficie del pavimento y la conformación de las juntas simuladas y la colocación del antisol o curador superficial. Con fecha del 10 de Enero del 2014 con la contratista Cuced SA solicita a la fiscalización del Proyecto una Orden de Cambio por incrementos de cantidades y un Contrato Complementario para la ejecución de Rubros nuevos con un plazo de 60 días adicionales, los mismos que están en proceso de revisión y aprobación. | Vera Vera, José Ricardo | 03/02/2014 - 11:18 AM |
| Diciembre 2013.- Colocación de pavimento rígido, colocación de tapas de alcantarillado pluvial y aguas servidas. | Vera Vera, José Ricardo | 03/02/2014 - 11:09 AM |
| Noviembre 2013.- Transporte tendido hidratación y compactación de material filtrante y sub base clase 3, instalación de guías domiciliarias para agua potable, Reparación de tuberías AAPP, limpieza y desalojo de material excavado. | Vera Vera, José Ricardo | 02/12/2013 - 10:36 AM |
| Octubre 2013.- Se realiza excavación en suelo en ambas calles, Desalojo de material excavado, señalización preventiva, Excavación para subdren, Colocación de material filtrante. | Vera Vera, José Ricardo | 04/11/2013 - 03:51 PM |
| Septiembre 2013.- La contratista recibe el anticipo y se inician los trabajos el 30 de septiembre del 2013 con el replanteo y la nivelación de las calles previo inicio de excavaciones. | Vera Vera, José Ricardo | 04/10/2013 - 02:27 PM |

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|---|
| 1 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Portoviejo |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | PLANEACIÓN: Adjudicación del contrato, adjudicado. | 3-Adjudicación | 19/07/2013 | | 19/07/2013 | | Sí | 1.0 |
| 2 | EJECUCIÓN: Inicio de trabajos, ejecutado. | 4-Inicio de Trabajo | 30/09/2013 | | 30/09/2013 | | Sí | 3.0 |
| 3 | PLANEACIÓN: Entrega del anticipo, entregado. | 9-Entregables Formales | 30/09/2013 | | 30/09/2013 | | Sí | 1.0 |
| 4 | EJECUCIÓN: Ejecución del 5 % de la obra acumulado, ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 10/11/2013 | | 06/11/2013 | | Sí | 5.0 |
| 5 | EJECUCIÓN: Ejecución del 25 % de la obra acumulado, ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 10/12/2013 | | 13/12/2013 | | Sí | 10.0 |
| 6 | EJECUCIÓN: Inicio de trabajos de hormigonado en pavimento en ambas calles, ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 15/12/2013 | | 15/12/2013 | | Sí | 8.0 |
| 7 | EJECUCIÓN: Ejecución del 45 % de la obra acumulado, ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 10/01/2014 | | 17/01/2014 | | Sí | 13.0 |
| 8 | EJECUCIÓN: Ejecución del 65 % de la obra acumulado, ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 10/02/2014 | | 10/02/2014 | | Sí | 18.0 |
| 9 | EJECUCIÓN: Firma contrato complementario, firmado. | 5-Entregables Intermedios | 27/02/2014 | | 27/02/2014 | | Sí | 5.0 |
| 10 | EJECUCIÓN: Rubros para el futuro soterramiento cables | 5-Entregables Intermedios | 27/02/2014 | | 27/02/2014 | | Sí | 10.0 |


HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| | eléctricos y telefónicos, ejecutado. | | | | | | | |
| 11 | EJECUCIÓN: Ejecución del 100 % de la obra acumulado, ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 10/03/2014 | | 28/04/2014 |  | Sí | 20.0 |
| 12 | CIERRE: Entrega provisional, firmada. | 5-Entregables Intermedios | 15/04/2014 | | 26/06/2014 |  | Sí | 2.0 |
| 13 | CIERRE: Liquidación de la obra, firmada. | 5-Entregables Intermedios | 27/09/2014 | | 27/12/2016 |  | Sí | 2.0 |
| 14 | COMPLETADO: Recepción definitiva, firmada. | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 27/09/2014 | | 03/08/2015 |  | Sí | 2.0 |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|---|---|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | SUPERVISION DE PROYECTO | Dueñas de la Torre, Susana Maria | {PR} - Provincia - MANABÍ | 28/08/2015 |
| 2 | Reconstruccion de calles de portoviejo en curso | Dueñas de la Torre, Susana Maria | {PR} - Provincia - MANABÍ | 28/05/2014 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---|---|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Numero de informes técnicos de control de obra. |  | - | - | - | 01/01/2017 | - |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado: | 304,886.31 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 2,348,504.93 ** |
| Costo Total: | 1,738,965.80 |
| Total Devengado: | 2,219,048.93 |
| % Costo Total Devengado: | 127.61 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 127.61 %

Perfil Económico 2017

| | Años Previos | Año Actual (2017) | Años Futuros | Total |
|---|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Ppto. Planeado | 1,464,157.18 | 129,456.00 | 0.00 | 1,593,613.18 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 2,749,645.92 | 0.00 | 0.00 | 2,749,645.92 |
| Ppto. Codificado | 2,497,966.36 | 0.00 | 0.00 | 2,497,966.36 |
| Ppto. Comprometido | 612,637.47 | 0.00 | 0.00 | 612,637.47 |
| Planeado - Codificado (2017) | | 129,456.00 | | |
| Programado a Devengar | 1,394,305.37 | 129,456.00 | 0.00 | 1,523,761.37 |
| Ppto. Devengado | 2,219,048.93 | 0.00 | 0.00 | 2,219,048.93 |
| Pagado Real | 608,214.20 | 0.00 | 0.00 | 608,214.20 |
| Estimado a fin de año | * 2,219,048.93 | 0.00 | 0.00 | 2,219,048.93 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | -824,743.56 | 129,456.00 | 0.00 | -695,287.56 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 159.15 % | 0.00 % | 0.00 % | 145.63 % |
| Ppto. Codificado 998 | 365,289.67 | 0.00 | 0.00 | 365,289.67 |
| Ppto. Devengado 998 | 365,289.67 | 0.00 | 0.00 | 365,289.67 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017

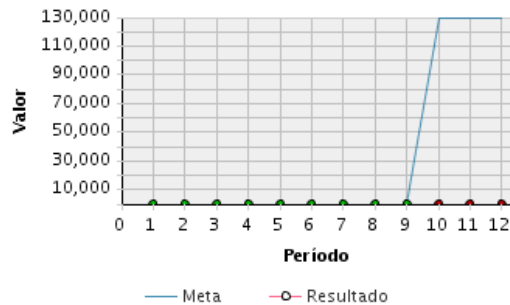

Presupuesto Mensual 2017

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | ● | 0.00 % |

| Presupuesto Mensual 2017 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| Abr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| Oct | 129,456.00 | 0.00 | 129,456.00 | 0.00 | 0.00 % | | 0.00 % |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 129,456.00 | 0.00 | 0.00 % | | 0.00 % |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 129,456.00 | 0.00 | 0.00 % | | 0.00 % |
| Total | 129,456.00 | 0.00 | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|--|
| 7 | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada |
| 8 | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos. |
| 10 | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo |
| 12 | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|-------------------------------|---------------|
| 1 | Contrato complementario. | B.2.pdf | 06/06/2014 |
| 2 | Contrato original. | A.1.pdf | 10/04/2014 |
| 3 | Informe ejecutivo SITOP abril 2014. | A.9.pdf | 12/05/2014 |
| 4 | Informe ejecutivo SITOP julio 2014. | B.4.pdf | 07/08/2014 |
| 5 | Informe Ejecutivo SITOP, marzo 2014. | A.8.pdf | 10/04/2014 |
| 6 | Informe Ejecutivo SITOP, diciembre 2013. | A.5.pdf | 10/04/2014 |
| 7 | Informe Ejecutivo SITOP, enero 2014. | A.6.pdf | 10/04/2014 |
| 8 | Informe Ejecutivo SITOP, febrero 2014. | A.7.pdf | 10/04/2014 |
| 9 | Informe Ejecutivo SITOP, junio 2014. | B.3.pdf | 02/07/2014 |
| 10 | Informe Ejecutivo SITOP, mayo 2014. | B.1.pdf | 06/06/2014 |
| 11 | Informe Ejecutivo SITOP, noviembre 2013. | A.4.pdf | 10/04/2014 |
| 12 | Informe Ejecutivo SITOP, octubre 2013. | A.3.pdf | 10/04/2014 |
| 13 | Informe Ejecutivo SITOP, septiembre 2013. | A.2.pdf | 10/04/2014 |
| 14 | R.1 - Informe ejecutivo SITOP mes de agosto de 2014. | B.5.pdf | 06/10/2014 |
| 15 | R.2 - Informe ejecutivo SITOP mes de septiembre de 2014. | B.6.pdf | 06/10/2014 |
| 16 | R.3- Acta de recepción provisional. | Acta_provisional_Grupo_8..pdf | 05/11/2014 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---|---------------|
| 17 | R.4- Informe ejecutivo del mes de octubre de 2014. | B.7.pdf | 05/11/2014 |
| 18 | R.5- Informe ejecutivo SITOP Noviembre 2014. | B.8.pdf | 01/12/2014 |
| 19 | R.6- Informe ejecutivo SITOP diciembre 2014. | B.9.pdf | 07/01/2015 |
| 20 | R.7- Informe ejecutivo SITOP enero 2015. | C.1.pdf | 30/01/2015 |
| 21 | R.8- Informe ejecutivo SITOP febrero 2015. | C.2.pdf | 04/03/2015 |
| 22 | R.9- Informe ejecutivo SITOP marzo 2015. | C.3.pdf | 06/04/2015 |
| 23 | S.1- Informe ejecutivo SITOP abril 2015. | C.4.pdf | 07/05/2015 |
| 24 | S.2- Informe ejecutivo SITOP mayo 2015. | C.5.pdf | 02/06/2015 |
| 25 | S.3- Informe ejecutivo SITOP junio 2015. | C.6.pdf | 07/07/2015 |
| 26 | S.4- Informe ejecutivo SITOP julio 2015. | C.7.pdf | 05/08/2015 |
| 27 | S.5- Informe ejecutivo SITOP agosto 2015. | C.8.pdf | 07/09/2015 |
| 28 | S.6 Acta definitiva | C.9.pdf | 07/09/2015 |
| 29 | S.7.- Prioridad Senplades. | Prioridad_Senplades_calles_de_Portoviejo..pdf | 14/09/2015 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|----------------------------|----------------------------|--|--------------------|-------------|
| Moreira Villanueva, Wilmer | Administrador del contrato | Supervisor de Construcciones de Manabí | salio@mtop.gob.ec | |
| Vera Vera, José Ricardo | Lider del Proyecto | Analista de Infraestructura Provincial 1 | jrvera@mtop.gob.ec | 023974600 |

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

| Archivo | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 71906_1.jpg | 15/09/2015 |
