

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 4
Dirección Provincial Manabí

PROYECTO: K057 MTOP - Rectificación y mejoramiento de la carretera San Antonio - La Margarita - San Vicente.

Líder del Proyecto:	Moreira Villanueva, Wilmer Antonio (wmoreira@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Alcívar Arauz, Diofre Leonel	Programas Relacionados:	AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA SAN VICENTE DE 37.9 KMS DE, Provincia - Manabí, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.372550	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	47,760,846.87
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	06/05/2012 - 01/08/2019
Fecha de última actualización:	06/07/2018	Fecha de Fin Base:	05/02/2015
Modificado por:	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	Fecha del siguiente Hito:	31/05/2019

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN: La información de acuerdo a formato SENPLADES no se la posee, se realizarán las consultas respectivas en el departamento de planificación de la Subsecretaría Regional 4..
 El objeto del contrato es: la Rehabilitación y Mantenimiento de la Carretera San Antonio- La Margarita- San Vicente de 37,9 km. de longitud ubicado en la Provincia de Manabí. Con un valor de \$ 25'979.368,94. El contrato esta a cargo de Hidalgo & Hidalgo, firmado con fecha 21 de junio de 2012. y por plazo de 730 días, que se inicio el 6 de agosto de 2012, con la entrega del 40 % del Anticipo.
 Monto del Proyecto: USD 25'979.568,94
 Monto de Fiscalización: USD 1'582.586,93
 Contrato Complementario: USD 7'417.137,78
 Orden de Cambio: USD 2'939.079,68
 Costo + %: USD 1'125.384,44
 Indemnización: USD 3'114.314,55
 Costo Total del Proyecto: USD 47'217.041,08 (Incluye IVA)

Beneficios Cualitativos

Una carretera que se encuentra con una calzada en buen estado, esta perfectamente señalizada, y conecta a lugares turisticos como las playas de San Vicente, Canoa, Bahía de Caraquez, Jama y Pedernales, beneficia tanto a vecinos de la carretera como a personas en tránsito.

Tipo de Beneficiario

Los habitantes que se encuentran ubicados a lo largo del proyecto podran realizar el traslado de productos que producen (agrícolas y del mar), con mayor rapidez y seguridad a los centros de consumo especialmente a los cantones de Chone, San Vicente y Sucre (Bahía de Caraquez).


Restricciones

TIEMPO: Contratista debe cumplir con los plazos establecidos para culminación de contrato.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 86.23 %
 Fecha de Inicio: 06/05/2012 Fecha de Fin: 01/08/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

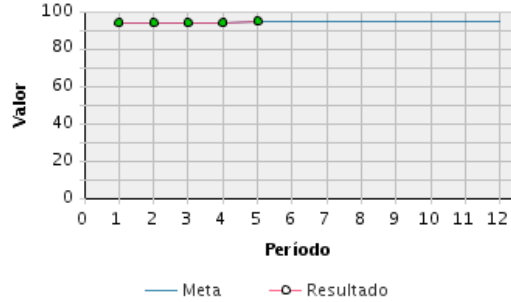

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	94 %	94 %	94 %	94 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	Avance real acumulado											
	94 %	94 %	94 %	94 %	95 %							
Estado												
	●	●	●	●	●							

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JUNIO 2018: Contratista realiza mantenimiento de la vía , sello de fisuras, limpieza de cunetas y alcantarillas a mano, roza a mano.	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	06/07/2018 - 08:41 AM
MAYO 2018: Contratista realiza mantenimiento de la vía , sello de fisuras, limpieza de cunetas y alcantarillas a mano, roza a mano.	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	07/06/2018 - 03:33 PM
ABRIL 2018: Contratista realiza mantenimiento de la vía , sello de fisuras, limpieza de cunetas y alcantarillas a mano, roza a mano.	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	09/05/2018 - 04:53 PM
MARZO 2018: Contratista realiza mantenimiento de la vía , sello de fisuras, limpieza de cunetas y alcantarillas a mano, roza a mano.	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	10/04/2018 - 03:57 PM
FEBRERO 2018: Contratista realiza mantenimiento de la vía , sello de fisuras, limpieza de cunetas y alcantarillas a mano, roza a mano.	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	13/03/2018 - 10:08 AM
ENERO 2018: Contratista realiza mantenimiento de la vía , sello de fisuras, limpieza de cunetas y alcantarillas a mano, roza a mano.	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	08/02/2018 - 09:39 AM
DICIEMBRE 2017: Contratista realiza mantenimiento de la vía , sello de fisuras, limpieza de cunetas y alcantarillas a mano, roza a mano.	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	08/02/2018 - 09:39 AM
NOVIEMBRE 2017: Contratista realiza mantenimiento de la vía , sello de fisuras, limpieza de cunetas y alcantarillas a mano, roza a mano.	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	05/12/2017 - 05:28 PM
OCTUBRE 2017: Contratista realiza mantenimiento de la vía , sello de fisuras, limpieza de cunetas y alcantarillas a mano, roza a mano.	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	16/11/2017 - 09:06 AM
SEPTIEMBRE 2017: Contratista realiza mantenimiento de la vía , sello de fisuras, limpieza de cunetas y alcantarillas a mano, roza a mano.	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	16/11/2017 - 09:06 AM
AGOSTO 2017: Contratista realiza mantenimiento de la vía , sello de fisuras, limpieza de cunetas y alcantarillas a mano, roza a mano.	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	16/11/2017 - 09:06 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2017: Contratista realiza mantenimiento de la vía , sello de fisuras, limpieza de cunetas y alcantarillas a mano, roza a mano.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	15/08/2017 - 08:52 AM
JUNIO 2017: Contratista realiza mantenimiento de la vía , sello de fisuras, limpieza de cunetas y alcantarillas a mano, roza a mano.	Moreira Villanueva, Wilmer	11/07/2017 - 11:27 AM
MAYO 2017: Contratista realiza mantenimiento de la vía , sello de fisuras, limpieza de cunetas y alcantarillas a mano, roza a mano.	Moreira Villanueva, Wilmer	11/07/2017 - 11:26 AM
FEBRERO ABRIL 2017 Contratista realiza mantenimiento de la vía , sello de fisuras, limpieza de cunetas y alcantarillas a mano, roza a mano.	Vera Vera, José Ricardo	05/05/2017 - 10:21 AM
Enero 2017: Contratista realiza mantenimiento de la vía , sello de fisuras, limpieza de cunetas y alcantarillas a mano, roza a mano.	Moreira Villanueva, Wilmer	21/02/2017 - 08:35 AM
Diciembre 2016: Contratista realiza mantenimiento de la vía , sello de fisuras, limpieza de cunetas y alcantarillas a mano, roza a mano.	Moreira Villanueva, Wilmer	21/02/2017 - 08:35 AM
Noviembre 2016: Contratista realiza mantenimiento de la vía , sello de fisuras, limpieza de cunetas y alcantarillas a mano, roza a mano.	Moreira Villanueva, Wilmer	21/02/2017 - 08:34 AM
OCTUBRE 2016.- Proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento realizando actividades como:Sello de fisuras, Roza a mano, Limpieza de cunetas y encauzamiento a mano y Limpieza de alcantarillas.	Moreira Villanueva, Wilmer	01/11/2016 - 04:30 PM
SEPTIEMBRE 2016.- Proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento realizando actividades como:Sello de fisuras, Roza a mano, Limpieza de cunetas y encauzamiento a mano y Limpieza de alcantarillas.	Moreira Villanueva, Wilmer	01/11/2016 - 04:29 PM
AGOSTO 2016.- Proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento realizando actividades como:Sello de fisuras, Roza a mano, Limpieza de cunetas y encauzamiento a mano y Limpieza de alcantarillas.	Moreira Villanueva, Wilmer	06/09/2016 - 10:03 AM
JULIO 2016.- Proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento realizando actividades como:Sello de fisuras, Roza a mano, Limpieza de cunetas y encauzamiento a mano y Limpieza de alcantarillas.	Moreira Villanueva, Wilmer	01/08/2016 - 11:42 AM
JUNIO 2016.- Proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento realizando actividades como: Roza a mano, Sello de fisuras, Limpieza de cunetas y encauzamiento a mano y Limpieza de alcantarillas, terremoto suscitado el 16 de abril de 2016 que afecto algunos tramos de la vía.	Moreira Villanueva, Wilmer	19/07/2016 - 08:27 AM
MAYO 2016.- Proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento realizando actividades como: Roza a mano, Sello de fisuras, Limpieza de cunetas y encauzamiento a mano y Limpieza de alcantarillas, terremoto suscitado el 16 de abril de 2016 que afecto algunos tramos de la vía, ademas se presentó un macrodeslizamiento en la absc 35+000 en el cual la Cia Contratista intervino oportunamente.	Moreira Villanueva, Wilmer	08/06/2016 - 08:11 AM
ABRIL 2016.- Proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento realizando actividades como: Roza a mano, Sello de fisuras, Limpieza de cunetas y encauzamiento a mano y Limpieza de alcantarillas, terremoto suscitado el 16 de abril de 2016 que afecto algunos tramos de la vía, ademas se presentó un macrodeslizamiento en la absc 35+000.	Moreira Villanueva, Wilmer	10/05/2016 - 10:54 AM
MARZO 2016.- Proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento realizando actividades como: Roza a mano, Sello de fisuras, Limpieza de cunetas y encauzamiento a mano y Limpieza de alcantarillas, terremoto suscitado el 16 de abril de 2016 que afecto algunos tramos de la vía, ademas se presentó un macrodeslizamiento en la absc 35+000.	Moreira Villanueva, Wilmer	10/05/2016 - 10:51 AM
MARZO 2016.- Proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento realizando actividades como: Roza a mano, Sello de fisuras, Limpieza de cunetas y encauzamiento a mano y Limpieza de alcantarillas.	Moreira Villanueva, Wilmer	08/04/2016 - 04:51 PM
MARZO 2016.- Proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento realizando actividades como: Roza a mano, Sello de fisuras, Limpieza de cunetas y encauzamiento a mano y Limpieza de alcantarillas.	Moreira Villanueva, Wilmer	08/04/2016 - 04:50 PM
FEBRERO 2016.- Proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento realizando actividades como: Roza a mano, Sello de fisuras, Limpieza de cunetas y encauzamiento a mano y Limpieza de alcantarillas.	Moreira Villanueva, Wilmer	05/03/2016 - 08:02 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2016.- Proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento realizando actividades como: Roza a mano, Sello de fisuras, Limpieza de cunetas y encauzamiento a mano y Limpieza de alcantarillas.	Moreira Villanueva, Wilmer	05/03/2016 - 08:01 PM
DICIEMBRE 2015.- Proyecto con recepción provisional firmada el 4 de mayo de 2015. Se encuentra en etapa de mantenimiento realizando actividades como: Roza a mano, Sello de fisuras, Limpieza de cunetas y encauzamiento a mano y Limpieza de alcantarillas.	Moreira Villanueva, Wilmer	06/01/2016 - 04:40 PM
NOVIEMBRE 2015.- Proyecto con recepción provisional firmada el 4 de mayo de 2015. Se encuentra en etapa de mantenimiento realizando actividades como: Roza a mano, Limpieza de cunetas y encauzamiento a mano y Limpieza de alcantarillas.	Moreira Villanueva, Wilmer	06/01/2016 - 04:37 PM
OCTUBRE 2015.- Proyecto con recepción provisional firmada el 4 de mayo de 2015. Se encuentra en etapa de mantenimiento.	Moreira Villanueva, Wilmer	09/11/2015 - 02:20 PM
SEPTIEMBRE 2015.- Proyecto con recepción provisional firmada el 4 de mayo de 2015. Se encuentra en etapa de mantenimiento.	Moreira Villanueva, Wilmer	07/10/2015 - 10:19 AM
AGOSTO 2015.- Proyecto con recepción provisional firmada el 4 de mayo de 2015. Se encuentra en etapa de mantenimiento.	Moreira Villanueva, Wilmer	03/09/2015 - 10:59 AM
JULIO 2015.- Proyecto con recepción provisional firmada el 4 de mayo de 2015.	Moreira Villanueva, Wilmer	06/08/2015 - 08:50 AM
JUNIO 2015.- Proyecto pasa a etapa de CIERRE con recepción provisional firmada el 4 de mayo de 2015.	Moreira Villanueva, Wilmer	07/07/2015 - 09:28 AM
MAYO 2015.- La obra concluyo el 1 de marzo de 2015, se encuentra en trámite el Acta de Recepción Provisional	Moreira Villanueva, Wilmer	01/06/2015 - 10:21 AM
ABRIL 2015.- La obra concluyo el 1 de marzo de 2015, con oficio Nro. 332-15-PSASV de fecha de 2 de marzo de 2015 el contratista solicito la recepción provisional de la obra.	Moreira Villanueva, Wilmer	29/04/2015 - 11:11 AM
MARZO 2015.- La obra concluyo el 1 de marzo de 2015, con oficio Nro. 332-15-PSASV de fecha de 2 de marzo de 2015 el contratista solicito la recepción provisional de la obra.	Moreira Villanueva, Wilmer	02/04/2015 - 11:17 AM
FEBRERO 2015.- Se realizaron trabajos de señalización horizontal; línea central en las variantes y colocación de mojoneros de hormigón cada kilómetro de la vía. Mediante Orden de Cambio N° 6 firmada el 5 de diciembre de 2014 se aprueba un incremento en el monto contractual por USD 2'939.079,68 y una ampliación de plazo por 60 días siendo la terminación original el 1 de Marzo de 2015.	Moreira Villanueva, Wilmer	05/03/2015 - 09:47 AM
ENERO 2015.- Colocación de señalética y tachas reflectivas. Mediante Acta de Negociación firmada el 7 de enero de 2015 se aprobó un costo + % por un monto de USD 151.291,40 y una orden de cambio Nro. 6 por un monto de 2'939.079,68 con una ampliación de plazo de 60 días siendo esta la terminación efectiva el 1 de marzo de 2015.	Moreira Villanueva, Wilmer	05/03/2015 - 09:41 AM
DICIEMBRE 2014.- Armado, encofrado y fundido de aceras y bordillos en el cantón San Vicente; riego de adherencia y carpeta asfáltica en el acceso a San Vicente (calle Furoani); capa de rodadura; áreas sembradas y plantas sembradas; colocación, compactación y sellado de material para doble tratamiento; colocación de tachas reflectivas, proyecto culminó el 31 de diciembre de 2014.	Moreira Villanueva, Wilmer	07/02/2015 - 02:33 PM
Noviembre 2014.- Armado y fundido de bordillos para cunetas en la variante Simbocal; armado y encofrado de aceras; rehabilitación del acceso a San Vicente; tubería de hormigón armado 1500mm; colocación de guardacaminos; señalización horizontal (pintura blanca); riego de adherencia o liga para asfaltado; capa de rodadura en las variantes de La Margarita y Simbocal.	Moreira Villanueva, Wilmer	08/12/2014 - 09:12 AM
Octubre 2014.- Fundido de aceras; Armado y fundido de bordillos para cunetas; Armado y encofrado de aceras; Rehabilitación del acceso al sector de San Vicente; Gaviones en salida de alcantarilla; Pintura de señalización; Asfalto para imprimación en la variante de Simbocal y en la Margarita; Pruebas de tuberías secundarias de agua potable; Colocación de material de base. Mediante Orden de Cambio N° 4 se aprobó una ampliación de plazo por 147 días, siendo la terminación efectiva el 31 de diciembre de 2014.	Moreira Villanueva, Wilmer	10/11/2014 - 09:50 AM
SEPTIEMBRE 2014.- se ejecutaron rubros como: Fundición de aceras; material de sub-base en las variantes de la Margarita y Simbocal; colocación y prueba de tuberías secundarias de agua potable; armado y encofrado de aceras y bordillos; material de base 1; colocación de señalización en San Antonio; material de préstamo importado; armado, encofrado y fundido de cabezales y	Moreira Villanueva, Wilmer	08/10/2014 - 09:34 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
alas en alcantarillas tubulares; colocación de geotextil; excavación en suelo; fundido de replantillo en alcantarilla de cajón en la variante Simbocal; fundido de cunetas.		
AGOSTO 2014.- Excavación en suelos; Escombreras en la comunidad de Barquero 1; Fundido de aceras; Conformación de terraplenado; Armado, encofrado y fundido de la losa superior en alcantarilla de cajón en la variante de La Margarita; Colocación de pedraplen; Excavación, encofrado y fundido de cunetas; Pruebas de tubería de AA.PP; Fundido de replantillo en alcantarillas tubulares; Colocación de tubería de hormigón armado; Colocación de tubería secundaria de agua potable; Colación de tubería para subdren; Fundido de cabezales y alas en alcantarillas tubulares.	Moreira Villanueva, Wilmer	05/09/2014 - 05:25 PM
JULIO 2014.- Excavación en Suelo para Alcantarillas de Cajón; Escombrera; Excavación, Encofrado y Funa los presudido de Bordillo y Cunetas; Tubería de Hormigón Armado; Colocación de Pedraplen; Armado y Fundido de Cabezales y Alas en Alcantarillas; Pruebas de Tubería de AA.PP; Fundido de Aceras; Fundido de Paredes en Alcantarillas de Cajón; Conformación de Terraplenado para la Variante Margarita,Se aprobó plazo por 147 días teniendose como fecha de terminación contractual el 31 de Diciembre de 2014,respecto a lo presupuestado se realizó el pago de la planilla N°23 del periodo del mes de Junio de 2014.	Moreira Villanueva, Wilmer	07/08/2014 - 05:22 PM
JUNIO 2014.- Liga para Riego de Adherencia; Mezcla Asfáltica para Pavimento; Excavación en Suelo; Escombreras; Excavación, Encofrado y Fundido de Bordillo y Cunetas,se encuentra en trámite ampliación de plazo por 165 días y una orden de trabajo por 2'854.300,00.	Moreira Villanueva, Wilmer	07/07/2014 - 04:05 PM
MAYO 2014 (ALCANCE).- Se firmo Contrato Complementario el 28 de Enero de 2014 por un Monto de 7'474.437,74. Incrementandose el monto total de 33'396.806,68	Moreira Villanueva, Wilmer	04/07/2014 - 10:02 AM
MAYO 2014.- Excavación en Suelo; Excavación para Muro y Acera; Fundición de Bordillo Interior; Escombreras; Colocación de Mezcla Asfáltica; Instalación de Válvulas de Aire; Desagües; y Derivación; Encofrado y Fundido de Muro para Bordillo Interior de Aceras.	Moreira Villanueva, Wilmer	06/06/2014 - 04:23 PM
ABRIL 2014.- Armado y Fundido para Camaras de Valvulas para Tubería de AAPP; Instalación de Valvulas de Aire, Desague y Derivación; Encofrado y Fundido de Muro para Bordillo Interior en Aceras; Excavaciones en Suelo.	Moreira Villanueva, Wilmer	05/06/2014 - 02:58 PM
MARZO 2014.- Armado y Fundido para Camaras de Valvulas para Tuberías de AAPP; Mantenimiento de Imprimación; Desbroce y Desboque para Aceras y Bordillos.	Moreira Villanueva, Wilmer	08/04/2014 - 03:58 PM
FEBRERO 2014.- Excavación en Suelo; Armado y Fundido Para Camaras de Valvulas Para Tubería de AAPP; Colocación de Tuberías AAPP; Escombreras; Mantenimiento de Imprimación.	Moreira Villanueva, Wilmer	28/03/2014 - 10:48 AM
ENERO 2014.- Excavación en Suelo; Armado y Fundido para Camaras de Valvulas para tubería de AAPP; Colocación de Tubería de AAPP; Escombrera; Control de Polvo; Muro de Gavion para Protección; Mantenimiento de la Vía.	Moreira Villanueva, Wilmer	07/03/2014 - 10:16 AM
DICIEMBRE 2013.- Transporte, Tendido, Hidratado de Prestamo Importado y Compactado de Material de Mejoramiento, Subbase y Base; Armado y Fundido para Camaras de Valvulas para Tuberías de AAPP; Muro de Gavion para Protección; Asfalto para Imprimación; Control de Polvo	Moreira Villanueva, Wilmer	03/02/2014 - 11:52 AM
NOVIEMBRE 2013.- Excavación en Suelo; Transporte, Tendido Hidratado de Material de Prestamo Importado; Transporte, Tendido, Hidratado y Compactado de Material de Mejoramiento; Tendido, Hidratado y Compactado de Material de Subbase; Tendido, Hidratado y Compactado de Material de Base; Asfalto para Imprimación; Colocación de Tubería de Agua Potable; Control de Polvo.	Moreira Villanueva, Wilmer	07/12/2013 - 11:46 AM
Octubre 2013.- Excavación en suelo, Armado y fundido de cabezalez y alas de alcantarilla, Material de pedraplen, Asfalto para imprimación, Transporte, Tendido, Hidratado y Compactado de prestamo importado y material de mejoramiento, Control de polvo, Instalación de tuberías de agua potable, Fundido de alas de ducto cajon	Moreira Villanueva, Wilmer	06/12/2013 - 11:00 AM
Septiembre 2013.- Excavación en suelo, Armado y fundido de cabezalez y alas de alcantarilla, Material de pedraplen, Asfalto para imprimación, Transporte, Tendido, Hidratado y Compactado de prestamo importado y material de mejoramiento, Control de polvo, Instalación de tuberías de agua potable, Fundido de alas de ducto cajon.	Moreira Villanueva, Wilmer	09/10/2013 - 10:36 AM
Agosto de 2013: En este mes se ejecutaron rubros como: Excavacion en suelo,Armado y Fundido de cabezales y Alas de alcantarillas de f'c= 180 Kg/cm2 y 210 Kg/cm2,Capa de Rodadura en Accesos,Liga de Adherencia,Transporte,Tendido Hidratado y Compactado de Prestamo Importado,Transporte,Tendido Hidratado y Compactado de Material de Mejoramiento,Transporte,Tendido Hidratado y Compactado de Material de Sub-Base,Excavacion en suelo para colocacion de alcantarillas,Remocion de Alcantarillas,Control de Polvo,Señalización Preventiva,Capa de Rodadura en la Vía.	Moreira Villanueva, Wilmer	05/09/2013 - 03:44 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Julio 2013: En trámite el contrato complementario (construcción de una variante y reubicación de red de tubería de agua potable),en este periodo se ejecutaron Rubros como: Excavacion en Suelo,Excavacion para rellenos y estructuras(alcantarillas de cajon),Armado y Fundido de Cabezales y Muros de Alas de alcantarilla ,Fundido de Losa inferior y Superior de alcantarillas de Cajon ,Transporte,Tendido Hidratado de material de Prestamo Importado,Asfalto para imprimacion,Control de Polvo,Señalización Preventiva.Capa de Rodadura,Riego de liga de Adherencia,Acero de Refuerzo,Asfalto para Imprimacion,Predraplen,Alcantarilla Doble ducto,Reubicacion de Poste.	Moreira Villanueva, Wilmer	08/08/2013 - 11:11 AM
Junio 2013: En trámite el contrato complementario (construcción de una variante y reubicación de red de tubería de agua potable),se ejecutaron Rubros como: Excavacion en Suelo,Excavacion para rellenos y estructuras(alcantarillas de cajon),Armado y Fundido de Cabezales ,Muros de Alas y Losa de Cimentacion,Armado de Losa superior de alcanatarillas, Transporte,Tendido Hidratado de material de prestamo importado,Asfalto para imprimacion,Control de Polvo,Señalización Preventiva.	Moreira Villanueva, Wilmer	08/08/2013 - 10:54 AM
Mayo 2013: Excavación en suelo km 20 + 00; (variante); km 5 + 290 al 5+840 (cajeras); construcción de escombrera km 19+800; colocación de material para pedraplen; colocación de material de mantenimiento; construcción de muro de ala y cabezales; construcción de cámara para válvulas de aire, desagüe y derivación	Moreira Villanueva, Wilmer	30/05/2013 - 11:29 AM
Abril 2013:Se ejecutaron Rubros como: Excavacion en suelo,Escombreras,Desbroce,Desbosque y Limpieza,Colocacion de Tuberias de Hormigon Arma do de D= 15mm,Colocacion de Tuberias Nuevas,Asfalto para la imprimacion en la Calle Furuani en el Canton San Vicente,Control de Polvo,Conos de Seguridad.Material de Base Clase 1A.Transporte de Material de Base.	Moreira Villanueva, Wilmer	30/05/2013 - 11:27 AM
Marzo 2013: Se ejecutan rubros como:Material de Prestamo Importado,Transporte de material de Prestamo Importado,Hormigon Estructural de f'c= 280 kg/cm2(fundicion de alas de alcantarilla cajon),210 kg/cm2 (fundicion de cabezales) y 180 kg/cm2 (fundicion de replantillo de lacantarillas),Excavacion en Suelo,Charlas de Concientizacion,Afiches,Comunicaciones Radiales,Control de Polvo,Hormigon Estructural de f'c= 280 kg/cm2,Conos de Seguridad,Transporte de Excavacion en suelo,Acero de Refuerzo en barras fy=4200 kg/cm2,Mezclado,Tendido,hidratado y compactado de material de mejoramiento.Mezclado,Tendido,Hidratado y compactado del material de Sub-base clase 3,	Moreira Villanueva, Wilmer	20/05/2013 - 03:10 PM
FEBRERO 2013:: Se ejecutan rubros como: Material de Prestamo Importado,Transporte de material de Prestamo Importado,Hormigon Estructural de f'c= 280 kg/cm2(fundicion de alas de alcantarilla cajon),210 kg/cm2 (fundicion de cabezales) y 180 kg/cm2 (fundicion de replantillo de lacantarillas),Excavacion en Suelo,Charlas de Concientizacion,Afiches,Comunicaciones Radiales,Control de Polvo,Hormigon Estructural de f'c= 280 kg/cm2,Conos de Seguridad,Transporte de Excavacion en suelo,Acero de Refuerzo en barras fy=4200 kg/cm2,Mezclado,Tendido,hidratado y compactado de material de mejoramiento.Mezclado,Tendido,Hidratado y compactado del material de Sub-base clase 3.	Moreira Villanueva, Wilmer	08/04/2013 - 04:14 PM
ENERO 2013:: Se ejecutan rubros como: Material de Prestamo Importado,Transporte de material de Prestamo Importado,Hormigon Estructural de f'c= 280 kg/cm2(fundicion de alas de alcantarilla cajon),210 kg/cm2 (fundicion de cabezales) y 180 kg/cm2 (fundicion de replantillo de lacantarillas),Excavacion en Suelo,Charlas de Concientizacion,Afiches,Comunicaciones Radiales,Control de Polvo,Hormigon Estructural de f'c= 280 kg/cm2,Conos de Seguridad,Transporte de Excavacion en suelo,Acero de Refuerzo en barras fy=4200 kg/cm2,Mezclado,Tendido,hidratado y compactado de material de mejoramiento.Mezclado,Tendido,Hidratado y compactado del material de Sub-base clase 3.	Moreira Villanueva, Wilmer	07/03/2013 - 08:45 AM
DICIEMBRE 2012:Octubre 2012: Se ejecutan rubros como: Material de Prestamo Importado,Transporte de material de Prestamo Importado,Hormigon Estructural de f'c= 280 kg/cm2(fundicion de alas de alcantarilla cajon),210 kg/cm2 (fundicion de cabezales) y 180 kg/cm2 (fundicion de replantillo de lacantarillas),Excavacion en Suelo,Pozo Septico,Charlas de Concientizacion,Afiches,Comunicaciones Radiales,Control de Polvo,Hormigon Estructural de f'c= 280 kg/cm2,Conos de Seguridad,Transporte de Excavacion en suelo,Acero de Refuerzo en barras fy=4200 kg/cm2,Mezclado,Tendido,hidratado y compactado de material de mejoramiento.	Moreira Villanueva, Wilmer	17/01/2013 - 03:12 PM
NOVIEMBRE 2012: Se ejecutan rubros como: Mejoramiento de la Subrasante con suelo seleccionado,Pozo Septico,Charlas de Concientizacion,Afiches,Comunicaciones Radiales,Control de Polvo,Hormigon Estructural de f'c= 280 kg/cm2,Conos de Seguridad,Transporte de Excavacion en suelo,Acero de Refuerzo en barras fy=4200 kg/cm2,Material de Prestamo Importado,Hormigon Estructural F'C= 180 kg/cm2 y F'c= 210 kg/cm2.	Moreira Villanueva, Wilmer	17/01/2013 - 03:04 PM
OCTUBRE 2012.- Colocación de escollera de piedra y pedraplen km. 5+700-6+000 lado izquierdo. colocación y/o remplazo de alcantarillas de hormigòn en varios sitios MES DE SEPTIEMBRE 2012.- reconformación de la obra básica y ampliación de la plataforma vial km. 0+000-6+000. Excavación en fango km. 0+400-2+000	Moreira Villanueva, Wilmer	17/01/2013 - 02:04 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MES DE AGOSTO 2012.- con la entrega del anticipo el 6 de agosto, se inician los trabajos. replanteo tanto horizontal como vertical de la vía. construcción del campamento del Contratista limpieza y desbroce entre el km. 0+000 - 6+000 puente Las Margaritas.		

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. Ambiental. Fuerte temporal invernal CAUSARÍA retrasos en la obra.	06/07/2018	Iván Fernando Ganchozo Villavicencio	50 %	60	30	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Chone

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Aprobación estudios. Realizado.	2-Publicación de Pliegos	09/06/2012		09/06/2012		Sí	3.0
2	PLANEACIÓN: Certificación presupuestaria. Realizada.	1-Solicitud de Información	09/07/2012		09/07/2012		Sí	3.0
3	PLANEACIÓN: Acta de adjudicación. Realizada.	1-Solicitud de Información	20/07/2012		20/07/2012		Sí	3.0
4	EJECUCIÓN: Preliminares. Terminado.	1-Solicitud de Información	09/12/2012		09/12/2012		Sí	1.0
5	EJECUCIÓN: Drenaje alcantarillas tramo 1 km. 0+000 - 20+000. Terminado.	1-Solicitud de Información	05/08/2013		05/08/2013		Sí	5.0
6	EJECUCIÓN: Estructura de pavimento tramo 1 km. 0+000 - 20+000. Terminado.	1-Solicitud de Información	05/08/2013		05/08/2013		Sí	6.0
7	EJECUCIÓN: Obra básica y conformación de la plataforma tramo 1 km. 0+000 - 20+000. Terminado.	1-Solicitud de Información	05/08/2013		05/08/2013		Sí	7.0
8	EJECUCIÓN: Capa de rodadura tramo 1 km. 0+000-20+000. Terminado.	1-Solicitud de Información	05/09/2013		05/09/2013		Sí	7.0
9	EJECUCIÓN: Firma de Contrato Complementario. Firmado.	5-Entregables Intermedios	28/01/2014		28/01/2014		Sí	2.0
10	EJECUCIÓN: Drenaje alcantarillas tramo 2 km.20+000 - 37+900. Terminado.	1-Solicitud de Información	31/05/2014		31/05/2014		Sí	5.0
11	EJECUCIÓN: Estructura de pavimento tramo 2 km. 20+000 - 37+900. Terminado.	1-Solicitud de Información	31/05/2014		31/05/2014		Sí	9.0


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
12	EJECUCIÓN: Línea de conducción agua potable Primera etapa. Terminado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2014		31/05/2014		Sí	3.0
13	EJECUCIÓN: Rubro de Contrato Complementario Primera Fase. Terminado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2014		31/05/2014		Sí	15.0
14	EJECUCIÓN: Línea de conducción agua potable-Segunda Etapa. Terminado.	5-Entregables Intermedios	05/08/2014		05/08/2014		Sí	2.0
15	EJECUCIÓN: Mitigación ambiental. Terminado.	5-Entregables Intermedios	05/08/2014		05/08/2014		Sí	2.0
16	EJECUCIÓN: Obra básica y conformación de la plataforma tramo 2 km. 20+000 - 37+900. Terminado.	1-Solicitud de Información	05/08/2014		05/08/2014		Sí	5.0
17	EJECUCIÓN: Señalización para control de tránsito. Terminado.	5-Entregables Intermedios	05/08/2014		05/08/2014		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN: Capa de rodadura tramo 2 km. 20+000 - 37+900. Terminado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2014		31/08/2014		Sí	4.0
19	EJECUCIÓN: Rubro de Contrato Complementario Segunda Fase. Terminado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	4.0
20	EJECUCIÓN: Transporte de materiales.Terminado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	2.0
21	CIERRE: Acta de Recepción Provisional. Realizada.	5-Entregables Intermedios	01/04/2015		29/05/2015		Sí	3.0
22	EJECUCIÓN: Mantenimiento primer año. Terminado	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		31/05/2016		Sí	1.0
23	EJECUCIÓN: Mantenimiento segundo año. Terminado	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	1.0
24	EJECUCIÓN: Mantenimiento tercer año. Terminado	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Mantenimiento cuarto año. Terminado	5-Entregables Intermedios	31/05/2019	31/05/2019			No	1.0
26	COMPLETADO: Acta de Recepción Definitiva. Realizada.	5-Entregables Intermedios	30/07/2019	30/07/2019			No	2.0
27	CIERRE: Liquidación del Contrato. Realizada.	5-Entregables Intermedios	31/07/2019	31/07/2019			No	2.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana María	{PR} - Provincia - MANABÍ	22/09/2015
2	Proyecto terminado y en funcionamiento	Dueñas de la Torre, Susana María	{PR} - Provincia - MANABÍ	18/06/2015
3	Proyecto terminado	Dueñas de la Torre, Susana María	{PR} - Provincia - MANABÍ	22/01/2015
4	Supervision de Proyecto	Dueñas de la Torre, Susana María	{PR} - Provincia - MANABÍ	16/12/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje del cumplimiento económico en el cronograma.		100.00 %	100	100	06/08/2012	Junio

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	13,358,722.58
Estimado Al Fin Del Proyecto:	47,760,846.87 **
Costo Total:	47,217,041.08
Total Devengado:	47,760,846.87
% Costo Total Devengado:	101.15 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 101.15 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	46,367,048.38	0.00	0.00	46,367,048.38
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	45,884,120.66	0.00	0.00	45,884,120.66
Ppto. Codificado	56,850,936.15	0.00	0.00	56,850,936.15
Ppto. Comprometido	56,391,978.88	0.00	0.00	56,391,978.88
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	46,123,765.15	0.00	0.00	46,123,765.15
Ppto. Devengado	47,760,846.87	0.00	0.00	47,760,846.87
Pagado Real	21,796,359.44	0.00	0.00	21,796,359.44
Estimado a fin de año	* 47,760,846.87	0.00	0.00	47,760,846.87
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-1,637,081.72	0.00	0.00	-1,637,081.72
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 103.55 %	0.00 %	0.00 %	103.55 %
Ppto. Codificado 998	10,040,285.15	0.00	0.00	10,040,285.15
Ppto. Devengado 998	10,007,807.37	0.00	0.00	10,007,807.37

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018



Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
17	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
18	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
19	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
20	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Contrato Complementario.	C.3.pdf	13/06/2014
2	Fotos del Proceso Constructivo de la Vía.	C.4.docx	16/06/2014
3	Informe Ejecutivo SITOP, abril 2013.	A.7.pdf	10/04/2014
4	Informe Ejecutivo SITOP, abril 2014.	C.1.pdf	05/05/2014
5	Informe Ejecutivo SITOP, agosto 2013.	B.2.pdf	10/04/2014
6	Informe Ejecutivo SITOP, diciembre 2012.	A.3.pdf	10/04/2014
7	Informe Ejecutivo SITOP, diciembre 2013.	B.6.pdf	10/04/2014
8	Informe Ejecutivo SITOP, enero 2013.	A.4.pdf	10/04/2014
9	Informe Ejecutivo SITOP, enero 2014.	B.7.pdf	10/04/2014
10	Informe Ejecutivo SITOP, febrero 2013.	A.5.pdf	10/04/2014
11	Informe Ejecutivo SITOP, febrero 2014.	B.8.pdf	10/04/2014
12	Informe Ejecutivo SITOP, julio 2013.	B.1.pdf	10/04/2014
13	Informe Ejecutivo SITOP, julio 2014.	C.6.pdf	05/08/2014
14	Informe Ejecutivo SITOP, junio 2013.	A.9.pdf	10/04/2014
15	Informe Ejecutivo SITOP, junio 2014.	C.5.pdf	04/07/2014
16	Informe Ejecutivo SITOP, marzo 2013.	A.6.pdf	10/04/2014
17	Informe Ejecutivo SITOP, marzo 2014.	B.9.pdf	10/04/2014
18	Informe Ejecutivo SITOP, mayo 2013.	A.8.pdf	10/04/2014
19	Informe Ejecutivo SITOP, mayo 2014.	C.2.pdf	05/06/2014
20	Informe Ejecutivo SITOP, noviembre 2012.	A.2.pdf	10/04/2014
21	Informe Ejecutivo SITOP, noviembre 2013.	B.5.pdf	10/04/2014
22	Informe Ejecutivo SITOP, octubre 2012.	A.1.pdf	10/04/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
23	Informe Ejecutivo SITOP, octubre 2013.	B.4.pdf	10/04/2014
24	Informe Ejecutivo SITOP, septiembre 2013.	B.3.pdf	10/04/2014
25	Orden de Cambio N° 3	C.7.pdf	07/08/2014
26	P.1-Informe Ejecutivo SITOP, agosto 2014.	C.7.pdf	04/09/2014
27	P.10-Informe Ejecutivo SITOP, mes marzo 2015.	D.7.pdf	02/04/2015
28	P.2-Informe Ejecutivo SITOP, septiembre 2014.	C.8.pdf	06/10/2014
29	P.3-Informe Ejecutivo SITOP, octubre 2014.	C.9.pdf	10/11/2014
30	P.4-Orden de Cambio N° 4.	D.1.pdf	10/11/2014
31	P.5-Informe Ejecutivo SITOP, noviembre 2014.	D.2.pdf	06/12/2014
32	P.6-Informe Ejecutivo SITOP, diciembre 2014.	D.3.pdf	06/01/2015
33	P.7-Informe Ejecutivo SITOP, enero 2015.	D.4.pdf	07/02/2015
34	P.8-Informe Ejecutivo SITOP, mes febrero 2015.	D.5.pdf	05/03/2015
35	P.9-Orden de Cambio N° 6	D.6.pdf	05/03/2015
36	Q.1- Informe Ejecutivo SITOP, mes abril 2015.	D.7.pdf	29/04/2015
37	Q.2- Informe Ejecutivo SITOP, mes mayo 2015.	D.8.pdf	01/06/2015
38	Q.3- Informe Ejecutivo SITOP, mes junio 2015.	D.9.pdf	07/07/2015
39	Q.4- Acta de Recepción Provisional.	E.1.pdf	07/07/2015
40	Q.5- Informe Ejecutivo SITOP, mes julio 2015.	E.2.pdf	06/08/2015
41	Q.6- Informe Ejecutivo SITOP, mes agosto 2015.	E.3.pdf	03/09/2015
42	Q.7- PRIORIDAD SENPLADES	E.4.pdf	21/09/2015
43	Q.8- Informe Ejecutivo SITOP, mes septiembre 2015.	E.5.pdf	07/10/2015
44	Q.9- Informe Ejecutivo SITOP, mes octubre 2015.	E.6.pdf	09/11/2015
45	R.1- Informe Ejecutivo SITOP, mes noviembre 2015.	E.7.pdf	06/01/2016
46	R.2- Informe Ejecutivo SITOP, mes diciembre 2015.	E.8.pdf	06/01/2016
47	R.3- Informe Ejecutivo SITOP, mes Enero 2016.	E.9.pdf	03/02/2016
48	R.4- Informe Ejecutivo SITOP, mes Febrero 2016.	F.1.pdf	05/03/2016
49	R.5- Informe Ejecutivo SITOP, mes Marzo 2016.	F.2.pdf	08/04/2016
50	R.6- Informe Ejecutivo SITOP, mes Abril 2016.	F.3.pdf	10/05/2016
51	R.7- Informe Ejecutivo SITOP, mes Mayo 2016.	F.4.pdf	08/06/2016
52	R.8- Informe Ejecutivo SITOP, mes Junio 2016.	F.5.pdf	19/07/2016
53	R.9- Informe Ejecutivo SITOP, mes Julio 2016.	F.6.pdf	01/08/2016
54	S.1- Informe Ejecutivo SITOP, mes Agosto 2016.	F.6.pdf	06/09/2016
55	S.2- Informe Ejecutivo SITOP, mes Septiembre 2016.	F.7.pdf	01/11/2016
56	S.3- Informe Ejecutivo SITOP, mes Octubre 2016.	F.8.pdf	01/11/2016
57	S.4- Informe Ejecutivo SITOP, mes Noviembre 2016.	F.9.pdf	21/02/2017
58	S.5- Informe Ejecutivo SITOP, mes Diciembre 2016.	G.1.pdf	21/02/2017
59	S.6- Informe Ejecutivo SITOP, mes Enero 2017.	G.2.pdf	21/02/2017
60	S.7- Informe Ejecutivo SITOP, mes Febrero 2017.	G.3.pdf	11/07/2017
61	S.8- Informe Ejecutivo SITOP, mes Marzo 2017.	G.4.pdf	11/07/2017
62	S.9- Informe Ejecutivo SITOP, mes Abril 2017.	G.5.pdf	11/07/2017
63	T.1- Informe Ejecutivo SITOP, mes Mayo 2017.	G.6.pdf	11/07/2017
64	T.2- Informe Ejecutivo SITOP, mes Junio 2017.	G.7.pdf	11/07/2017
65	T.3- Informe Ejecutivo SITOP, mes Julio 2017.	G.8.pdf	15/08/2017
66	T.4- Informe Ejecutivo SITOP, mes Agosto 2017.	G.9.pdf	16/11/2017
67	T.5- Informe Ejecutivo SITOP, mes Septiembre 2017.	H.1.pdf	16/11/2017
68	T.6- Informe Ejecutivo SITOP, mes Octubre 2017.	H.2.pdf	16/11/2017
69	T.7- Informe Ejecutivo SITOP, mes Noviembre 2017.	H.3.pdf	05/12/2017
70	T.8- Informe Ejecutivo SITOP, mes Diciembre 2017.	H.4.pdf	08/02/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
71	T.9- Informe Ejecutivo SITOP, mes Enero 2018.	H.5.pdf	08/02/2018
72	U.1- Informe Ejecutivo SITOP, mes Febrero 2018.	H.6.pdf	13/03/2018
73	U.2- Informe Ejecutivo SITOP, mes Marzo 2018.	H.7.pdf	10/04/2018
74	U.3- Informe Ejecutivo SITOP, mes Abril 2018.	H.8.pdf	09/05/2018
75	U.4- Informe Ejecutivo SITOP, mes Mayo 2018.	H.9.pdf	07/06/2018
76	U.5- Informe Ejecutivo SITOP, mes Junio 2018.	I.1.pdf	06/07/2018

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Briones Ibarra, José Edelberto	Patrocinador ejecutivo.		salio@mtop.gob.ec	
Moreira Villanueva, Wilmer	Lider del proyecto.	Supervisor de Construcciones de Manabí	salio@mtop.gob.ec	
Navia Gallardo, Xavier Eduardo	Administrador del contrato.		salio@mtop.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
51103_1.jpg	13/03/2018
