

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial Loja

PROYECTO: K039 MTOP - Centro Binacional de atención en Frontera -CEBAF- Macará

Líder del Proyecto:	Vega Silva, Andrea Karla (avega@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Calderón Ojeda, Jaime Ramiro	Programas Relacionados:	CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA - CEBAF- MACARA
Titular:	Rojas Cazar, Walter Emilio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	50590000.1504.6387	TIR:	12.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.01
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	13,632,970.38
Localidad de Gestión:	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	23/10/2014 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	03/09/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2019
Modificado por:	Vega Silva, Andrea Karla	Fecha del siguiente Hito:	30/12/2018

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN: La zona del proyecto está localizada al sur occidente de la ciudad de Loja, cuyo emplazamiento se ubica a una distancia de 140 Km desde la ciudad de Loja, en el sector del puente internacional de Macará y tiene las siguientes coordenadas:

LATITUD LONGITUD
 S 9514399.14 E 614940.28

PRODUCTO: Construcción y Operación del Centro Binacional de atención de Frontera -CEBAF- Macará - La Tina

LINEA BASE: El proyecto se encuentra a 200 metros del puente Internacional de Macará. El 3 de febrero de 2011 se firmó el contrato entre La Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (CNTTTSV), denominada en la actualidad como Agencia Nacional de Tránsito (ANT), pero se terminó por mutuo acuerdo el contrato de obra y de fiscalización. Mediante Decreto Ejecutivo 957 de fecha 08/dic del 2011, se encarga al MTOP la Planificación, administración y ejecución de la obra de infraestructura de los CEBAF. El proyecto es un compromiso Binacional por lo que el MTOP procedió a contratar el CEBAF Macará- La Tina el 27 de febrero de 2015.

OBJETIVO GENERAL: Construcción del Centro Binacional de atención de Frontera -CEBAF- Macará - La Tina

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Los objetivos específicos del CEBAF, son los siguientes:

a. Control eficiente y organizado de una infraestructura bien equipada y de actuación mutua, para prevenir la evasión de control y promulgación de enfermedades ocasionadas por virus o bacterias.

b. Incentivar el libre comercio entre las naciones y una conciencia responsable del comerciante y del viajero.

c. Proveer de una adecuada obra de manera que el proyecto cumpla con los requisitos necesarios para su funcionamiento, de forma que se le dotará de los sistemas necesarios para este proyecto.

d. Coordinar acciones para el control Aduanero en el área: comercial, turística, de estupefacientes, migratoria e industrial.

El proyecto en construcción comprende los siguientes componentes:

- Construcción del edificio Administrativo
- Construcción de 2 Bodegas
- Construcción de 2 estructuras para Manifiesto
- Construcción de 1 comedor
- Construcción de vías de acceso
- Cerramiento perimetral
- Laboratorio para el control Fito y zoonosanitario

CONTRATISTA: Consorcio A.S.
 FISCALIZADOR: Ing. Cecibel Vargas
 ADMINISTRADOR: Director Distrital de Loja. Ing. Walter Rojas


DATOS GENERALES

Descripción	
FINANCIAMIENTO:	Presupuesto General del Estado
MONTO DE INVERSIÓN:	USD. 12'343.178.58
Beneficios Cualitativos	
Contribuir al desarrollo de libre comercio entre Ecuador - Perú y desarrollar una conciencia responsable del comerciante y del viajero.	
Generar seguridad a los usuarios que viajan entre los dos países	
Tipo de Beneficiario	
Comerciantes, Agricultores, Ganaderos y Turistas	
Restricciones	
* CLIMA: Por empezar su construcción en la época invernal, puede ser un factor negativo para la construcción	

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 74.42 %
 Fecha de Inicio: 23/10/2014 Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

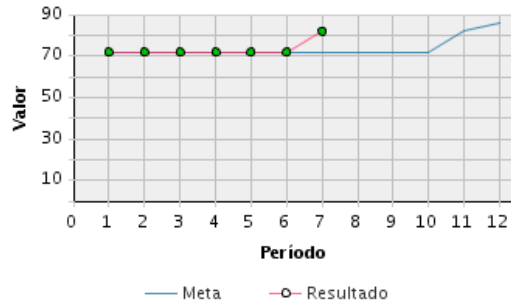

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	72 %	72 %	72 %	72 %	72 %	72 %	72 %	72 %	72 %	72 %	82 %	86 %
	Avance real acumulado											
	72 %	72 %	72 %	72 %	72 %	72 %	82 %					
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●					

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2018: Obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y aumento de monto	Vega Silva, Andrea Karla	03/09/2018 - 12:27 PM
JULIO 2018: Obra en ejecución, obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y aumento de monto	Vega Silva, Andrea Karla	02/08/2018 - 12:43 PM
JUNIO 2018: Obra en ejecución, obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y aumento de monto	Vega Silva, Andrea Karla	05/07/2018 - 05:41 PM
MAYO 2018: Obra en ejecución, obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y aumento de monto	Vega Silva, Andrea Karla	04/06/2018 - 12:37 PM
ABRIL 2018: Obra en ejecución, los trabajos se realizan con normalidad, con acta 451 firmada se da ampliación de plazo hasta el 04 de junio del 2018. En trámite contrato complementario Nro.03, variación de cantidades y rubros nuevos	Vega Silva, Andrea Karla	02/05/2018 - 10:11 AM
ENERO-MARZO 2018: Obra en ejecución, los trabajos se realizan con normalidad, con acta 451 firmada se da ampliación de plazo hasta el 04 de junio del 2018.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	03/04/2018 - 09:27 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
dic 2017: se levanta la paralización dle proyecto el 26 de diciembre del 2017. con ampliación d eplazo de 45 días, pendiente liquidación de plazo, se regularizan los trabajos en Cebaf-Macara	Vega Silva, Andrea Karla	02/01/2018 - 11:41 AM
Nov 2017: Actualmente el proyecto se encuentra paralizado.	Vega Silva, Andrea Karla	04/12/2017 - 05:03 PM
Oct 2017: Actualmente el proyecto se encuentra reactivado desde el 11/10/2017, se realizan trabajos electricos y eléctricos, además de trabajos de imprimación de vías.	Vega Silva, Andrea Karla	01/11/2017 - 08:22 AM
SEP 2017: Actualmente el proyecto se encuentra paralizado por falta de pago de planillas, por parte del MTOP_Dirección Distrital de Loja se realizaron los pagos de planillas pendientes el día 17/08/2017, se requiere que MEF acredite dichos fondos urgentemente a la contratista, para levantar la paralización de la obra.	Ludeña Suescun, Rusbel Enrique	03/10/2017 - 09:08 AM
AGOSTO 2017: Actualmente el proyecto se encuentra paralizado por falta de pago de planillas.. 1) Se realizaron los pagos de planillas pendientes el día 17/08/2017 por parte de la Dirección Distrital de Loja, se requiere que MEF acredite dichos fondos urgentemente. 2) Con fecha 29 de marzo de 2017 se da la suspensión indefinida del proyecto, hasta que la comisión 451 resuelva sobre la solicitud de ampliación del plazo contractual y las condiciones climáticas mejoren. Con fecha 28 de junio de 2017, se reúne la Comisión 451 en Quito y celebran el acta, en la cual levantan la suspensión y aprueban la variación de cantidades, creación de rubros nuevos sin incremento de monto e incremento de plazo en sesenta días, tomando como nueva fecha para la terminación de los trabajos el 27 de agosto de 2017. Con memorando MTOP-DDL-2017-1351-ME, del 04 de agosto 2017 se da paso a la paralización legal de la obra hasta que de se de el pago de haberes pendientes al contratista. Con oficio Nro. 391-CONSORCIO A.S-CEBAF, del 04 de agosto, se solicita ampliación de 45 días a partir de la cancelación y acreditación de los haberes pendientes de pago. Por lo que urgentemente se requiere la colaboración del MEF. El Mtop es únicamente la ejecutora de la infraestructura, los responsable de los mecanismos de administración son INMOBILIAR y CANCELLERIA de acuerdo a la reunión realizada entre Cancillería, MTOP, INMOBILIAR Y SENPLADES que así lo establecieron.	Vega Silva, Andrea Karla	05/09/2017 - 12:44 PM
JULIO 2017: Actualmente el proyecto se encuentra en ejecución desde el 27 de junio del 2017, con un avance físico de la obra del 84%, con plazo vigente según acta 451 hasta el 28 de agosto del 2017. Planillas pendientes de pago por falta de asignación de recursos 998, por lo que la contratista solicitó la paralización legal de los trabajos por incumplimienrto en el pago por parte de la contratista.	Vega Silva, Andrea Karla	02/08/2017 - 03:44 PM
JUNIO 2017: Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario Nro.2.	Vega Silva, Andrea Karla	05/07/2017 - 08:35 AM
MAYO 2017: Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario Nro.2.	Vega Silva, Andrea Karla	05/06/2017 - 10:38 AM
abril 2017 Mediante Memorando Nro. MTOP-EITZ7-2016-381-ME, de fecha 28 de octubre de 2016, el Ing. Volter González, Fiscalizador del Proyecto, remite a la Dirección Provincial información para trámite de Contrato Complementario No. 1 para ampliación de plazo en 90 días, aumento y disminucion de cantidades, creación de rubros nuevos, sin incremento de monto contractual, referente a la Propuesta de Hormigon 350 Kg/cm2 en parqueos del CEBAF, Macara - La Tina. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario.	Ocampo Veintimilla, Danny Andrei	05/05/2017 - 10:09 AM
Noviembre 2016: Mediante Memorando Nro. MTOP-EITZ7-2016-381-ME, de fecha 28 de octubre de 2016, el Ing. Volter González, Fiscalizador del Proyecto, remite a la Dirección Provincial información para trámite de Contrato Complementario No. 1 para ampliación de plazo en 90 días, aumento y disminucion de cantidades, creación de rubros nuevos, sin incremento de monto contractual, referente a la Propuesta de Hormigon 350 Kg/cm2 en parqueos del CEBAF, Macara - La Tina. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	13/12/2016 - 09:37 AM
Octubre 2016: Mediante Memorando Nro. MTOP-EITZ7-2016-381-ME, de fecha 28 de octubre de 2016, el Ing. Volter González, Fiscalizador del Proyecto, remite a la Dirección Provincial información para trámite de Contrato Complementario No. 1 para ampliación de plazo en 90 días, aumento y disminucion de cantidades, creación de rubros nuevos, sin incremento de monto contractual, referente a la Propuesta de Hormigon 350 Kg/cm2 en parqueos del CEBAF, Macara - La Tina. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	08/11/2016 - 07:51 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Septiembre 2016: Mediante Memorando Nro. MTOP-EITZ7-2016-348-ME, de fecha 28 de septiembre de 2016, el Ing. Volter González, Fiscalizador del Proyecto, remite a la Dirección Provincial información solicitada desde matriz para trámite de Contrato Complementario No. 1 para ampliación de plazo en 90 días, aumento y disminución de cantidades, creación de rubros nuevos, sin incremento de monto contractual. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	10/10/2016 - 09:05 AM
Agosto 2016: En trámite Contrato Complementario No. 1 para ampliación de plazo en 90 días, aumento y disminución de cantidades, creación de rubros nuevos, sin incremento de monto contractual. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	09/09/2016 - 12:55 PM
Julio 2016: En trámite Contrato Complementario No. 1 para ampliación de plazo en 90 días, aumento y disminución de cantidades, creación de rubros nuevos, sin incremento de monto contractual. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	09/08/2016 - 05:30 PM
Junio 2016: Se reinician los trabajos de obra con una ampliación de 60 días, a partir del 8 de junio del 2016. Se legaliza Orden de Cambio No. 1 para ampliación de plazo.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	05/07/2016 - 03:24 PM
Mayo 2016: Mediante reunión de la comisión 451, aprobó una ampliación de 60 días para terminar los trabajos objeto del contrato, cuyo plazo corre a partir de que se efectivicen el pago correspondiente de cuatro planillas por parte del Ministerio de Finanzas. Actualmente el proyecto continúa suspendido.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	02/06/2016 - 04:45 PM
Abril 2016: Mediante reunión de la comisión 451, aprobó una ampliación de 60 días para terminar los trabajos objeto del contrato, cuyo plazo corre a partir de que se efectivicen el pago correspondiente de cuatro planillas por parte del Ministerio de Finanzas. Actualmente el proyecto continúa suspendido. Marzo 2016: Mediante reunión de la comisión 451, aprobó una ampliación de 60 días para terminar los trabajos objeto del contrato, cuyo plazo corre a partir de que se efectivicen el pago correspondiente de cuatro planillas por parte del Ministerio de Finanzas. Actualmente el proyecto continúa suspendido.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	04/05/2016 - 03:00 PM
Febrero 2016: Hasta la presente fecha el Ministerio de Finanzas no efectiviza el pago de las cuatro planillas realizadas por MTOP a la Contratista, por lo que no se reinicia los trabajos con los 60 días de ampliación conforme aprobación de Comisión 451.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	07/03/2016 - 04:14 PM
Enero 2016: Comisión 451, aprueba ampliación de plazo por 60 días.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	11/02/2016 - 12:53 PM
Diciembre 2015: Continúa la suspensión de los trabajos, conforme Oficio Nro. MTOP-DPL-15-363-OF, de fecha 25 de agosto la Fiscalización-MTOP, hasta que se proceda con los pagos correspondientes.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	30/12/2015 - 06:32 PM
Noviembre 2015: Continúa la suspensión de los trabajos, conforme Oficio Nro. MTOP-DPL-15-363-OF, de fecha 25 de agosto la Fiscalización-MTOP, hasta que se proceda con los pagos correspondientes.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	30/12/2015 - 06:32 PM
Octubre 2015: Continúa la suspensión de los trabajos, conforme Oficio Nro. MTOP-DPL-15-363-OF, de fecha 25 de agosto la Fiscalización-MTOP, hasta que se proceda con los pagos correspondientes.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	30/12/2015 - 06:32 PM
Septiembre 2015: Continúa la suspensión de los trabajos, conforme Oficio Nro. MTOP-DPL-15-363-OF, de fecha 25 de agosto la Fiscalización-MTOP, hasta que se proceda con los pagos correspondientes.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	30/12/2015 - 06:32 PM
Agosto 2015: Se culminan los trabajos de colocación de estructura metálica en el edificio central, mediante Oficio Nro. MTOP-DPL-15-363-OF, de fecha 25 de agosto la Fiscalización-MTOP, notifica al contratista sobre la suspensión de los trabajos hasta que se proceda con los pagos correspondientes.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	30/12/2015 - 06:31 PM
Julio 2015: Se continúan realizando trabajos de colocación de estructura metálica, la contratista solicita suspensión de trabajos por cuanto hasta la presente fecha no se le han cancelado ninguna planilla.	CECIBEL DEL CARMEN,	30/12/2015 - 06:31 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
	VARGAS PINEDA	
Junio 2015: Se continúan realizando trabajos de colocación de estructura metálica, construcción de tanque séptico.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	30/12/2015 - 06:31 PM
Mayo 2015: Con los contrapisos fundidos se inician trabajos de colocación de estructuras metálicas.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	30/12/2015 - 06:30 PM
Abril 2015: Se realizan trabajos preliminares como movimiento de tierras, construcción de bodegas para campamento y adquisición de materiales para colocación de estructuras metálicas.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	30/12/2015 - 06:29 PM
Marzo 2015: Se entrega el anticipo a la contratista con fecha 25 de marzo del 2015 con lo cual inician los trabajos.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	30/12/2015 - 06:29 PM
Febrero 2015: Se suscribe acta de adjudicación y contrato para construcción del CEBAF con la contratista CONSORCIO A.S	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	30/12/2015 - 06:28 PM
Enero 2015: El proceso precontractual se encuentra en proceso de adjudicación.	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	30/12/2015 - 06:28 PM

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. Económico. La falta de recursos económicos CAUSARÍA retraso en la entrega de la obra	03/09/2018	Andrea Karla Vega Silva	20 %	80	16	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 7 - Sur > Loja > Macara

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Planificación: Certificación Presupuestaria ejecutada	1-Solicitud de Información	23/10/2014		23/10/2014		Sí	1.0
2	Planificación: Documentos, contractuales, terminados	1-Solicitud de Información	23/10/2014		23/10/2014		Sí	1.5
3	Planificación: Publicación en Portal de Compras Publicas, concluidas	2-Publicación de Pliegos	24/10/2014		24/10/2014		Sí	1.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
4	Planificación: Acta de Adjudicación, ejecutada	3-Adjudicación	05/02/2015		05/02/2015		Sí	2.0
5	Ejecución: Suscripción de Contrato, ejecutado	3-Adjudicación	27/02/2015		27/01/2015		Sí	2.0
6	Ejecución: Entrega de anticipo, ejecutado	4-Inicio de Trabajo	25/03/2015		25/03/2015		Sí	4.0
7	Ejecución: Inicio de Trabajos, ejecutado	4-Inicio de Trabajo	25/03/2015		25/03/2015		Sí	2.0
8	Ejecución: Trabajos Preliminares, movimiento de tierras	5-Entregables Intermedios	22/07/2015		22/07/2015		Sí	3.0
9	Ejecución: Obras de calzada fase 1	5-Entregables Intermedios	19/11/2015		19/11/2015		Sí	5.0
10	Ejecución: Obras Estructurales	5-Entregables Intermedios	27/11/2015		27/11/2015		Sí	15.0
11	Ejecución: Instalaciones Hidro-sanitarias	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	6.0
12	Ejecución: Construcción de garitas	5-Entregables Intermedios	09/09/2016		09/09/2016		Sí	6.0
13	Ejecución: Instalaciones electricas	5-Entregables Intermedios	10/10/2016		10/10/2016		Sí	6.0
14	Ejecución: Instalaciones Electrónicas y Mecánicas	5-Entregables Intermedios	10/10/2016		10/10/2016		Sí	7.0
15	Ejecución: Obras arquitectonicas	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	10.0
16	Ejecución: Acabados arquitectónicos	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		31/07/2018		Sí	10.0
17	Ejecución: Obras de calzada fase 2	5-Entregables Intermedios	30/12/2018	30/12/2018			No	2.0
18	Ejecución: Señalización	5-Entregables Intermedios	30/12/2018	30/12/2018			No	2.0
19	Cierre: Liquidación Económica del Contrato ejecutada	5-Entregables Intermedios	01/01/2019	28/02/2019			No	3.0
20	Cierre: Recepción provisional del proyecto y acta de recepción provisional	9-Entregables Formales	31/03/2019	31/05/2019			No	5.0
21	Completado: Recepción definitiva del proyecto y acta de recepción, ejecutado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2019	30/11/2019			No	6.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	3,702,953.57
Estimado Al Fin Del Proyecto:	13,632,970.38 **
Costo Total:	12,343,178.58
Total Devengado:	11,996,949.27
% Costo Total Devengado:	97.19 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 97.19 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	19,345,656.98	2,251,208.49	0.00	21,596,865.47
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	2,251,208.49	0.00	2,251,208.49
Ppto. Codificado	11,851,114.47	3,476,626.18	0.00	15,327,740.65
Ppto. Comprometido	11,489,091.80	615,187.38	0.00	12,104,279.18
Planeado - Codificado (2018)		-1,225,417.69		
Programado a Devengar	9,270,126.88	2,251,208.49	0.00	11,521,335.37
Ppto. Devengado	11,381,761.89	615,187.38	0.00	11,996,949.27
Pagado Real	6,557,470.54	217,122.99	0.00	6,774,593.53
Estimado a fin de año	* 11,381,761.89	0.00	0.00	11,381,761.89
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-2,111,635.01	2,251,208.49	0.00	139,573.48
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 122.78 %	27.33 %	0.00 %	104.13 %
Ppto. Codificado 998	1,485,637.48	1,225,417.69	0.00	2,711,055.17
Ppto. Devengado 998	1,336,406.51	274,637.24	0.00	1,611,043.75

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

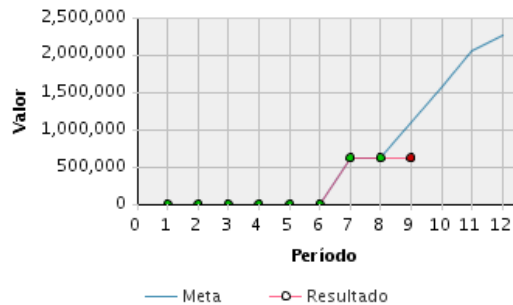

Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	615,187.38	615,187.38	615,187.38	615,187.38	100.00 %		27.33 %
Ago	0.00	0.00	615,187.38	615,187.38	100.00 %		27.33 %
Sep	477,664.59	0.00	1,092,851.97	615,187.38	56.29 %		27.33 %
Oct	477,664.59		1,570,516.56				
Nov	477,664.59		2,048,181.15				
Dic	203,027.34		2,251,208.49				
Total	2,251,208.49	615,187.38					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
15	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
16	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
17	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
18	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		AVANCE_SEMANAL_OBRA_CEBAF_05_09_2017.xlsx	03/10/2017
2	A.2 Informe ejecutivo febrero-2015	Infor-ejecutivo_febrero-2015.pdf	10/12/2015
3	A.3 Informe ejecutivo marzo-2015	Infor-ejecutivo_marzo-2015.pdf	10/12/2015
4	A.4 Informe ejecutivo abril-2015	Infor-ejecutivo_abril-2015.pdf	10/12/2015
5	A.5 Informe ejecutivo mayo-2015	Infor-ejecutivo_mayo-2015.pdf	10/12/2015
6	A.6 Informe ejecutivo junio-2015	Infor-ejecutivo_junio-2015.pdf	10/12/2015
7	A.7 Informe ejecutivo julio-2015	Infor-ejecutivo_julio-2015.pdf	10/12/2015
8	A.8 Informe ejecutivo agosto-2015	Infor-ejecutivo_agosto-2015.pdf	10/12/2015
9	A.9 Informe ejecutivo septiembre-2015	Infor-ejecutivo_septiembre-2015.pdf	10/12/2015
10	A1 Dictamen de prioridad SENPLADES	Dictamen_de_prioridad__SENPLADES_del_CEBAF.pdf	31/05/2015
11	A10 Informe ejecutivo octubre-2015	Infor-ejecutivo_octubre-2015.pdf	10/12/2015
12	A11 Informe ejecutivo noviembre-2015	Infor-ejecutivo_noviembre-2015.pdf	10/12/2015
13	A2 Convocatoria	CONVOCATORIA_CEBAF.pdf	31/05/2015
14	A3 Contrato	01-contrato.pdf	31/05/2015
15	A4 Memorando nombrando Fiscalizador y Supervisor	MTOP-DPL-2015-365-ME.pdf	31/05/2015
16	A5 Memorando nombrando al nuevo fiscalizador	MTOP-DPL-2015-562-ME.pdf	31/05/2015
17	acta 451 cebaf	acta_451_cebaf.pdf	02/08/2017
18	ACTA 451 CEBAF - MACARA - LA TINA	ACTA_451_CEBAF_-_MACARA_-_LA_TINA.pdf	05/04/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
19	B.1 Informe Ejecutivo Enero 2016	B.1_Informe_Ejecutivo_Enero_2016.pdf	07/03/2016
20	B.2 Informe Ejecutivo Febrero 2016	B.2_Informe_Ejecutivo_Febrero_2016.pdf	07/03/2016
21	B.3 Informe Ejecutivo Marzo 2016	B.3_Informe_Ejecutivo_Marzo_2016.pdf	05/04/2016
22	B.4 Informe Ejecutivo Abril 2016	Informe_Ejecutivo_Abril_2016.pdf	04/05/2016
23	B.5 Informe Ejecutivo Mayo 2016	Informe_Ejecutivo_Mayo_2016.pdf	03/06/2016
24	B.7 Informe Ejecutivo Julio 2016	Informe_Ejecutivo_Julio_2016.pdf	11/08/2016
25	B.8 Informe Ejecutivo Agosto 2016	Informe_Ejecutivo_Agosto_2016.pdf	09/09/2016
26	B.9 Informe Ejecutivo Septiembre 2016	B.9_Informe_Ejecutivo_Septiembre_2016.pdf	10/10/2016
27	B.9 Informe Ejecutivo Septiembre 2016	B.9_Informe_Ejecutivo_Septiembre_2016.pdf	10/10/2016
28	informe agosto	informe-CEBAF_04_08_2017.pdf	05/09/2017
29	INFORME CEBAF AL 31 DE MARZO DEL 2018	INFORME_CEBAF_AL_31_DE_MARZO_DEL_2018.pdf	04/04/2018
30	informe de trabajos de julio del 2017	AVANCE_SEMANAL_OBRA_CEBAF_08_2017.pdf	02/08/2017
31	Informe Ejecutivo CEBAF Macará - La Tina Mayo 2018	Informe_Ejecutivo_CEBAF_Macará_- _La_Tina_Mayo_2018.pdf	04/06/2018
32	Informe Ejecutivo Mayo 2016	Informe_Ejecutivo_Mayo_2016.pdf	03/06/2016
33	INFORME SEMANAL CEBAF 04 2018	INFORME_SEMANAL_CEBAF_04_2018.pdf	02/05/2018
34	INFORME SEMANAL CEBAF 30 06 2018	INFORME_SEMANAL_CEBAF_30_06_2018.pdf	05/07/2018
35	informe_OBRA_CEBAF_08_2017	informe_OBRA_CEBAF_08_2017.pdf	02/08/2018
36	Memorando Nro. MTOP-EITZ7-2016-348-ME	Memorando_Nro._MTOP-EITZ7-2016-348-ME.pdf	10/10/2016

LIGAS EXTERNAS

Dirección (URL)	
1	SITOP
	http://sitop.mtop.gob.ec:8080/mtop/

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Calderón Ojeda, Jaime Ramiro	Subsecretario Regional 7	Subsecretario Regional 7	jcalderon@mtop.gob.ec	023974600
Pineda Betancourt, Gabriela Del Cisne	Coordinadora de Planificación Zonal 7	Coordinadora de Planificación Zonal 7	gpineda@mtop.gob.ec	023974600
Rojas Cazar, Walter Emilio	Director Distrital de Loja	Experto de Infraestructura Provincial	wrojas@mtop.gob.ec	023974600
Vega Silva, Andrea Karla	Coordinador Técnico de Infraestructura Provincial	Coordinadora de Infraestructura Provincial	avega@mtop.gob.ec	023974600
Vega Silva, Andrea Karla	Líder del Proyecto	Coordinadora de Infraestructura Provincial	avega@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
97605_1.jpg	03/04/2018
