

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 2
Dirección Provincial Napo

PROYECTO: K018 MTOP - Construcción del Puente sobre el río Chontayacu de 50 metros de longitud.

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Líder del Proyecto: | Dias Mayorga, Daniel Andrés (ddias@mtop.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Benavides Morillo, Omar Alexander | Programas Relacionados: | CONSTRUCCION DEL PUENTE CHONTAYACU E45A ("Y" DE NARUPA - HOLLIN - LLORETO), Provincia - Napo, Proyectos Emblemáticos, Proyectos Prioritarios PAI |
| Titular: | Mora Orozco, Fabián Alberto | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 1.41 |
| CUP: | 175200000.23.4949 | TIR: | 16.60 % |
| Objetivos Operativos: | 0 | VAN: | 375,600.00 |
| Viabilidad Técnica: | Muy Alta | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 1,815,742.48 |
| Localidad de Gestión: | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 22/11/2010 - 31/12/2018 |
| Fecha de última actualización: | 02/08/2018 | Fecha de Fin Base: | 30/12/2012 |
| Modificado por: | Mora Orozco, Fabián Alberto | Fecha del siguiente Hito: | 11/06/2018 |

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES

Descripción

Construcción del puente sobre el río Chontayacu, de 50m de longitud, ubicado Vía Y de Narupa - Pasohurco. Uniendo la Provincia del Napo con la de Orellana, complementado el anillo vial: Napo - Sucumbios - Orellana

Objetivo

Interconectar las Regiones 1,2,3,6 y 7 desde el Puente Internacional sobre el Río San Miguel, en la frontera con Colombia, hasta el límite sur en la frontera con Perú, en el puente Balzas.

Estrategia

1. Supervisión técnica permanente
2. Disponibilidad de cupo presupuestario
3. Pago oportuno de planilla
4. Seguimiento al plan de obra
5. Aseguramiento del control de calidad

CONTRATISTA: Cuerpo de Ingenieros del Ejército

Beneficios Cualitativos

Se disminuirá el riesgo de accidente por el paso vehicular sobre los puentes provisionales que ya cumplieron su tiempo de servicio.

La calidad de la infraestructura vial mejorará el servicio a la circulación vehicular.

Influirá en beneficio del desarrollo de las comunidades del sector al acortar los tiempos de movilización de mercadería, personal, turismo y comercio.

Tipo de Beneficiario

Del Sectores:

Petrolero

Turístico

A la comunidad local: Loreto y Archidona

Restricciones

Tiempo. La entrega de la obra según cronograma, plazo 06 meses para culminación del contrato.

Recursos:

La mano de obra calificada requerida para la Ejecución del Proyecto considerando la experiencia que cada uno de los miembros del personal técnico mínimo deberá acreditar como mínimo, ya sea en años, número o monto de proyectos en los que haya participado.

Restricciones

Los Equipos y Materiales utilizados son de excelente calidad y rendimiento con el fin de desarrollar de manera afectiva y en el plazo estimado sumando al desarrollo del País con obras emblemáticas.


Alcance:

Las especificaciones técnicas que regirán cada uno de los Proyectos contratados por medio del MTOP Napo serán las "Especificaciones generales para la ejecución de puentes y caminos MOP-001-F 2002", del MTOP del Ecuador.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado **Congelado** Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 95.95 %
 Fecha de Inicio: 22/11/2010 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2012 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 86 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 91 % | 97 % | 97 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 86 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 91 % | 91 % | 91 % |
| Estado | | | | | | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▼ | ▼ |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| JULIO 2018: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 este monto incluye IVA, correspondiente al pago de Planilla de Reajuste Definitivo. Se encuentra incluido en el PAI 2018 y se está tramitando el pago respectivo. | Mora Orozco, Fabián Alberto | 02/08/2018 - 04:04 PM |
| JUNIO 2018: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 este monto incluye IVA, correspondiente al pago de Planilla de Reajuste Definitivo que se encuentra tramitando en el área financiera para su respectivo pago. Para lo cual se solicitó la apertura de parámetros del contrato en sistema e-sigef. | Mora Orozco, Fabián Alberto | 02/08/2018 - 04:04 PM |
| MAYO 2018: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 este monto incluye IVA, correspondiente al pago de Planilla de Reajuste Definitivo que se encuentra tramitando en el área financiera para su respectivo pago. Para lo cual se solicitó la apertura de parámetros del contrato en sistema e-sigef. | Mora Orozco, Fabián Alberto | 02/08/2018 - 04:04 PM |
| ABRIL 2018: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 este monto incluye IVA, correspondiente al pago de Planilla de Reajuste Definitivo que se encuentra tramitando en el área financiera para su respectivo pago. Para lo cual se solicitó la apertura de parámetros del contrato en sistema e-sigef. | Mora Orozco, Fabián Alberto | 02/08/2018 - 04:02 PM |
| MARZO 2018: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 este monto incluye IVA, correspondiente al pago de Planilla de Reajuste Definitivo que se encuentra tramitando en el área financiera para su respectivo pago. Para lo cual se solicitó la apertura de parámetros del contrato en sistema e-sigef. | Mora Orozco, Fabián Alberto | 02/08/2018 - 03:59 PM |
| FEBRERO 2018: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,00 este monto incluye IVA, correspondiente al pago de Planilla de Reajuste Definitivo que se encuentra tramitando en el área | Mora Orozco, Fabián Alberto | 02/08/2018 - 03:59 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| financiera para su respectivo pago. Para lo cual se solicitó la apertura de parámetros del contrato en sistema e-sigef. | | |
| ENERO 2018: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,00 este monto incluye IVA, correspondiente al pago de Planilla de Reajuste Definitivo que se encuentra tramitando en el área financiera para su respectivo pago. Para lo cual se solicitó la apertura de parámetros del contrato en sistema e-sigef. | Mora Orozco, Fabián Alberto | 02/08/2018 - 03:58 PM |
| DICIEMBRE 2017: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,00 este monto incluye IVA, correspondiente al pago de Planilla de reajuste definitivo que se encuentra tramitando en el área financiera para su respectivo pago. Para lo cual se solicitó la apertura de parámetros del contrato en sistema e-sigef. | Díaz Arequipa, Evelyn Karina | 02/01/2018 - 04:21 PM |
| NOVIEMBRE 2017: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,00 este monto incluye IVA, correspondiente al pago de Planilla de reajuste definitivo que se encuentra tramitando en el área financiera para su respectivo pago. | Díaz Arequipa, Evelyn Karina | 04/12/2017 - 02:03 PM |
| OCTUBRE 2017: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 correspondiente al pago de Planilla de reajuste definitivo, debido a que los técnicos responsables del proyecto no se encuentran laborando en la institución, el supervisor del proyecto remite un informe técnico a fin de que se emita criterio jurídico para la legalización de la planilla. | Díaz Arequipa, Evelyn Karina | 06/11/2017 - 11:46 AM |
| SEPTIEMBRE 2017: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 correspondiente al pago de Planilla de reajuste definitivo, se espera que el pago se efectúe a fines del mes de OCTUBRE de 2017. | Díaz Arequipa, Evelyn Karina | 04/10/2017 - 06:37 PM |
| AGOSTO 2017: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 correspondiente al pago de Planilla de reajuste definitivo, se espera que el pago se efectúe a fines del mes de SEPTIEMBRE de 2017. | Díaz Arequipa, Evelyn Karina | 05/09/2017 - 11:25 AM |
| JULIO 2017: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 correspondiente al pago de Planilla de reajuste definitivo, se espera que el pago se efectúe a fines del mes de SEPTIEMBRE de 2017. | Solano Pineda, Oscar Santiago | 03/08/2017 - 04:39 PM |
| JUNIO 2017: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 correspondiente al pago de Planilla de reajuste definitivo, se espera que el pago se efectúe a fines del mes de AGOSTO de 2017. | Solano Pineda, Oscar Santiago | 05/07/2017 - 09:33 AM |
| MAYO 2017: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 correspondiente al pago de Planilla de reajuste definitivo, se espera que el pago se efectúe a fines del mes de JULIO de 2017. | Solano Pineda, Oscar Santiago | 05/06/2017 - 12:17 PM |
| MAYO 2017: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 correspondiente al pago de Planilla de reajuste definitivo, se espera que el pago se efectúe a fines del mes de JUNIO de 2017. | Solano Pineda, Oscar Santiago | 05/05/2017 - 12:14 AM |
| MARZO 2017: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 correspondiente al pago de Planilla de reajuste definitivo, se espera que el pago se efectúe a fines del mes de MAYO de 2017. | León Fernández, Jhoer Gustavo | 03/04/2017 - 03:13 PM |
| FEBRERO 2017: Existe un monto pendiente de \$ 4.439,31 correspondiente al pago de Planilla de reajuste definitivo, se espera que el pago se efectúe a fines del mes de Marzo de 2017. | Zarate Iñiguez, Luis Santiago | 02/03/2017 - 09:55 AM |
| Marzo 2014: El acta de recepción de recepción definitiva de la construcción del puente se encuentra Legalizada por lo que se procede a completar este proyecto. | Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio | 05/06/2014 - 12:07 PM |
| Noviembre - Diciembre 2013: El acta de recepción de recepción definitiva de la construcción del puente se encuentra en trámite. | Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio | 07/01/2014 - 09:58 AM |
| Julio - Octubre 2013: El acta de recepción de recepción definitiva se encuentra en trámite. | Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio | 21/10/2013 - 10:07 AM |
| Mayo - Junio 2013: El acta de recepción de recepción definitiva se encuentra en trámite además de su liquidación económica. | Cevallos Castillo, Eduardo Ramiro | 04/07/2013 - 04:45 PM |
| Abril 2013: El acta de recepción de recepción definitiva se encuentra en trámite además de su liquidación económica. | Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio | 16/05/2013 - 11:37 AM |
| Marzo: El acta de recepción de recepción definitiva se encuentra en trámite además de su liquidación económica. | Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio | 16/04/2013 - 07:26 AM |
| Febrero 2013: El acta de recepción de recepción definitiva se encuentra en trámite además de su liquidación económica. | Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio | 16/04/2013 - 07:23 AM |
| Enero 2013: El acta de recepción de recepción definitiva se encuentra en trámite además de su liquidación económica. | Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio | 16/04/2013 - 07:22 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Diciembre 2012: El acta de recepción definitiva se encuentra en tramite. | Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio | 16/04/2013 - 07:20 AM |
| NOVIEMBRE 2012: Con Memorando N° MTOP-SUBREG2-2012-0122-O con fecha 26 de Septiembre se nombra una comisión para la entrega recepción definitiva. Se realiza trámites correspondientes para liquidación económica. | Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio | 16/04/2013 - 07:19 AM |
| OCTUBRE 2012: Fiscalización entrega los documentos habilitantes para el pago de las planillas de liquidación | Avilés Castillo, Byron Alfonso | 10/12/2012 - 08:29 AM |
| SEPTIEMBRE - 2012: Trámite para el pago de obras adicionales, y el cierre económico del proyecto. AGOSTO - 2012: Trámite para el pago de obras adicionales, y el cierre económico del proyecto. JULIO - 2012: Trámite para el pago de obras adicionales, y el cierre económico del proyecto. JUNIO - 2012: Trámite para el pago de obras adicionales, y el cierre económico del proyecto. MAYO - 2012: Trámite para el pago de obras adicionales, y el cierre económico del proyecto. ABRIL - 2012: Trámite para el pago de obras adicionales, y el cierre económico del proyecto. MARZO - 2012: Se realiza trámite para el pago de obras adicionales, y el cierre económico del proyecto. FEBRERO-2012: Se realiza trámite para el pago de obras adicionales, y el cierre económico del proyecto. ENERO-2012: Se realiza señalización horizontal y vertical. DICIEMBRE-2011: Se realizo cunetas laterales y se trabaja en la conformación de los accesos al puente lado norte y lado sur NOVIEMBRE 2011: Armado de la losa y fundición 1, se concluye con el montaje del acero estructural. OCTUBRE 2011: EL 25% del montaje de acero estructural SEPTIEMBRE 2011: El 25% del montaje de acero estructural y 25% de pintura AGOSTO -2011: Se colocan placas de neopreno, el 50% del montaje de acero estructural y el 25% limpieza y pintura de acero estructural JULIO - 2011: Se termino la fabricación de acero estructural, limpieza y pintura JUNIO - 2011: Infraestructura: excavación y relleno, hormigón estructural, material filtrante para drenaje Superestructura: fabricación de acero estructural MAYO - 2011: Infraestructura: excavación y relleno, hormigón estructural y acero de refuerzo, material filtrante para drenaje Superestructura: fabricación de acero estructural ABRIL - 2011: Infraestructura: excavación y relleno para puentes, hormigón ciclópeo, hormigón estructural y acero de refuerzo, gaviones Superestructura: suministro y montaje de acero estructural. MARZO - 2011: Infraestructura: Cimentación - excavación y relleno para puentes, hormigón estructural y acero de refuerzo, drenaje, escombreras FEBRERO - 2011: Infraestructura: hormigón estructural y acero de refuerzo Señalización y comunicados, (rubros ambientales) ENERO - 2011: Infraestructura: Excavación y relleno para puentes, hormigón estructural y acero de refuerzo, mejoramiento de la subrasante. Señalización y comunicados, (rubros ambientales) DICIEMBRE -2010: Entrega de anticipo, instalación de campamento y construcción de taller de carpintería | Avilés Castillo, Byron Alfonso | 07/11/2012 - 02:47 PM |

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Problema | Fecha de última actualización | Responsable | Urgencia | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|
| Revisión de documentación para la liquidación económica | 19/02/2018 | Rolando Alberto Villacis Miranda | 50 | 50 | 25 | 0/1 |

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 5- PROYECTO. Recursos. La falta de Recursos económicos CAUSARÍA el retraso del cierre del proyecto en General. | 19/02/2018 | Rolando Alberto Villacis Miranda | 50 % | 50 | 25 | 0/1 |

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|--|
| 1 | Zona 2 - Centro Norte > Napo > Archidona |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | PLANEACIÓN: Firma de contrato, realizado | 3-Adjudicación | 25/11/2010 | | 25/11/2010 | | Sí | 5.0 |
| 2 | PLANEACIÓN: Entrega de anticipo, realizado | 4-Inicio de Trabajo | 22/12/2010 | | 22/12/2010 | | Sí | 2.0 |
| 3 | PLANEACIÓN: Rubros Ambientales. Señalización, realizado | 4-Inicio de Trabajo | 28/02/2011 | | 28/02/2011 | | Sí | 2.0 |
| 4 | EJECUCIÓN: Infraestructura. Acero de refuerzo en barras, realizado | 5-Entregables Intermedios | 06/05/2011 | | 06/05/2011 | | Sí | 7.0 |
| 5 | EJECUCIÓN: Infraestructura. Hormigón estructural B f'c=240 y tubos PVC, realizado | 5-Entregables Intermedios | 06/05/2011 | | 06/05/2011 | | Sí | 10.0 |
| 6 | EJECUCIÓN: Infraestructura. Hormigón estructural; Placas de Neopreno , realizado | 5-Entregables Intermedios | 10/05/2011 | | 10/05/2011 | | Sí | 5.0 |
| 7 | EJECUCIÓN: Infraestructura. Señales al lado de la carretera; Excavación y Relleno para puentes, realizado | 5-Entregables Intermedios | 10/05/2011 | | 10/05/2011 | | Sí | 4.0 |
| 8 | EJECUCIÓN: Infraestructura. Material filtrante; Gaviones con revestimiento, realizado | 5-Entregables Intermedios | 05/06/2011 | | 05/06/2011 | | Sí | 5.0 |
| 9 | EJECUCIÓN: Superestructura. Metal miscelaneos para puentes, Juntas de dilatación y tubos PVC, realizado | 5-Entregables Intermedios | 01/07/2011 | | 01/07/2011 | | Sí | 5.0 |
| 10 | EJECUCIÓN: Superestructura. Suministro, fabricación, montaje, limpieza y pintura de acero estructural, realizado | 5-Entregables Intermedios | 01/08/2011 | | 01/08/2011 | | Sí | 24.0 |
| 11 | EJECUCIÓN: Superestructura. Acero de refuerzo en barras, realizado | 5-Entregables Intermedios | 01/10/2011 | | 01/10/2011 | | Sí | 1.0 |
| 12 | EJECUCIÓN: Accesos. Excavación en suelo; acabado de obra básica existente, realizado | 5-Entregables Intermedios | 25/10/2011 | | 25/10/2011 | | Sí | 1.0 |
| 13 | EJECUCIÓN: Infraestructura. Limpieza y reconfiguración de cauce, realizado | 5-Entregables Intermedios | 10/11/2011 | | 10/12/2011 | | Sí | 4.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 14 | EJECUCIÓN: Accesos. Desbroce, desbosque y limpieza, realizado | 5-Entregables Intermedios | 15/11/2011 | | 15/11/2011 | | Sí | 1.0 |
| 15 | EJECUCIÓN: Accesos. Mejoramiento de la subrasante, realizado | 5-Entregables Intermedios | 15/11/2011 | | 15/11/2011 | | Sí | 1.0 |
| 16 | EJECUCIÓN: Accesos. Sub base clase III, base clase I, asfalto RC250, capa de rodadura, realizado | 5-Entregables Intermedios | 20/11/2011 | | 20/11/2011 | | Sí | 1.0 |
| 17 | EJECUCIÓN: Accesos. Hormigón estructural Df'c=180 cunetas, limpieza y re conformación del cauce, realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2011 | | 30/12/2011 | | Sí | 2.0 |
| 18 | EJECUCIÓN: Superestructura. Capa de rodadura; Hormigón estructural, realizado | 5-Entregables Intermedios | 12/12/2011 | | 12/12/2011 | | Sí | 2.0 |
| 19 | EJECUCIÓN: Superestructura. Barandales de Hormigón , realizado | 5-Entregables Intermedios | 15/12/2011 | | 15/12/2011 | | Sí | 3.0 |
| 20 | EJECUCIÓN: Infraestructura: señalización a lado de la carretera (informativa), realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/01/2012 | | 30/01/2012 | | Sí | 1.0 |
| 21 | EJECUCIÓN: Señalización horizontal y vertical, realizado | 1-Solicitud de Información | 29/02/2012 | | 03/02/2012 | | Sí | 3.0 |
| 22 | CIERRE: Acta entrega recepción provisional, realizado | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/10/2012 | | 30/10/2012 | | Sí | 2.0 |
| 23 | CIERRE: Acta entrega recepción definitiva, firmada | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/11/2012 | | 17/03/2014 | | Sí | 6.0 |
| 24 | CIERRE: Liquidación económica del contrato, pagada | 9-Entregables Formales | 21/05/2018 | 11/06/2018 | | | No | 3.0 |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|---|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | Historico - | Carrera Lopez, Milton Salomón | {PR} - Provincia - NAPO | 08/12/2011 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de infraestructura ejecutado | | 100.00 % | 100 | 100 | 01/01/2011 | Diciembre |
| 2 | Porcentaje de Superestructura ejecutado | | 100.00 % | 100 | 100 | 01/04/2011 | Diciembre |
| 3 | Porcentaje de Accesos ejecutado | | 100.00 % | 100 | 100 | 01/06/2011 | Diciembre |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado: | 359,687.93 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 1,815,742.48 ** |
| Costo Total: | 899,219.83 |
| Total Devengado: | 916,522.65 |
| % Costo Total Devengado: | 101.92 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 101.92 %

Perfil Económico 2012

| | Años Previos | Año Actual (2012) | Años Futuros | Total |
|---|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| Ppto. Planeado | 907,219.84 | 150,000.00 | 899,219.83 | 1,956,439.67 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 434,314.67 | 150,000.00 | 0.00 | 584,314.67 |
| Ppto. Codificado | 304,020.26 | 612,502.39 | 8,138.48 | 924,661.13 |
| Ppto. Comprometido | 0.00 | 0.00 | 475.64 | 475.64 |
| Planeado - Codificado (2012) | | -462,502.39 | | |
| Programado a Devengar | 304,020.26 | 612,502.39 | 0.00 | 916,522.65 |
| Ppto. Devengado | 304,020.26 | 612,502.39 | 0.00 | 916,522.65 |
| Pagado Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimado a fin de año | * 304,020.26 | 612,502.39 | 0.00 | 916,522.65 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % |
| Ppto. Codificado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Devengado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2012

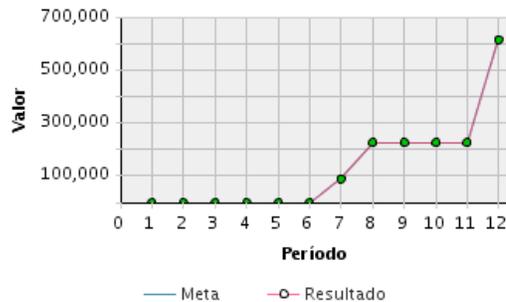

Presupuesto Mensual 2012

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | ● | 0.00 % |

| Presupuesto Mensual 2012 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| Abr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| Jul | 89,566.05 | 89,566.05 | 89,566.05 | 89,566.05 | 100.00 % | | 14.62 % |
| Ago | 137,288.36 | 137,288.36 | 226,854.41 | 226,854.41 | 100.00 % | | 37.04 % |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 226,854.41 | 226,854.41 | 100.00 % | | 37.04 % |
| Oct | 0.00 | 0.00 | 226,854.41 | 226,854.41 | 100.00 % | | 37.04 % |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 226,854.41 | 226,854.41 | 100.00 % | | 37.04 % |
| Dic | 385,647.98 | 385,647.98 | 612,502.39 | 612,502.39 | 100.00 % | | 100.00 % |
| Total | 612,502.39 | 612,502.39 | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |
|-------------------------------|
| No hay información disponible |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 1 | Acta de Recepción Provisional de la Construcción del Puente Chontayacu | acta_recepcion_provisional_Puente_Chontayacu.pdf | 16/05/2013 |
| 2 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA | A7.pdf | 05/06/2014 |
| 3 | Contrato Complementario del Proyecto Puente Chontayacu | A9.pdf | 02/03/2017 |
| 4 | Contrato del Proyecto Puente Chontayacu | A8.pdf | 02/03/2017 |
| 5 | CROQUIS AVANCE DE OBRA | PUENTE_CHONTAYACU.pdf | 05/06/2012 |
| 6 | Fotos del puente sobre el Rio Chontayacu | Fotos.doc | 22/05/2012 |
| 7 | Informe Ejecutivo al mes de Mayo -2011: La obra se encuentra concluida | INFORME_EJECUTIVO_2011-MAYO-_CHONTAYACU-RURAYACU.pdf | 06/07/2011 |
| 8 | PAGOS SEGUN ESIGEF ENE-AGO 2012 | CHONTAYACU.pdf | 10/09/2012 |
| 9 | Planilla 11 Pág. 1 al 60 E INFORMES | B1.pdf | 05/04/2017 |
| 10 | Planilla 11 Pág. 60 al 130 E INFORMES | B2.pdf | 05/04/2017 |
| 11 | Planilla Costo + % Pág. 1 al 51 | B3.pdf | 05/04/2017 |
| 12 | Planilla de Liquidación Pág. 1 al 52 | B4.pdf | 05/04/2017 |
| 13 | Planilla de Liquidación Pág. 53 al 115 | B5.pdf | 05/04/2017 |
| 14 | Proyecto Priorizado SENPLADES | INFORME_DEFINITIVO-VIABILIDAD_CHONTAYACU.DOC | 04/05/2012 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|--------|-------------------------|--------|--------------------|-------------|
| | Asistente de Ingeniería | | | |

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|-------------------------------|---------------------------------|---|---------------------|-------------|
| López Manitio, Pedro Simón | Subsecretario Regional 2 | | salio@mtop.gob.ec | |
| Solano Pineda, Oscar Santiago | Director Provincial (Encargado) | Analista de Infraestructura Distrital 1 | osolano@mtop.gob.ec | 023974600 |
| Solano Pineda, Oscar Santiago | Supervisor de Obra | Analista de Infraestructura Distrital 1 | osolano@mtop.gob.ec | 023974600 |

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

| Archivo | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 18195_1.jpg | 19/02/2018 |
