

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 5
Dirección Provincial Bolívar

PROYECTO: K006 MTOP - Construcción y Fiscalización de la carretera Chillanes-Bucay: Construcción de la Carretera Chillanes-Bucay de 55.44 km de longitud. (Bolívar)

Líder del Proyecto:	Pungaña Zaruma, Sergio Washington (spungana@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	Programas Relacionados:	CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA CHILLANES BUCAY, Provincia - Bolivar
Titular:	Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.766.3365	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	41,226,032.78
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	25/07/2008 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	08/03/2018	Fecha de Fin Base:	30/04/2014
Modificado por:	Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN

Construcción de la carretera Chillanes - Bucay, con una longitud de 55.44 Km de longitud, proyecto ubicado en la Provincia de Bolívar.

PRODUCTO/SERVICIO

Carretera Chillanes - Bucay, con una longitud de 55.44 Km de longitud, proyecto que une a los cantones de la provincia Bolívar, rehabilitada, mejorada y señalizada óptima para la circulación vehicular.

LÍNEA BASE

Ante la necesidad de los pobladores de las Parroquias pertenecientes al Cantón Chillanes se ejecuta la obra Construcción de la carretera Chillanes - Bucay, con una longitud de 55.44 Km de longitud, proyecto ubicado en la Provincia de Bolívar, para fomentar el turismo, la producción agrícola y por ende mejorando la calidad de vida de los pobladores.

OBJETIVO GENERAL

Construir la carretera Chillanes - Bucay, con una longitud de 55.44 Km de longitud, proyecto ubicado en la Provincia de Bolívar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Incrementar la velocidad de diseño.
 Colocar señalización Horizontal y vertical para mejorar la visibilidad y velocidad de circulación
 Construcción de cunetas

MONTO TOTAL DEL PROYECTO: 43,784,046.66
 CONTRATISTA: CONSORCIO BELLAVISTA.
 FISCALIZACION: INCE CIA. LTDA.

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de la Carretera Chillanes-Bucay de 55.44 km de longitud. (Bolívar)

Beneficios Cualitativos

Red vial estatal con asfalto y señalización.

Tipo de Beneficiario

Comercio
Turístico
Social
Industrial
Agrapecuario


Restricciones

Tiempo: Máximo se debe terminar el proyecto el 30/10/2012

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre **Completado** Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 25/07/2008 Fecha de Fin: 31/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

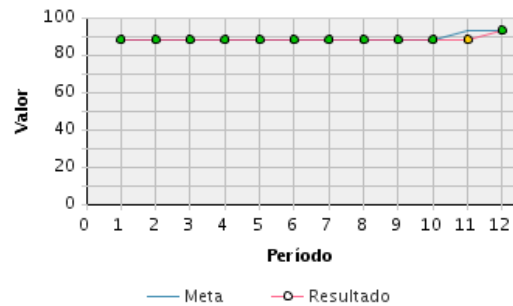

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2014	Avance programado acumulado											
	88 %	88 %	88 %	88 %	88 %	88 %	88 %	88 %	88 %	88 %	93 %	93 %
	Avance real acumulado											
	88 %	88 %	88 %	88 %	88 %	88 %	88 %	88 %	88 %	88 %	88 %	93 %
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▼	●

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Diciembre 2017: - Se encuentra ejecutándose un contrato emergente para el tramo CHILLANES-SANTA ROSA DE AGUA CLARA, actualmente se ejecuta trabajos de construcción del ducto cajón. - El proyecto se encuentra terminado, pero con fecha 07 de agosto de 2017.	Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier	05/01/2018 - 04:38 PM
Noviembre 2017: - Se encuentra ejecutándose un contrato emergente para el tramo CHILLANES-SANTA ROSA DE AGUA CLARA, actualmente se ejecuta trabajos de construcción del ducto cajón. - El proyecto se encuentra terminado, pero con fecha 07 de agosto de 2017.	Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier	05/12/2017 - 10:38 AM
Octubre 2017 - El proyecto se encuentra terminado, pero con fecha 07 de agosto de 2017, se suscribió el contrato emergente para el tramo CHILLANES-SANTA ROSA DE AGUA CLARA, luego de lo cual se realizaron algunas inspecciones entre el Contratista, Fiscalización y Supervisión, con el fin de determinar el alcance de los trabajos contratados, determinándose que es	Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier	01/11/2017 - 11:59 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
necesario determinar una evaluación técnica económica con el propósito de ejecutar rubros no contemplados en el contrato		
<p>Octubre 2017</p> <p>- Actualmente se ejecuta trabajos de construcción del ducto cajón. Se requiere una evaluación técnica económica con el fin de determinar los rubros necesarios para dar atención a ciertos puntos críticos que presenta el proyecto.</p>	Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier	01/11/2017 - 11:58 AM
<p>Septiembre 2017:</p> <p>- El proyecto se encuentra terminado, pero con fecha 07 de agosto de 2017, se suscribió el contrato emergente para el tramo CHILLANES-SANTA ROSA DE AGUA CLARA, luego de lo cual se realizaron algunas inspecciones entre el Contratista, Fiscalización y Supervisión, con el fin de determinar el alcance de los trabajos contratados, determinándose que es necesario determinar una evaluación técnica económica con el propósito de ejecutar rubros no contemplados en el contrato, esto debido a que la fuerte estación invernal produjo afectaciones en algunos sistemas de drenaje y estructura de pavimento por lo que es necesario la construcción de alcantarillas de acero corrugado y hormigón armado, así como también la construcción de badenes que permitan recuperar el ancho de vía en los sitios colapsados, evaluación que se encuentra en trámite.</p>	Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier	04/10/2017 - 10:46 AM
<p>Agosto 2017:</p> <p>En período de recepción provisional y definitiva, mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ5-2017-1232-ME, de fecha 31 de agosto de 2017, se nombro la comisión de recepción definitiva.</p>	Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier	06/09/2017 - 12:25 PM
<p>Julio 2017:</p> <p>Proyecto completado, se realizó el pago de liquidación pendiente el día 22 de marzo de 2017. No se encuentra pendiente ningún acto contractual, además de cuenta con las debidas actas del proyecto. Anexo CUR de pago correspondiente.</p>	Abedrabbo García, Jorge Farah	04/08/2017 - 04:09 PM
<p>JUNIO 2017:</p> <p>Proyecto completado, se realizó el pago de liquidación pendiente el día 22 de marzo de 2017. No se encuentra pendiente ningún acto contractual, además de cuenta con las debidas actas del proyecto. Anexo CUR de pago correspondiente.</p>	Abedrabbo García, Jorge Farah	11/07/2017 - 03:00 PM
<p>MAYO 2017:</p> <p>Proyecto completado, se realizó el pago de liquidación pendiente el día 22 de marzo de 2017. No se encuentra pendiente ningún acto contractual, además de cuenta con las debidas actas del proyecto. Anexo CUR de pago correspondiente.</p>	Abedrabbo García, Jorge Farah	05/06/2017 - 03:17 PM
<p>ABRIL 2017:</p> <p>Tramo San Pablo Chillanes, este tramo requiere de manera urgente la intervención debido que a la actualidad la capa de rodadura de doble tratamiento bituminoso se encuentra en malas condiciones con grandes baches, de este tramo el MTOP cuenta con estudios definitivos y aprobados y la inversión para la ejecución de esta obra es de 19 millones. Tramo Chillanes-Bucay, para realizar los trabajos definitivos de todos los puntos críticos causados por la etapa invernal y el terremoto causado el 16 de abril de 2016 se requiere la contratación de estudios de ingeniería a fin de remediar definitivamente los puntos críticos.</p>	Abedrabbo García, Jorge Farah	08/05/2017 - 03:36 PM
<p>Marzo 2017:</p> <p>Tramo Chillanes-Bucay, vía CERRADA, maquinaria de la institución se encuentra realizando la limpieza de derrumbes de gran magnitud, existe pérdida de plataforma de la vía en el sector de achín, para realizar los trabajos definitivos de todos los puntos críticos causados por la etapa invernal y el terremoto causado el 16 de abril de 2016 se requiere la contratación de estudios de ingeniería a fin de remediar definitivamente los puntos críticos. Tramo San Pablo Chillanes, este tramo requiere de manera urgente la intervención debido que a la actualidad la capa de rodadura de doble tratamiento bituminoso se encuentra en malas condiciones con grandes baches, de este tramo el MTOP cuenta con estudios definitivos y aprobados y la inversión para la ejecución de esta obra es de 19 millones.</p>	Abedrabbo García, Jorge Farah	05/04/2017 - 04:10 PM
<p>Febrero 2017:</p> <p>El proyecto se encuentra terminado. Debido a las fuertes lluvias se encuentran deslizamientos de lodo de gran magnitud en varios puntos, pérdida de plataforma de la vía. Se recomienda cerrar la vía precautelando la seguridad de los usuarios.</p>	Abedrabbo García, Jorge Farah	06/03/2017 - 08:57 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Junio (2015): Firmada el Acta de Entrega Recepción Definitiva con fecha 23 de diciembre del 2014. El proyecto no contempla mantenimiento. El mantenimiento se realizará como gasto corriente.	Abedrabbo García, Jorge Farah	10/06/2015 - 09:22 AM
Diciembre(2014): Proyecto totalmente terminado, se espera firmar el Acta en el mes de Enero 2015.	Lara Villacis, Ligia Elena	06/01/2015 - 09:44 AM
Noviembre(2014): En trámite el Acta de Recepción Definitiva, las obras se entregaron en la fecha establecida en el contrato. Debido al fuerte temporal invernal no se pudo realizar el Acta de Recepción Provisional ya que se tuvo que realizar trabajos adicionales hasta el mes de julio 2013. Se firmó el Acta Provisional el 1 de Julio 2013, la firma del acta de recepción definitiva estuvo prevista para el mes de enero 2014 acto que no se ha cumplido por cuanto se está legalizando el trámite de los accesos al sector de Achín con lo cuál se procederá a firmar el Acta de Recepción Definitiva.	Lara Villacis, Ligia Elena	08/12/2014 - 12:25 PM
Octubre(2014): Se realizan trabajos de mantenimiento rutinario, limpieza de derrumbes menores. etc. En trámite Acta Recepción Defenitiva	Lara Villacis, Ligia Elena	06/11/2014 - 02:20 PM
Septiembre(2014):Se realizan trabajos de mantenimiento rutinario, limpieza de derrumbes menores. etc. En trámite Acta Recepción Defenitiva	Lara Villacis, Ligia Elena	06/10/2014 - 04:14 PM
Agosto(2014): En trámite Acta de Entrega Recepción Definitiva, se realizó la liquidación económica. Se realizan trabajos de mantenimiento rutinario, limpieza de derrumbes menores. etc	Lara Villacis, Ligia Elena	09/09/2014 - 02:32 PM
Julio(2014): En trámite Acta de Entrega Recepción Definitiva, se realizó la liquidación económica.	Lara Villacis, Ligia Elena	05/08/2014 - 10:40 AM
Diciembre(2013): Obra 100% concluida. Se encuentra en trámite el acta de recepción provisional y Liquidación económica. Fecha estimada para la inauguración segunda quincena de enero 2014.	Viscarra Gavilanes, Medardo Patricio	06/01/2014 - 02:23 PM
Noviembre(2013): Obra 100% concluida. Se encuentra en trámite el acta de recepción provisional y Liquidación económica. Fecha estimada para la inauguración segunda quincena de enero 2014.	Viscarra Gavilanes, Medardo Patricio	06/12/2013 - 03:45 PM
Octubre(2013): Obra 100% concluida. Se encuentra en trámite el acta de recepción provisional y Liquidación económica. Fecha estimada para la inauguración segunda quincena de enero 2014.	Lara Villacis, Ligia Elena	06/11/2013 - 11:56 AM
Septiembre(2013): Obra 100% concluida. Se encuentra en trámite el acta de recepción provisional y Liquidación económica. Fecha estimada para la inauguración segunda quincena de enero 2014.	Lara Villacis, Ligia Elena	08/10/2013 - 10:02 AM
Agosto(2013): Proyecto terminado, se encuentra realizando reparaciones y construcción de cunetas, Limpieza de derrumbes, bacheo menor, Señalización Horizontal y Vertical. En trámite acta de entrega recepción provisional.	Lara Villacis, Ligia Elena	06/09/2013 - 12:17 PM
Julio(2013): Reparaciones y construcción de cunetas, Limpieza de derrumbes, bacheo menor. En trámite acta de entrega recepción provisional.	Gaviláñez Camacho, Fafo Holguin	06/08/2013 - 03:04 PM
Junio (2013): Reparaciones y construcción de cunetas, Limpieza de derrumbes, bacheo menor. En trámite acta de entrega recepción provisional.	Gaviláñez Camacho, Fafo Holguin	04/07/2013 - 02:45 PM
Mayo (2013): Reparaciones y construcción de cunetas, Limpieza de derrumbes, bacheo menor	Gaviláñez Camacho, Fafo Holguin	06/06/2013 - 09:38 AM
Abril (2013): Reparaciones y construcción de cunetas, Limpieza de derrumbes, bacheo menor.	Gaviláñez Camacho, Fafo Holguin	03/05/2013 - 11:40 AM
Marzo (2013): Se culminan los trabajos de construcción de cunetas, señalización horizontal y vertical.	Gaviláñez Camacho, Fafo Holguin	03/05/2013 - 11:36 AM
Febrero(2013): Se realizan trabajos de construcción de cunetas, señalización horizontal y vertical,	Gaviláñez Camacho, Fafo Holguin	08/04/2013 - 09:32 AM
Enero(2013): Señalización horizontal y vertical, construcción de cunetas, limpieza de derrumbes.	Gaviláñez Camacho, Fafo Holguin	26/02/2013 - 10:24 AM
Diciembre(2012): Colocación de Carpeta de rodadura, señalización horizontal y vertical, construcción de cunetas, limpieza de derrumbes.	Gaviláñez Camacho, Fafo Holguin	26/02/2013 - 10:24 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Noviembre(2012): Construcciones de obras de drenaje(cunetas), construcción de muro de construcción, Hormigon simple, guardacaminos.</p>	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	29/11/2012 - 12:03 PM
<p>Octubre(2012): Transporte de materiales de excavación, construcciones de obras de drenaje(cunetas), construcción de muro de construcción. Septiembre(2012): Realizó la Reprogramación, Hormigon simple, guardacaminos,Limpieza de derrumbes, transporte de materiales de excavación, construcciones de obras de drenaje(cunetas), construcción de muro de construcción. Agosto(2012): Construcciones de obras de drenaje(cunetas), construcción de muro de construcción, Transporte de materiales de excavación Julio(2012): Guardacaminos,Limpieza de derrumbes, transporte de materiales de excavación, construcciones de obras de drenaje(cunetas), construcción de muro de construcción. Junio (2012) Hormigon simple, guardacaminos,Limpieza de derrumbes, transporte de materiales de excavación, construcciones de obras de drenaje(cunetas), construcción de muro de construcción. Mayo (2012) Limpieza de derrumbes, transporte de materiales de excavación, construcciones de obras de drenaje(cunetas), construcción de muro de construcción. Abril(2012) Limpieza de derrumbes, transporte de material de excavación, escombreras, construccion de cunetas laterales y muros, señalizaciones"Guardavías." Marzo(2012) Limpieza de derrumbes, transporte de material de excavación, construcción de muros de hormigón de cemento portland, construcción de cunetas laterales con hormigon simple, guardacaminos, escombreras, perfilado y saneado de taludes. Febrero-2012: Deslizamiento de taludes por la etapa invernal. Etapa inverna fuerte impidiendo el avance físico programado. Enero-2012: Deslizamiento de taludes por la etapa invernal. Diciembre-2011: Avance de trabajo normal, ejecutando las diferentes capas de la estructura de pavimento. Cumpliendo con el decreto 451. Noviembre-2011: Avance de trabajo normal, ejecutando las diferentes capas de la estructura de pavimento. Octubre-2011: Avance de trabajo normal, ejecutando las diferentes capas de la estructura de pavimento. Trituración de los agragados, es constante. Avance de obras de drenaje. Septiembre-2011: Avance de trabajo normal, ejecutando las diferentes capas de la estructura de pavimento. Trituración de los agragados, es constante. Avance de obras de drenaje. Agosto-2011: Constató avance físico del 80 % del contrato original. Se prevee realizar un contrato complementario por el incremento, decrecimiento y la creación de rubro Nuevos.</p>	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	29/11/2012 - 12:03 PM

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Chillanes

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Adjudicación realizada	3-Adjudicación	25/07/2008		25/07/2008		Sí	1.56
2	PLANEACIÓN: Inicio de trabajos realizada	4-Inicio de Trabajo	30/07/2011		30/07/2011		Sí	3.0
3	EJECUCIÓN: Desbroce, desbosque y limpieza realizada	5-Entregables Intermedios	30/08/2011		30/08/2011		Sí	2.0
4	EJECUCIÓN: Excavación en suelo realizada	1-Solicitud de Información	30/09/2011		30/09/2011		Sí	5.0
5	EJECUCIÓN: Excavación en roca realizada	1-Solicitud de Información	30/10/2011		30/10/2011		Sí	5.0
6	EJECUCIÓN: Trabajos en la subrasante realizada	1-Solicitud de Información	30/11/2011		30/11/2011		Sí	5.0
7	EJECUCIÓN: Encauzamientos realizada	1-Solicitud de Información	30/12/2011		30/12/2011		Sí	9.0
8	EJECUCIÓN: Alcantarillas realizada	1-Solicitud de Información	30/01/2012		30/01/2012		Sí	9.0
9	EJECUCIÓN: Aceras y bordillos realizada	1-Solicitud de Información	10/02/2012		10/02/2012		Sí	8.0
10	EJECUCIÓN: Cunetas realizada	1-Solicitud de Información	29/02/2012		29/02/2012		Sí	8.0
11	EJECUCIÓN: Hormigones realizada	1-Solicitud de Información	20/04/2012		20/04/2012		Sí	4.0
12	EJECUCIÓN: Juntas de dilatación realizada	1-Solicitud de Información	30/05/2012		30/05/2012		Sí	1.0
13	EJECUCIÓN: Impacto ambiental realizada	1-Solicitud de Información	30/06/2012		30/06/2012		Sí	1.44
14	EJECUCIÓN: Colocación de carpeta asfáltica realizada	1-Solicitud de Información	30/10/2012		30/10/2012		Sí	6.0
15	EJECUCIÓN: Terminación Cunetas realizada	1-Solicitud de Información	30/10/2012		30/10/2012		Sí	5.0
16	EJECUCIÓN: Trabajos complementarios realizada	1-Solicitud de Información	30/10/2012		30/10/2012		Sí	5.0
17	EJECUCIÓN: Señalización horizontal y vertical realizada	5-Entregables Intermedios	30/04/2013		30/04/2013		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN: Terminación Trabajos complementarios realizada	5-Entregables Intermedios	30/04/2013		30/04/2013		Sí	4.0
19	CIERRE: Acta entrega recepción provisional realizada	9-Entregables Formales	22/06/2013		01/07/2013		Sí	5.0
20	COMPLETADO: Acta entrega recepción Definitiva realizada	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		23/12/2014		Sí	5.0
21	COMPLETADO: Liquidación definitiva COMPLETADO:	9-Entregables Formales	31/12/2016		22/03/2017		Sí	7.0


SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	EL PROYECTO SI SE EJECUTA EN EL CANTON CHILLANES	Tenelema Taris, Piedad Norma	{PR} - Provincia - BOLIVAR	30/04/2017
2	Acta Entrega Recepcion definitiva, se realizara en 15 dias aproximadamente	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	04/09/2014
3	Falta señaletica en la vía	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	10/10/2013
4	Supervisión No 1	Bayas Duran, Angel Ovidio	{PR} - Provincia - BOLIVAR	30/04/2013

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
5	Supervisión de la Vía que va desde el Cantón Chillanes hasta el _Recinto	Bayas Duran, Angel Ovidio	{PR} - Provincia - BOLIVAR	29/05/2013
6	Supervisión de la Vía que va desde el Cantón Chillanes hasta el _Recinto	Bayas Duran, Angel Ovidio	{PR} - Provincia - BOLIVAR	29/05/2013
7	Supervisión No 1	Bayas Duran, Angel Ovidio	{PR} - Provincia - BOLIVAR	30/04/2013
8	Historico - Conforme a la visita realizada el 07/08/2012, al tramo de la vía Chillanes # Bucay se pudo evidenciar que se encuentra asfaltado totalmente unos 17 km aproximadamente, en donde falta s	Bayas Duran, Angel Ovidio	{PR} - Provincia - BOLIVAR	13/08/2012
9	Historico - Los estudios se realizaron durante los meses de marzo y abril del 2012 con la finalidad principal de mejorar el alto número de curvas que existe en esta vía. La ciudadanía de Chillan	Bayas Duran, Angel Ovidio	{PR} - Provincia - BOLIVAR	25/04/2012
10	Historico - Chillanes, Santa Rosa de Agua, Clara y Bucay puedo informar que se encuentran trabajando en varios frentes en lo que relaciona a limpieza de derrumbos en toda la vía en razón que el	Bayas Duran, Angel Ovidio	{PR} - Provincia - BOLIVAR	25/02/2012
11	Historico - Movilización de tierra desde Chillanes hasta Santa Rosa de Agua Clara, se ide ntifica desde Chillanes hasta el puente de Alvarado con Sub - Base y con base hasta Vista Alegre. Desde el	Bayas Duran, Angel Ovidio	{PR} - Provincia - BOLIVAR	24/11/2011

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Avance Físico del Proyecto		100.00 %	100	100	01/01/2012	Diciembre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	8,846,620.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	41,226,032.78 **
Costo Total:	43,784,046.66
Total Devengado:	41,828,038.63
% Costo Total Devengado:	95.53 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 95.53 %

Perfil Económico 2014

	Años Previos	Año Actual (2014)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	39,033,564.92	380,700.00	1,105,363.06	40,519,627.98
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	39,033,564.92	431,401.22	1,941,027.03	41,405,993.17
Ppto. Comprometido	0.00	431,401.22	1,783,565.23	2,214,966.45
Planeado - Codificado (2014)		-50,701.22		
Programado a Devengar	39,740,023.09	380,646.54	1,105,363.06	41,226,032.69
Ppto. Devengado	39,740,023.18	431,401.22	1,656,614.23	41,828,038.63
Pagado Real	0.00	431,401.22	1,656,614.23	2,088,015.45
Estimado a fin de año	* 39,740,023.18	380,700.00	0.00	40,120,723.18
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-0.09	-53.46	1,105,363.06	1,105,309.51
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	113.33 %	149.87 %	101.46 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2014

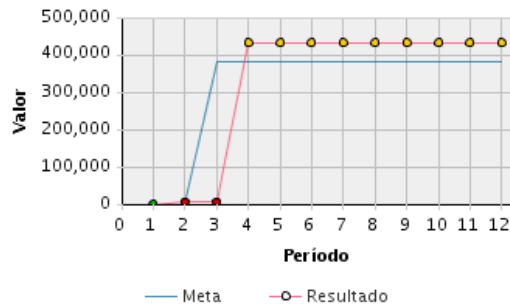

Presupuesto Mensual 2014

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2014							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	5,077.10	0.00	5,077.10	115.00 %		1.33 %
Mar	380,646.54	0.00	380,646.54	5,077.10	1.33 %		1.33 %
Abr	0.00	426,324.12	380,646.54	431,401.22	113.33 %		113.33 %
May	0.00	0.00	380,646.54	431,401.22	113.33 %		113.33 %
Jun	0.00	0.00	380,646.54	431,401.22	113.33 %		113.33 %
Jul	0.00	0.00	380,646.54	431,401.22	113.33 %		113.33 %
Ago	0.00	0.00	380,646.54	431,401.22	113.33 %		113.33 %
Sep	0.00	0.00	380,646.54	431,401.22	113.33 %		113.33 %
Oct	0.00	0.00	380,646.54	431,401.22	113.33 %		113.33 %
Nov	0.00	0.00	380,646.54	431,401.22	113.33 %		113.33 %
Dic	0.00	0.00	380,646.54	431,401.22	113.33 %		113.33 %
Total	380,646.54	431,401.22					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
9	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
10	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
11	Incrementar la eficiencia de control para el cumplimiento de los contratos MEDIANTE un plan de verificación y coordinación de acciones paralelas con la administración, la fiscalización y supervisión acorde al cronograma de obra y económico.
12	Incrementar la conectividad de todos los modos de transporte en cada región MEDIANTE un plan de coordinación para el diseño y construcción de corredores que integren física y operacionalmente los modos de transporte.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta de Entrega Recepción Definitiva	Acta_de_Entrega_Definitiva.pdf	10/06/2015
2	Asfalto	mtop_084.jpg	10/04/2012
3	COmpletado - Acta de Recepción Definitiva	141_Acta_de_Entrega_Recepción_Definitiva.pdf	15/01/2015
4	Completado: Informe de avance de mantenimiento San Pablo - Chillanes - Bucay Febrero 2017	Avance_San_Pablo-Chillanes-Bucay_Febrero_2017.pdf	06/03/2017
5	Completado: Informe de avance de mantenimiento San Pablo - Chillanes - Bucay Marzo 2017	INFORME_CHILLANES_BUCAY.pdf	05/04/2017
6	Croquis Proyecto Chillanes-Bucay	1.Proyecto_Chillanes-Bucay.pdf	15/06/2012
7	CUR DE PAGO DE LIQUIDACIÓN PENDIENTE 2017	CUR_Liquidación_Chillanes_Bucay.pdf	05/06/2017
8	Deslizamiento de Taludes	mtop_019.jpg	10/04/2012
9	Deslizamiento de Taludes	mtop_026.jpg	10/04/2012
10	HITO 19 Acta Provisional	A.1_Acta_de_Entrega_Recepción_Provisional.pdf	18/07/2014
11	Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. ABRIL 2017	INFORME_DE_TRABAJOS_San_Pablo-Chillanes-Bucay_Informe_Mayo_2017.pdf	08/05/2017
12	Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. AGOSTO 2017	San_Pablo-Chillanes-Bucay_Agosto_2017.pdf	06/09/2017
13	Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. NOVIEMBRE 2017	Chillanes_Santa_Rosa_de_Agua_Clara_27-11-2017_..pdf	05/12/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
14	Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. OCTUBRE 2017	Ayuda_Memoria_Emergente_Chillanes_Santa_Rosa_de_Agua Clara_09_2017.pdf	01/08/2017
15	Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. SEPTIEMBRE 2017	Emergente_Chillanes_Santa_Rosa_de_Agua Clara_09_2017.pdf	01/08/2017
16	Informe Ejecutivo Abril 2012	Abril_Ch_B.pdf	14/08/2012
17	Informe Ejecutivo Abril 2014	A.5.pdf	05/08/2014
18	Informe Ejecutivo Agosto 2012	1.0.1.pdf	08/10/2012
19	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2013	08_2013.pdf	08/10/2013
20	Informe Ejecutivo Agosto 2014	A.9_Informe_Ejecutivo_Agosto_2014.pdf	06/10/2014
21	Informe Ejecutivo Diciembre 2011	Diciembre.pdf	02/04/2012
22	Informe Ejecutivo Diciembre 2014	Informe_Ejecutivo_Diciembre_2014.pdf	06/01/2015
23	Informe Ejecutivo Enero 2012	Enero.pdf	02/04/2012
24	Informe Ejecutivo Enero 2014	A.2.pdf	05/08/2014
25	Informe Ejecutivo Febrero 2012	Febrero.pdf	02/04/2012
26	Informe Ejecutivo Febrero 2014	A.3.pdf	05/08/2014
27	Informe Ejecutivo Julio 2012	Julio.pdf	22/08/2012
28	INFORME EJECUTIVO JULIO 2013	07_2013.pdf	08/10/2013
29	Informe Ejecutivo Julio 2014	A.8.pdf	05/08/2014
30	Informe Ejecutivo Junio 2012	1.1_Junio_Ch_B.pdf	14/08/2012
31	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2013	INFORME_EJECUTIVO_CHILLANES_-_BUCAY_JUNIO_2013.pdf	04/07/2013
32	Informe Ejecutivo Junio 2014	A.7.pdf	05/08/2014
33	Informe Ejecutivo Marzo 2012	Marzo_Ch_B.pdf	14/08/2012
34	Informe Ejecutivo Marzo 2014	A.4.pdf	05/08/2014
35	Informe Ejecutivo Mayo 2012	Mayo_Ch_B.pdf	14/08/2012
36	INFORME EJECUTIVO MAYO 2013	INFORME_EJECUTIVO_CHILLANES_-_BUCAY_MAYO_2013.pdf	04/07/2013
37	Informe Ejecutivo Mayo 2014	A.6.pdf	05/08/2014
38	Informe Ejecutivo Noviembre 2011	01_Noviembre_2011.pdf	03/04/2012
39	Informe Ejecutivo Octubre 2014	B.2.pdf	06/11/2014
40	Informe Ejecutivo Septiembre 2012	0.0.0.1.pdf	27/11/2012
41	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013	09_2013.pdf	08/10/2013
42	Informe Ejecutivo Septiembre 2014	B.1_Informe_Ejecutivo_Septiembre_2014.pdf	06/10/2014
43	Neblina	mtop_027.jpg	10/04/2012
44	Relatoría Fotográfica	RELATORÍA.pdf	10/04/2012
45	Trámite Acta de Recepción Definitiva.	Informe_Ejecutivo_Noviembre_2014.pdf	08/12/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier	Supervisor	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Bolívar	gpilamunga@mtop.gob.ec	023974600
Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier	Director Provincial de Bolívar	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Bolívar	gpilamunga@mtop.gob.ec	023974600
Pungaña Zaruma, Sergio Washington	Supervisor de Conservación Vial	Supervisor de Conservación Vial de Bolívar	spungana@mtop.gob.ec	023974600
