

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 5**  
**Dirección Provincial Guayas**

**PROYECTO: K064** MTOP - Mantenimiento Vial de la Provincia del Guayas

Líder del Proyecto:	Salas Aragundi, Daniel (dsalas@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	Programas Relacionados:	Provincia - Guayas, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3844	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	5	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	02/07/2014 - 31/10/2018
Fecha de última actualización:	09/08/2018	Fecha de Fin Base:	02/07/2015
Modificado por:	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	Fecha del siguiente Hito:	10/10/2018

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Construcción de la Plaza Gastronómica y servicios en Progreso, y la corrección geométrica del distribuidor de tráfico y aumento del Gálibo del intercambiador de Progreso

La Vía Guayaquil-Salinas pasa debajo del puente del distribuidor de tráfico, a la altura de Progreso, cuyo gálibo actual es de 5.2 m. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas desea aumentar el gálibo del puente del distribuidor de tráfico de Progreso, a 6 m de altura como mínimo.

Se propone la elevación del puente mediante un sistema hidráulico de cilindros y bombas, para lograr la altura deseada, y fundición de muro complementario de apoyo para descanso definitivo.

ID SITOP:8450  
Monto: \$ 3,175,103.57  
Longitud: 3.5 km, incluye accesos  
Plazo de ejecución:6 Meses  
Fecha de entrega de Anticipo:22 de julio de 2014  
Porcentaje de Anticipo Entregado:7.50%  
Fecha de inicio según contrato: 02 de Julio de 2014  
Monto de Anticipo entregado:\$ 238,132.77  
Total planillado a la fecha:\$ 0.00

PRODUCTO: Intercambiador  
OBJETIVO: Corrección geométrica del distribuidor de tráfico y aumento del Gálibo del intercambiador de Progreso

año 2018 este proyecto abarca:

- 1.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA DE ACCESO A MONTE SINÁI DE 4.5 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS
- 2.- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA GASTRONÓMICA UBICADA EN LA PARROQUIA GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO)
- 3.- GASTOS OPERACIONALES: APORTE PATRONAL
- 4.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DDG DEL MTOP- PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO- NOCTURNO
- 5.- GASTOS OPERACIONALES: HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
- 6.- GASTOS OPERACIONALES: FONDOS DE RESERVA
- 7.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: EMPALME PICHINCHA

**DATOS GENERALES**


Descripción
8.- MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RIOS, TRABAJOS REALIZADOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS
9.- GASTOS OPERACIONALES: SERVICIO DE VIGILANCIA PUNTO DE SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, DIURNO-NOCTURNO (SEGURIDAD Y VIGILANCIA)
10.- ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO 2018 DE VARIAS VIAS DE LA RED VIAL ESTATAL
11.- ADMINISTRACION, COBRO Y RECAUDACION DE Y DEPOSITO DE LA ESTACION DE PEAJE CHONGON - UBICADA EN LA CARRETERA GUAYAQUIL - PROGRESO, PROVINCIA DEL GUAYAS
12.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E-40 TRAMO PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS
13.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO CUARTO SUELDO
14.- MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA E-40 TRAMO: PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS
15.- GASTOS OPERACIONALES: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
16.- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA SALITRE LIMITE GUAYAS - LOS RIOS A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS.
17.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: NARANJAL A RIO 7
18.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E40 PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA SECTOR LA PUNTILLA CON UNA EXTENSION DE 17.80 KM
19.- SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
20.- GASTOS OPERACIONALES: VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)
21.- GASTOS OPERACIONALES: DECIMO TERCER SUELDO
22.- MANTENIMIENTO RUTINARIO: PUENTES DE LA UNIDAD NACIONAL

Beneficios Cualitativos
Mejorar el tráfico vehicular y seguridad de los usuarios que se dirigen hacia el sector de Playas y viceversa
Tipo de Beneficiario
Turistas, comercio, transporte
Restricciones
TIEMPO: proyecto tendrá la duración de 6 meses

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**







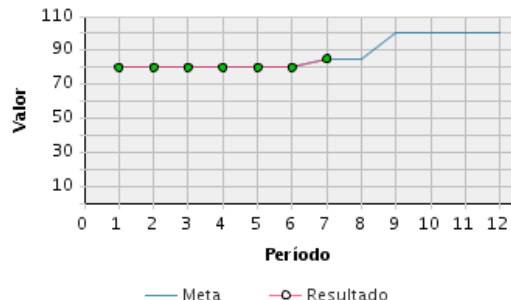

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 96.27 %  
 Fecha de Inicio: 02/07/2014      Fecha de Fin: 31/10/2018

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	85 %					
Estado												
												

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Julio 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador.	Salas Aragundi, Daniel	06/08/2018 - 09:46 AM
Junio 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador	Salas Aragundi, Daniel	05/07/2018 - 08:43 AM
Mayo 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador	Salas Aragundi, Daniel	05/06/2018 - 09:22 AM
Abril 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad, se comunico a la contratista sobre ciertos daños y arreglos que tiene que realizar en los aproches del puente y limpieza de espaldones y vía en los enlaces del intercambiador		
Enero 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad	Salas Aragundi, Daniel	05/04/2018 - 04:56 PM
Febrero 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad		
Marzo 2018.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad		
Diciembre 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad	Salas Aragundi, Daniel	04/01/2018 - 08:48 AM
Noviembre 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad		
Octubre 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad	Salas Aragundi, Daniel	01/11/2017 - 02:59 PM
Septiembre 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad	Salas Aragundi, Daniel	10/10/2017 - 09:21 AM
Agosto 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad	Mendoza Cedeno, José Eugenio	06/09/2017 - 11:58 AM
Julio 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	02/08/2017 - 04:04 PM
Junio 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	04/07/2017 - 02:14 PM
Mayo 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	09/06/2017 - 03:23 PM
Abril 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	09/06/2017 - 03:23 PM
Marzo 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	04/04/2017 - 11:21 AM
Febrero 2017.- Trabajos se encuentran terminados y prestando servicio a la comunidad.	Mendoza Cedeno, José Eugenio	06/03/2017 - 07:27 AM
Enero 2017.- Se terminan los trabajos relacionados con la señalización y el proyecto está terminado al 100% dando servicio a la comunidad.	Salas Aragundi, Daniel	06/02/2017 - 09:10 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Diciembre 2016.- Se realizan trabajos de señalización horizontal y vertical en los diferentes enlaces del distribuidor de tráfico. Se tiene en trámite Orden de cambio 7 y contrato complementario	Salas Aragundi, Daniel	05/01/2017 - 02:59 PM
Noviembre 2016.- Se realizan trabajos de señalización horizontal y vertical en los diferentes enlaces del distribuidor de tráfico	Salas Aragundi, Daniel	05/12/2016 - 04:03 PM
OCTubre 2016: Se terminan realizar el asfaltado dentro de todos los enlaces del distribuidor de tráfico, se comienza a colocar la pintura de tráfico para la señalización	Salas Aragundi, Daniel	07/11/2016 - 12:07 AM
Septiembre 2016: Se terminan de realizar los trabajos de movimiento de tierras, se procede a realizar asfaltado del enlace 2 3 4 5 6 7. Terminación de cunetas enlace 5		
Agosto 2016: Se terminan de realizar los trabajos de movimiento de tierras, se procede a realizar asfaltado del enlace 4 lado derecho; se terminan trabajos en el enlace 5. Terminación de cunetas enlace 3	Salas Aragundi, Daniel	09/09/2016 - 08:39 AM
JuLIO 2016: Una vez entregado el porcentaje de anticipo faltante, se procedió a realizar los trabajos de sub-base - base en los enlaces 3, 6 y 7; se comenzo a realizar la imprimación de el enlace 4 y 8.	Salas Aragundi, Daniel	09/09/2016 - 08:35 AM
Junio 2016: Según comunicación de las autoridades se ha entregado el 35% faltante del anticipo con credito chino, la contratista a partir del día lunes 11 de Julio de 2016, entrará a trabajar al 100% con su personal y maquinaria.	Salas Aragundi, Daniel	06/07/2016 - 11:09 AM
MAYO 2016: Continuan con los trabajos de fundición del hormigón de las alas del puente, que servirán para contener relleno adicional como resultado de la elevación de 1 m del puente existente.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	07/06/2016 - 10:41 AM
ABRIL 2016: Continuan con los trabajos de fundición de los incrementos de los estribos en ambos lados del puente, producto de la elevación de 1 m del puente existente	Calderón Cañar, Edgar Miguel	06/05/2016 - 02:01 PM
MARZO 2016: Se han ejecutado trabajos de fundición de los incrementos de los estribos en ambos lados del puente, producto de la elevación de 1 m del puente existente	Calderón Cañar, Edgar Miguel	06/05/2016 - 01:56 PM
FEBRERO 2016:  Los trabajos se encuentran suspendidos por la contratista por diferentes causas, entre ellas la etapa invernal y el no pago de planillas de obra.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	09/03/2016 - 09:04 AM
ENERO 2016:  Colocación del material en los enlaces 6 y 7	Calderón Cañar, Edgar Miguel	09/03/2016 - 09:03 AM
DICIEMBRE 2015:  Se realizaron trabajos de imprimación en el enlace 8 y se colocó material de base en el enlace 4	Calderón Cañar, Edgar Miguel	09/03/2016 - 09:01 AM
NOVIEMBRE 2015: La obra se encuentra con un ritmo bajo de avance de obra por motivos de pago de planillas, el MTOP no ha pagado ninguna de las 6 planillas presentadas por la contratista.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	24/12/2015 - 11:15 AM
OCTUBRE 2015: Levantamiento de los dos tramos del puente, colocación de mejoramiento, sub base y base en los ocho ramales del distribuidor de tráfico.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	24/12/2015 - 11:14 AM

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 0

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Adjudicación realizada	3-Adjudicación	02/07/2014		02/07/2014		Sí	1.0
2	EJECUCIÓN: Inicio de obra realizada	4-Inicio de Trabajo	02/07/2014		31/10/2014		Sí	1.0


**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
3	EJECUCIÓN: Movimiento de tierra realizada	5-Entregables Intermedios	15/09/2015		15/09/2015		Sí	30.0
4	EJECUCIÓN: Levantamiento del puente realizada	5-Entregables Intermedios	30/10/2015		30/10/2015		Sí	15.0
5	EJECUCIÓN: Obras de drenaje realizada	5-Entregables Intermedios	30/01/2016		30/04/2016		Sí	5.0
6	EJECUCIÓN: Capa de rodadura de hormigón asfáltico realizada	5-Entregables Intermedios	14/06/2016		31/10/2016		Sí	20.0
7	EJECUCIÓN: Señalización vial realizada	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/01/2017		Sí	3.0
8	EJECUCIÓN: Señalización vial tramo 2 realizada	9-Entregables Formales	30/11/2016		30/01/2017		Sí	3.0
9	EJECUCIÓN: Señalización vial tramo 3 realizada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2016		30/01/2017		Sí	2.0
10	EJECUCIÓN: Acta de recepción provisional realizada	9-Entregables Formales	30/07/2017		30/07/2017		Sí	5.0
11	CIERRE: Pago liquidación realizado	9-Entregables Formales	30/09/2017	10/10/2018			No	10.0
12	CIERRE: Recepción definitiva	9-Entregables Formales	30/09/2017	31/10/2018			No	5.0

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Se han realizado las reparaciones necesarias para tener en óptimas condiciones la vía, sin embargo hay desprendimientos de hitos de vía en el tramo 4	Monge Espinel, Luis Humberto	{PR} - Provincia - GUAYAS	30/06/2017
2	La obra presenta grandes daños, por tal razón solicitamos al MTOP oficio inmediatamente a la Contratista para que realice las reparaciones necesarias	Monge Espinel, Luis Humberto	{PR} - Provincia - GUAYAS	26/05/2017
3	La obra tiene un 99% de avance se espera que culmine los trabajos el 15 de enero de 2017	Monge Espinel, Luis Humberto	{PR} - Provincia - GUAYAS	13/01/2017
4	La obra presenta retrasos, la fecha de término de acuerdo a la ampliación era 30 de Nov. de 2016	Monge Espinel, Luis Humberto	{PR} - Provincia - GUAYAS	21/12/2016
5	Se cumplió el plazo que era el 31 de octubre de 2016 y la obra no está finalizada aun quedan rubros por ejecutar	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	10/11/2016
6	La obra presenta un gran avance, se espera que esté lista para el 31 de Octubre de 2016	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	14/10/2016
7	La obra presenta retrasos de acuerdo a la programación de la ficha GPR, se espera que la obra termine el 31 de octubre de 2016	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	25/08/2016
8	La obra permanece paralizada no se encontró personal en obra	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	23/05/2016
9	La obra se encuentra paralizada	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	19/02/2016
10	Debido a la etapa invernal los trabajos se han retrasado, se espera que la obra culmine el 15 de abril del 2016	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	28/01/2016
11	Debido a la etapa invernal los trabajos se han retrasado, se espera que la obra culmine el 15 de abril del 2016	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	28/01/2016
12	Los trabajos se ejecutan según lo programado, la obra culminaría a finales de diciembre del 2015	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	26/11/2015
13	Los trabajos se ejecutan según lo programado por la contratista, se solicita actualizar la ficha de GPR para conocer fechas de cumplimiento de hitos	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	11/09/2015
14	Se retomaron los trabajos, se espera que la obra culmine el 15 de noviembre del 2015	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	24/06/2015
15	La obra se encuentra suspendida hasta que se realice la declaratoria de utilidad pública	Panchana Farra, Rolando José	{PR} - Provincia - GUAYAS	17/04/2015

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje avance físico		100.00 %	6	6	01/01/2017	Diciembre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	18,854,333.80
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1.00	0.00	0.00	1.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2017)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017



Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	100.00 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
7	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
8	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
9	Reducir el índice de incumplimiento de las normativas de transporte pesado, MEDIANTE la implementación del sistema de control de pesos y dimensiones de los vehículos de carga.
10	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo
13	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta de suspensión	Acta_de_Suspensión_Temporal_Galibo.pdf	05/12/2017
2	Contrato complementario	COntrato_complementario.pdf	05/12/2017
3	orden de cambio	orden_de_cambio_no._1_varios_proyectos.pdf	06/07/2016
4	Orden de cambio 2	ORDEN_DE_CAMBIO_No._2_FIRMADA.pdf	06/07/2016
5	Orden de cambio 3	orden_de_cambio_nO._3.pdf	06/07/2016
6	orden de cambio 4	orden_de_cambio_no._4_sinohydro_con_fecha.pdf	06/07/2016
7	Orden de Cambio 5 Aumento de PLazo 30/11/2016	Orden_de_Cambio_5.pdf	11/11/2016
8	Orden de cambio 6 - 30/01/2017	ORDEN_DE_CAMBIO_No._6_SINOHYDRO.pdf	06/02/2017
9	Reanudación de trabajos	Reanudación_de_Trabajos.pdf	05/12/2017

### EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Aguilar Ronquillo, Marco Antonio	Líder de Proyecto	Analista de Infraestructura Provincial 2	maaguilar@mtop.gob.ec	042068577
Calderón Cañar, Edgar Miguel	Líder de Proyecto	Supervisor de Obra del Guayas - MTOP	ecalderon@mtop.gob.ec	023974600



Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Mendoza Cedeno, José Eugenio	Líder de Proyecto	Supervisor de Obras de la Dirección Provincial del Guayas	jemendoza@mtop.gob.ec	023974600
Montalván Rodríguez, Erwin Nicolas	Líder de Proyecto	Experto de Infraestructura provincial	emontalvan@mtop.gob.ec	0984061125
Paz Mora, Luis Alfredo	Líder de Proyecto	Administrador Vial - Construcciones Guayas	lpaz@mtop.gob.ec	
Perez Marcillo, Patricia Lisseth	Líder de Proyecto	Analista de Infraestructura 2	pperez@mtop.gob.ec	042068577
Pulecio Montalvo, Roger Alberto	Director Distrital del Guayas	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Guayas, Encargado	rpulecio@mtop.gob.ec	023974600
Rocohano Granados, Maritza Alexandra	Líder de Proyecto	Experto de Infraestructura provincial	mrocohan@mtop.gob.ec	0969002382
Salas Aragundi, Daniel	Líder de Proyecto	Asistente de Estudios Zonal 5	dsalas@mtop.gob.ec	023974600
Valle Zuñiga, Hugo Arturo	Subsecretario Regional 5	Subsecretario Regional 5	hvalle@mtop.gob.ec	023974600

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
86622_1.jpg	05/12/2016
