

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 5
Dirección Provincial Bolívar

PROYECTO: K004 MTOP - Fase I mejoramiento carretera Guaranda - Balzapamba circunvalación de Guaranda accesos Vinchoa Santa Fe

Líder del Proyecto:	Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier (gpilamunga@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	Programas Relacionados:	Provincia - Bolivar, TERMINACION, CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA C. GUARANDA - BALZAPAMBA
Titular:	Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.766.3372	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	27,422,692.64
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	21/06/2007 - 28/10/2017
Fecha de última actualización:	07/02/2018	Fecha de Fin Base:	30/03/2014
Modificado por:	Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN

Construcción, Terminación de la Carretera Guaranda-Balzapamba, 74.02 km. , ubicado en la Provincia De Bolívar.

PRODUCTO/SERVICIO

Carretera Guaranda-Balzapamba, 74.02 km. que une a los cantones de la provincia Bolívar, rehabilitada, mejorada y señalizada óptima para la circulación vehicular.

LÍNEA BASE

Ante la necesidad de los pobladores de los Cantones Guaranda, Chimbo, San Miguel, San Pablo, Balzapamba y sus correspondientes parroquias se ejecuta la obra Construcción, Terminación de la Carretera Guaranda-Balzapamba, de 74.02 km de Longitud, ubicado En La Provincia De Bolívar, para fomentar el turismo, la producción agrícola y por ende mejorando la calidad de vida de los pobladores.

OBJETIVO GENERAL

Construir, Rehabilitar y Señalizar la Carretera Guaranda-Balzapamba, de 74.02 km de Longitud, ubicado En La Provincia De Bolívar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Incrementar la velocidad de diseño.
 Colocar señalización Horizontal y vertical para mejorar la visibilidad y velocidad de circulación
 Construcción de cunetas

MONTO TOTAL DEL PROYECTO: 27,889,974.55
 CONTRATISTA: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO.
 FISCALIZACION: CONSULTORA VERA & ASOCIADOS.

OBJETO CONTRATO: Construcción, Terminación de la Carretera Guaranda-Balzapamba, 74.02 km. (Bolívar)

Beneficios Cualitativos

La ciudadanía puede transportarse con seguridad
 La población puede comunicarse con otras ciudades con mayor agilidad

Tipo de Beneficiario

- Comercio
- Turístico
- Social
- Industrial
- Agropecuario


Restricciones

Tiempo: El plazo de término del proyecto es 04/10/2012

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre **Completado** Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 21/06/2007 Fecha de Fin: 28/10/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

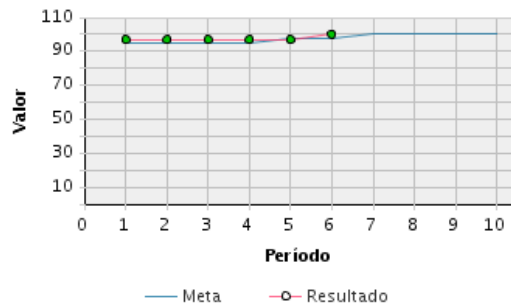

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	95 %	95 %	95 %	95 %	98 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	
	Avance real acumulado											
	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %	100 %						
	Estado											
	●	●	●	●	●	●						

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Diciembre 2017 - Se realiza mantenimiento rutinario con microempresas, trabajos como desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de señalización. - Se legalizó el Acta Entrega Recepción Definitiva del proyecto. Proyecto terminado.	Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier	05/01/2018 - 04:37 PM
Noviembre 2017 - Se realiza mantenimiento rutinario con microempresas, trabajos como desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de señalización. - Se legalizó el Acta Entrega Recepción Definitiva del proyecto. Proyecto terminado.	Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier	05/12/2017 - 08:34 AM
Octubre 2017 - Se legalizó el Acta Entrega Recepción Definitiva del proyecto. Proyecto terminado.	Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier	01/11/2017 - 11:37 AM
Septiembre 2017: - Dispone de Acta Entrega Recepción Definitiva del proyecto de fecha 27 de Noviembre de 2015. Existen valores por cobrar al Contratista en base al Informe de la Controlaría por un monto de:	Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier	04/10/2017 - 08:43 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>USD 1'915.538,16. Existen derrumbe algunos a lo largo de la vías los mismos son desalojados por Maquinaria del MTOP.</p> <p>- La carretera fue inaugurada por el Presidente de la República, el 20 de Noviembre de 2012.</p>		
<p>AGOSTO 2017:</p> <p>- Se realiza los trabajos de mantenimiento rutinario como: rosa a mano, la limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y la limpieza general de la obra. Se colocó tachas reflectivas desde la abc. 0+000 hasta la abs. 22+000.</p> <p>- Proyecto terminado. Pendiente 1 planilla de mantenimiento, pero el Contratista Cuerpo de Ingenieros adeuda valores al Ministerio en lo cuál se espera solucionar este pago</p>	<p>Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier</p>	<p>06/09/2017 - 09:23 AM</p>
<p>JULIO 2017:</p> <p>- Proyecto terminado. Pendiente 1 planilla de mantenimiento, pero el Contratista Cuerpo de Ingenieros adeuda valores al Ministerio en lo cuál se espera solucionar este pago.</p>	<p>Abedrabbo García, Jorge Farah</p>	<p>04/08/2017 - 10:17 AM</p>
<p>JUNIO 2017:</p> <p>- En el mes de julio se espera finiquitar la liquidación pendiente.</p> <p>- Km 14+400 - 19+200 en donde meses atrás se produjeron una serie de deslizamientos, por lo que personal y maquinaria del MTOP está realizando limpiezas diarias en estos sectores.</p>	<p>Abedrabbo García, Jorge Farah</p>	<p>11/07/2017 - 02:42 PM</p>
<p>MAYO 2017:</p> <p>- A finales del mes de julio se espera finiquitar la liquidación pendiente.</p>	<p>Abedrabbo García, Jorge Farah</p>	<p>05/06/2017 - 02:51 PM</p>
<p>MAYO 2017:</p> <p>Se realiza la limpieza de derrumbes y deslizamientos desde la abs. 0+000 hasta las 77+000 para mantenerla habilitada la circulación vehicular, debido a la temporada invernal, Se produjo un deslizamiento en la Abs. 64+000, mismos que ya han desalojados.</p>	<p>Abedrabbo García, Jorge Farah</p>	<p>05/06/2017 - 02:45 PM</p>
<p>ABRIL 2017</p> <p>Trabajos realizados en el mes de abril: Limpieza de derrumbes y deslizamientos desde la abs. 0+000 hasta las 77+000 para mantenerla habilitada la circulación vehicular, debido a la temporada invernal. Se concluyó con la construcción del muro de ala de la alcantarilla de la abscisa 47+000, sector Las Guardias. Se realiza los trabajos de mantenimiento rutinario como: rosa a mano, la limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y la limpieza general de la obra. Se colocó tachas reflectivas desde la abc. 0+000 hasta la abs. 22+000.</p>	<p>Abedrabbo García, Jorge Farah</p>	<p>05/05/2017 - 05:04 PM</p>
<p>Marzo 2017:</p> <p>Se realiza la limpieza de derrumbes y deslizamientos desde la abs. 0+000 hasta las 77+000 para mantenerla habilitada la circulación vehicular, debido a la temporada invernal. Se concluyó con la construcción del muro de ala de la alcantarilla de la abscisa 47+000, sector Las Guardias.</p> <p>Se realiza los trabajos de mantenimiento rutinario como: rosa a mano, la limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y la limpieza general de la obra. Se colocó tachas reflectivas desde la abc. 0+000 hasta la abs. 22+000.</p>	<p>Abedrabbo García, Jorge Farah</p>	<p>05/04/2017 - 04:13 PM</p>
<p>Marzo 2017:</p> <p>Tramo Chillanes-Bucay, vía CERRADA, maquinaria de la institución se encuentra realizando la limpieza de derrumbes de gran magnitud, existe perdida de plataforma de la vía en el sector de achín, para realizar los trabajos definitivos de todos los puntos críticos causados por la etapa invernal y el terremoto causado el 16 de abril de 2016 se requiere la contratación de estudios de ingeniería a fin de remediar definitivamente los puntos críticos.</p> <p>Tramo San Pablo Chillanes, este tramo requiere de manera urgente la intervención debido que a la actualidad la capa de rodadura de doble tratamiento bituminoso se encuentra en malas condiciones con grandes baches, de este tramo el MTOP cuenta con estudios definitivos y aprobados y la inversión para la ejecución de esta obra es de 19 millones.</p>	<p>Abedrabbo García, Jorge Farah</p>	<p>05/04/2017 - 04:02 PM</p>
<p>Febrero 2017:</p> <p>El proyecto se encuentra terminado con fecha 30 de Agosto de 2012, fue inaugurado el 20 de noviembre de 2012, dispone de Acta Entrega Recepción Definitiva. A la fecha se encuentra pendiente de pago la planilla de liquidación de la fiscalización a cargo de la Consultora Vera y Asociados, para lo cuál se ha incluido en el PAI 2017 el monto correspondiente.</p>	<p>Abedrabbo García, Jorge Farah</p>	<p>03/03/2017 - 03:28 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Diciembre(2014): Concluye el mantenimiento ejecutado desde el 16 de Octubre 2012 hasta el 16 de Octubre 2014 previo a la Recepción Definitiva se ha solicitado a la contratista realizar el bacheo de la vía.	Lara Villacis, Ligia Elena	06/01/2015 - 09:17 AM
Noviembre(2014): Concluido el Mantenimiento, ejecutado desde el 16 de Octubre 2014. Previo a la Recepción Definitiva se ha solicitado a la contratista realizar el bacheo de la vía. Se ejecutan trabajos de reposición de tachas con personal de la Dirección Provincial de Bolívar.	Lara Villacis, Ligia Elena	08/12/2014 - 11:57 AM
Octubre(2014): Se realiza mantenimiento rutinario por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito. Se realizan trabajos de: desbroce, limpieza de cunetas, limpieza señalización.	Lara Villacis, Ligia Elena	06/11/2014 - 02:05 PM
Septiembre(2014): Se realiza mantenimiento rutinario por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito. Se realizan trabajos de: desbroce, limpieza de cunetas, limpieza señalización.	Lara Villacis, Ligia Elena	06/10/2014 - 03:38 PM
Agosto(2014): Se realiza mantenimiento rutinario por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito. Se realizan trabajos de: desbroce, limpieza de cunetas, limpieza señalización.	Lara Villacis, Ligia Elena	09/09/2014 - 01:49 PM
Julio (2014): Se realiza mantenimiento rutinario por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito. Se realizan trabajos de: desbroce, limpieza de cunetas, limpieza señalización.	Lara Villacis, Ligia Elena	05/08/2014 - 09:35 AM
Junio (2014): Se encuentra realizando Mantenimiento Rutinario. En trámite se encuentra el Acta de Recepción Provisional.	Viscarra Gavilanes, Medardo Patricio	03/07/2014 - 02:27 PM
Mayo (2014): Se encuentra realizando Mantenimiento Rutinario. En trámite se encuentra el Acta de Recepción Provisional.	Viscarra Gavilanes, Medardo Patricio	03/07/2014 - 02:27 PM
Abril (2014): Se encuentra realizando Mantenimiento Rutinario. En trámite se encuentra el Acta de Recepción Provisional.	Viscarra Gavilanes, Medardo Patricio	03/07/2014 - 02:27 PM
Marzo (2014): Se encuentra realizando Mantenimiento Rutinario. En trámite se encuentra el Acta de Recepción Provisional.	Viscarra Gavilanes, Medardo Patricio	03/07/2014 - 02:26 PM
Febrero (2014): Se encuentra realizando Mantenimiento Rutinario. En trámite se encuentra el Acta de Recepción Provisional.	Viscarra Gavilanes, Medardo Patricio	03/07/2014 - 02:26 PM
Enero (2014): Se encuentra realizando Mantenimiento Rutinario. En trámite se encuentra el Acta de Recepción Provisional.	Viscarra Gavilanes, Medardo Patricio	03/07/2014 - 02:26 PM
Diciembre (2013): Mantenimiento Rutinario. En trámite se encuentra el Acta de Recepción Provisional.	Viscarra Gavilanes, Medardo Patricio	06/01/2014 - 02:17 PM
Noviembre (2013): Mantenimiento Rutinario. Trámite acta recepción Provisional	Viscarra Gavilanes, Medardo Patricio	06/12/2013 - 11:51 AM
<p>Noviembre(2013): Tramo 1: Ambato - El Arenal L= 61.19 km</p> <p>Abscisas 0+000 - 20+000</p> <p>Se ejecutan la construcción de subdrenes y geodrenes.</p> <p>El Consejo Provincial de Tungurahua realiza la Instalación de la tubería de Alcantarillado Sanitario en el Sector de Miñarica abscisa 7+000.</p> <p>En la abscisa 18+000 en el sector de Chibuleo, San Alfonso el Municipio de Ambato realiza los trabajos de instalación de la Tubería de Agua Potable.</p>	Viscarra Gavilanes, Medardo Patricio	06/12/2013 - 11:49 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Abscisas 20+000 - 40+000 Subcontratado CONSTRUCTORA ALVARADO.</p> <p>Se tiene alrededor de 19 km a nivel base asfáltica y se ejecutan los rubros de:</p> <p>Construcción de los cabezales de hormigón de las estructuras de entrada y salida de las alcantarillas.</p> <p>Colocación de capa de base recuperada e=20cm.</p> <p>Colocación de Base granular e= 20cm.</p> <p>Colocación de Base Asfáltica e=15cm.</p> <p>Colocación de Carpeta Asfáltica e=12cm.</p> <p>Abscisas 40+000 - 61+20 Subcontratado CONSTRUCTORA ALVARADO.</p> <p>Se tiene alrededor de 21.20 km a nivel de carpeta asfáltica y se ejecutan los rubros de:</p> <p>Construcción de los cabezales de hormigón de las estructuras de entrada y salida de las alcantarillas.</p> <p>Construcción de Cunetas.</p> <p>Colocación de la Señalización Horizontal.</p> <p>Tramo 2: Guaranda - El Arenal L= 30.000 km</p> <p>Abscisas 0+000 - 30+000</p> <p>Se tiene 14.50 km a nivel de base asfáltica.</p> <p>Mejoramiento de suelo en las variante abscisa 13+000</p> <p>Construcción de Subdrenes y geodrenes.</p> <p>Construcción de las estructuras de entrada y salida de las alcantarillas.</p> <p>Colocación de capa de base recuperada e=20cm</p> <p>Colocación de Base granular e= 20cm</p> <p>Colocación de Base Asfáltica e=15cm</p> <p>Relleno y compactado muro abscisa 0+950.</p> <p>En total se dispone de 55.00 km a nivel de asfaltó.</p>		
<p>Octubre(2013): Se encuentra en trámite legalización de documentos para realizar la liquidación económica, para posteriormente realizar el Acta de Recepción Provisional. Proyecto terminado totalmente.</p>	<p>Lara Villacis, Ligia Elena</p>	<p>06/11/2013 - 11:57 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Septiembre(2013): Se encuentra en trámite legalización de documentos para realizar la liquidación económica, para posteriormente realizar el Acta de Recepción Provisional. Proyecto terminado totalmente.	Lara Villacis, Ligia Elena	07/10/2013 - 08:54 AM
Agosto(2013): Se encuentra en trámite legalización de documentos para realizar la liquidación económica, para posteriormente realizar el Acta de Recepción Provisional.	Lara Villacis, Ligia Elena	06/09/2013 - 11:13 AM
Julio(2013): En espera de documentos legales para realizar la liquidación económica, además se encuentra en trámite el Acta de Recepción Provisional.	Gaviláñez Camacho, Fafo Holguin	06/08/2013 - 03:00 PM
Junio(2013): En espera de documentos legales para realizar la liquidación económica.	Gaviláñez Camacho, Fafo Holguin	05/07/2013 - 03:08 PM
Febrero a Mayo (2013): En espera de documentos legales para realizar la liquidación económica.	Gaviláñez Camacho, Fafo Holguin	28/05/2013 - 03:47 PM
Enero (2013): En espera de documentos legales para realizar la liquidación económica.	Gaviláñez Camacho, Fafo Holguin	26/02/2013 - 10:05 AM
Diciembre(2012): Falta Liquidación Económica	Gaviláñez Camacho, Fafo Holguin	08/01/2013 - 09:18 AM
<p>Noviembre(2012): Inauguración de la Carretera Guaranda-Balzapamba.</p> <p>Octubre(2012): Se realizan reposición y colocación de tachas, así como la culminación con la señalización horizontal y vertical.</p> <p>Septiembre(2012): Inician trabajos de complemento para cumplir con la señalización horizontal y vertical.</p> <p>Agosto(2012): Se realizan trabajos de reparación de los sitios críticos, reconstrucción de cunetas, cabezales y bordillos, sello asfáltico en varios tramos de la vía.</p> <p>Julio(2012): Se ejecutan los trabajos de señalización horizontal, vertical.</p> <p>Junio(2012): Se firmará el contrato para los Estudios de Estabilización de Taludes.</p> <p>Mayo(2012): Se está analizando trabajos emergentes para solucionar problemas de deslizamientos presentados en el Km 65.</p> <p>Abril(2012): Limpieza de derrumbes, atención de emergencias debido a la estación invernal.</p> <p>Marzo(2012): Se está colocando señalización vial, por medio de Convenio de Pago. Se estima que la acta provisional se efectuará el 15/04/2012</p> <p>Febrero 2012: Se está realizando concluyendo con la señalización vertical y horizontal</p> <p>Enero 2012: Se ha realizado reparación de los puntos críticos km 28, 40 y 41. Se inició la señalización horizontal y vertical en los 74.02 km</p> <p>Junio(2011) Trabajando en los puntos críticos. Construcción de Cunetas.</p>	Gaviláñez Camacho, Fafo Holguin	27/11/2012 - 11:02 AM

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Guaranda

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Inicio de trabajos realizado	4-Inicio de Trabajo	04/07/2007		04/07/2007		Sí	1.0
2	PLANEACIÓN: Suscripción del Contrato realizado	4-Inicio de Trabajo	04/07/2007		04/07/2007		Sí	1.0
3	EJECUCIÓN: Desmonte, nivelación realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2007		31/08/2007		Sí	10.0
4	EJECUCIÓN: Imprimación realizado	1-Solicitud de Información	01/03/2010		01/03/2010		Sí	10.0
5	EJECUCIÓN: Colocación de base realizado	1-Solicitud de Información	01/11/2010		01/11/2010		Sí	11.0
6	EJECUCIÓN: Reforzamiento con geomalla realizado	1-Solicitud de Información	01/01/2011		01/01/2011		Sí	11.0
7	EJECUCIÓN: Colocación de capa Asfáltica realizado	1-Solicitud de Información	03/03/2011		03/03/2011		Sí	12.0
8	EJECUCIÓN: Construcción de cunetas realizado	1-Solicitud de Información	01/04/2011		01/04/2011		Sí	11.0
9	EJECUCIÓN: Evaluación de puntos críticos realizado	1-Solicitud de Información	01/07/2011		01/07/2011		Sí	11.0
10	EJECUCIÓN: Señalización vertical realizado	1-Solicitud de Información	20/10/2011		20/10/2011		Sí	5.0
11	EJECUCIÓN: Terminación Plazo Proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2012		31/01/2012		Sí	6.0
12	CIERRE: Acta Recepción Provisional realizado	9-Entregables Formales	24/08/2012		16/10/2012		Sí	1.0
13	EJECUCIÓN: Señalización Horizontal realizado	9-Entregables Formales	16/10/2012		16/10/2012		Sí	2.0
14	COMPLETADO: Acta Recepción Definitiva realizado	9-Entregables Formales	30/12/2014		05/01/2015		Sí	3.0
15	CIERRE: Limpieza de derrumbes, realizado.	9-Entregables Formales	31/05/2017		05/06/2017		Sí	3.0
16	CIERRE: Limpieza de cunetas realizado	9-Entregables Formales	31/07/2017		31/12/2016		Sí	1.0
17	CIERRE: Liquidación Económica realizado	9-Entregables Formales	31/07/2017		31/12/2016		Sí	1.0


SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON SAN MIGUEL	Coronel Monar, Anibal Alejandrino	{PR} - Provincia - BOLIVAR	30/06/2017
2	PROYECTO PRESENTE DIFICULTADES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	20/12/2014
3	Puntos críticos peligrosos y falta de mantenimiento	Bayas Duran, Angel Ovidio	{PR} - Provincia - BOLIVAR	09/07/2013
4	Supervisión Vía Guaranda Balsapamba	Bayas Duran, Angel Ovidio	{PR} - Provincia - BOLIVAR	15/11/2012
5	Historico - Conforme a la visita realizada el 04/07/2012, se evidenció que en varios tramos de la vía las tachas reflectivas ya se han desprendido del pavimento, en mayores cantidades en el tramo	Bayas Duran, Angel Ovidio	{PR} - Provincia - BOLIVAR	04/07/2012
6	Historico - Se está colocando señalética en un 65%, se está colocando tachas y postes reflectivos, estan tambien colocadas ya 7 porticos informativos los mismos que se encuentran divididos e	Bayas Duran, Angel Ovidio	{PR} - Provincia - BOLIVAR	25/04/2012
7	Historico - Se está colocando señalética en un 45%, ya que en el momento actual en el país no cuentan con tachas	Bayas Duran, Angel Ovidio	{PR} - Provincia - BOLIVAR	22/03/2012

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
	reflectivas , postes reflectivos lo cual se esta esperando que en el transcurso			
8	Historico - Se está colocando señalética, división de carriles con pintura, y los denominados ojos de gato desde el tramo Guaranda - Chimbo. y San Miguel. Se puede observar que no existe un un ros	Bayas Duran, Angel Ovidio	{PR} - Provincia - BOLIVAR	25/02/2012
9	Historico - Se esta colocando señalética, división de carriles con pintura, y los denominados ojos de gato desde el tramo Guaranda - Chimbo. y San Miguel. Se puede observar que no existe un un ros	Bayas Duran, Angel Ovidio	{PR} - Provincia - BOLIVAR	10/02/2012
10	Historico - El tramo Guaranda # Chimbo, se encuentra con nueva capa de asfalto previa colocación intermedia geomalla de fibra de vidrio, con cunetas terminadas, excepto el tramo de la Plaza La	Bayas Duran, Angel Ovidio	{PR} - Provincia - BOLIVAR	24/11/2011

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Numero de informes técnicos de control de obra.		100.00 %	1	1	01/01/2017	Jul-Dic


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	6,898,712.56
Estimado Al Fin Del Proyecto:	27,422,692.64 **
Costo Total:	27,889,974.55
Total Devengado:	27,243,777.07
% Costo Total Devengado:	97.68 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 97.68 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	19,807,688.52	331,138.00	0.00	20,138,826.52
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	5,440,592.28	0.00	0.00	5,440,592.28
Ppto. Codificado	12,724,458.40	238,858.35	0.00	12,963,316.75
Ppto. Comprometido	7,283,866.12	190,896.93	0.00	7,474,763.05
Planeado - Codificado (2017)		92,279.65		
Programado a Devengar	21,061,938.59	331,138.00	0.00	21,393,076.59
Ppto. Devengado	27,091,554.64	152,222.43	0.00	27,243,777.07
Pagado Real	7,283,866.12	152,222.43	0.00	7,436,088.55
Estimado a fin de año	* 27,091,554.64	0.00	0.00	27,091,554.64
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-6,029,616.05	331,138.00	0.00	-5,698,478.05
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 128.63 %	45.97 %	0.00 %	127.35 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017

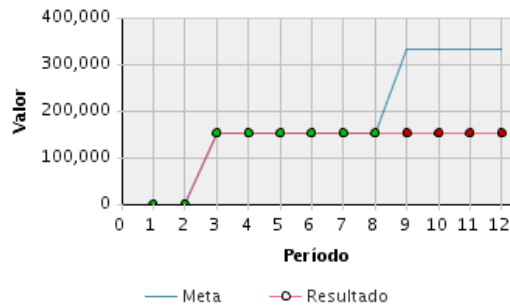

Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	152,222.43	152,222.43	152,222.43	152,222.43	100.00 %		45.97 %
Abr	0.00	0.00	152,222.43	152,222.43	100.00 %		45.97 %
May	0.00	0.00	152,222.43	152,222.43	100.00 %		45.97 %
Jun	0.00	0.00	152,222.43	152,222.43	100.00 %		45.97 %
Jul	0.00	0.00	152,222.43	152,222.43	100.00 %		45.97 %
Ago	0.00	0.00	152,222.43	152,222.43	100.00 %		45.97 %
Sep	178,915.57	0.00	331,138.00	152,222.43	45.97 %		45.97 %
Oct	0.00	0.00	331,138.00	152,222.43	45.97 %		45.97 %
Nov	0.00	0.00	331,138.00	152,222.43	45.97 %		45.97 %
Dic							
Total	331,138.00	152,222.43					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
9	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
10	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
13	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		A.8_Informe_Ejecutivo_Agosto_2014.pdf	09/09/2014
2		A.9_Informe_Ejecutivo_Septiembre_2014.pdf	09/09/2014
3		B.1_Acta_de_Entrega_Recepción_Provisional.pdf	09/09/2014
4	Acta Entrega Recepción Definitiva Firmada.	Acta_Definitiva.pdf	06/01/2015
5	1.Croquis Proyecto Guaranda-Balzapamba	1.Croquis_Guaranda-Balzapamba.pdf	09/07/2012
6	Acciones realizadas en Puntos Críticos Guaranda-Balzapamba	0.2_Trabajos_Realizados_Puntos_críticos_Guaranda-Balzapamba.pdf	17/07/2012
7	Deslizamiento de Taludes	mtop_388.jpg	10/04/2012
8	Deslizamiento de Tierras	mtop_011.jpg	10/04/2012
9	Estado de vía	mtop_071.jpg	10/04/2012
10	INFORME DE AVANCE MANTENIMIENTO GUARANDA - BALSAPAMBA FEBRERO 2017	Avance_Guaranda_-Balsapamba_Febrero_2017.pdf	06/03/2017
11	INFORME DE AVANCE MANTENIMIENTO GUARANDA - BALSAPAMBA MARZO 2017	Guaranda_Balzapamba_marzo_de_2017.pdf	05/04/2017
12	INFORME DE TRABAJO Y ARCHIVO FOTOGRAFICO JULIO 2017	Guaranda_Balzapamba_julio_2017.pdf	07/08/2017
13	Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. AGOSTO 2017	Guaranda_Balzapamba_AGOSTO_2017.pdf	06/09/2017
14	Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. JUNIO 2017	Guaranda_Balzapamba_junio_de_2017.pdf	11/07/2017
15	Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. MAYO 2017	Guaranda_Balzapamba_del_29_de_mayo_de_2017.pdf	05/06/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
16	Informe de Trabajo y Archivo fotográfico. NOVIEMBRE 2017	Informe_Guaranda_Balzapamba.pdf	05/12/2017
17	Informe Ejecutivo Abril 2014	A.4.pdf	05/08/2014
18	Informe Ejecutivo Enero 2014	A.1.pdf	05/08/2014
19	Informe Ejecutivo Febrero 2014	A.2.pdf	05/08/2014
20	Informe Ejecutivo Julio 2014	A.7.pdf	05/08/2014
21	Informe Ejecutivo Junio 2014	A.6.pdf	05/08/2014
22	Informe Ejecutivo Marzo 2014	A.3.pdf	05/08/2014
23	Informe Ejecutivo Mayo 2014	A.5.pdf	05/08/2014
24	Informe Ejecutivo Octubre 2014	B.2.pdf	06/11/2014
25	Informe Ejecutivo Septiembre 2011	Informe_Ejecutivo_Septiembre_2011.pdf	03/04/2012
26	Mantenimiento Culminado	Informe_Ejecutivo_Diciembre_2014.pdf	06/01/2015
27	Oficio enviado al Sr. Gobernador respecto a las evaluaciones del proyecto.	0.1.1.pdf	26/07/2012
28	Puntos Críticos por Temporada Invernal Guaranda-Balzapamba	0.1_Asentamiento_Producido_por_Etapa_Invernal_Guaranda-Balzapamba.pdf	17/07/2012
29	Trabajos previo a la Recepción Definitiva.	Informe_Ejecutivo_Noviembre_2014.pdf	08/12/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Lara Villacis, Ligia Elena	Supervisor Conservación Vial	Asistente de Ingeniería de Bolívar	llara@mtop.gob.ec	023974600
Pilamunga Llumiguano, Gustavo Xavier	Director Provincial de Bolívar	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Bolívar	gpilamunga@mtop.gob.ec	023974600
Pungaña Zaruma, Sergio Washington	Supervisor	Supervisor de Conservación Vial de Bolívar	spungana@mtop.gob.ec	023974600
