

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 4
Dirección Provincial Manabí

PROYECTO: K019 MTOP.-Ampliación y Rehabilitación del Acceso a la Ciudad de Manta de 8.4 Km. de Longitud.

Líder del Proyecto:	Palma Chiquito, Fernando Abrahan (fapalma@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Herrera Falcones, José Ricardo	Programas Relacionados:	AMPLIACION ACCESO A MANTA (AMPLIACION REHABILITACION (7 MESES) Y MANTENIMIENTO. (48 MESES) ACCESO A MANTA DE 8 4 , MTOP - RUTA DE SPONDYLUS, Provincia - Manabí, Proyectos Prioritarios PAI, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Macias Fuentes, Alberto Fabrizio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	1752.0000.641.4056	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	17,461,959.52
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	02/12/2008 - 30/12/2017
Fecha de última actualización:	03/08/2018	Fecha de Fin Base:	17/02/2016
Modificado por:	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN: Proyecto anterior a formato SENPLADES, no se tiene toda la información requerida.

OBJETO DEL CONTRATO:Ampliación, Rehabilitación (6 meses) y Mantenimiento del Acceso de la Ciudad de Manta , Ocho punto Cuatro km. de Longitud, Ubicado en la Provincia de Manabí.

CONTRATISTA: Compañía Xavier Macias y Asociados

FISCALIZACIÓN Contratada: Cia. Consuldisa

MONTO DE OBRA: USD 5'615.105,05

MONTO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO N°1: USD 2'012.714,12

MONTO CONTRACTUAL: USD 7'627.819,17

PLAZO: 180 días

AMPLIACIÓN DE PLAZO: 60 días.

Beneficios Cualitativos

Este proyecto beneficia al Cantón Manta y a la Provincia de Manabí al ser parte de la Ruta del Spondylus.

Tipo de Beneficiario

Operadores Turisticos
 Turistas
 Pesca Artesanal
 Pesca Industrial
 Inmobiliarias
 Industrias

Restricciones

Tiempo.- Retrasos en la Obra por Expropiaciones


Tiempo.- El plazo del nuevo contrato es de 180 días ,el cual comienza a regir desde el 30 de Octubre del 2012 en la cual se entrego Anticipo hasta el 28 de abril del 2012.

Tiempo.-Se firmo un contrato complementario con una Ampliación de plazo de 60 días teniendo una fecha de Terminación el 27 de Junio del 2013.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	-------------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 02/12/2008 Fecha de Fin: 30/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

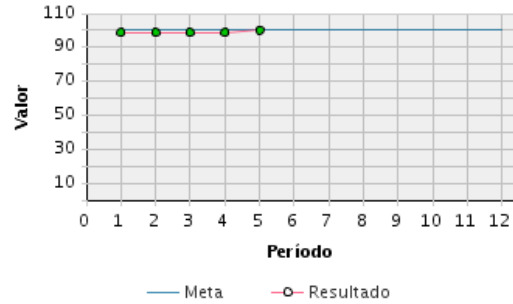

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	99 %	99 %	99 %	99 %	100 %							
Estado												
	●	●	●	●	●							

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2018: Legalización de Recepción Definitiva con fecha 15 de Mayo de 2017, proyecto pasa a etapa COMPLETADO.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	03/08/2018 - 12:21 PM
JUNIO 2018: Legalización de Recepción Definitiva con fecha 15 de Mayo de 2017, proyecto pasa a etapa COMPLETADO.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	06/07/2018 - 08:39 AM
MAYO 2018: Legalización de Recepción Definitiva con fecha 15 de Mayo de 2017, proyecto pasa a etapa COMPLETADO.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	07/06/2018 - 04:31 PM
ABRIL 2018: Legalización de Recepción Definitiva con fecha 15 de Mayo de 2017, proyecto pasa a etapa COMPLETADO.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	09/05/2018 - 09:24 AM
MARZO 2018: Legalización de Recepción Definitiva con fecha 15 de Mayo de 2017, proyecto pasa a etapa COMPLETADO.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	09/04/2018 - 12:29 PM
FEBRERO 2018: Legalización de Recepción Definitiva con fecha 15 de Mayo de 2017, proyecto pasa a etapa COMPLETADO.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	13/03/2018 - 08:25 AM
ENERO 2018: Legalización de Recepción Definitiva con fecha 15 de Mayo de 2017, proyecto pasa a etapa COMPLETADO.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	07/02/2018 - 09:26 AM
DICIEMBRE 2017: Legalización de Recepción Definitiva con fecha 15 de Mayo de 2017, proyecto pasa a etapa COMPLETADO.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	09/01/2018 - 11:52 AM
NOVIEMBRE 2017: Legalización de Recepción Definitiva con fecha 15 de Mayo de 2017, proyecto pasa a etapa COMPLETADO.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	05/12/2017 - 08:25 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
OCTUBRE 2017: Legalización de Recepción Definitiva con fecha 15 de Mayo de 2017, proyecto pasa a etapa COMPLETADO.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	01/11/2017 - 04:15 PM
SEPTIEMBRE 2017: Legalización de Recepción Definitiva con fecha 15 de Mayo de 2017, proyecto pasa a etapa COMPLETADO.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	05/10/2017 - 11:17 AM
AGOSTO 2017: Legalización de Recepción Definitiva con fecha 15 de Mayo de 2017, proyecto pasa a etapa COMPLETADO.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	05/10/2017 - 11:16 AM
JULIO 2017: Legalización de Recepción Definitiva con fecha 15 de Mayo de 2017, proyecto pasa a etapa COMPLETADO.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	20/08/2017 - 10:19 PM
JUNIOO 2017: Legalización de Recepción Definitiva con fecha 15 de Mayo de 2017, proyecto pasa a etapa COMPLETADO.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	20/08/2017 - 10:19 PM
MAYO 2017: Legalización de Recepción Definitiva con fecha 15 de Mayo de 2017, proyecto pasa a etapa COMPLETADO.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	06/06/2017 - 10:02 AM
ABRIL 2017: En espera de legalización de trámite de Recepción Definitiva.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	16/05/2017 - 03:48 PM
MARZO 2017: En espera de legalización de trámite de Recepción Definitiva.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	16/05/2017 - 03:48 PM
FEBRERO 2017: En espera de legalización de trámite de Recepción Definitiva.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	06/03/2017 - 09:45 AM
ENERO 2017: En espera de legalización de trámite de Recepción Definitiva.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	09/02/2017 - 08:43 AM
DICIEMBRE 2016: En espera de legalización de trámite de Recepción Definitiva.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	17/01/2017 - 09:58 AM
NOVIEMBRE 2016: En espera de legalización de trámite de Recepción Definitiva.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	08/12/2016 - 08:14 AM
OCTUBRE 2016: En espera de legalización de trámite de Recepción Definitiva.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	01/11/2016 - 12:14 PM
SEPTIEMBRE 2016: En espera de legalización de trámite de Recepción Definitiva.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	13/10/2016 - 03:58 PM
AGOSTO 2016: En espera de legalización de trámite de Recepción Definitiva.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	06/09/2016 - 10:56 AM
JULIO 2016: En espera de legalización de trámite de Recepción Definitiva.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	03/08/2016 - 09:29 AM
JUNIO 2016: En espera de legalización de trámite de Recepción Definitiva.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	06/07/2016 - 08:33 AM
MAYO 2016: En espera de legalización de trámite de Recepción Definitiva.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	07/06/2016 - 04:48 PM
ABRIL 2016: En espera de legalización de trámite de Recepción Definitiva.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	05/05/2016 - 03:23 PM
Marzo 2016: En espera de legalización de trámite de Recepción Definitiva.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	06/04/2016 - 06:19 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Enero-Febrero 2016: En espera de legalización de trámite de Recepción Definitiva.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	05/03/2016 - 10:55 AM
Junio-Diciembre 2015: En espera de legalización de trámite de Recepción Definitiva.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	05/03/2016 - 10:54 AM
Mayo 2015: Con Oficio Nro. MTOP-SUBSZ4-14-331-OF, con fecha 03 de diciembre de 2014, suscrito por el Ing Fernando Zambrano Párraga SUBSECRETARIO REGIONAL 4 nombra comisión para proceder a efectuar la Recepción Definitiva de la obra el día viernes 5 de diciembre de 2014, dicha acta se encuentra en proceso de correcciones	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	02/06/2015 - 09:51 AM
Abril 2015: Con Oficio Nro. MTOP-SUBSZ4-14-331-OF, con fecha 03 de diciembre de 2014, suscrito por el Ing Fernando Zambrano Párraga SUBSECRETARIO REGIONAL 4 nombra comisión para proceder a efectuar la Recepción Definitiva de la obra el día viernes 5 de diciembre de 2014, dicha acta se encuentra en proceso de correcciones	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	07/05/2015 - 08:05 AM
Marzo 2015: Con Oficio Nro. MTOP-SUBSZ4-14-331-OF, con fecha 03 de diciembre de 2014, suscrito por el Ing Fernando Zambrano Párraga SUBSECRETARIO REGIONAL 4 nombra comisión para proceder a efectuar la Recepción Definitiva de la obra el día viernes 5 de diciembre de 2014, dicha acta se encuentra en proceso de correcciones.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	06/04/2015 - 08:49 AM
Febrero 2015: Con Oficio Nro. MTOP-SUBSZ4-14-331-OF, con fecha 03 de diciembre de 2014, suscrito por el Ing Fernando Zambrano Párraga SUBSECRETARIO REGIONAL 4 nombra comisión para proceder a efectuar la Recepción Definitiva de la obra el día viernes 5 de diciembre de 2014, dicha acta se encuentra en proceso de correcciones.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	05/03/2015 - 10:10 AM
Enero 2015: Con Oficio Nro. MTOP-SUBSZ4-14-331-OF, con fecha 03 de diciembre de 2014, suscrito por el Ing Fernando Zambrano Párraga SUBSECRETARIO REGIONAL 4 nombra comisión para proceder a efectuar la Recepción Definitiva de la obra el día viernes 5 de diciembre de 2014, dicha acta se encuentra en proceso de correcciones.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	07/02/2015 - 07:46 PM
Diciembre 2014(alcance): Con Oficio Nro. MTOP-SUBSZ4-14-331-OF, con fecha 03 de diciembre de 2014, suscrito por el Ing Fernando Zambrano Párraga SUBSECRETARIO REGIONAL 4 nombra comisión para proceder a efectuar la Recepción Definitiva de la obra "Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento del Acceso a la Ciudad de Manta", el día viernes 5 de diciembre de 2014, dicha acta se encuentra en proceso de correcciones.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	07/01/2015 - 12:01 PM
Diciembre 2014: Se encuentra en espera el trámite la Recepción Definitiva, se encuentra en revisión las nuevas fórmulas polinómicas para realizar la liquidación de los reajustes definitivos.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	07/01/2015 - 09:01 AM
Noviembre 2014: Se encuentra en espera el trámite la Recepción Definitiva, se encuentra en revisión las nuevas fórmulas polinómicas para realizar la liquidación de los reajustes definitivos.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	05/12/2014 - 04:06 PM
OCTUBRE 2014: Se encuentra en espera el trámite la Recepción Definitiva, además de la presentación de la Planilla de Liquidación de Reajustes Definitivos, se solicito de manera urgente presentar a la Contratista "CONSORCIO XAVIER MACIAS Y ASOCIADOS" la Planilla de Liquidación de reajustes por Parte de Supervisión mediante Oficio Nro. MTOP-DPM-GI-CONSV-14-64-OF, con fecha 04 de Agosto de 2014.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	07/11/2014 - 11:15 PM
SEPTIEMBRE 2014: Se encuentra en espera el trámite la Recepción Definitiva, además de la presentación de la Planilla de Liquidación de Reajustes Definitivos, se solicito de manera urgente presentar a la Contratista "CONSORCIO XAVIER MACIAS Y ASOCIADOS" la Planilla de Liquidación de reajustes por Parte de Supervisión mediante Oficio Nro. MTOP-DPM-GI-CONSV-14-64-OF, con fecha 04 de Agosto de 2014.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	06/10/2014 - 10:37 PM
AGOSTO 2014: Se encuentra en espera el trámite la Recepción Definitiva, además de la presentación de la Planilla de Liquidación de Reajustes Definitivos, se solicito de manera urgente presentar a la Contratista "CONSORCIO XAVIER MACIAS Y ASOCIADOS" la Planilla de Liquidación de reajustes por Parte de Supervisión mediante Oficio Nro. MTOP-DPM-GI-CONSV-14-64-OF, con fecha 04 de Agosto de 2014, de acuerdo a lo presupuestado en este mes se realizó el pago de la Planilla de Liquidación de Reajustes Definitivos de la Fiscalización.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	04/09/2014 - 10:03 AM
JULIO 2014: Se encuentra en espera el trámite la Recepción Definitiva, además de la presentación de la Planilla de Liquidación de Reajustes Definitivos, se solicito de manera urgente presentar a la Contratista "CONSORCIO XAVIER MACIAS Y ASOCIADOS" la Planilla de Liquidación de reajustes por Parte de Supervisión mediante Oficio Nro. MTOP-DPM-GI-CONSV-14-64-OF, con fecha 04 de Agosto de 2014.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	05/08/2014 - 09:46 AM
JUNIO 2014: Se encuentra en espera el trámite la Recepción Definitiva, además de la presentación de la Planilla de Liquidación de Reajustes Definitivos.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	04/07/2014 - 08:42 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2014: Se encuentra en espera el trámite la Recepción Definitiva, además de la presentación de la Planilla de Liquidación de Reajustes Definitivos.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	05/06/2014 - 09:13 AM
ABRIL 2014: Se encuentra en espera el trámite la Recepción Definitiva, además de la presentación de la Planilla de Liquidación de Reajustes Definitivos.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	05/05/2014 - 10:11 AM
Marzo de 2014: Se encuentra en espera el trámite la Recepción Definitiva.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	28/03/2014 - 01:34 PM
Febrero de 2014: Se encuentra en espera el trámite la Recepción Definitiva.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	05/03/2014 - 09:09 AM
Enero 2014: Se firmó acta de Recepción Provisional, en espera de trámite de Recepción Provisional de la Obra.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	08/02/2014 - 11:16 AM
Diciembre 2013: Se encuentra en trámite recepción provisional.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	07/01/2014 - 09:20 AM
Octubre-Noviembre 2013: Se encuentra en trámite recepción provisional.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	02/12/2013 - 10:36 AM
Septiembre de 2013: Se encuentra en trámite recepción provisional.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	07/10/2013 - 04:24 PM
Julio-Agosto 2013: Se encuentra en trámite recepción provisional de la Obra.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	04/09/2013 - 08:59 AM
Junio 2013: Se firmó un Contrato Complementario y Ampliación de Plazo de 60 días quedando como fecha de terminación 27 de Junio del 2013. Se Ejecutaron Rubros como: Bordillo separado de Ciclovía de Hormigón Simple (F'c= 210 Kg/cm ²), Cuneta de Bordillo de Hormigón Simple Clase B (F'c= 210 Kg/cm ²). Bordillo de Hormigón simple, sección (0,45x0,15)m de clase (F'c= 210 Kg/cm ²), Excavación para cuneta y encauzamiento a mano, Acera de Hormigón Simple, Capa de rodadura de Hormigón Asfáltico mezclado en planta de 10,00 cm de espesor, Capa de rodadura de Hormigón Asfáltico mezclado en planta de 5,00 cm de espesor, Transporte de Mezcla Asfáltica para capa de rodadura, Asfalto diluido tipo RC grado 250, para riego de adherencia, asfalto MC para imprimación, Base clase 1A, Transporte de Base Clase 1A. Excavación y relleno para estructuras, Tubería de Hormigón Armado d=48"(1200 mm), Sub-drenes D=160 mm PVC, Geotextil para Subdren, 1600 NT, Material Filtrante, Señalización Horizontal y Vertical, Colocación de Piedra Escollera para Canal y Línea Costanera. Culminación de Trabajos el 27 de Junio de 2013.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	19/07/2013 - 01:57 PM
Mayo 2013: Se encuentra en Trámite Contrato Complementario y Ampliación de Plazo de 60 días, Se Ejecutaron Rubros como: Excavación en Suelo, Transporte de Material de Excavación, Bordillo Separador de Ciclovía, Cuneta Bordillo de Hormigón Simple clase B F'c= 210 kg/cm ² , Bordillo de hormigón simple, sección (0,45 x 0,15) m, Clase B (f'c=210 Kg/cm ²), Excavación para cunetas y encauzamientos a mano, Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta de 5.00 cm. de espesor. Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta de 10.00 cm. de espesor, Transporte de mezcla asfáltica para capa de rodadura, Asfalto diluido tipo RC grado 250, para riego de adherencia, Asfalto MC para imprimación, Base, Clase 1; Sub-base Clase 3c; Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado, Transporte de suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante, Transporte de sub-base, Transporte de base, ESCOMBRERA.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	19/06/2013 - 12:02 PM
Abril 2013: En este mes se ejecutaron rubros como: Excavación en Suelo, Excavación y relleno para estructuras, Geotextil para subdren, Tubería para Subdrenes D=160 mm PVC Perforada, Material Filtrante, Excavación para Cunetas y Encauzamiento a mano; Bordillo de Hormigón Simple, sección (0,45x0,15)m Clase B (F'c= 210 kg/cm ²), Bordillo de Hormigón Simple clase B F'c= 210 kg/cm ² , Cuneta Bordillo de Hormigón Simple clase B F'c= 210 kg/cm ² , Cunetas de Hormigón clase B (F'c= 210 kg/cm ²), Cunetas de Coronación y Pie de talud hormigón clase B (F'c= 210 kg/cm ²), Tubería a Presión de PVC, AAPP d= 250 mm 1,25 MPA, Acero de Refuerzo en Barras, Asfalto diluido tipo RC grado 250 para riego de adherencia, Capa de Rodadura de Hormigón Asfáltico mezclado en Planta de 10,00 cm de espesor y 5.00 cm de espesor, Comunicados Radiales, Instructivo y Tríptico, Charlas de Adiestramiento, Sub-base Clase 3, Transporte de Mezcla Asfáltica, Señales al lado de la Carretera (Rotulo Ambiental 1,20x2,40m), Preventivas (0,60x1,20)m. Se encuentra en Trámite un Contrato Complementario y Ampliación de Plazo de 60 días.	Palma Chiquito, Fernando Abrahan	30/05/2013 - 11:31 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Marzo 2013: En este mes se ejecutaron rubros como: Tubería para Subdrenes D=160 mm PVC Perforada, Geotextil para Subdren, Material Filtrante, Excavación para Cunetas y Encauzamiento a mano; Bordillo de Hormigón Simple, sección (0,45x0,15)m Clase B (F'c= 210 kg/cm²), Bordillo de Hormigón Simple clase B F'c= 210 kg/cm², Cuneta Bordillo de Hormigón Simple clase B F'c= 210 kg/cm², Cunetas de Hormigón clase B (F'c= 210 kg/cm²), Cunetas de Coronación y Pie de talud hormigón clase B (F'c= 210 kg/cm²), Tubería a Presión de PVC, AAPP d= 250 mm 1,25 MPA, Acero de Refuerzo en Barras, Asfalto diluido tipo RC grado 250 para riego de adherencia, Capa de Rodadura de Hormigón Asfáltico mezclado en Planta de 10,00 cm de espesor y 5.00 cm de espesor, Comunicados Radiales, Instructivo y Tríptico; Charlas de Adiestramiento. Sub-base Clase 3, Transporte de Mezcla Asfáltica, Señales al lado de la Carretera (Rotulo Ambiental 1,20x2,40m), Preventivas (0,60x1,20)m, Excavación en Suelo</p>	<p>Palma Chiquito, Fernando Abrahan</p>	<p>04/05/2013 - 06:57 PM</p>
<p>Febrero 2013: En este mes se ejecutaron rubros como: Excavación en Suelo, Transporte de Material de Excavación (transporte libre 500 mts), Agua para Control de Polvo y Escombreras, Transporte de Base, Transporte de Sub-base, Colocación de Base Clase 1A, Sub-base Clase 3C, Transporte de Material para mejoramiento de la Subrasante, Construcción de Campamentos y Obras Convexas, Señales al lado de Carretera (0.75x0.75 m) y (0.60x1.20 m) Preventivas, Colocación de Asfalto de MC de Imprimación, Colocación de Tubería de Hormigón Armado D=1200mm y D= 1500mm. Excavación para cunetas y Encauzamiento a mano, Tubería de Hormigón Armado d= 48" (1200mm) y d= 60" (150 mm), Bordillo de Hormigón Simple clase B F'c= 210 kg/cm², Cuneta Bordillo de Hormigón Simple clase B F'c= 210 kg/cm², Cunetas de Hormigón clase B (F'c= 210 kg/cm²), Cunetas de Coronación y Pie de talud hormigón clase B (F'c= 210 kg/cm²), Tubería a Presión de PVC, AAPP d= 250 mm 1,25 MPA, Acero de Refuerzo en Barras, Asfalto diluido tipo RC grado 250 para riego de adherencia, Capa de Rodadura de Hormigón Asfáltico mezclado en Planta de 10,00 cm de espesor y 5.00 cm de espesor, Comunicados Radiales, Letrina Sanitaria, Instructivo y Tríptico; Charlas de Adiestramiento.</p>	<p>Palma Chiquito, Fernando Abrahan</p>	<p>04/04/2013 - 01:57 PM</p>
<p>Enero 2013: En este mes se ejecutaron rubros como: Excavación en Suelo, Transporte de Material de Excavación (transporte libre 500 mts), Agua para Control de Polvo y Escombreras, Transporte de Base, Transporte de Sub-base, Colocación de Base Clase 1A, Sub-base Clase 3C, Transporte de Material para mejoramiento de la Subrasante, Construcción de Campamentos y Obras Convexas, Señales al lado de Carretera (0.75x0.75 m) y (0.60x1.20 m) Preventivas, Colocación de Asfalto de MC de Imprimación, Colocación de Tubería de Hormigón Armado D=1200mm y D= 1500mm. Excavación para cunetas y Encauzamiento a mano, Tubería de Hormigón Armado d= 48" (1200mm) y d= 60" (150 mm), Remoción de Alcanatarilla de Tubo, Bordillo de Hormigón Simple clase B F'c= 210 kg/cm², Cuneta Bordillo de Hormigón Simple clase B F'c= 210 kg/cm², Cunetas de Hormigón clase B (F'c= 210 kg/cm²), Cunetas de Coronación y Pie de talud hormigón clase B (F'c= 210 kg/cm²), Tubería a Presión de PVC, AAPP d= 250 mm 1,25 MPA.</p>	<p>Palma Chiquito, Fernando Abrahan</p>	<p>04/03/2013 - 08:16 AM</p>
<p>Diciembre 2012: En este mes se ejecutaron rubros como: Excavación en Suelo, Transporte de Material de Excavación (transporte libre 500 mts), Agua para Control de Polvo y Escombreras, Transporte de Base, Transporte de Sub-base, Colocación de Base Clase 1A, Sub-base Clase 3C, Transporte de Material para mejoramiento de la Subrasante, Construcción de Campamentos y Obras Convexas, Señales al lado de Carretera (0.75x0.75 m) y (0.60x1.20 m) Preventivas, Colocación de Asfalto de MC de Imprimación, Colocación de Tubería de Hormigón Armado D=1200mm y D= 1500mm.</p>	<p>Palma Chiquito, Fernando Abrahan</p>	<p>15/02/2013 - 10:29 AM</p>
<p>Noviembre 2012: En este mes se ejecutaron Rubros como: Excavación en suelo, Transporte de Material de Excavación (transporte libre 500 mts), Agua para Control de Polvo y Escombreras.</p>	<p>Palma Chiquito, Fernando Abrahan</p>	<p>08/01/2013 - 11:00 AM</p>
<p>OCTUBRE 2012: Inicio de la obra una vez entregado el Anticipo el día 30 de Octubre del 2012 por el CONSORCIO XAVIER MACIAS Y ASOCIADOS y Fiscalizado por la Consultora CONSULDISA Monto: USD 5'615.105,05 Anticipo: 40,00% Plazo: 180 días.</p>	<p>Palma Chiquito, Fernando Abrahan</p>	<p>08/01/2013 - 08:18 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2012: Se firma nuevo contrato para la rehabilitación de este proyecto el 28 de Septiembre del 2012 a cargo de la Compañía Xavier Macias y Asociados, y Fiscalización Contratada con la Consultora Cia. Consuldisa</p>	<p>Palma Chiquito, Fernando Abrahan</p>	<p>08/01/2013 - 08:12 AM</p>
<p>MARZO 2012: Mediante oficio N° MTOP-SUBBSZ4-12-137-OF. con fecha 08 de Marzo del 2012, se notifica de Terminación Unilateral N° 001-MTOP-SUBZ4-2012, a partir de esta fecha no se ha realizado ninguna actividad en la Obra, tanto la Fiscalización como la Supervisión realiza la liquidación de los trabajos ejecutados por la compañía contratista. FEBRERO 2012.- Proyecto en proceso de terminación unilateral. ENERO 2012.- Excavación en suelo, transporte de material de excavación. Colocación de material de mejoramiento y sub-base.</p>	<p>Palma Chiquito, Fernando Abrahan</p>	<p>08/01/2013 - 08:11 AM</p>

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 4 - Pacifico > Manabí > Manta

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN:Acta de Adjudicación,realizada.	4-Inicio de Trabajo	02/12/2008		02/12/2008		Sí	2.0
2	PLANEACIÓN:Aprobación de Estudio,realizada.	4-Inicio de Trabajo	02/12/2008		02/12/2008		Sí	2.0
3	PLANEACIÓN:Certificación Presupuestaria,realizada.	4-Inicio de Trabajo	02/12/2008		02/12/2008		Sí	2.0
4	EJECUCIÓN:Transporte de Mejoramiento,realizada.	5-Entregables Intermedios	02/01/2012		02/01/2012		Sí	0.1
5	EJECUCIÓN:Transporte de Sub-base,realizada.	5-Entregables Intermedios	03/01/2012		03/01/2012		Sí	0.1
6	EJECUCIÓN:Material Mejoramiento,realizada.	5-Entregables Intermedios	05/01/2012		05/01/2012		Sí	0.1
7	EJECUCIÓN:Material de Sub - base,realizada.	5-Entregables Intermedios	06/01/2012		06/01/2012		Sí	0.1
8	EJECUCIÓN:Tubería de Hormigón Armado d=60 pulg,realizada.	5-Entregables Intermedios	08/01/2012		08/01/2012		Sí	0.1
9	EJECUCIÓN:Hormigón Estructural 210 kg/cm2,realizada.	5-Entregables Intermedios	10/01/2012		10/01/2012		Sí	0.1
10	EJECUCIÓN:Firma de un Nuevo Contrato con el CONSORCIO XAVIER MACIAS Y ASOCIADOS,firmado	5-Entregables Intermedios	28/09/2012		28/09/2012		Sí	1.0
11	EJECUCIÓN:Terracería Primer Fase,terminado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	1.6
12	EJECUCIÓN:Drenaje Primera Fase,terminado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2013		31/01/2013		Sí	5.85
13	EJECUCIÓN:Medio Ambiente Primera Fase,terminado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2013		31/01/2013		Sí	1.14
14	EJECUCIÓN:Pavimento Primera Fase,terminado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2013		31/01/2013		Sí	2.0
15	EJECUCIÓN:Drenaje Segunda Fase,terminado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2013		28/02/2013		Sí	7.3
16	EJECUCIÓN:Medio Ambiente Segunda Fase,terminado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2013		28/02/2013		Sí	3.11
17	EJECUCIÓN:Pavimento Segunda Fase,terminado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2013		28/02/2013		Sí	6.5
18	EJECUCIÓN:Señalización Vertical Primera Fase,terminado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2013		28/02/2013		Sí	1.3
19	EJECUCIÓN:Varios,terminado	5-Entregables Intermedios	28/02/2013		28/02/2013		Sí	1.4
20	EJECUCIÓN:Drenaje Tercera Fase,terminado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2013		31/03/2013		Sí	8.2
21	EJECUCIÓN:Pavimento Tercera Fase,terminado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2013		31/03/2013		Sí	10.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
22	EJECUCIÓN:Terracería Segunda Fase,terminado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2013		31/03/2013		Sí	4.1
23	EJECUCIÓN:Drenaje Cuarta Fase,terminado.	5-Entregables Intermedios	28/04/2013		28/04/2013		Sí	6.4
24	EJECUCIÓN:Pavimento Cuarta Fase,terminado.	5-Entregables Intermedios	28/04/2013		28/04/2013		Sí	10.0
25	EJECUCIÓN:Firma de Contrato Complementario,firmado.	5-Entregables Intermedios	03/06/2013		03/06/2013		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN:Medio Ambiente Tercera Fase,terminado.	5-Entregables Intermedios	27/06/2013		27/06/2013		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN:Rubros de Contrato Complementario,terminado.	5-Entregables Intermedios	27/06/2013		27/06/2013		Sí	12.0
28	EJECUCIÓN:Señalización Horizontal Primera Fase,terminado.	5-Entregables Intermedios	27/06/2013		27/06/2013		Sí	0.8
29	EJECUCIÓN:Señalización Horizontal Segunda Fase,terminado.	5-Entregables Intermedios	27/06/2013		27/06/2013		Sí	1.2
30	EJECUCIÓN:Señalización Vertical Segunda Fase,terminado	5-Entregables Intermedios	27/06/2013		27/06/2013		Sí	4.0
31	CIERRE:Acta de Recepción Provisional,firmado.	5-Entregables Intermedios	30/08/2013		30/08/2013		Sí	1.0
32	CIERRE:Liquidación de Contrato,realizado.	9-Entregables Formales	30/04/2014		15/05/2017		Sí	1.0
33	COMPLETADO: Acta de Recepción Definitiva,firmada.	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		31/12/2014		Sí	1.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	obra totalmente terminada	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	30/06/2014
2	Obras emblemáticas	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	30/04/2013
3	Historico - La construcción del acceso a Manta desde San Mateo (Ruta del Spondylus) de 8.4 Km. de longitud, se le adjudicó a la compañía VIPA, por un monto de 8.295.815,99 en marzo del año 2010.	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	17/04/2012

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance de acuerdo al cronograma		100.00 %	100	100	30/10/2012	Diciembre

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	6,189,863.76
Estimado Al Fin Del Proyecto:	17,461,959.52 **
Costo Total:	15,054,529.14
Total Devengado:	17,461,959.52
% Costo Total Devengado:	115.99 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 115.99 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	9,585,192.91	13,985.00	0.00	9,599,177.91
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	7,113,523.12	13,985.00	0.00	7,127,508.12
Ppto. Codificado	15,871,108.33	3,000.00	0.00	15,874,108.33
Ppto. Comprometido	13,572,732.18	0.00	0.00	13,572,732.18
Planeado - Codificado (2017)		10,985.00		
Programado a Devengar	14,541,897.33	0.00	0.00	14,541,897.33
Ppto. Devengado	17,461,959.52	0.00	0.00	17,461,959.52
Pagado Real	179,813.24	0.00	0.00	179,813.24
Estimado a fin de año	* 17,461,959.52	0.00	0.00	17,461,959.52
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-2,920,062.19	0.00	0.00	-2,920,062.19
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 120.08 %	0.00 %	0.00 %	120.08 %
Ppto. Codificado 998	2,546,557.79	0.00	0.00	2,546,557.79
Ppto. Devengado 998	2,544,929.99	0.00	0.00	2,544,929.99

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017



Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	100.00 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Oct	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Nov	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Dic	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Total	0.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
7	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
8	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	ACTA_ACCESO_A_MANTA_CONSORCIO_XAVIER_MACIAS	16/06/2014
2	Acta de Recepción Provisional del Acceso a la Ciudad de Manta.	A.5.pdf	11/04/2014
3	Ayuda Memoria Sitop Acceso a la Ciudad de Manta	A.6.pdf	11/04/2014
4	Contrato Complementario N°1	A.4.pdf	11/04/2014
5	Designación por parte de la Máxima Autoridad de Supervisor de Obra al Ing.Fernando Palma Chiquito	A.2.pdf	11/04/2014
6	Fotos de proceso constructivo en el periodo de Noviembre-Diciembre de 2012	A.7.pdf	11/04/2014
7	Informe Sitop Abril 2013	B.6.pdf	11/04/2014
8	Informe Sitop Abril 2014	C.9.pdf	07/05/2014
9	Informe Sitop Agosto 2013	C.1.pdf	11/04/2014
10	Informe Sitop Diciembre 2012	B.2.pdf	11/04/2014
11	Informe Sitop Diciembre 2013	C.5.pdf	11/04/2014
12	Informe Sitop Enero 2013	B.3.pdf	11/04/2014
13	Informe Sitop Enero 2014	C.6.pdf	11/04/2014
14	Informe Sitop Febrero 2013	B.4.pdf	11/04/2014
15	Informe Sitop Febrero 2014	C.7.pdf	11/04/2014
16	Informe Sitop Julio 2013	B.9.pdf	11/04/2014
17	Informe Sitop Julio 2014	D.4.pdf	05/08/2014
18	Informe Sitop Junio 2013	B.8.pdf	11/04/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
19	Informe Sitop Junio 2014	D.2.pdf	04/07/2014
20	Informe Sitop Marzo 2013	B.5.pdf	11/04/2014
21	Informe Sitop Marzo 2014	C.8.pdf	11/04/2014
22	Informe Sitop Mayo 2013	B.7.pdf	11/04/2014
23	Informe Sitop Mayo 2014	D.1.pdf	05/06/2014
24	Informe Sitop Noviembre 2012	B.1.pdf	11/04/2014
25	Informe Sitop Noviembre 2013	C.4.pdf	11/04/2014
26	Informe Sitop Octubre 2013	C.3.pdf	11/04/2014
27	Informe Sitop Septiembre 2013	C.2.pdf	11/04/2014
28	Oficio Nro. MTOP-DPM-GI-CONSV-14-64-OF, acerca de solicitud de presentación de Planilla de Liquidación de de Reajustes.	D3.pdf	05/08/2014
29	Orden de Cambio para Ampliación de Plazo de 60 días.	A.3.pdf	11/04/2014
30	Referencia a Oficio Nro.MTOP-DPM-Z4-2012-263-OF,terminación unilateral VIPA S.A	A.1.pdf	11/04/2014
31	S.1-Informe Sitop Agosto 2014	D.5.pdf	04/09/2014
32	S.2-Informe Sitop Septiembre 2014	D.6.pdf	06/10/2014
33	S.3-Informe Sitop Octubre 2014	D.7.pdf	07/11/2014
34	S.4-Informe Sitop Noviembre 2014	D.8.pdf	06/12/2014
35	S.5-Informe Sitop Diciembre 2014	D.9.pdf	07/01/2015
36	S.6-Oficio Nro. MTOP-SUBSZ4-14-331-OF, nombramiento de comisión para Recepción Definitiva.	E.1.pdf	07/01/2015
37	S.7-Informe Sitop Enero 2015	E.2.pdf	07/02/2015
38	S.8-Informe Sitop Febrero 2015.	E.3.pdf	05/03/2015
39	S.9-Informe Sitop Marzo 2015.	E.4.pdf	06/04/2015
40	T.1-Informe Sitop Abril 2015.	E.5.pdf	07/05/2015
41	T.2-Informe Sitop Mayo 2015.	E.6.pdf	02/06/2015
42	T.3-Informe Sitop Junio 2015.	E.7.pdf	05/03/2016
43	T.4-Informe Sitop Julio 2015.	E.8.pdf	05/03/2016
44	T.5-Informe Sitop Agosto 2015.	E.9.pdf	05/03/2016
45	T.6-Informe Sitop Septiembre 2015.	F.1.pdf	05/03/2016
46	T.7-Informe Sitop Octubre 2015.	F.2.pdf	05/03/2016
47	T.8-Informe Sitop Noviembre 2015.	F.3.pdf	05/03/2016
48	T.9-Informe Sitop Diciembre 2015.	F.4.pdf	05/03/2016
49	U.1-Informe Sitop Enero 2016.	F.5.pdf	05/03/2016
50	U.2-Informe Sitop Febrero 2016.	F.6.pdf	05/03/2016
51	U.3-Informe Sitop Marzo 2016.	F.7.pdf	06/04/2016
52	U.4-Informe Sitop Abril 2016.	F.8.pdf	05/05/2016
53	U.5-Informe Sitop Mayo 2016.	F.9.pdf	07/06/2016
54	U.6-Informe Sitop Junio 2016.	G.1.pdf	18/07/2016
55	U.7-Informe Sitop Julio 2016.	G.2.pdf	03/08/2016
56	U.8-Informe Sitop Agosto 2016.	G.3.pdf	06/09/2016
57	U.9-Informe Sitop Septiembre 2016.	G.4.pdf	13/10/2016
58	V.1-Informe Sitop Octubre 2016.	G.5.pdf	01/11/2016
59	V.2-Informe Sitop Noviembre 2016.	G.6.pdf	08/12/2016
60	V.3-Informe Sitop Diciembre 2016.	G.7.pdf	17/01/2017
61	V.4-Informe Sitop Enero 2017.	G.8.pdf	06/03/2017
62	V.5-Informe Sitop Febrero 2017.	G.9.pdf	06/03/2017
63	V.6-Informe Sitop Marzo 2017.	H.1.pdf	16/05/2017
64	V.7-Informe Sitop Abril 2017.	H.2.pdf	16/05/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
65	V.8-Informe Sitop Mayo 2017.	H.3.pdf	05/10/2017
66	V.9-Informe Sitop Junio 2017.	H.4.pdf	05/10/2017
67	W.1-Informe Sitop Julio 2017.	H.5.pdf	05/10/2017
68	W.2-Informe Sitop Agosto 2017.	H.6.pdf	05/10/2017
69	W.3-Informe Sitop Septiembre 2017.	H.7.pdf	05/10/2017
70	W.4-Informe Sitop Octubre 2017.	H.8.pdf	01/11/2017
71	W.5-Informe Sitop Noviembre 2017.	H.9.pdf	05/12/2017
72	W.6-Informe Sitop Diciembre 2017.	I.1.pdf	09/01/2018
73	W.7-Informe Sitop Enero 2018.	I.2.pdf	07/02/2018
74	W.8-Informe Sitop Febrero 2018.	I.3.pdf	13/03/2018
75	W.9-Informe Sitop Marzo 2018.	I.4.pdf	09/04/2018
76	X.1-Informe Sitop Abril 2018.	I.5.pdf	09/05/2018
77	X.2-Informe Sitop Mayo 2018.	I.6.pdf	07/06/2018
78	X.3-Informe Sitop Junio 2018.	I.7.pdf	03/08/2018
79	X.4-Informe Sitop Julio 2018.	I.8.pdf	03/08/2018

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Cevallos Alava, Eder Joffre	Administrador del contrato.	Director Provincial Manabí (MIDUVI)	ejcevallos@miduvi.gob.ec	
Palma Chiquito, Fernando Abrahan	Lider del proyecto	Analista de Infraestructura Provincial 1	fapalma@mtop.gob.ec	023974600
Zambrano Parraga, Ramón Fernando	Patrocinador ejecutivo.	Coordinador Zonal 4 (MIDUVI)	rfzambrano@miduvi.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
6330_1.jpg	02/04/2015
