

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 1

Dirección Provincial Sucumbíos

PROYECTO: K030 MTOP-Construcción del puente Parahuaycu 1, ubicado en la carretera: Lago Agrio-Cuyabeno -Tarapoa

Líder del Proyecto:	López Mendoza, Cristhian Manuel (cmlopez@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Benavides Morillo, Omar Alexander	Programas Relacionados:	CONSTRUCCION DEL PUENTE PARAHUAYCU 1 UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO -TARAPOA, Provincia - Sucumbíos, STPE - Inversión en 40km de frontera norte
Titular:	Vinces Navarrete, Julio Cesar	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	2.37
CUP:	175200000.20.6934	TIR:	24.20 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	967,700.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,918,047.67
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	16/09/2011 - 29/12/2018
Fecha de última actualización:	05/11/2018	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	López Mendoza, Cristhian Manuel	Fecha del siguiente Hito:	30/08/2012

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Construcción del puente Parahuaycu 1, ubicado en la carretera: Lago Agrio- Cuyabeno -Tarapoa

PRODUCTO / SERVICIO:

El producto esperado, es el puente nuevo.

LÍNEA BASE:

La línea base para la construcción del puente es cero

OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO:

Construir un puente que brinde mayor fluidez al tráfico vehicular

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Disminuir el tiempo de viaje en la carretera Lago Agrio- Cuyabeno -Tarapoa

Evitar accidentes de transito

Constructor: PATE C.A.

Valor Contractual:

1'0153 20.97 (valor contractual por puentes: Teteye, Parahuaico 1 y Dureno)

Beneficios Cualitativos

Disminución del tiempo de viaje entre las poblaciones: Lago Agrio, Dureno, Pacayacu, Chiritza, Tarapoa, Puerto el Carmen del Putumayo; disminución de accidentes debido al mal estado de las estructuras existentes, incremento del nivel de servicio.

Tipo de Beneficiario

Habitantes de la Provincia de Sucumbios, Orellana e industrias petroleras asentadas en el sector


Restricciones

Tiempo: Se debe tener Acta de recepción definitiva junio del 2013

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado **Congelado** Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 97.93 %
 Fecha de Inicio: 16/09/2011 Fecha de Fin: 29/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

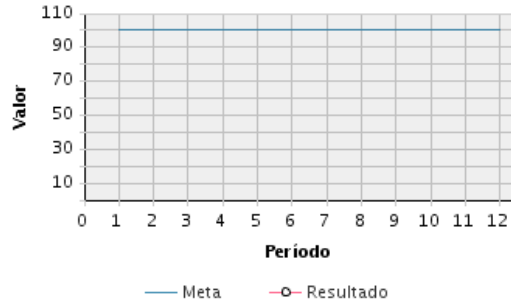

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Octubre 2018: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de la fiscalización, se solicitó la inclusión en el PAI 2019</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	05/11/2018 - 09:27 AM
<p>Septiembre 2018: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de la fiscalización.</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	03/10/2018 - 02:49 PM
<p>Agosto: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de la fiscalización.</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	04/09/2018 - 02:26 PM
<p>Julio 2018: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación del contrato de la fiscalización.</p>	López Mendoza, Cristhian Manuel	03/08/2018 - 02:08 PM
<p>MAYO 2018: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, ya se realizo el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	01/06/2018 - 03:23 PM
<p>Abril 2018: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, ya se realizo el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	03/05/2018 - 11:15 AM
<p>Marzo 2018: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, ya se realizo el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	03/05/2018 - 11:15 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Febrero 2018: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, ya se realizo el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	03/05/2018 - 11:14 AM
<p>Enero 2018: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, ya se realizo el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	08/02/2018 - 10:46 AM
<p>Diciembre 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, ya se realizo el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	05/01/2018 - 03:41 PM
<p>Noviembre 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	04/12/2017 - 05:29 PM
<p>Octubre 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	01/11/2017 - 04:17 PM
<p>Septiembre 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	02/10/2017 - 11:01 AM
<p>Agosto 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/09/2017 - 09:48 PM
<p>JuLio 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	02/08/2017 - 02:40 PM
<p>Junio 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	04/07/2017 - 10:45 AM
<p>Mayo 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	01/06/2017 - 11:25 AM
<p>Abril 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	03/05/2017 - 01:24 PM
<p>Marzo 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	30/03/2017 - 11:02 AM
<p>Febrero 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/03/2017 - 01:33 PM
<p>Enero 2017: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>		
<p>Diciembre 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Benavides Morillo, Omar Alexander	05/01/2017 - 11:41 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.		
<p>Noviembre 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/12/2016 - 09:49 AM
<p>Octubre 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	31/10/2016 - 12:54 PM
<p>Septiembre 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p> <p>Agosto 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p> <p>Julio 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p> <p>Junio 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	29/09/2016 - 12:52 PM
<p>Mayo 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	13/05/2016 - 09:03 AM
<p>Abril 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	25/04/2016 - 12:00 PM
<p>Marzo 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	06/04/2016 - 05:07 PM
<p>Febrero 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	08/03/2016 - 04:03 PM
<p>Enero 2016: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	13/02/2016 - 01:24 PM
<p>Diciembre 2015: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p> <p>Noviembre 2015: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	15/12/2015 - 12:28 PM
<p>Octubre 2015: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.</p>	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	30/10/2015 - 11:12 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Septiembre 2015: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo debido a fallas en los estudios, falta realizar el pago correspondiente a la liquidación.	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	07/10/2015 - 08:57 AM
Agosto 2015 La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT; el contrato se encuentra terminado por mutuo acuerdo, debido a fallas en los estudios	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	01/09/2015 - 10:04 AM
JULIO 2015: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/08/2015 - 10:43 AM
JUNIO 2015: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/07/2015 - 10:57 AM
MAYO 2015: La liquidación técnica y económica ha sido realizada por la fiscalización ASCONDELIT.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/07/2015 - 10:57 AM
ABRIL 2015 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Parahuaico 1; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. Actualmente se encuentra en proceso de legalización del acta.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	11/05/2015 - 11:57 AM
MARZO 2015 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Parahuaico 1; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. Actualmente se encuentra en proceso de legalización del acta.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/04/2015 - 11:35 AM
FEBRERO 2015 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/03/2015 - 08:45 AM
ENERO 2015 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/02/2015 - 11:53 AM
DICIEMBRE 2014 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	23/01/2015 - 11:28 AM
NOVIEMBRE 2014 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/12/2014 - 08:59 AM
OCTUBRE 2014 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/11/2014 - 12:45 PM
SEPTIEMBRE 2014 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/10/2014 - 10:12 AM
AGOSTO 2014 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/10/2014 - 10:12 AM
JULIO 2014 La Cia. PATE C.A, contratista de la obra, aceptó la terminación por mutuo acuerdo para la construcción del puente Teteye; la Dirección Provincial dispuso a la fiscalización realizar la liquidación técnica y económica de la obra. No se ha realizado la liquidación Económica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	21/08/2014 - 04:22 AM
JUNIO 2014 La compañía PATE C.A. acepta la terminación por mutuo acuerdo, la DPS solicitó a la fiscalización que realice la liquidación económica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	03/07/2014 - 03:36 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2014 La compañía PATE C.A. acepta la terminación por mutuo acuerdo, la DPS solicitó a la fiscalización que realice la liquidación económica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	03/07/2014 - 03:36 PM
ABRIL 2014 La compañía PATE C.A. acepta la terminación por mutuo acuerdo, la DPS solicitó a la fiscalización que realice la liquidación económica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	03/07/2014 - 03:35 PM
MARZO 2014 La compañía PATE C.A. acepta la terminación por mutuo acuerdo, la DPS solicitó a la fiscalización que realice la liquidación económica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/04/2014 - 09:59 AM
FEBRERO 2014 La compañía PATE C.A. acepta la terminación por mutuo acuerdo, la DPS solicitó a la fiscalización que realice la liquidación económica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/04/2014 - 09:59 AM
ENERO 2014 La compañía PATE C.A. acepta la terminación por mutuo acuerdo, la DPS solicitó a la fiscalización que realice la liquidación económica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/04/2014 - 09:59 AM
DICIEMBRE 2013 La compañía PATE C.A. acepta la terminación por mutuo acuerdo, la DPS solicitó a la fiscalización que realice la liquidación económica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/04/2014 - 09:59 AM
NOVIEMBRE 2013 La compañía PATE C.A. acepta la terminación por mutuo acuerdo, la DPS solicitó a la fiscalización que realice la liquidación económica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/04/2014 - 09:58 AM
OCTUBRE 2013 La compañía PATE C.A. acepta la terminación por mutuo acuerdo, la DPS solicitó a la fiscalización que realice la liquidación económica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/04/2014 - 09:58 AM
OCTUBRE 2013 La compañía PATE C.A. acepta la terminación por mutuo acuerdo, la DPS solicitó a la fiscalización que realice la liquidación económica.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	09/12/2013 - 01:35 AM
SEPTIEMBRE 2013 La compañía PATE C.A. acepta la terminación por mutuo acuerdo, la DPS solicitó a la fiscalización que realice la liquidación económica	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/11/2013 - 12:10 PM
AGOSTO 2013 La compañía PATE C.A. acepta la terminación por mutuo acuerdo, la DPS solicitó a la fiscalización que realice la liquidación económica	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/10/2013 - 02:09 PM
JULIO 2013 La compañía PATE C.A. acepta la terminación por mutuo acuerdo, la DPS solicitó a la fiscalización que realice la liquidación económica	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	09/09/2013 - 09:11 AM
JUNIO 2013 La compañía PATE C.A. acepta la terminación por mutuo acuerdo, la DPS solicitó a la fiscalización que realice la liquidación económica	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/07/2013 - 09:25 AM
MAYO 2013 La compañía PATE C.A. acepta la terminación por mutuo acuerdo, la DPS solicitó a la fiscalización que realice la liquidación económica	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/07/2013 - 09:25 AM
ABRIL 2013 La compañía PATE C.A. acepta la terminación por mutuo acuerdo, la DPS solicitó a la fiscalización que realice la liquidación económica	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	06/06/2013 - 08:26 PM
MARZO 2013 El trámite de la revisión de estudios continúa en la Subsecretaría (Con fecha 19 de Diciembre el contratista entrega los estudios definitivos para la construcción de los puentes: Teteyé, Parahuaico y Dureno, los mismos que se encuentran en aprobación en la Subsecretaría regional 1. Se ha realizado la consulta al departamento jurídico del MTOP central, para que emita su criterio jurídico respecto al problema presentado.)	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	24/04/2013 - 05:20 PM
FEBRERO 2013 Con fecha 19 de Diciembre el contratista entrega los estudios definitivos para la construcción de los puentes: Teteyé, Parahuaico y Dureno, los mismos que se encuentran en aprobación en la Subsecretaría regional 1. Se ha realizado la consulta al departamento jurídico del MTOP central, para que emita su criterio jurídico respecto al problema presentado.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	24/04/2013 - 05:17 PM
ENERO 2013 Con fecha 19 de Diciembre el contratista entrega los estudios definitivos para la construcción de los puentes: Teteyé, Parahuaico y Dureno, los mismos que se encuentran en aprobación en la	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	06/03/2013 - 04:48 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Subsecretaria regional 1. Se ha realizado la consulta al departamento juridico del MTOP central, para que emita su criterio juridico respecto al problema presentado.		
DICIEMBRE 2012 Con fecha 19 de Diciembre el contratista entrega los estudios definitivos para la construccion de los puentes: Teteyé, Parahuaico y Dureno, los mismos que se encuentran en revisión en la Dirección Provincial de Sucumbios.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	06/03/2013 - 04:47 PM
NOVIEMBRE 2012 Debido a problemas técnicos sucitados desde el mes de Agosto, la obra se encuantra suspendida hasta realizar rediseño de infraestructura y superestructura.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	09/01/2013 - 03:04 PM
OCTUBRE 2012.- Contratista : Pate C.A. Debido a problemas técnicos sucitados desde el mes de Agosto, la obra se encuantra suspendida hasta realizar rediseño de infraestructura y superestructura. SEPTIEMBRE 2012.- Contratista : Pate C.A. Debido a problemas técnicos sucitados desde el mes de Agosto, la obra se encuantra suspendida hasta realizar rediseño de infraestructura y superestructura. AGOSTO 2012.- Contratista : Pate C.A. Debido a problemas técnicos, la obra se encuantra suspendida hasta realizar rediseño de infraestructura y superestructura. JULIO 2012.- Contratista : Pate C.A. Debido a problemas técnicos, la obra se encuantra suspendida hasta realizar rediseño de estribos y superestructura. JUNIO 2012 Debido a problemas técnicos, la obra se encuantra suspendida hasta realizar rediseño de estribos y superestructura MAYO 2012: SE INICIA LOS trabajos ABRIL 2012: Se realiza la entrega del anticipo a PATECA el 13 de Abril Todavía el contratista PATECA no presenta planillas de ejecucion de Obra. por ese motivo no se adjunta el reporte ejecutivo del SITOP MARZO 2012 : Se Adjudica el proceso a la oferta de la Cia. PATE C.A. y se continúa el proceso para la contratación. FEBRERO 2012: Se cae el Proceso y se espera reiniciar nuevamente el 01 de Abril del 2012 ENERO 2012 : En espera de adjudicación en el portal de Compras Publicas DICIEMBRE 2011: Revisión de ofertas, convalidación y calificación y firma de resolución de adjudicación NOVIEMBRE2011: Publicación en el portal de Compras Piublicas OCTUBRE2011: Certificación Presupuestaria	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	09/01/2013 - 03:03 PM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Cuyabeno

HITOS

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1 DEFINICIÓN: Dictamen Senplades, obtenido	1-Solicitud de Información	16/09/2011		16/09/2011		Sí	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
2	PLANEACIÓN: Certificación Presupuestaria, obtenido	1-Solicitud de Información	31/10/2011		31/10/2011	●	Sí	1.0
3	PLANEACIÓN: Documentos precontractuales, realizado	1-Solicitud de Información	31/10/2011		31/10/2011	●	Sí	2.0
4	PLANEACIÓN: Publicación en el portal compras públicas, realizado	2-Publicación de Pliegos	01/04/2012		01/04/2012	●	Sí	1.0
5	PLANEACIÓN: Acta de adjudicación y publicación en el portal de Compras Publicas, realizado	3-Adjudicación	15/05/2012		15/05/2012	●	Sí	1.0
6	EJECUCIÓN: Contrato suscrito, firmado	4-Inicio de Trabajo	30/05/2012		30/05/2012	●	Sí	5.0
7	EJECUCIÓN: Infraestructura, realizado	5-Entregables Intermedios	30/08/2012	30/08/2012		▼	No	25.0
8	EJECUCIÓN: Superestructura, realizado	5-Entregables Intermedios	30/10/2012	30/10/2012		▼	No	25.0
9	EJECUCIÓN: Accesos Viales, realizado	5-Entregables Intermedios	15/12/2012	15/12/2012		▼	No	20.0
10	EJECUCIÓN: Impactos ambientales, realizado	5-Entregables Intermedios	29/12/2012	29/12/2012		▼	No	5.0
11	EJECUCIÓN: Señalización, realizado	5-Entregables Intermedios	29/12/2012	29/12/2012		▼	No	2.0
12	CIERRE: Acta entrega recepción provisional, realizado	9-Entregables Formales	30/12/2012	30/12/2012		▼	No	3.0
13	CIERRE; Liquidación económica del contrato, realizado	9-Entregables Formales	30/12/2012		30/12/2012	●	Sí	4.0
14	COMPLETADO: Acta entrega recepción definitiva, realizado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2013	30/06/2017		▼	No	3.0


SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	OBRA ABANDONADA	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	27/02/2014
2	Obra paralizada	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	01/04/2014
3	Hasta la fecha no se reinicia la obra.	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	30/04/2014
4	Se sugiere retomar los trabajos urgentes por la gran necesidad de los poblados que diariamente transitan por este puente.	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	30/06/2014
5	Obra abandonada, sin fecha de reinicio de trabajos.	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	31/07/2014
6	OBRA PARALIZADA	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	30/07/2013
7	Historico - JULIO-2012 obra paralizada. PROBLEMA: segun el constructor los estudios de suelos no concuerdan con la realidad del puente. Iniciar los trabajos en cuanto le entreguen los estudios	Morocho Velaña, Nancy Beatriz	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	20/07/2012
8	Historico - JUNIO-2012 Se evidencia solamente trabajos que realizaron anteriormente como es excavaciones en los dos lados donde se ubicaran las bases del puente y acercamiento de material pétreo,	Morocho Velaña, Nancy Beatriz	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	15/06/2012
9	Historico - MAYO-2012 Hay presencia de 1 maquina excavadora y limpieza del suelos en los dos lados donde se ubicaran las bases del puente, presencia de un pequeño número de trabajadores	Morocho Velaña, Nancy Beatriz	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	10/05/2012

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
10	Historico - ABRIL-2012 En recorrido realizado por la Señora Gobernadora y el Supervisor de la SNAP se constato que en los puentes Teteye, Dureno y Parahuayco, aun no se inician los trabajos de con	Morocho Velaña, Nancy Beatriz	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	25/04/2012

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance en la construcción del puente Parahuaico 1		100.00 %	3	3	01/01/2017	Oct-Dic


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	95,865.02
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,918,047.67 **
Costo Total:	319,550.02
Total Devengado:	133,987.62
% Costo Total Devengado:	41.93 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 41.93 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	319,551.02	2,046,461.99	0.00	2,366,013.01
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	1,269,157.70	0.00	0.00	1,269,157.70
Ppto. Codificado	319,550.02	1,664,939.74	0.00	1,984,489.76
Ppto. Comprometido	0.00	437,337.62	0.00	437,337.62
Planeado - Codificado (2017)		381,522.25		
Programado a Devengar	319,550.00	1,784,060.05	0.00	2,103,610.05
Ppto. Devengado	133,987.62	0.00	0.00	133,987.62
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 133,987.62	0.00	0.00	133,987.62
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	185,562.38	1,784,060.05	0.00	1,969,622.43
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 41.93 %	0.00 %	0.00 %	6.37 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017



Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Oct	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Nov	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Dic	1,784,060.05	0.00	1,784,060.05	0.00	0.00 %		0.00 %
Total	1,784,060.05	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
11	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
14	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
16	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.0041 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	informe_ejecutivo_noviembre_id_4529.pdf	04/12/2017
2	A.0042 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2017_PROYECTO_K0302.pdf	30/09/2017
3	A.0043 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2017_ID_4529.pdf	02/10/2017
4	A.0045 INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2017	ID_CONTRATO_4529.pdf	05/09/2017
5	A.0046 INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2017	INFORME_SITOP_JULIO_2017_ID_4529.pdf	02/08/2017
6	A.0047 INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2017	INFORME_SITOP_JUNIO_2017_ID_4529.pdf	04/07/2017
7	A.048 INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2017	INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2017_ID_4529.pdf	01/06/2017
8	A.049 INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2017	INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2017_PROYECTO_4529.pdf	06/05/2017
9	A.050 INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2017	INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2017_PROYECTO_4529.pdf	01/03/2017
10	A.1 INFORME EJECUTIVO PARA HUAICO A MAYO 2016	INFORME_EJECUTIVO_PARAHUAICO_A_MAYO_2016.pdf	13/05/2016
11	A1 INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2015	A1_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MARZO_2015_PARAHUAICO_2015.pdf	11/03/2015
12	A1.01 INFORME EJECUTIVO A SEPTIEMBRE 2016.	INFORME_EJECUTIVO_PARAHUAICO_A_SEPTIEMBRE_2016.pdf	20/09/2016
13	A1.01 INFORME EJECUTIVO SITOP DESDE AGOSTO A DICIEMBRE 2015	INFORME_EJECUTIVO_PARAHUAICO.pdf	15/12/2015
14	A1.02 INFORME EJECUTIVO A OCTUBRE 2016	1.02_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2016_FISCAL_6_PUENTES.pdf	09/10/2016
15	A1.1 ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO PUENTES TETEYÉ , PARA HUAICO Y DURENO	Acta_puentes_parte1.pdf	25/05/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
16	A2 INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2015	A2_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_ABRIL_2015.pdf	08/06/2015
17	A3 INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2015	A3_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MAYO_2015.pdf	08/06/2015
18	A4 INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2015	JUNIO.pdf	07/09/2015
19	A5 INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2015	JULIO.pdf	07/09/2015
20	A6 Informe Ejecutivo Agosto 2015	INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2015.pdf	01/09/2015
21	A7 Informe Ejecutivo Septiembre 2015	A7_Informe_Ejecutivo_Septiembre_2015.pdf	07/10/2015
22	A8 Informe Ejecutivo Febrero 2016	INFORME_SITOP_FEBRERO_2016.pdf	08/03/2016
23	CROQUIS DE UBICACIÓN (Abrir con Internet Explorer)	PUENTES_TETEYE_-_PARAHUAICO_Y_DURENO.jpg	10/07/2012
24	DEVENGADO MES DE JULIO	Julio_-_2012_DEVENGADO.xls	13/08/2012
25	DEVENGADO MES DE JUNIO	Ejecucion_Junio_2012.pdf	09/07/2012
26	DEVENGADO MES DE MAYO	DEVENGADOS_MES_DE_MAYO.pdf	08/06/2012
27	EJECUCION PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE	Ejecucion_Septiembre_del_2012(1).pdf	05/10/2012
28	EJECUCION PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2013	devengado_septiembre.pdf	07/10/2013
29	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2013	Reporte_de_Ejecucion_mes_de_Junio_2013[1].pdf	05/07/2013
30	ESTADO ACTUAL DEL PUENTE PARAHUAICO (SE CONSTRUIRÁ UN PUENTE NUEVO)	FOTO_BARANDAS_PUENTE_PARAHUAICO.pdf	24/04/2012
31	FOTOGRAFIA ACTUAL PARAHUAICO 1	FOTOGRAFIA_ACTUAL_PARAHUAICO.pdf	08/06/2012
32	INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2013 PARAHUAICO	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MES_DE_JUNIO_2013_teteye_parahuaico_y_dureno.pdf	09/07/2013
33	INFORME EJECUTIVO SITOP MES DE AGOSTO 2013	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_PUENTE_TETEYE_PARAHUAICO_Y_DURENO_MES_DE_AGO_2013.pdf	09/09/2013
34	INFORME EJECUTIVO SITOP MES DE JULIO 2013	informe_ejecutivo_sitop_teteye_parahuaico_y_dureno_julio.pdf	07/08/2013
35	INFORME EJECUTIVO SITOP MES DE SEPT 2013	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_SEPT_teteye_parahuaico_y_dureno.pdf	07/10/2013
36	JUSTIFICATIVO PARA SUSPENDER LOS TRABAJOS	JUSTIFICATIVOS_TRABAJOS_SUSPENDIDOS_TETEYE_PARAHUAICO_Y_DURENO.pdf	05/07/2013
37	OFICIO DE PATE C.A. ACEPTACIÓN DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO	aceptacion_de_terminacion_pateca_teteye.pdf	05/07/2013
38	OFICIO DONDE SE HACE CONOCER LOS PROBLEMAS TECNICOS	MTOP-CON_SUC-12-40-OF.pdf	14/08/2012
39	PLANILLA PARAHUAICO JUNIO	PLANILLA_PARAHUAICO_1.pdf	09/07/2012
40	PLANILLA PARAHUAICO MAYO	PLANILLA_PARAHUAICO_1.pdf	08/06/2012
41	Proyecto Priorizado SENPLADES	INFORME.doc	03/05/2012

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
30717_1.jpg	06/10/2015
