

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 6**  
**Dirección Provincial Azuay**

**PROYECTO: K033 MTOP - Construcción del Camino Vecinal Minas - Tablón - Pucará**

Líder del Proyecto:	Plaza Quintuña, Galo Patricio (gplaza@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Quezada Jara, Mónica Fabiola	Programas Relacionados:	CONSTRUCCION CAMINO VECINAL MINAS-TABLON-PUCARA
Titular:	Albán Tinoco, Leonardo Bolívar	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	1.03
CUP:	175200000.0000.372206	TIR:	12.05 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	45,100.19
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	20,628,728.59
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	25/04/2013 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	05/11/2018	Fecha de Fin Base:	25/06/2015
Modificado por:	Plaza Quintuña, Galo Patricio	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2018

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

El MTOP está realizando la Construcción del Camino Vecinal Minas - Tablón - Pucara, debido a la suscripción del Compromiso Presidencial No. 19814, en el cual se compromete a realizar 36 km de vía en hormigón asfáltico con un e=7.5 cm.

El Gobierno Provincial del Azuay no realizaba mejoras, por tanto, el Presidente de la República, entregó recursos necesarios para su rehabilitación.

La población objetivo serán los habitantes de la provincia del Azuay y sobre todo de los cantones Pucará y Santa Isabel, es decir los 21.977 habitantes (según el Censo de Población y Vivienda 2010) los mismos que están divididos en 10.604 hombres y 11.373 mujeres.

Antes de la ejecución del proyecto, la calzada de la vía estaba en malas condiciones, la capa de rodadura correspondía a un material de mejoramiento de la subrasante que cubría todo el ancho de la vía entre bordes interiores de cunetas; el ancho era variable entre 4 y 7 m.

**Objetivo General**

Mejorar la vialidad en la provincia del Azuay, dotando de un sistema de infraestructura vial estable, eficaz, confiable y permanente, que permita la integración entre las poblaciones y con la infraestructura vial del resto del país.

**Objetivos Específicos**

- Rehabilitación de la vía Minas - Tablón - Pucará
- Construcción de puentes
- Sistema de señalización
- Sistema de letrización a beneficiarios

**Beneficios Cualitativos**

La construcción del Camino Vecinal Minas - Tablón - Pucará busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Zona de influencia directa del proyecto al contar con una vía que garantice la seguridad y el confort de los usuarios que utilizan la misma, al mismo tiempo que reduce los tiempos de viaje y permite a los usuarios contar con una arteria vial en buenas condiciones.

**Tipo de Beneficiario**

Los beneficiarios directos del proyecto son los habitantes de la provincia del Azuay de los cantones Pucará y Santa Isabel, es decir los 21.977 habitantes (según el Censo de Población y Vivienda 2010) los mismos que están divididos en 10.604 hombres y 11.373 mujeres.

**Restricciones**

Tiempo: 6 años (Diciembre 2012 - Julio 2018)

Costo: USD 16.239.672,03


Alcance: Reconstrucción de la carretera Minas - Tablón - Pucará a nivel de pavimento flexible y construcción de tres puentes.

Recursos: MTOP - Personal técnico de la Dirección Distrital del Azuay, Fiscalización: Ing. Galo Plaza Quintuña, Empresa Contratista: FOPECA S.A.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


### AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

#### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 97.26 %  
 Fecha de Inicio: 25/04/2013 Fecha de Fin: 31/12/2018

#### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

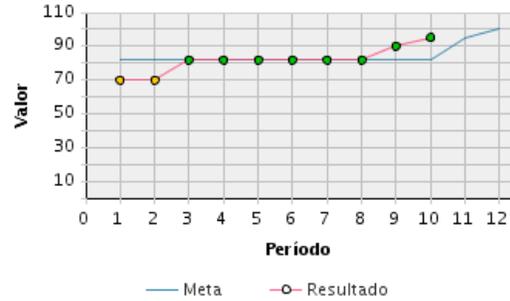

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	82 %	82 %	82 %	82 %	82 %	82 %	82 %	82 %	82 %	82 %	95 %	100 %
	Avance real acumulado											
	70 %	70 %	82 %	82 %	82 %	82 %	82 %	82 %	90 %	95 %		
Estado												
	▼	▼	●	●	●	●	●	●	●	●		

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<b>OCTUBRE 2018:</b> TRAMO VIAL: Terminado PUENTES: 5 puentes terminados SEÑALIZACIÓN: Terminado SITUACIÓN ACTUAL: Se ha realizado la recepción provisional, el acta se ha firmado con fecha 22 de octubre de 2018	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/11/2018 - 08:00 AM
<b>SEPTIEMBRE 2018:</b> TRAMO VIAL: En construcción tramo km 14 al 16, sector denominado zona de descenso, restantes 34 km terminados PUENTES: 5 puentes terminados SEÑALIZACIÓN: Terminado los 34 km SITUACIÓN ACTUAL: Se reinician los trabajos luego de la suscripción del Contrato complementario realizado con fecha 29 de junio de 2018 por un monto de 2'097.341,76 (no incluye IVA) y por 122 días de ampliación a partir de la suscripción del C.C 1.; se encuentran ejecutando los rubros de señalización, se ha terminado el tendido de la carpeta asfáltica y fundición de bordillos y cunetas. Se debe anotar que la constructora no ha recibido aún el anticipo correspondiente del contrato complementario, recalando que los trabajos tienen un avance del 96%.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	03/10/2018 - 12:34 PM
<b>AGOSTO 2018:</b> TRAMO VIAL: En construcción tramo km 14 al 16, sector denominado zona de descenso, restantes 34 km terminados PUENTES: 5 puentes terminados SEÑALIZACIÓN: Terminado los 34 km SITUACIÓN ACTUAL: Se reinician los trabajos luego de la suscripción del Contrato complementario realizado con fecha 29 de junio de 2018 por un monto de 2'097.341,76 (no incluye IVA) y por 122 días de ampliación a partir de la suscripción del C.C 1.; se terminó de colocación alcantarillas, movimiento de tierras, escolleras, tendido y compactado de mejoramiento; fundición de cabezales.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	03/09/2018 - 10:15 AM
<b>JULIO 2018:</b> TRAMO VIAL: En construcción tramo km 14 al 16, sector denominado zona de descenso, restantes 34 km terminados	Plaza Quintuña, Galo Patricio	03/08/2018 - 12:28 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>PUENTES: 5 puentes terminados                      SEÑALIZACIÓN: Terminado los 34 km                      SITUACIÓN ACTUAL: Se reinician los trabajos luego de la suscripción del Contrato complementario realizado con fecha 29 de junio de 2018 por un monto de 2'097.341,76 (no incluye IVA) y por 122 días de ampliación a partir de la suscripción del C.C 1.</p>		
<p>JUNIO 2018:                      TRAMO VIAL: En análisis tramo km 14 al 16, sector denominado zona de descenso, restantes 34 km terminados                      PUENTES: 5 puentes terminados                      SEÑALIZACIÓN: Terminado los 34 km                      SITUACIÓN ACTUAL: Se encuentran suspendidos los trabajos desde el 27 de marzo de 2018 debido a la estación invernal y en trámite suscripción contrato complementario por incremento de monto y ampliación de plazo para realizar labores en la zona de descenso. Mediante Memorando MTOP-SUBZ6-2018-715-ME de fecha 11 de junio de 2018 la subsecretaria solicita se apruebe ampliación de plazo e incremento de monto al subsecretario de infraestructura: En reunión mantenida el 18 de junio en la sala de sesiones del Viceministerio de Infraestructura, se aprueba la misma y se dispone la suscripción del respectivo Contrato Complementario por un monto de 2'097.341,76 (no incluye IVA) y por 122 días de ampliación a partir de la suscripción del C.C 1.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	04/07/2018 - 08:15 AM
<p>MAYO 2018:                      TRAMO VIAL: En análisis tramo km 14 al 16, sector denominado zona de descenso, restantes 34 km terminados                      PUENTES: 5 puentes terminados                      SEÑALIZACIÓN: Terminado los 34 km                      SITUACIÓN ACTUAL: Se encuentran suspendidos los trabajos desde el 27 de marzo de 2018 debido a la estación invernal y en trámite suscripción contrato complementario por incremento de monto y ampliación de plazo para realizar labores en la zona de descenso.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	04/06/2018 - 12:44 PM
<p>ABRIL 2018:                      TRAMO VIAL: En análisis tramo km 14 al 16, sector denominado zona de descenso, restantes 34 km terminados                      PUENTES: 5 puentes terminados                      SEÑALIZACIÓN: Terminado los 34 km                      SITUACIÓN ACTUAL: Se encuentran suspendidos los trabajos desde el 27 de marzo de 2018 debido a la estación invernal y en trámite suscripción contrato complementario por incremento de monto y ampliación de plazo para realizar labores en la zona de descenso.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	04/05/2018 - 09:44 AM
<p>MARZO 2018:                      TRAMO VIAL: En análisis tramo km 14 al 16, sector denominado zona de descenso, restantes 34 km terminados                      PUENTES: 5 puentes terminados                      SEÑALIZACIÓN: Terminado los 34 km                      SITUACIÓN ACTUAL: Se encuentran suspendidos los trabajos desde el 27 de marzo de 2018 debido a la estación invernal y en trámite suscripción contrato complementario por incremento de monto y ampliación de plazo para realizar labores en la zona de descenso.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	03/04/2018 - 04:38 PM
<p>FEBRERO 2018:                      Se realizan trabajos correspondientes a la Orden de Cambio N° 1:                      TRAMO VIAL: Mejoramiento km 34+500; Cunetas: 33+200                      PUENTES: Pte. San Francisco: TERMINADO; Pte. Hualguro I: TERMINADO; Pte. Pinillo 2: TERMINADO; Pte. Hualguro 2: TERMINADO; Puente Pinillo 1 trabajos superestructura.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	22/03/2018 - 03:49 PM
<p>ENERO 2018:                      Se realizan trabajos correspondientes a la Orden de Cambio N° 1:                      TRAMO VIAL: Mejoramiento km 33+000; Cunetas: 29+500                      PUENTES: Pte. San Francisco: TERMINADO; Pte. Hualguro I: TERMINADO; Pte. Pinillo 2: TERMINADO; Pte. Hualguro 2: TERMINADO; Puente Pinillo 1 terminado infraestructura, inicio superestructura.</p>	Plaza Quintuña, Galo Patricio	21/03/2018 - 12:49 PM
<p>DICIEMBRE 2017:                      Se realizan trabajos de colocación de carpeta asfáltica, construcción de cunetas y estribos del puente Pinillo 2, el proyecto presenta un avance del 80%. Se trabaja en la evaluación de cantidades de la Zona de Descenso.</p>	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	19/01/2018 - 04:29 PM
<p>NOVIEMBRE 2017:                      Los trabajos se encuentra realizando con normalidad, no se han presentado mayores problemas, terminados los puentes San Francisco, Hualguro 1, Hualguro 2, Pinillos 2                      MEJORAMIENTO: Se transporta y perfila hacia el tramo del 29+000 al 29+500                      SUBBASE: 27+400 a 29+000                      DRENAJE: Terminado                      CUNETAS VIALES: 24+000 al 25+700</p>	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	04/12/2017 - 10:30 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
27+000 al 27+500: Se encuentra asfaltado todo el ancho de la vía		
<p>OCTUBRE 2017:</p> <p>La obra se encuentra realizando con normalidad, no se han presentado mayores problemas, terminado puente San Francisco</p> <p>Se realizan excavaciones puente Pinillos 1</p> <p>MEJORAMIENTO: Se transporta y perfila hacia el tramo del 27+300 al 27+600, tramo que se quedó pendiente debido a la variante horizontal y vertical.</p> <p>DRENAJE:</p> <p>CANALES DE AGUA: 24+700 AL 25+840: Se concluyó esta actividad, quedando ya operativos los canales, con sus respectivas cajas de revisión.</p> <p>CUNETAS VIALES: 21+000 al 22+000; 22+300 al 23+300</p> <p>SUBDRENES: 32+200 al 33+400: Se encuentra ejecutado la Excavación, Geotextil, Material Filtrante, Tubería de drenaje 110mm</p> <p>PUENTE HUALGURO 2: Una vez que se obtuvo la autorización de parte del fiscalizador el día viernes del acero de refuerzo de la Viga 1, se procedió a la fundición por lo actualmente se tiene ya hormigonado las 5 vigas que corresponden al puente en mención. Se inició los trabajos de encofrado de las losa.</p> <p>ASFALTO: 23+800 al 24+700: Se encuentra asfaltado todo el ancho</p> <p>27+000 al 27+500: Se encuentra asfaltado todo el ancho de la vía, por lo que se continuara con el asfalto</p>	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	01/11/2017 - 04:32 PM
<p>SEPTIEMBRE 2017:</p> <p>La obra se encuentra realizando con normalidad, no se han presentado mayores problemas, terminado puente San Francisco</p> <p>Se trabaja en vigas curvas del puente Hualguero 2.</p> <p>Se realizan excavaciones puente Pinillos 1</p> <p>Colocación de geomalla y geotextil km 30+100</p> <p>Escollera km 29+970</p> <p>Fundición de cuentas y bordillos km 21+000</p> <p>Subdrenes km 31+050</p> <p>Colocación de carpeta asfáltica km 21+000 a 23+200</p>	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/10/2017 - 03:16 PM
<p>AGOSTO 2017:</p> <p>SE REALIZAN TRABAJOS DE: TENDIDO PERFILADO Y COMPACTADO DE MEJORAMIENTO Km: 19+800 al 21+300, Asfalto RC para Imprimación Km: 18+800, Capa de rodadura de hormigón Asfáltico mezclado en planta de 7.5 cm de espesor km 18+200, CONSTRUCCION DE GAVIONES KM 20+000, LOSA DE APROXIMACION ENTRADA Y SALIDA DE PUENTE HUALGURO 1, Hormigón estructural cemento portland, clase A, fc = 280 Kg/cm2, pantalla estribo lado derecho PUENTE HUALGURO 2, LOSA DE APROXIMACION ENTRADA Y SALIDA DE PUENTE PINILLO 2, ACABADO DE LA OBRA BASICA KM: 25+800, APROCHE DE MURO ARMADO KM 19+000 CON MATERIAL FILTRANTE</p>	Brito Puni, Andrea Valerie	05/09/2017 - 06:40 PM
<p>JULIO 2017: SE REALIZAN TRABAJOS DE: TENDIDO PERFILADO Y COMPACTADO DE MEJORAMIENTO Km: 19+800 al 20+300, Asfalto RC para Imprimación Km: 18+800, Capa de rodadura de hormigón Asfáltico mezclado en planta de 7.5 cm de espesor km 18+200, CONSTRUCCION DE GAVIONES KM 20+000, LOSA DE APROXIMACION ENTRADA Y SALIDA DE PUENTE HUALGURO 1, Hormigón estructural cemento portland, clase A, fc = 280 Kg/cm2, pantalla estribo lado derecho PUENTE HUALGURO 2, LOSA DE APROXIMACION ENTRADA Y SALIDA DE PUENTE PINILLO 2, ACABADO DE LA OBRA BASICA KM: 25+800, APROCHE DE MURO ARMADO KM 19+000 CON MATERIAL FILTRANTE</p>	Brito Puni, Andrea Valerie	04/08/2017 - 04:33 PM
<p>JUNIO 2017:</p> <p>Fundición zapatas puentes Hualguero 2; Colocación de carpeta asfáltica km 13+600; Fundición muro de contención km 12+260; desbroce y limpieza taludes km 22+750; cajera completación mejoramiento km 18+100; fundición de cunetas y bordillos km 11+200</p>	Brito Puni, Andrea Valerie	05/07/2017 - 05:11 PM
<p>MAYO 2017: FOPECA S.A, se encuentra realizando la construcción de subdrenes en la 17+200, colocación de hormigón en cunetas en la 9+150, alcantarilla tipo cajón en el 17+005, colocación de carpeta asfáltica desde 10+500-12+000, estabilización de talud en el 19+800, limpieza de derrumbes en el 20+100, colocación de pasamanos en el puente Hualguero 1 y Pinillo 2.</p>	Brito Puni, Andrea Valerie	05/06/2017 - 05:31 PM
<p>NOVIEMBRE 2016: Por parte de la Dirección Provincial del Azuay, se emite la Resolución de dar por Terminado Unilateralmente el contrato de obra. Se notifica al Consorcio Caminos - Corey, lo pertinente.</p>	Merchán González, Luis Eduardo	23/11/2016 - 04:18 PM
<p>OCTUBRE 2016: Por parte de la Dirección Provincial del Azuay, se emite la Resolución de dar por Terminado Unilateralmente el contrato de obra, y se notifica al Consorcio Caminos - Corey, lo pertinente.</p>	Merchán González, Luis Eduardo	01/11/2016 - 11:27 AM
<p>SEPTIEMBRE 2016: Por parte de la Dirección Provincial del Azuay, se resuelve y notifica al Consorcio Caminos - Corey, la desición del MTOP, de dar por Terminado Unilateralmente el contrato de obra.</p>	Merchán González, Luis Eduardo	01/11/2016 - 11:05 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2016: Por parte de la Dirección Provincial del Azuay, se resuelve y notifica al Consorcio Caminos - Corey, la desición del MTOP, de dar por Terminado Unilateralmente el contrato de obra.	Merchán González, Luis Eduardo	01/11/2016 - 11:01 AM
AGOSTO 2016: Por parte de la Dirección Provincial del Azuay, se resuelve y notifica al Consorcio Caminos - Corey, la desición del MTOP, de dar por Terminado Unilateralmente el contrato de obra.	Merchán González, Luis Eduardo	24/08/2016 - 12:03 PM
JULIO 2016: Por parte de la Dirección Provincial del Azuay, se resuelve y notifica al Consorcio Caminos - Corey, la desición del MTOP, de dar por Terminado por Mutuo Acuerdo el contrato de obra, particular que fue aceptado por el contratista.	Merchán González, Luis Eduardo	03/08/2016 - 09:54 AM
JUNIO 2016: Por parte de la Dirección Provincial del Azuay, se resuelve y notifica al Consorcio Caminos - Corey, contratista de la obra, la Terminación por Mutuo Acuerdo del contrato, cuyo plazo concluyó el 4 de diciembre de 2015	Merchán González, Luis Eduardo	01/07/2016 - 08:53 AM
Mayo 2016: Por parte de la Dirección Provincial del Azuay, se ha solicitado el pronunciamiento jurídico, previo al trámite de Terminación por Mutuo Acuerdo del contrato, cuyo plazo concluyó el 4 de diciembre de 2015	Merchán González, Luis Eduardo	03/06/2016 - 02:09 PM
ABRIL 2016: El plazo del contrato se encuentra suspendido desde el 3 de diciembre 2015, considerando que el mismo concluía el 4 de diciembre 2015, es necesario se realicen los trámites administrativos y legales pertinentes.	Merchán González, Luis Eduardo	03/05/2016 - 02:14 PM
MARZO 2016: Continúan suspendidos los trabajos y de igual manera suspendido el plazo del contrato desde el 3 de diciembre 2015 (Fecha de terminación 4 de diciembre 2015). Se pide se legalicen los trámites administrativos correspondientes. Auditoría Interna, comunica resultados provisionales del examen especial de ingeniería que se está efectuando al proyecto, existiendo varias observaciones realizadas durante la etapa contractual del contrato que deberían ser absueltas por la Fiscalización	Merchán González, Luis Eduardo	04/04/2016 - 11:00 AM
FEBRERO 2016: El plazo del contrato concluyó el 4 de diciembre 2015. Por parte del Director Provincial del Azuay, con fecha 29 de enero 2016, se dispuso la suspensión del plazo del contrato de obra, a partir del 3 de diciembre 2015.	Merchán González, Luis Eduardo	02/03/2016 - 09:42 AM
ENERO 2016: El plazo del contrato concluyó el 4 de diciembre 2015. En reunión de trabajo se indica, que por parte del Director Provincial del Azuay, se ha procedido a suspender el plazo del contrato de obra	Merchán González, Luis Eduardo	15/02/2016 - 10:52 AM
DICIEMBRE 2015: Concluyó el plazo establecido en la Orden de Cambio No. 2, que ampliaba el plazo hasta el 3 de Diciembre de 2015, para conseguir la Partida Presupuestaria que permita suscribir un contrato complementario para concluir la obra. Aún no se legaliza el plazo del período comprendido entre el 11 de marzo 2015 y el 20 de agosto 2015. Se espera la decisión de las autoridades, en vista de que el plazo se encuentra terminado. No existe presencia en la obra ni del Constructor ni de la Fiscalización.	Bustos Cabrera, Cristian Danilo	08/01/2016 - 02:34 PM
NOVIEMBRE 2015: Continúan suspendidos los trabajos de construcción. Se procede con la legalización de una Orden de Cambio, que amplía el plazo hasta el 4 de Diciembre de 2015, para conseguir la Partida Presupuestaria que permita suscribir un contrato complementario para concluir la obra.	Merchán González, Luis Eduardo	02/12/2015 - 02:32 PM
OCTUBRE 2015: No es posible reprogramar la fecha estimada de hitos en amarillo, ni actualizar los resultados, debido a que el sistema se encuentra en etapa de CIERRE. Se espera el resultado de los trámites, a fin de confirmar el futuro del presente contrato, al que originalmente se dispuso ya su Terminación.	Peña Bernal, Joaquin Antonio	13/11/2015 - 12:12 PM
SEPTIEMBRE 2015: Se procede con los trámites administrativos y legales que posibiliten, conseguir la partida presupuestaria y la suscripción de un contrato complementario con el constructor, que permita reiniciar los trabajos de construcción	Merchán González, Luis Eduardo	07/10/2015 - 11:08 AM
AGOSTO 2015: La Ingeniera Directora Provincial del Azuay Subrogante, mediante oficio Nro. MTOP-DPAZ-2015-000228-OF, del 20 de agosto 2015, comunica a la Procuradora Común del Consorcio Caminos Corey, que deja insubsistente el trámite de terminación unilateral del proyecto "Construcción del Camino Vecinal Minas - Tablón - Pucará de 36 km. en la provincia del Azuay", con la finalidad de cumplir el objeto del contrato.	Merchán González, Luis Eduardo	07/10/2015 - 11:07 AM
JULIO 2015: La Dirección Provincial del Azuay se encuentra analizando técnica y legalmente los incumplimientos determinados por la Constructora Caminos - Corey. Se ha solicitado alcances a la información entregada por fiscalización, supervisión y administración del contrato, previo a la emisión de una resolución, de la información previa analizada en reunión de trabajo con asesoría jurídica de matriz se informa que no sería procedente la terminación unilateral del contrato	Plaza Quintuña, Galo Patricio	27/08/2015 - 11:37 AM
JUNIO 2015: Está en trámite una acción técnico administrativo para la terminación del proyecto de obra.	Bonilla Ochoa, René Marcelo	03/07/2015 - 08:43 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2015: Está en trámite una acción técnico administrativo para la terminación del proyecto de obra.	Plaza Quintuña, Galo Patricio	05/06/2015 - 10:30 AM
ABRIL 2015: Está en trámite una acción técnico administrativo para la terminación del proyecto de obra.	Bonilla Ochoa, René Marcelo	06/05/2015 - 10:33 AM
MARZO 2015: Los trabajos se encuentran abandonados por parte del constructor Consorcio Caminos Corey, por lo que se tramita la terminación unilateral.	Bonilla Ochoa, René Marcelo	02/04/2015 - 09:26 AM
FEBRERO 2015: Se procede a suscribir una Orden de Cambio por 45 días de Plazo, por la no suscripción del contrato complementario N° 1 a falta de la certificación presupuestaria, el mismo que termina el 11 de marzo de 2015.	Bonilla Ochoa, René Marcelo	02/03/2015 - 01:46 PM
ENERO 2015: Se procede a suscribir una Orden de Cambio por 45 días de Plazo, por la no suscripción del contrato complementario N° 1 a falta de la certificación presupuestaria.	Bonilla Ochoa, René Marcelo	06/02/2015 - 03:52 PM
DICIEMBRE 2014: Se trabaja en la conformación de subrasante para cajoneras en varios tramos de la vía. Se aprueba contrato complementario #1 y orden de cambio #1 con una ampliacion de plazo de 5 meses.	Sánchez Zamora, Iván Patricio	06/01/2015 - 01:44 PM
NOVIEMBRE 2014: Se tiene legalizado el Acta de la Comisión Especial 451 con la que se autoriza realizar un contrato complementario por un valor de (Orden de cambio + Contrato Complementario) USD 1427301.96 y con una ampliación de plazo de 5 meses a partir del 25 enero de 2015. OCTUBRE 2014: Se continúa con los trabajos correspondientes al afirmado de la vía, esto es, en los rubros de sub-base, base y carpeta asfáltica. Se inició además la construcción de cunetas revestidas.	Sánchez Zamora, Iván Patricio	12/12/2014 - 08:26 AM

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. * General.</b> La temporada invernal CAUSARÍA interrupciones en el tráfico normal	05/11/2018	Galo Patricio Plaza Quintuña	80 %	90	72	0/1

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Azuay > Pucara

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: pliegos aprobados	2-Publicación de Pliegos	25/04/2013		25/04/2013		Sí	2.0
2	PLANEACIÓN: Adjudicación realizada	3-Adjudicación	11/05/2013		11/05/2013		Sí	2.0
3	EJECUCIÓN: Drenaje ejecutados.	5-Entregables Intermedios	25/07/2013		30/11/2017		Sí	3.0
4	EJECUCIÓN: Movimiento de tierras ejecutados.	4-Inicio de Trabajo	25/08/2014		25/08/2014		Sí	8.0
5	EJECUCIÓN: Calzada tramo 0+000 al 9+000, realizado	5-Entregables Intermedios	30/10/2014		30/10/2014		Sí	12.0
6	EJECUCIÓN: Puente Pinillo 1, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	02/01/2015		31/03/2018		Sí	4.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
7	EJECUCIÓN: Puente San Francisco ejecutado.	5-Entregables Intermedios	02/01/2015		30/07/2017		Sí	4.0
8	EJECUCIÓN: Calzada tramo 9+000 al 14+000, realizado.	5-Entregables Intermedios	22/02/2015		30/10/2017		Sí	12.0
9	EJECUCIÓN: Calzada tramo 16+000 al 27+000, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/03/2015		10/11/2017		Sí	12.0
10	EJECUCIÓN: Puente Hualguro 1, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/03/2015		30/06/2017		Sí	4.0
11	EJECUCIÓN: Puente Hualguro 2, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/03/2015		24/11/2017		Sí	4.0
12	EJECUCIÓN: Puente Pinillo 2, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/03/2015		30/06/2017		Sí	4.0
13	EJECUCIÓN: Calzada tramo 27+000 al 36+000, realizado.	5-Entregables Intermedios	15/05/2015		31/03/2018		Sí	8.0
14	PLANEACIÓN: Adjudicación realizada C2	3-Adjudicación	15/02/2017		20/02/2017		Sí	1.0
15	EJECUCIÓN: Movimiento de Tierras	5-Entregables Intermedios	03/03/2017		30/11/2017		Sí	2.0
16	CIERRE: Acta de entrega de recepción provisional, aprobado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		22/10/2018		Sí	5.0
17	EJECUCIÓN: Puntos críticos realizados.	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/09/2018		Sí	5.0
18	EJECUCIÓN: Rubros ambientales, ejecutados.	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/09/2018		Sí	2.0
19	EJECUCIÓN: Señalización, realizada	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/09/2018		Sí	1.0
20	CIERRE: Liquidación económica realizada	9-Entregables Formales	31/12/2018	31/12/2018			No	2.0
21	COMPLETADO: Acta de entrega de recepción definitivo, aprobado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2018	31/12/2018			No	3.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Avance programado		100.00 %	100	100	01/01/2014	Octubre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	3,598,310.60
Estimado Al Fin Del Proyecto:	20,628,728.59 **
Costo Total:	14,934,974.16
Total Devengado:	20,333,690.44
% Costo Total Devengado:	136.15 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 136.15 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	19,411,471.33	2,628,047.12	0.00	22,039,518.45
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	15,007,304.15	962,345.09	0.00	15,969,649.24
Ppto. Codificado	20,937,979.47	2,403,456.70	0.00	23,341,436.17
Ppto. Comprometido	20,583,304.42	2,368,401.36	0.00	22,951,705.78
Planeado - Codificado (2018)		224,590.42		
Programado a Devengar	18,368,514.31	2,628,047.12	0.00	20,996,561.43
Ppto. Devengado	18,000,681.47	2,333,008.97	0.00	20,333,690.44
Pagado Real	15,026,533.98	267,267.56	0.00	15,293,801.54
Estimado a fin de año	* 18,000,681.47	0.00	0.00	18,000,681.47
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	367,832.84	2,628,047.12	0.00	2,995,879.96
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 98.00 %	88.77 %	0.00 %	96.84 %
Ppto. Codificado 998	1,808,629.60	0.00	0.00	1,808,629.60
Ppto. Devengado 998	1,570,402.03	0.00	0.00	1,570,402.03

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018



Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.00 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	19,378.59	19,378.59	19,378.59	19,378.59	100.00 %		0.74 %
Abr	0.00	0.00	19,378.59	19,378.59	100.00 %		0.74 %
May	0.00	0.00	19,378.59	19,378.59	100.00 %		0.74 %
Jun	0.00	0.00	19,378.59	19,378.59	100.00 %		0.74 %
Jul	0.00	0.00	19,378.59	19,378.59	100.00 %		0.74 %
Ago	410,553.37	0.00	429,931.96	19,378.59	4.51 %		0.74 %
Sep	218,759.16	0.00	648,691.12	19,378.59	2.99 %		0.74 %
Oct	435,952.15	2,313,630.38	1,084,643.27	2,333,008.97	215.09 %		88.77 %
Nov	1,318,993.43	0.00	2,403,636.70	2,333,008.97	97.06 %		88.77 %
Dic	224,410.42		2,628,047.12				
<b>Total</b>	<b>2,628,047.12</b>	<b>2,333,008.97</b>					

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
13	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
14	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
15	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
16	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A 23 Informe ejecutivo junio 2015	SITOP_Junio_2015.pdf	03/07/2015
2	A 23 Informe ejecutivo mayo 2015	SITOP_mayo_2015.pdf	05/06/2015
3	A.1 Informe ejecutivo Octubre 2014	A.1_Informe_ejecutivo_Octubre_2014.pdf	07/11/2014
4	A.19 Informe Ejecutivo marzo 2015	SITOP_marzo_2015.pdf	02/04/2015
5	A.2 Informe ejecutivo Dic 2014	A.2_Informe_ejecutivo_Minis_Tablón_Pucará.pdf	06/01/2015
6	A.20 Informe Ejecutivo abril 2015	SITOP_abril_2015.pdf	06/05/2015
7	A.6 Informe ejecutivo SITOP febrero 2015	6_FEBRERO_2015__SITOP.pdf	02/03/2015
8	A17 Informe ejecutivo SITOP, enero 2015.pdf	5_ENERO_2015__SITOP.pdf	06/02/2015
9	ACTA COMISION ESPECIAL 451	ACTA_COMISION_ESPECIAL_451_MINAS-TABLON-PUCARA.pdf	12/12/2014
10	Acta comisión especial decreto 451_2 marzo 2018	Acta_de_Comisión_Especial_-_Minas-Tablón-Pucará.pdf	14/05/2018
11	Acta de Recepción Provisional, 22 oct.2018	ACTA_RECEPCION_MTP_22_oct.2018.pdf	05/11/2018
12	ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIORIDAD SENPLADES.	ACT_DICT_SENPLADES-SZ6A-2014-0422-OF_MINAS_-_TABLÓN.pdf	07/11/2014
13	Ayuda Memoria Minas - Tablón - Pucará Diciembre 2017	Ayuda_Memoria_Minis_-_Tablón_-_Pucará.xlsx	19/01/2018
14	Comunicación a contratista que no procede solicitud de recepción de trabajos	MTOPI-DDAZ-2018-677-ME_adm.a_cont.no_procede_recep._2_abril_2018.pdf	05/04/2018
15	Contrato complementario N°1	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_NRO_1_MINAS_TABLON_23072018.pdf	23/07/2018

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
16	Disposición Insubistente Terminación Unilateral contrato	MTOP-DPAZ-2015-000228DisposicAnulaTerminacionUnilateral.pdf	09/09/2015
17	Informe de fiscalización al 3 de septiembre de 2018	Informe-Fiscalizacion_(legalizado)-al_03_Septiembre-2018-Minas-Tablon-Pucara.pdf	03/09/2018
18	Informe de fiscalización, mes de abril 2018	informe_de_fisc._m-t-p_2_mayo_2018.pdf	04/05/2018
19	Informe de fiscalización, mes de julio 2018	INF_FISC_M-T-P_Julio_2018.pdf	03/08/2018
20	Informe de fiscalización, mes de junio 2018	INFORME_FISCALIZACION_MTOP_junio_2018.pdf	04/07/2018
21	Informe de fiscalización, mes de marzo 2018	INF_FISCA_MTP_02_abril_2018.pdf	03/04/2018
22	Informe de fiscalización, mes de septiembre 2018	INFORME_FISC_M-P-T_1_oct.2018.pdf	03/10/2018
23	Informe Ejecutivo Julio 2015	Julio_2015.pdf	27/08/2015
24	Informe Ejecutivo Julio 2017	INFORME_EJECUTIVO_-MINAS_TABLÓN_PUCARA_JULIO_2017.pdf	05/08/2017
25	Informe Ejecutivo Junio 2017	INFORME_EJECUTIVO_-MINAS_TABLÓN_PUCARA_JUNIO_2017.pdf	05/07/2017
26	Informe Ejecutivo Mayo 2017	INFORME_EJECUTIVO_-MINAS_TABLÓN_PUCARA_MAYO_2017.pdf	05/06/2017
27	Informe Ejecutivo SITOP al 3 de septiembre de 2018	Informe_Ejecutivo_SITOP_Agosto_2018_M-T-P_legalizado.pdf	03/09/2018
28	Informe ejecutivo SITOP, abril 2018	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_M-T-P_Abril_2018.pdf	04/05/2018
29	Informe ejecutivo SITOP, enero 2018	Informe_Ejecutivo_SITOP_enero_2018.pdf	21/03/2018
30	Informe ejecutivo SITOP, febrero 2018	Informe_Ejecutivo_SITOP_febrero_2018.pdf	22/03/2018
31	Informe ejecutivo SITOP, julio 2018	INFORME_SITOP_M-T-P_Julio_2018.pdf	03/08/2018
32	Informe ejecutivo SITOP, junio 2018	INFORME_EJECUTIVO_M-T-P_SITOP_junio_2018.pdf	04/07/2018
33	Informe ejecutivo SITOP, marzo 2018	Informe_Ejecutivo_SITOP_marzo_2018.pdf	03/04/2018
34	Informe ejecutivo SITOP, marzo 2018	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MTP_marzo_2018.pdf	04/04/2018
35	Informe ejecutivo SITOP, mayo 2018	Informe_Ejecutivo_SITOP_mayo_2018.pdf	04/06/2018
36	Informe ejecutivo SITOP, nov. 2017	INFORME_EJECUTIVO_M-T-P_nov.2017.pdf	04/12/2017
37	Informe ejecutivo SITOP, oct. 2017	Informe_Ejecutivo_SITOP_octubre_2017.pdf	01/11/2017
38	Informe ejecutivo SITOP, octubre 2018	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MTP_Octubre_2018.pdf	05/11/2018
39	Informe ejecutivo SITOP, sept. 2017	Informe_Ejecutivo_SITOP_septiembre_2017.pdf	05/10/2017
40	Informe ejecutivo SITOP, septiembre 2018	INFORME_Ejecutivo_SITOP_septiembre_2018.pdf	04/10/2018
41	Informe SITOP Agosto 2015	InformeAgosto-15SITOP.pdf	09/09/2015
42	Informe SITOP Enero 2016	InformeSITOPenero-16.pdf	15/02/2016
43	Informe SITOP Noviembre 2015	InfSITOPNov-15.pdf	02/12/2015
44	Informe SITOP Septiembre 2015	InfSITOPSept-15.pdf	08/10/2015
45	Levantamiento de la suspensión de los trabajos	Oficio_MTOP-DDAZ-2018-000330-OF_adm.a_cont.levant.susp.plazo_2_julio_2018.pdf	25/07/2018
46	Notificación suspensión de trabajos	Oficio_MTOP-DDAZ-2018-000142-OF_adm.a_cont.SUSPENSION_DE_TRABAJOS_M-T-P_27_marzo_2018.pdf	05/04/2018
47	Orden de Cambio N° 1	ORDEN_DE_CAMBIO_MINAS-TABLON-PUCARA__10-02-15.pdf	02/03/2015
48	Orden de cambio N° 1, incremento de monto y ampliación de plazo hasta 28 marzo 2018	ORDEN_DE_CAMBIO_No_1.pdf	21/03/2018
49	Resolución Terminación Unilateral Contrato Obra	67-resolucion_02_terminacion_unilateral.pdf	23/11/2016

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Plaza Quintuña, Galo Patricio	Lider del proyecto	Analista de Infraestructura de Azuay	gplaza@mtop.gob.ec	023974600

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Quezada Jara, Mónica Fabiola	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretaria Zonal 6	mquezada@mtop.gob.ec	023974600
Vásquez Guzmán, Edwin Enrique	Administrador	Coordinador Técnico de Infraestructura Provincial	eevasquez@mtop.gob.ec	023974600

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
89101_1.jpg	05/11/2018
