

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 2
Dirección Provincial Orellana

PROYECTO: K034 MTOP - Nuevo Edificio Terminal, nueva Torre de Control, nuevo Hangar SCI, nueva Plataforma de aeronaves y Sistema de alcantarillado pluvial del aeropuerto Francisco de Orellana de El Coca - provincia de Orellana.

Líder del Proyecto:	Valencia Delgado, Carlos Julio (cvalencia@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Lara Mendoza, Richard Patricio	Programas Relacionados:	NUEVO EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL NUEVO HANGAR S.C.I. NUEVA PLATAFORMA DE AERONAVES Y SISTEMA DE , Provincia - Orellana, Proyectos Prioritarios PAI, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Pita Suarez, Esteban Alejandro	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.1006.5635	TIR:	27.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	9,824,168.65
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	16,287,036.46
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2011 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	05/11/2018	Fecha de Fin Base:	06/11/2015
Modificado por:	Valencia Delgado, Carlos Julio	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2018

DATOS GENERALES

Descripción

Construcción de: Nuevo Edificio Terminal, nueva Torre de Control, nuevo Hangar SCI, nueva Plataforma de aeronaves y Sistema de alcantarillado pluvial del aeropuerto del Coca.
 Línea Base: El Edificio terminal tiene una superficie aproximada de 1.000,00 m2, con una sala general tan reducida que el nivel de servicio que ofrece el aeropuerto al usuario está por debajo del nivel que rige en el ámbito internacional determinada por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Adicionalmente la Torre de Control y el servicio contra incendios son insuficientes para cumplir de manera eficiente con los servicios inherentes a cada edificación, comprometiendo la seguridad operacional.
 Objetivo: Mejorar las instalaciones, así como optimizar los servicios que brinda, tanto para las aeronaves y pasajeros, como alternativa para los flujos comerciales y turísticos en la provincia de Orellana.
 Objetivos Específicos: Construcción del Nuevo Edificio Terminal, Construcción de la Nueva Torre de Control, Construcción del Nuevo Hangar del Servicio Contra Incendios, Construcción de la Nueva Plataforma de Aeronaves, Construcción del Sistema de Alcantarillado Pluvial .
 Producto: Infraestructura aeroportuaria mejorada.
 Contratista: CONSORCIO COMSA - RM
 Monto del Contrato: 14'892.051,47 incluido iva
 Plazo del contrato: 12 meses
 Fiscalizador : Ingeniero Marco Molina Sierra.
 La contratista realizara planillaje a los tres meses tal como consta en el contrato.
 Este proyecto se esta realizando el proyecto para la actualización de Prioridad. en el nuevo formato de Senplades.

Beneficios Cualitativos

Incrementar el servicio a los usuarios del sector petrolero, turístico y dela zona que permitirá disminuir los tiempos de traslado.

Tipo de Beneficiario

Sector petrolero, turístico

Restricciones

(Tiempo/Costo/Recursos/Alcance) La mala calidad del material utilizado, ocasionaría pérdidas económicas y retraso en la ejecución de la obra


Restricciones

Mejorar las instalaciones del Aeropuerto de El Coca, así como optimizar los servicios que brinda, tanto a aeronaves y pasajeros como alternativa para los flujos comerciales y turísticos en la provincia de Orellana, Incrementar en 6,5% el transporte aéreo de pasajeros, Aumentar al menos al 7% la percepción de calidad de los servicios públicos. y así de esta manera mantener y expandir el sistema nacional de transporte y movilidad multimodal, que favorezca el comercio interno y externo, y la integración nacional y regional.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 98.05 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2011 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

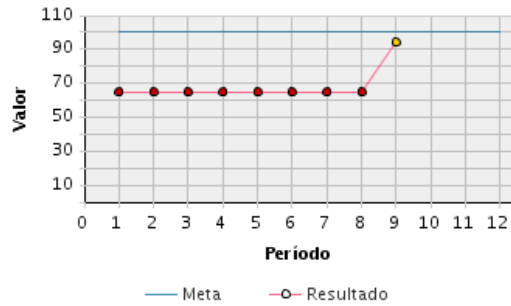

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	94 %			
	Estado											
	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🟡			

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Octubre 2018: Con fecha 24 de septiembre del 2018 se terminó los trabajos del proyecto, se estan realizando los informes para el acta de recepción provisional.	Valencia Delgado, Carlos Julio	05/11/2018 - 01:58 PM
Septiembre 2018: Con fecha 24 de septiembre del 2018 se terminó el plazo de la ejecución de los trabajos del proyecto de la referencia, durante el período comprendido desde el 24 de septiembre al 30 de septiembre de 2018, el Contratista ha realizado trabajos de mantenimiento y pruebas de operación de los diferentes sistemas, para la posterior capacitación de los mismos.	Pita Suarez, Esteban Alejandro	04/10/2018 - 01:20 PM
Agosto 2018: Se realizan los trabajos de Colocación de alucubond en Counters Bloque B Fundición de contrapisos en áreas exteriores, Colocación de porcelanato en Bloque C. Colocación de bordillos en áreas exteriores, Habilitación de cuarto para bombas y ensamblaje de bomba del Hangar antiguo. Generador para Hangar. Conexión de generador para Torre de Control. Fresado de sección de capa asfáltica en pista. Tendido de material de fresado en acceso a Cabecera Norte. Excavación de zanja para colocación de tuberías. Colocación de tuberías para sistema eléctrico y electrónico.	Lara Mendoza, Richard Patricio	05/09/2018 - 04:31 PM
Julio 2018: Se encuentran realizando los trabajos de Figurado y armado de acero de refuerzo de tanque de Reactor anaeróbico para la Planta de Tratamiento , Hormigonado de tanque de Reactor anaeróbico para la Planta de Tratamiento, se realizan trabajos en la torre de control de aplicación de empaste en paredes, colocación de cerámica (N+15.20 m), Remate de Alucubond (N+15.20 m), adecuación de cerramiento de malla de acceso a la Torre de Control, trabajos de Excavación de cimentación para garita en Cabecera Sur , Relleno con material de mejoramiento para nivelación de zona de reflexión, Hormigonado de cadenas para cerramiento de malla.	Lara Mendoza, Richard Patricio	02/08/2018 - 10:23 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Junio 2018.- Con fecha 21 junio de 2018, se firmo Contrato Complementario No. 3 del contrato de construcción de la "Terminación de la construcción del Aeropuerto Francisco de Orellana, se procede a LEVANTAR EL PLAZO, a partir del 22 de Junio de 2018, se realizan los trabajos de en la terminal de pasajeros de Instalación de Porcelanato en bases de columnas Arribo, Instalación de sistema eléctrico y electrónico Bloque B, Instalación del sistema para control de luminarias, Instalación de Porcelanato en bases de columnas bloque G, trabajos en la torre de control: Instalación de cerámica en pisos N+6.08, Remate y siliconado de alucubond en friso N+15.20, Instalación de barrederas escaleras,	Lara Mendoza, Richard Patricio	05/07/2018 - 10:20 AM
Mayo 2018.- Mediante memorando No. MTOP-CONS_ORE-2018-76-ME, de fecha 17 de mayo de 2018, se emitió informe referente al incremento de cantidades contractuales y obras adicionales solicitadas por la DGAC, con el fin de que se implemente el acto administrativo de Contrato Complementario No. 3 y Orden de Cambio No. 2 en el del contrato de construcción de la "Terminación de la construcción del Aeropuerto Francisco de Orellana, autorizado en la reunión mantenida con autoridades superiores del MTOP el 28 de marzo de 2018 en la que además se aprobó el aumento de plazo en 90 días. Como hasta la presente fecha todavía no se han implementado los actos administrativos de Contrato complementario No. 3 y Orden de Cambio No. 2, se procede a SUSPENDER EL PLAZO, a partir del 23 de mayo de 2018, con oficio Nro. MTOP-CONS_ORE-18-13-OF hasta que queden legalizados los mencionados actos administrativos. se realizan los trabajos de en la terminal de pasajeros de limpieza de ventanería en Fachada - Punto fijo. Pintura de bolardos - Entrada principal al terminal, Pintura en pared inclinada - Bloque A - Cafetería Empaste de pared en cerramiento exterior, Fundición de acera en Caseta de Transformador N° 1 Soldadura en puerta metálica - Entrada a plataforma, trabajos en la torre de control Instalación y soldadura de pasamanos de acero N+15.20 - Sala de Control. Colocación de cerámica en piso N+12.16m	Lara Mendoza, Richard Patricio	04/06/2018 - 02:31 PM
Abril 2018: Con memorando Nro. MTOP-SUBZ2-2018-0452-M se levanta la suspensión del Aeropuerto del Coca, se realizan los trabajos en la terminal: instalación de muebles de madera en cafetería, colocación de silicona en punto fijo, colocación de muro cortina colocación de friso, instalación de cables de datos y eléctricos en Counters, colocación de remates de porcelanato en pasarela, trabajos en la torre de control: excavación y desalojo de material a escombrera, colocacion y tendido de material de Sub Base Clase 3	Lara Mendoza, Richard Patricio	04/05/2018 - 01:48 PM
Marzo 2018: Actualmente se encuentra suspendido el plazo contractual para la elaboración del acto administrativo Contrato complementario para cumplir los requerimientos de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) para la realización de obras de. El proyecto tiene un avance físico del 80.00% y un avance económico del 78.72 %.Una vez que se cuente con la autorizacion del acto administrativo contrato complementario se levantara la suspensión y se tendra una fecha exacta de cuando se culminara la obra.	Lara Mendoza, Richard Patricio	05/04/2018 - 05:25 PM
Febrero 2018: Se realizan en la terminal de pasajeros las Prueba de funcionamiento en ascensor - Bloque B Instalación sistema de iluminación - Sala de Prebarque, Instalación de cerramiento de malla - Áreas exteriores Instalación de piso de madera tratada en exteriores -Jardineras, Instalación de lavamanos en baños - Sala de Arribo Instalación de urinarios en baños - Sala de Arribo , trabajos en la torre de control Izaje de columnas metálicas para Sala de Control. Soldadura de Friso en Cubierta metálica - Sala de Control. Soldadura de Friso en Cubierta metálica - Sala de Control. Excavación e Instalación de tubería para sistema de voz, datos y media tensión.	Lara Mendoza, Richard Patricio	05/03/2018 - 09:45 PM
Enero 2018: Terminal de pasajeros se realizan los trabajos de: Colocacion de cielo raso, Colocación de alucubond en fachada posterior - Bloque B, Hormigón cepillado en rampa de salida - Sala de Pre embarque, Enlucido en mampostería de cerramiento exterior, Fundición de Losa en Bloque A - Cafetería, Torre de control trabajos de: Enlucido horizontal en losa. (N+15.20 m). Excavación para cisterna.	Lara Mendoza, Richard Patricio	05/03/2018 - 09:34 PM
Diciembre 2017: Trabajos en la terminal de pasajeros; Instalación sistema de climatización. (Planta alta - Bloque B), Instalación ventanería y porcelanato en piso (Planta alta - Bloque B), Instalación y soldadura de perfiles para colocación de paneles de alucubond, Instalación tubería para desagüe (Bloque H), instalación de escalera metálica (Planta Baja - Bloque B), Colocación de porcelanato en piso (Sala de Pre-embarque), Trabajos en la torre de control: Armado del acero de refuerzo en vigas y losa, instalación sanitaria (planta alta N+12.16.), Fundición de vigas y losa (planta alta N+12.16.) Alcantarillado Fluvial : Excavación para la colocación de tubería plástica alcant. (D=1000mm). Cabecera norte, Colocación de tubería plástica alcant. (D=1000mm) Cabecera norte, Colocación y soldadura de estructura metálica para friso. (Fachada frontal) Adoquinado (salida vehicular y parqueadero de buses)	Lara Mendoza, Richard Patricio	05/01/2018 - 01:46 PM
Noviembre 2017: Se realizan los trabajos de nivelación (zona de parqueadero de buses), Compacatación de material sub base (zona de parqueadero de buses), fundición de contrapiso, toma de densidades de campo , ventanería en fachada, instalacion y soldado de escaleras metálicas. armado de acero de refuerzo en vigas. planta alta de la torre de control , caja de revisión del alcantarillado, desalojo del material.	Lara Mendoza, Richard Patricio	05/12/2017 - 04:57 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Octubre 2017.- Se realizan los trabajos en la Terminal de pasajeros como: Nivelación y mejoramiento de suelo para adoquinado (Áreas exteriores), Hidratación y compactación de suelo para adoquinado, Instalación porcelanato en pared de Baños (Sala de arriba), Instalación sistema de suspensión para cielo raso. (Salade arriba), Colocación de pared de Gypsum (Planta Alta, Sala de Arriba), Instalación de perfilería para ventanas. (Sala de arriba) trabajos en la torre de control: Chequeo del acero de refuerzo en columnas, vigas y losa. (Planta Baja, N0+000), Fundición de vigas y losa. (Planta Baja, N0+000), trabajos de alcantarillado fluvial como: Fundición de canal abierto para recolección de aguas lluvias. (Cabecera Norte) Fundición de base para colocación de luces PAPI(Cabecera Norte)</p>	Lara Mendoza, Richard Patricio	03/11/2017 - 04:43 PM
<p>Septiembre 2017: Se realizan los trabajos de adherencia de pintura en la terminal de pasajeros, enlucido de mampostería en la terminal, instalación de la estructura de acero, instalaciones de acometidas.</p>	Lara Mendoza, Richard Patricio	05/10/2017 - 04:42 PM
<p>Agosto 2017.- Se realizan trabajos de enlucido de mampostería, Retiro de pintura de estructura principal, Picado de mampostería para colocación de tubería para instalación eléctrica, Instalación de Placa colaborante y malla, Fundición de losa, Elaboración de diafragma para elevador, Excavación para elaboración de canal recolector de aguas lluvias, Colocación de material de mejoramiento para pozo de revisión, Relleno y compactación en excavación de tubería, tiene un avance de 5.28%</p>	Lara Mendoza, Richard Patricio	05/09/2017 - 07:40 PM
<p>Julio 2017: El proyecto tiene un avance físico del 47,71%. Se dio la Terminación por mutuo acuerdo., se firmo el contrato con el Consorcio OBRACIV SEDEMI, a fin de poder llevar la terminación del Aeropuerto del Coca, los trabajos de aeropuerto se inician con fecha 19 de junio 2017, al momento se encuentra realizando los trabajos en el hangar de bomberos, instalaciones, trabajos en la terminal de pasajeros, trabajos en el alcantarillado.</p>	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/08/2017 - 08:30 PM
<p>Mayo 2017: El proyecto tiene un avance físico del 47,71%. Se dio la Terminación por mutuo acuerdo., se firmo el contrato con el Consorcio OBRACIV SEDEMI, a fin de poder llevar la terminación del Aeropuerto del Coca, los trabajos de aeropuerto se inician con fecha 19 de junio 2017.</p>	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/07/2017 - 01:16 PM
<p>Mayo 2017: El proyecto tiene un avance físico del 47,71%. Se dio la Terminación por mutuo acuerdo., se publicó en el Portal de Compras Públicas el proceso de licitación de la obra signado con el número LICO-1-AO-DO-MTOP-17, se adjudicó el proceso con fecha 12 de mayo de 2017, Con fecha 23 de Mayo de 2017 se firmo el contrato con el Consorcio OBRACIV SEDEMI, a fin de poder llevar la terminación del Aeropuerto del Coca.</p>	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/06/2017 - 09:52 PM
<p>Abril 2017: El proyecto tiene un avance físico del 47,71%. Se dio la Terminación por mutuo acuerdo. Una vez que el presupuesto para el nuevo proceso de contratación de la ejecución de la obra fue aprobado por la Dirección de Estudios, con fecha 16-03-2017 se publicó en el Portal de Compras Públicas el proceso de licitación de la obra signado con el número LICO-1-AO-DO-MTOP-17, la fecha de adjudicación estimada es el 08-05-2017, pues se mandó a convalidar documentos a los oferentes que entraron a la fase de calificación</p>	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	04/05/2017 - 11:41 PM
<p>Marzo 2017: El proyecto tiene un avance físico del 47,71%. Terminado por mutuo acuerdo, esta en proceso precontractual la nueva contratación a fin de culminar la obra.</p>	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	04/04/2017 - 10:47 AM
<p>Febrero 2017: El proyecto tiene un avance físico del 47,71%. Terminado por mutuo acuerdo y se encuentra en legalizada el acta de entrega recepción y liquidación económica, se ha devuelto por parte del contratista lo correspondiente al anticipo que tenía que devengar, se ha autorizado el aval para la nueva contratación a fin de realizar el nuevo proceso para finalizar la obra, se estra realizando todos los tramites correspondientes para el nuevo proceso precontractual para la nueva contratacion de la obra.</p>	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	04/03/2017 - 02:40 PM
<p>Enero 2017: El proyecto tiene un avance físico del 47,71%. Terminado por mutuo acuerdo y se encuentra en legalizada el acta de entrega recepción y liquidación económica, se ha devuelto por parte del contratista lo correspondiente al anticipo que tenía que devengar, se ha autorizado el aval para la nueva contratación a fin de realizar el nuevo proceso para finalizar la obra.</p>	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	07/02/2017 - 03:58 PM
<p>Diciembre 2016: Se ha procedido a realizar la firma del convenio de Terminación de Mutuo Acuerdo el 15 de Diciembre 2016. Se ha realizado el informe repectivo para la solicitud de certificación plurianual a fin de proceder a contratar nuevamente la obra.</p>	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/01/2017 - 05:47 AM
<p>Noviembre 2016: Este proyecto está suspendido esta desde 30 de octubre 2015 la primera suspensión y la segunda el 24 de Diciembre de 2015, se ha realizado la cancelación hasta las planillas Nro. 08 acreditada por el MF y están en trámite de pagos desde la planilla 9 a la planilla 14, al momento no se tiene previsto una fecha de cuando se reactivara la obra ya que el contratista ha solicitado la terminación de mutuo acuerdo se espera la definición por parte de las autoridades.</p>	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/01/2017 - 05:46 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Octubre 2016: Este proyecto está suspendido esta desde 30 de octubre 2015 la primera suspensión y la segunda el 24 de Diciembre de 2015, se ha realizado la cancelación hasta las planillas Nro. 08 acreditada por el MF y están en trámite de pagos desde la planilla 9 a la planilla 14, al momento no se tiene previsto una fecha de cuando se reactivara la obra ya que el contratista ha solicitado la terminación de mutuo acuerdo se espera la definición por parte de las autoridades.</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>07/11/2016 - 04:16 PM</p>
<p>Septiembre 2016: Este proyecto está suspendido esta desde 30 de octubre 2015 la primera suspensión y la segunda el 24 de Diciembre de 2015, se ha realizado la cancelación hasta las planillas Nro. 08 acreditada por el MF y están en trámite de pagos desde la planilla 9 a la planilla 13, al momento no se tiene previsto una fecha de cuando se reactivara la obra ya que el contratista ha solicitado la terminación de mutuo acuerdo se espera la definición por parte de las autoridades.</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>05/10/2016 - 05:00 PM</p>
<p>Agosto 2016: Este proyecto aun esta Suspendido, se encuentran realizando reuniones con las Autoridades de Planta central a fin de definir la solicitud de terminacion de mutuo acuerdo entre las partes.</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>07/09/2016 - 04:50 PM</p>
<p>Julio 2016: Este proyecto aun esta Suspendido, se ha solicitado por parte de la Contratista la Terminación de Mutuo Acuerdo, dentro del cual se estan realizando los respectivos informes técnico, económico y legal de la situación actual del proyecto, determinando la viabilidad de terminarse o no el contrato por mutuo acuerdo de conformidad con lo establecido en el contrato y la Ley.</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>05/08/2016 - 02:49 PM</p>
<p>Junio 2016: Este proyecto aun esta Suspendido, se ha solicitado por parte de la Contratista la Terminación de Mutuo Acuerdo, dentro del cual se estan realizando los respectivos informes técnico, económico y legal de la situación actual del proyecto, determinando la viabilidad de terminarse o no el contrato por mutuo acuerdo de conformidad con lo establecido en el contrato y la Ley.</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>05/07/2016 - 02:35 PM</p>
<p>Mayo 2016: Se esperaran la realización de los actos administrativos de incremento de monto por la cantidad de Seis Cientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Once Dólares Americanos con 53/100 (\$ 651.511,53) e incremento de plazo por el tiempo de cuatro meses mediante contrato complementario Nro. 2, por cuanto existen rubros nuevos, al momento se encuentra pendiente el aval que justifique la existencia de fondos para suscribir tal contrato complementario, por lo tanto hasta legalizar estos actos administrativos la obra se encuentra suspendida. Ante la suspensión de los trabajos y la falta de aval que justifique la existencia de fondos, para suscribir el contrato complementario Nro. 2 se está gestionando la certificación de recursos lo más pronto posible para concluir este proyecto emblemático que mejorara el sistema aéreo en la provincia de Orellana. Se ha realizado una convocatoria para realizar una reunion a fin de que se puedan dar soluciones.</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>07/06/2016 - 11:36 AM</p>
<p>Abril 2016: Se esperaran la realización de los actos administrativos de incremento de monto por la cantidad de Seis Cientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Once Dólares Americanos con 53/100 (\$ 651.511,53) e incremento de plazo por el tiempo de cuatro meses mediante contrato complementario Nro. 2, por cuanto existen rubros nuevos, al momento se encuentra pendiente el aval que justifique la existencia de fondos para suscribir tal contrato complementario, por lo tanto hasta legalizar estos actos administrativos la obra se encuentra suspendida. Ante la suspensión de los trabajos y la falta de aval que justifique la existencia de fondos, para suscribir el contrato complementario Nro. 2 se está gestionando la certificación de recursos lo más pronto posible para concluir este proyecto emblemático que mejorara el sistema aéreo en la provincia de Orellana.</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>06/05/2016 - 03:25 PM</p>
<p>Marzo 2016: Se esperaran la realización de los actos administrativos de incremento de monto por la cantidad de Seis Cientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Once Dólares Americanos con 53/100 (\$ 651.511,53) e incremento de plazo por el tiempo de cuatro meses mediante contrato complementario Nro. 2, por cuanto existen rubros nuevos, al momento se encuentra pendiente el aval que justifique la existencia de fondos para suscribir tal contrato complementario, por lo tanto hasta legalizar estos actos administrativos la obra se encuentra suspendida. Ante la suspensión de los trabajos y la falta de aval que justifique la existencia de fondos, para suscribir el contrato complementario Nro. 2 se está gestionando la certificación de recursos lo más pronto posible para concluir este proyecto emblemático que mejorara el sistema aéreo en la provincia de Orellana.</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>05/04/2016 - 03:30 PM</p>
<p>Febrero 2016: Está por legalizarse el acto administrativo de incremento de monto por la cantidad de Seis Cientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Once Dólares Americanos con 53/100 (\$ 651.511,53) e incremento de plazo por el tiempo de cuatro meses mediante contrato complementario Nro. 2, por cuanto existen rubros nuevos, al momento se encuentra pendiente el aval que justifique la existencia de fondos para suscribir tal contrato complementario, por lo tanto hasta legalizar estos actos administrativos la obra se encuentra suspendida. Ante la suspensión de los trabajos y la falta de aval que justifique la existencia de fondos, para suscribir el contrato complementario Nro. 2 se está gestionando la certificación de recursos lo</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>02/03/2016 - 05:58 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
más pronto posible para concluir este proyecto emblemático que mejorara el sistema aéreo en la provincia de Orellana.		
Enero 2016: El plazo de la obra se encuentra suspendido por casos de fuerza mayor, es decir hasta que se den los actos administrativos pendientes (Contrato Complementario, pago de planillas, etc.).	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	09/02/2016 - 10:25 AM
Diciembre 2015: Se ha realizado la suspensión de plazo contractual de los trabajos hasta que se realicen los actos administrativos para ampliación de plazo, contrato complementario, Debido a todos estos inconvenientes se encuentran los hitos en amarillo ya que no se ha podido cumplir con lo establecido en el cronograma.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/01/2016 - 12:41 PM
Noviembre 2015: Terminado el Hangar SCI faltando instalaciones de agua, luz y teléfono que no son parte del contrato. Sigue el armado de estructura metálica en el terminal de pasajeros. Ha bajado totalmente el ritmo de trabajos por falta de pagos de planillas. Solo un pequeño grupo de obreros trabajan en la construcción de paredes internas del terminal de pasajeros. Se ha realizado la suspensión de plazo contractual de los trabajos por dos meses, se esta a la espera de las resoluciones para los actos administrativos para dar solución al retraso en el cobro de planillas, ampliación de plazo, contrato complementario. Debido a todos estos inconvenientes se encuentran los hitos en amarillo ya que no se ha podido cumplir con lo establecido en el cronograma.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	07/12/2015 - 11:55 AM
Octubre 2015: Terminado el Hangar SCI faltando instalaciones de agua, luz y teléfono que no son parte del contrato. Sigue el armado de estructura metálica en el terminal de pasajeros. Ha bajado totalmente el ritmo de trabajos por falta de pagos de planillas. Solo un pequeño grupo de obreros trabajan en la construcción de paredes internas del terminal de pasajeros. Se ha realizado la suspensión de plazo contractual de los trabajos.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	09/11/2015 - 03:18 PM
Septiembre 2015: Terminado el Hangar SCI faltando instalaciones de agua, luz y teléfono que no son parte del contrato. Sigue el armado de estructura metálica en el terminal de pasajeros. Colocación de cubierta en el edificio terminal de pasajeros. Ha bajado totalmente el ritmo de trabajos por falta de pagos de planillas. Se esta aun en la espera de la definición por parte de las autoridades sobre la ampliación de plazo, aun no se cancelan planillas pendientes por lo que la obra no cuenta con el avance que debería tener. El contratista reclama pago oportuno de planillas, consecuencia de lo cual el avance de los trabajos ha bajado muy significativamente sin que la Fiscalización pueda hacer pues el mismo se encuentra impago desde la planilla de mayo 2015.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	07/10/2015 - 05:20 PM
Agosto 2015: Los trabajos realizados por la contratista durante el mes de Agosto son : Montaje de vigas de acero estructural A36 en Nueva Terminal, Montaje de tensores de acero A36 en Nueva Terminal, Montaje de columnas secundarias y vigas en Nueva Terminal, Colocación de placas de acero A36 en vigas de cimentación de bloque A en Nueva Terminal, Colocación de porcelanato en pared de cocina, baños y gradas en Nuevo Hangar, Colocación de vidrio en torre vigía del Nuevo Hangar, Fundición sumideros del sistema de alcantarillado pluvial paralelo a la pista de aterrizaje, Colocación de aluminio compuesto en zona de cubierta en Nuevo Hangar, Pintura exterior en Nuevo Hangar, Extensión de piedra bola y material seleccionado a los costados de la pista de aterrizaje, Empaste de pared en caseta de bomba de Nuevo Hangar, Pintura de pasamanos metálicos en Nuevo Hangar, Terminado de filos de gradas en Nuevo Hangar, Colocación de aluminio compuesto en zona de cubierta en Nuevo Hangar, Pintura exterior en Nuevo Hangar, Pintura exterior de pared en caseta de bomba de Nuevo Hangar, Limpieza en zona de maniobras en Nuevo Hangar, Adecuación de sistema de garza en caseta de bomba, Montaje de columnas de acero A36 en nuevo bloque de Nueva Terminal, Corte de asfalto previo a hormigón en zona de maniobras de Nuevo Hangar y en excavación de sistema de alcantarillado pluvial, Almacenamiento de cubierta stilpanel con aislamiento acústico para Nueva Terminal, Montaje de estructura metálica para canal de aguas lluvias en Nueva Terminal, Mejoramiento de suelo en vía de acceso al Nuevo Hangar, Compactación y nivelación en zona de cisterna del Nuevo Hangar, Colocación puertas y mamparas para duchas en Nuevo Hangar, Colocación puertas de acceso principal y hacia gimnasio en Nuevo Hangar, Montaje de canales de aguas lluvias para cubierta en Nueva Terminal, Relleno, compactación y nivelación en zona de cisterna del Nuevo Hangar. Se esta aun en la espera de la definición por parte de las autoridades sobre la ampliación de plazo, aun no se cancelan planillas pendientes por lo que la obra no cuenta con el avance que debería tener.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	08/09/2015 - 06:23 PM
Julio 2015: Fundición base cisterna de agua potable de la nueva terminal de pasajeros, Armado de encofrado interior y exterior cisterna, Llegada y armado de columnas y vigas de acero estructural de la nueva terminal, Figurado de acero para las vigas y zapatas del bloque A de la nueva terminal, Derrocamiento y desalojo de la zona en la cual se levantara el bloque A de la nueva terminal, Colocación ángulos y rejillas de canales de agua del Hangar, Colocación porcelanato en zonas de Hangar, Fundición de Hormigón de 350 k/cm2 en la zona de parqueo de la Terminal, Colocación Tubería de 1200 mm y 1000mm en el sistema de alcantarillado,	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	08/09/2015 - 06:22 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>incluye excavación , base clase ii, rellano con material de excavación y desalojo de material sobrante, Fundición Pozos de Sistema de alcantarillado pluvial, Corte carpeta asfáltica en zona del hangar y reposición con suelo cemento después de la colocación de la tubería de 1200mm, Armado caseta de bomba con estructura metálica en zona del hangar, Enlucido de mampostería en caseta de bomba en Nuevo Hangar, Montaje de vigas de acero estructural A36 de la nueva terminal, Encofrado y armado de vigas de cimentación del bloque A de la nueva terminal, Colocación de pasamanos metálicos en Nuevo Hangar, Colocación de placa colaborante deck en Caseta de Bomba y Torre Vigía de Nuevo Hangar, Montaje de tensores de acero A36 en Nueva Terminal, Enlucido de mampostería en caseta de bomba en Nuevo Hangar, Colocación de pantallas para aluminio compuesto en estructura para cubierta en Nuevo Hangar, Colocación de tensores en estructura de cubierta para Nuevo Hangar.</p> <p>Cabe indicar que por parte de la contratista se ha solicitado una ampliación de plazo considerando el retraso en la legalización del Contrato Complementario, el cual crea los rubros de Acero A-36 y la Tubería PVC de 1800 mm, mismo que se legaliza el 17 de junio de 2015, así como el análisis del avance actual de los trabajos y teniendo en cuenta que la imposibilidad de ejecutar los rubros objeto del Contrato Complementario se debieron a errores en el proyecto con el que se contrató. Se esta a la espera de una respuesta a la solicitud realizada una vez que se ha procedido a realizar todos los tramites administrativos pertinentes.</p>		
<p>Junio 2015: Colocación de tubería para instalaciones hidrosanitario en la Nueva Terminal, colocación de tubería de 1200mm y 1000mm de PVC paralela a la pista de aterrizaje. Re adoquinado en Calle 13, armado y encofrado de cisterna de recolección de aguas lluvias y cisterna de agua potable en Nueva Terminal, fundición de Nueva Plataforma de Aeronaves, fundición de contrapiso en Nueva Terminal de Pasajeros, Encofrado y fundición de aceras en Nuevo Hangar, montaje de estructura metálica en cisterna en Nuevo Hangar, montaje de columnas de acero estructural A36 en Nueva Terminal de Pasajeros, terminado de hormigón de parqueadero en Nuevo Hangar, montaje de estructura metálica en cisterna en Nuevo Hangar, montaje de celosías en Nuevo Hangar, recolección de materiales recuperables de oficinas a derrocar y derrocamiento de las mismas, desmontaje de torre de iluminación de plataforma existente, fundición para caseta de bomba en Nuevo Hangar, mampostería lateral en ambas naves de Nuevo Hangar debido a nueva disposición, fundición de cajas de revisión en Red de alcantarillado pluvial paralelo a la pista de aterrizaje, colocación de porcelanato en Nuevo Hangar, terminación de re adoquinado en Calle 13, Colocación tubería de 160mm de PVC en Nueva Terminal, armado y encofrado de cisterna de recolección de aguas lluvias y cisterna de agua potable en Nueva Terminal, Armado y encofrado de muro para cerrar el aeropuerto donde se realizaron trabajos de la red de alcantarillado pluvial en Calle 13.</p> <p>Ya se cuenta con el contrato complementario legalizado mismo que no incrementa monto.</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>09/07/2015 - 04:13 PM</p>
<p>Mayo 2015: Colocación de material pétreo en Perímetro de Pista de Aterrizaje. Continúan trabajos en el hangar con el enlucido y pasteado de paredes. Terminó la colocación del canal de aguas lluvias bajo la pista del aeropuerto y la colocación de tubería a través de la actual plataforma. Colocación de tubería para el colector de descarga de aguas lluvias. Encofrado y fundición de vigas de cimentación para el terminal de pasajeros. Fundición de plataforma de estacionamiento de aeronaves</p> <p>Es necesario tener la legalización del contrato complementario por la creación del rubro acero estructural A-36 y la tubería PVC de 1800 mm. Ya que por este motivo el porcentaje de cumplimiento de cronograma está bajo ya que no se ha podido iniciar los trabajos que comprenden este hito</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>09/07/2015 - 04:13 PM</p>
<p>Abril 2015: Desbroce en Perímetro de Pista de Aterrizaje. Construcción de paredes y cisterna. Excavaciones en calle 13 (colector de descarga de Aguas LLuvias). Colocación de tubería para el colector de descarga de aguas lluvias. Encofrado y fundición de vigas de cimentación para el terminal de pasajeros. Fundición de plataforma de estacionamiento de aeronaves</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>08/06/2015 - 12:10 PM</p>
<p>Marzo 2015: Se realizan los trabajos de : Desbroce en Perímetro de Pista de Aterrizaje. Armado de hierros, encofrado y fundición en plintos de Hangar. Excavaciones en calle 13 (colector de descarga de Aguas LLuvias). Colocación de tubería para el colector de descarga de aguas lluvias.</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>06/04/2015 - 03:55 PM</p>
<p>Febrero 2015: los trabajos realizados por la empresa contratista son los siguientes: Desbroce en Perímetro de Pista de Aterrizaje. Excavación de plintos de Hangar. Bombeo de agua y relleno con mejoramiento, retiro de adoquín en calle 13 (colector de descarga de AALL) Almacenado de Subbase 3 para conformación de Base Estabilizada con Cemento para Plataforma Mezclado de subbase con cemento, extendido y compactación día y noche Cambio de suelo y colocación de geotextil tejido 3000g en Obras Exteriores de Terminal. Continuación Desbroce en Perímetro de Pista de Aterrizaje Continuación Retiro de adoquín en calle 13 (colector de descarga de AALL) Extendido y Conformado de Base Estabilizada con Cemento para Plataforma, se siguen los trabajo tal como esta programado.</p>	<p>Navarrete Gilces, Silvia Katherine</p>	<p>09/03/2015 - 09:55 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Diciembre 2014: En este mes se comenzaron los trabajos una vez que fue entregado el anticipo, se empezó con los trabajos de movimientos de tierra, desalojo de materiales	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/01/2015 - 08:27 PM
Noviembre 2014: Con fecha 28 de Noviembre de 2014, se realizó la entrega del anticipo a la empresa adjudicada del contrato, y de esta manera se inician los trabajos de ejecución del proyecto.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/01/2015 - 08:19 PM
Octubre 2014: Se realizó la adjudicación con fecha 21 de octubre de 2014 del contrato a la empresa adjudicada	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/01/2015 - 08:16 PM
SEPTIEMBRE 2014: Se revisaron las ofertas por parte de la subcomisión de apoyo. La comisión solicita convalidación de errores.	González Cajas, Christian Paúl	07/10/2014 - 06:13 PM
AGOSTO 2014: -LAS OFERTAS SERAN PRESENTADAS POR LOS OFERENTES EL 29 DE AGOSTO HASTA LAS 15:00 PM	González Cajas, Christian Paúl	26/08/2014 - 05:29 PM
JULIO 2014: - Se declara desierta la licitación del mes de mayo de 2014 - Con Resolución Ministerial se eleva al portal de compras públicas la licitación el 31 de julio de 2014	González Cajas, Christian Paúl	05/08/2014 - 06:52 PM
JUNIO 2014: La subcomisión de apoyo se encuentra revisando las ofertas presentadas.	González Cajas, Christian Paúl	08/07/2014 - 10:56 AM
MAYO 2014: El 26 de mayo de 2014, se eleva al portal de compras públicas la licitación del proyecto.	González Cajas, Christian Paúl	02/06/2014 - 09:58 AM
ABRIL 2014: Se declara desierta la Licitación.	Dávila Cadena, Christian Roberto	28/05/2014 - 09:10 AM
MARZO 2014: Las ofertas presentadas están en revisión para calificación por parte de la Subcomisión de Apoyo, para posterior envío a la Comisión Técnica.	González Cajas, Christian Paúl	07/04/2014 - 09:12 AM
FEBRERO 2014: Se eleva al portal del SERCOP la licitación. El 6 de marzo de 2014 deberán ser presentadas las ofertas por los oferentes.	González Cajas, Christian Paúl	11/03/2014 - 03:47 PM
Enero 2014: Se encuentra en revisión final de documentos habilitantes para subir el proceso licitatorio al portal del SERCOP.	González Cajas, Christian Paúl	13/02/2014 - 11:19 AM
Diciembre 2013: Los documentos habilitantes se entregaron a la Dir. de Contrataciones del MTOP. En revisión para aprobación de los pliegos por parte de la Comisión Técnica.	Terán Gordillo, Ivette Lorena	08/01/2014 - 10:57 AM
Noviembre 2013: Se elabora la desagregación tecnológica de acuerdo al "Nuevo Formato" establecido por el INCOP. Se obtiene la Certificación Presupuestaria emitida por la Dirección Financiera de Orellana del MTOP.	Terán Gordillo, Ivette Lorena	03/12/2013 - 10:17 AM
Oct. 2013: Se elabora la Desagregación Tecnológica según formato del INCOP	Terán Gordillo, Ivette Lorena	31/10/2013 - 10:14 AM
Sept. 2013: Se recibe la aprobación integral de los Estudios del Proyecto por parte de la Dirección de Estudios del MTOP. Se solicita a la Dirección Provincial de Orellana emita la Certificación Presupuestaria.	Terán Gordillo, Ivette Lorena	27/09/2013 - 03:15 PM
Agosto 2013: Los estudios se encuentran en revisión de la Dirección de Estudios del MTOP para su aprobación.	Terán Gordillo, Ivette Lorena	12/09/2013 - 04:27 PM
Julio 2013: Los estudios se encuentran en revisión de la Dirección de Estudios del MTOP para su aprobación, una vez que el consultor ha venido realizando las correcciones a las observaciones.	Terán Gordillo, Ivette Lorena	12/09/2013 - 04:27 PM
Junio 2013: Los estudios se encuentran en revisión de la Dirección de Estudios del MTOP para su aprobación, una vez que el consultor ha venido realizando las correcciones a las observaciones.	Terán Gordillo, Ivette Lorena	03/07/2013 - 12:49 PM
Mayo 2013: Los estudios se encuentran en revisión de la Dirección de Estudios del MTOP, para su aprobación.	Terán Gordillo, Ivette Lorena	06/06/2013 - 09:05 AM
Abril 2013: El consultor se encuentra realizando las correcciones a los estudios de acuerdo a las observaciones realizadas por la Dirección de Estudios del MTOP.	Terán Gordillo, Ivette Lorena	06/06/2013 - 09:04 AM
Marzo 2013: El consultor se encuentra realizando las correcciones a los estudios de acuerdo a las observaciones encontradas. Estudios que deberán ser presentados a la DGAC y entregados a la STAC en el mes de abril de 2013.	Terán Gordillo, Ivette Lorena	04/04/2013 - 12:42 PM
Febrero 2013: El Municipio del Coca presenta observaciones a los estudios, las mismas que deberán ser absueltas por el consultor, para obtener la autorización municipal.	Terán Gordillo, Ivette Lorena	04/03/2013 - 12:45 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Enero 2013: El consultor realiza las correcciones a las observaciones de los estudios, presentadas por la DGAC	Terán Gordillo, Ivette Lorena	04/03/2013 - 12:43 PM
Diciembre 2012: El consultor se encuentra realizando las correcciones del estudio del proyecto, a las observaciones presentadas por la DGAC.	Terán Gordillo, Ivette Lorena	10/01/2013 - 03:57 PM
<p>Noviembre 2012: La DGAC se encuentra revisando los estudios del proyecto presentados por el Consultor, para su aprobación y envío al MTOP</p> <p>Octubre 2012: El consultor entrega los estudios para revisión y aprobación de la DGAC. Quienes entregarán a la STAC en diciembre para revisión y aprobación de la Dir. de Estudios del MTOP. Se presentaron retrasos en el proceso del proyecto por la negociación y pago de expropiación de los terrenos con la Cía. Weatherford - Se define la ejecución del proyecto para el año 2013, por lo que se reprograman los hitos.</p> <p>Septiembre 2012: El Consultor se encuentra desarrollando los estudios del proyecto.</p> <p>Agosto 2012: Se inicia el proceso de pago por la expropiación del terreno aledaño al aeropuerto, propiedad de la empresa Weatherford</p> <p>Julio 2012: La DGAC contrata la consultoría para los estudios. Se inician la elaboración de los estudios del proyecto</p> <p>Junio 2012: Se obtiene la partida presupuestaria para el pago de la expropiación. Se emite el acuerdo de declaración de utilidad pública del terreno a expropiar.</p> <p>Mayo 2012: Se inicia el trámite de expropiación, solicitando la partida presupuestaria.</p> <p>Abril 2012: Se realizó la primera reunión de negociación con los dueños del terreno aledaño al aeropuerto, para la expropiación.</p> <p>Marzo 2012: Se inicia el proceso de expropiación del terreno aledaño al aeropuerto del Coca.</p> <p>Febrero 2012: Se define el cronograma de actividades para realizar la expropiación del terreno aledaño al aeropuerto, en reunión mantenida en la Jefatura del Aeropuerto del Coca. Se determina que una vez que exista el "Acta de Ocupación" la DGAC contratará la consultoría para los estudios del nuevo terminal de pasajeros..</p> <p>Enero 2012: Se realizan correcciones a observaciones en los estudios. Se determina reformular el proyecto para lo que se concluye que se necesita realizar una expropiación al terreno aledaño al aeropuerto del Coca.</p> <p>Diciembre 2011: Estudios en revisión para aprobación</p> <p>Noviembre 2011: Estudios en revisión del MTOP. La DGAC en conjunto con el consultor se encuentra corrigiendo el proyecto de acuerdo a las observaciones realizadas por Estudios del MTOP.</p> <p>Julio 2011: Se cuenta con el informe de prioridad de SENPLADES. Los estudios se encuentran en revisión para aprobación en el MTOP. El proyecto se encuentra en revisión para verificar la Factibilidad Económica y Social del proyecto.</p>	Terán Gordillo, Ivette Lorena	10/12/2012 - 01:50 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Area de lote que no se ha considerado para expropiación.	05/07/2018	Silvia Katherine Navarrete Gilces	30	60	18	0/1
Trabajos adicionales Aeropuerto del Coca.	04/05/2018	Silvia Katherine Navarrete Gilces	10	10	1	0/1

Problemas cerrados: 7, Abiertos: 2

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
3- REGIONAL. Ambiental. Lagunas de agua lluvias al rededor de la pista CAUSARIA accidentes aereos.	04/05/2018	Silvia Katherine Navarrete Gilces	10 %	10	1	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Orellana

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Priorización de la Ficha Senplades realizada	1-Solicitud de Información	31/05/2011		04/05/2011		Sí	2.0
2	PLANEACIÓN: Elaboración y Aprobación de los Estudios realizado	1-Solicitud de Información	27/09/2013		27/09/2013		Sí	2.0
3	PLANEACIÓN: Pliegos para la licitación ingresados en el portal de compras públicas Realizado	2-Publicación de Pliegos	31/07/2014		31/07/2014		Sí	2.0
4	PLANEACIÓN: Informe de Adjudicación presentado	3-Adjudicación	21/10/2014		21/10/2014		Sí	2.0
5	EJECUCIÓN: inicio de trabajos(campamentos)realizado	4-Inicio de Trabajo	28/11/2014		28/11/2014		Sí	2.0
6	EJECUCIÓN: Obras preliminares (Nueva Plataforma, Derrocamiento y retiro de hormigón, retiro carpeta asfáltica) Realizado	5-Entregables Intermedios	30/01/2015		30/01/2015		Sí	7.0
7	EJECUCION: Obras Civil (movimientos de tierra) Realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	3.0
8	EJECUCIÓN: Obras de Infraestructura Civil (obras exteriores para terminal) Realizada	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	8.0
9	EJECUCIÓN: Obras Preliminares (Plataforma, movimientos de tierra, y base de regado con cemento)Realizado	5-Entregables Intermedios	30/03/2015		30/03/2015		Sí	7.0
10	EJECUCIÓN: Obras de Infraestructura Civil (Construcción del Hangar, movimientos de tierra) Realizada	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	8.0
11	EJECUCIÓN: Obras Infraestructura civil(colector de hormigon armado y cruce de pista) realizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2015		30/05/2015		Sí	7.0
12	EJECUCIÓN: Obras de Infraestructura Civil (Cubierta de la terminal ACERO A36) Realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		30/12/2015		Sí	7.0
13	EJECUCIÓN: Obras de Infraestructura Civil (Plataforma, pavimento de hormigon , cemento portland)Realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		28/08/2017		Sí	8.0
14	EJECUCION: Obras Civil (Instalaciones Electronicas) Realizada	5-Entregables Intermedios	06/11/2015		30/09/2018		Sí	5.0
15	EJECUCION: Obras civiles(Instalaciones Electricas) Realizada	5-Entregables Intermedios	06/11/2015		30/09/2018		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
16	EJECUCION: Obras de Infraestructura Civil (Torre de control)Realizado	5-Entregables Intermedios	06/11/2015		30/09/2018		Sí	7.0
17	EJECUCION: Obras de infraestructura civil (Plan de manejo ambiental) Realizado	9-Entregables Formales	06/11/2015		30/09/2018		Sí	4.0
18	EJECUCIÓN : Acabados Generales (aluqubond)realizado	5-Entregables Intermedios	06/11/2015		30/09/2018		Sí	3.0
19	EJECUCIÓN: Acabados Generales(Cerramientos, cristalerías) realizado	5-Entregables Intermedios	06/11/2015		30/09/2018		Sí	5.0
20	COMPLETADO :Acta de Recepción Definitiva Firmada	5-Entregables Intermedios	15/12/2015	31/12/2018			No	3.0
21	CIERRE: Liquidación Económica del Contrato realizada	5-Entregables Intermedios	30/12/2015	31/12/2018			No	3.0


SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	18/12/2017
2	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	15/11/2017
3	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	20/10/2017
4	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	26/09/2017
5	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	31/08/2017
6	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	28/07/2017
7	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	26/06/2017
8	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	31/05/2017
9	Obra suspendida en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	29/04/2017
10	Obra suspendida en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	31/03/2017
11	Obra suspendida en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	26/01/2017
12	Obra suspendida en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	27/02/2017
13	Obra suspendida en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	30/12/2016
14	Obra suspendida en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	18/11/2016
15	Obra suspendida en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	13/10/2016
16	Obra suspendida en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	13/09/2016
17	Obra suspendida en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	16/08/2016
18	Obra suspendida en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	21/07/2016
19	Obra suspendida en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	22/06/2016

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
20	Obra suspendida en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	27/04/2016
21	Obra suspendida en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	09/05/2016
22	Obra suspendida en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	17/03/2016
23	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	24/02/2016
24	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	28/01/2016
25	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	24/12/2015
26	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	29/11/2015
27	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Guevara Yáñez, Mónica Alexandra	{PR} - Provincia - ORELLANA	21/10/2015
28	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Obando Morales, Santa Felicita	{PR} - Provincia - ORELLANA	08/09/2015
29	Proyecto en ejecución	Obando Morales, Santa Felicita	{PR} - Provincia - ORELLANA	15/08/2015
30	Obra en ejecución en la Provincia de Orellana	Obando Morales, Santa Felicita	{PR} - Provincia - ORELLANA	25/08/2015
31	OBRA EN EJECUCIÓN EN LA PROVINCIA DE ORELLANA	Obando Morales, Santa Felicita	{PR} - Provincia - ORELLANA	08/07/2015
32	OBRA EN EJECUCIÓN EN LA PROVINCIA DE ORELLANA	Obando Morales, Santa Felicita	{PR} - Provincia - ORELLANA	05/06/2015
33	OBRA EN EJECUCIÓN DE ACUERDO A LO PLANIFICADO EN LA PROVINCIA DE ORELLANA	Obando Morales, Santa Felicita	{PR} - Provincia - ORELLANA	14/04/2015
34	OBRA EN EJECUCIÓN DE ACUERDO A LO PLANIFICADO	Obando Morales, Santa Felicita	{PR} - Provincia - ORELLANA	06/02/2015
35	CAMBIO DE SUELO Y DESALOJO DE ESCOMBROS	Obando Morales, Santa Felicita	{PR} - Provincia - ORELLANA	16/12/2014
36	LIMPIEZA DEL TERRENO OBJETO DEL PROYECTO.	Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente	{PR} - Provincia - ORELLANA	15/07/2014
37	INFORME DE AVANCE DE OBRA	Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente	{PR} - Provincia - ORELLANA	31/01/2014
38	Avance de la obra en Orellana	Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente	{PR} - Provincia - ORELLANA	27/12/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje avance de obra		100.00 %	0	100	01/01/2015	Octubre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	16,287,036.46 **
Costo Total:	16,250,000.00
Total Devengado:	16,287,036.46
% Costo Total Devengado:	100.23 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 100.23 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	37,694,114.10	0.00	0.00	37,694,114.10
Ppto. Externo Planeado	8,489,746.07	0.00	0.00	8,489,746.07
Ppto. Aprobado Inicial	21,546,094.36	0.00	0.00	21,546,094.36
Ppto. Codificado	22,770,868.24	0.00	0.00	22,770,868.24
Ppto. Comprometido	20,010,049.34	0.00	0.00	20,010,049.34
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	15,977,767.76	0.00	0.00	15,977,767.76
Ppto. Devengado	16,287,036.46	0.00	0.00	16,287,036.46
Pagado Real	9,788,398.09	0.00	0.00	9,788,398.09
Estimado a fin de año	* 16,287,036.46	0.00	0.00	16,287,036.46
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-309,268.70	0.00	0.00	-309,268.70
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 101.94 %	0.00 %	0.00 %	101.94 %
Ppto. Codificado 998	2,876,054.57	0.00	0.00	2,876,054.57
Ppto. Devengado 998	2,245,952.18	0.00	0.00	2,245,952.18

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

16	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
19	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ACTA DE CONVALIDACION DE ERRORES	A.3.pdf	08/10/2014
2	Acta de terminación y Liquidación Económica del Aeropuerto del Coca	I.2.pdf	07/02/2017
3	Actualización de Dictamen de Prioridad	D.2.pdf	05/09/2015
4	ACTUALIZACIÓN DE LA PRIORIZACIÓN 2013	A.2.pdf	08/05/2014
5	Adjudicación del Proceso Terminación del Aeropuerto del Coca	I.6.pdf	05/06/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
6	Certificación de recursos	H.1.pdf	21/11/2016
7	Certificación presupuestaria 2015	G.8.pdf	21/11/2016
8	Certificación presupuestaria 2016	G.9.pdf	21/11/2016
9	Contrato	A.6.pdf	10/01/2015
10	Contrato Complementario (creacion de rubros de Acero A-36 y la Tubería PVC de 1800 mm)	C.3.pdf	13/08/2015
11	Contrato Modificatorio	F.7.pdf	21/11/2016
12	Convenio de terminación de Mutuo Acuerdo	I.1.pdf	07/02/2017
13	Criterio de Juridico	H.5.pdf	21/11/2016
14	Criterio de Planificación	H.4.pdf	21/11/2016
15	Criterio de Subsecretario de infraestructura	H.6.pdf	21/11/2016
16	Cronograma Valorado del Aeropuerto del Coca	A.9.PDF	10/02/2015
17	Dictamen de Prioridad	C.9.pdf	05/09/2015
18	Dictamen de Prioridad	D.1.pdf	05/09/2015
19	Documentos de solicitud para Ampliación de plazo.	C.6.PDF	13/08/2015
20	Documentos precontractuales	A.4.pdf	10/01/2015
21	Fotografias de los Trabajos	A.7.pdf	10/01/2015
22	Informe de avances de trabajos Aeropuerto Mayo 2015.	B.9.pdf	08/06/2015
23	Informe de avances de trabajos Aeropuerto y Fotografias mes de julio 2015.	C.5.pdf	13/08/2015
24	Informe de avances de trabajos Aeropuerto-Fotografias junio 2015	C.2.docx	09/07/2015
25	Informe de avances de trabajos por parte Constructora Septiembre 2015	E.3.docx	07/10/2015
26	Informe de avances de trabajos y fotografias agosto 2015.	E.1.docx	08/09/2015
27	Informe de Fiscalizacion Diciembre 2017	I.8.pdf	05/01/2018
28	Informe de Fiscalizacion Diciembre 2017	I.9.pdf	05/01/2018
29	Informe de Fiscalizacion Octubre 2017	I.7.pdf	03/11/2017
30	Informe de Fiscalización de Abril 2015	F.9.pdf	21/11/2016
31	Informe de Fiscalización de Agosto 2015	G.4.pdf	21/11/2016
32	Informe de Fiscalización de Enero a Febrero de 2016	G.7.pdf	21/11/2016
33	Informe de Fiscalización de Julio 2015	G.3.pdf	21/11/2016
34	Informe de Fiscalización de Junio 2015	G.2.pdf	21/11/2016
35	Informe de Fiscalización de Mayo 2015	G.1.pdf	21/11/2016
36	Informe de Fiscalización de Noviembre a Marzo 2015	F.8.pdf	21/11/2016
37	Informe de Fiscalización de octubre 2015	G.6.pdf	21/11/2016
38	Informe de Fiscalización de Septiembre 2015	G.5.pdf	21/11/2016
39	Informe de Fiscalización Julio 2018	I.9.pdf	02/08/2018
40	Informe de los trabajos y fotografias Marzo 2015	B.7.docx	07/04/2015
41	Informe de Sitop Abril 2016	E.9.pdf	06/05/2016
42	Informe de Sitop Agosto 2015	D.9.pdf	08/09/2015
43	Informe de Sitop Febrero 2016	E.8.pdf	02/03/2016
44	Informe de Sitop Julio 2015	C.4.pdf	13/08/2015
45	Informe de Sitop Junio 2015	C.1.PDF	09/07/2015
46	Informe de Sitop Junio 2016	F.2.pdf	05/07/2016
47	Informe de Sitop Marzo 2016	E.8.pdf	05/04/2016
48	Informe de Sitop Mayo 2015	B.8.pdf	08/06/2015
49	Informe de Sitop Mayo 2016	F.1	07/06/2016
50	Informe de Sitop Noviembre 2015	E.4.pdf	07/12/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
51	Informe de Sitop Octubre 2015	E.3.pdf	05/11/2015
52	Informe de Sitop Septiembre 2015	E.2.pdf	07/10/2015
53	Informe Mensual y fotografías del mes febrero 2015	B.5.pdf	10/03/2015
54	Informe semanal y fotografías febrero 2015	B.3.pdf	09/03/2015
55	Informe semanal y fotografías febrero 2015	B.4.pdf	09/03/2015
56	Informe Sitop Abril 2015	B.8.pdf	15/05/2015
57	Informe Sitop Diciembre 2015.	E.5.pdf	05/01/2016
58	Informe Sitop Diciembre 2016	H.9.pdf	05/01/2017
59	Informe Sitop Febrero 2015	B.2.pdf	09/03/2015
60	Informe Sitop Marzo 2015	B.6.pdf	06/04/2015
61	Informe Sitop Octubre 2016	F.6.pdf	07/11/2016
62	Informes de Sitop ENERO 2017	I.3.pdf	07/02/2017
63	Informes ejecutivos Sitop Agosto 2016	F.4.pdf	07/09/2016
64	Informes ejecutivos Sitop Julio 2016	F.3.pdf	05/08/2016
65	Informes Sitop Enero 2015.	A.8.pdf	09/02/2015
66	Informes Sitop Enero 2015.	B.1.pdf	10/02/2015
67	Informes SITOP enero 2016	E.7.pdf	09/02/2016
68	Informes SITOP Febrero 2017	I.4.pdf	04/03/2017
69	Informes SITOP mes de marzo 2017	I.5.pdf	04/04/2017
70	Informes SITOP Noviembre 2016	H.7.pdf	05/12/2016
71	Informes SITOP septiembre 2016	F.5.pdf	05/10/2016
72	Oficio COMSA-RM (carencias de trabajos adicionales en el aeropuerto).	D.6.pdf	05/09/2015
73	Oficio COMSA-RM (Retraso en el cobro de planillas)	D.7.pdf	05/09/2015
74	Oficio de Fiscalización a Cruce de pista, hundimiento.	D.4.pdf	05/09/2015
75	Oficio de terreno que no se tomó en cuenta para expropiación	D.3.pdf	05/09/2015
76	Oficio Fiscalización MTOP (trabajos adicionales en el aeropuerto).	D.8.pdf	05/09/2015
77	Oficio para ampliación de plazo marzo 2015	D.5.pdf	05/09/2015
78	Planillas del Aeropuerto del Coca desde la 01 hasta la pLanillas final 14	H.8.rar	05/01/2017
79	Priorización SENPLADES	A.1.pdf	08/05/2014
80	Pronunciamiento de Prioridad	C.8.pdf	05/09/2015
81	Proyecto Aeropuerto del Coca	C.7.doc	05/09/2015
82	Reporte de planillas Aeropuerto	H.7.xls	21/11/2016
83	Resolución de Adjudicación	A.5.pdf	10/01/2015
84	Solicitud al Ministro para la terminación de mutuo acuerdo	H.1.pdf	21/11/2016
85	Solicitud de Criterios a Planificación, Jurídico, Subsecretaría de Infraestructura para la terminación de mutuo acuerdo	H.2.pdf	21/11/2016
86	Suspension de plazo contractual	E.4.pdf	09/11/2015
87	Suspensión de plazo contratual del proyecto Dcbre 2015	E.6.pdf	05/01/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Lara Mendoza, Richard Patricio	Administrador del proyecto	Subsecretario Zona 2, Encargado	rlara@mtop.gob.ec	023974600

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Molina Sierra, Marco	Fiscalizador del proyecto	Coordinador y Supervisor Vial de Construcciones Dirección Provincial de Orellana	mmolina@mtop.gob.ec	023974600
Navarrete Gilces, Silvia Katherine	Supervisor del Proyecto	Analista de Infraestructura Provincial 1	snavarrete@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
4889_1.jpg	05/07/2018
